


ESCP - BATSCOP - EXE - OPC - CLD - TN - TZ - Calendrier Général d'Exécution - PHASE ...

[illegible]

ESCP - BATSCOP - EXE - OPC - CLD - TN - TZ - Calendrier Général d'Exécution - PHASE

[illegible]

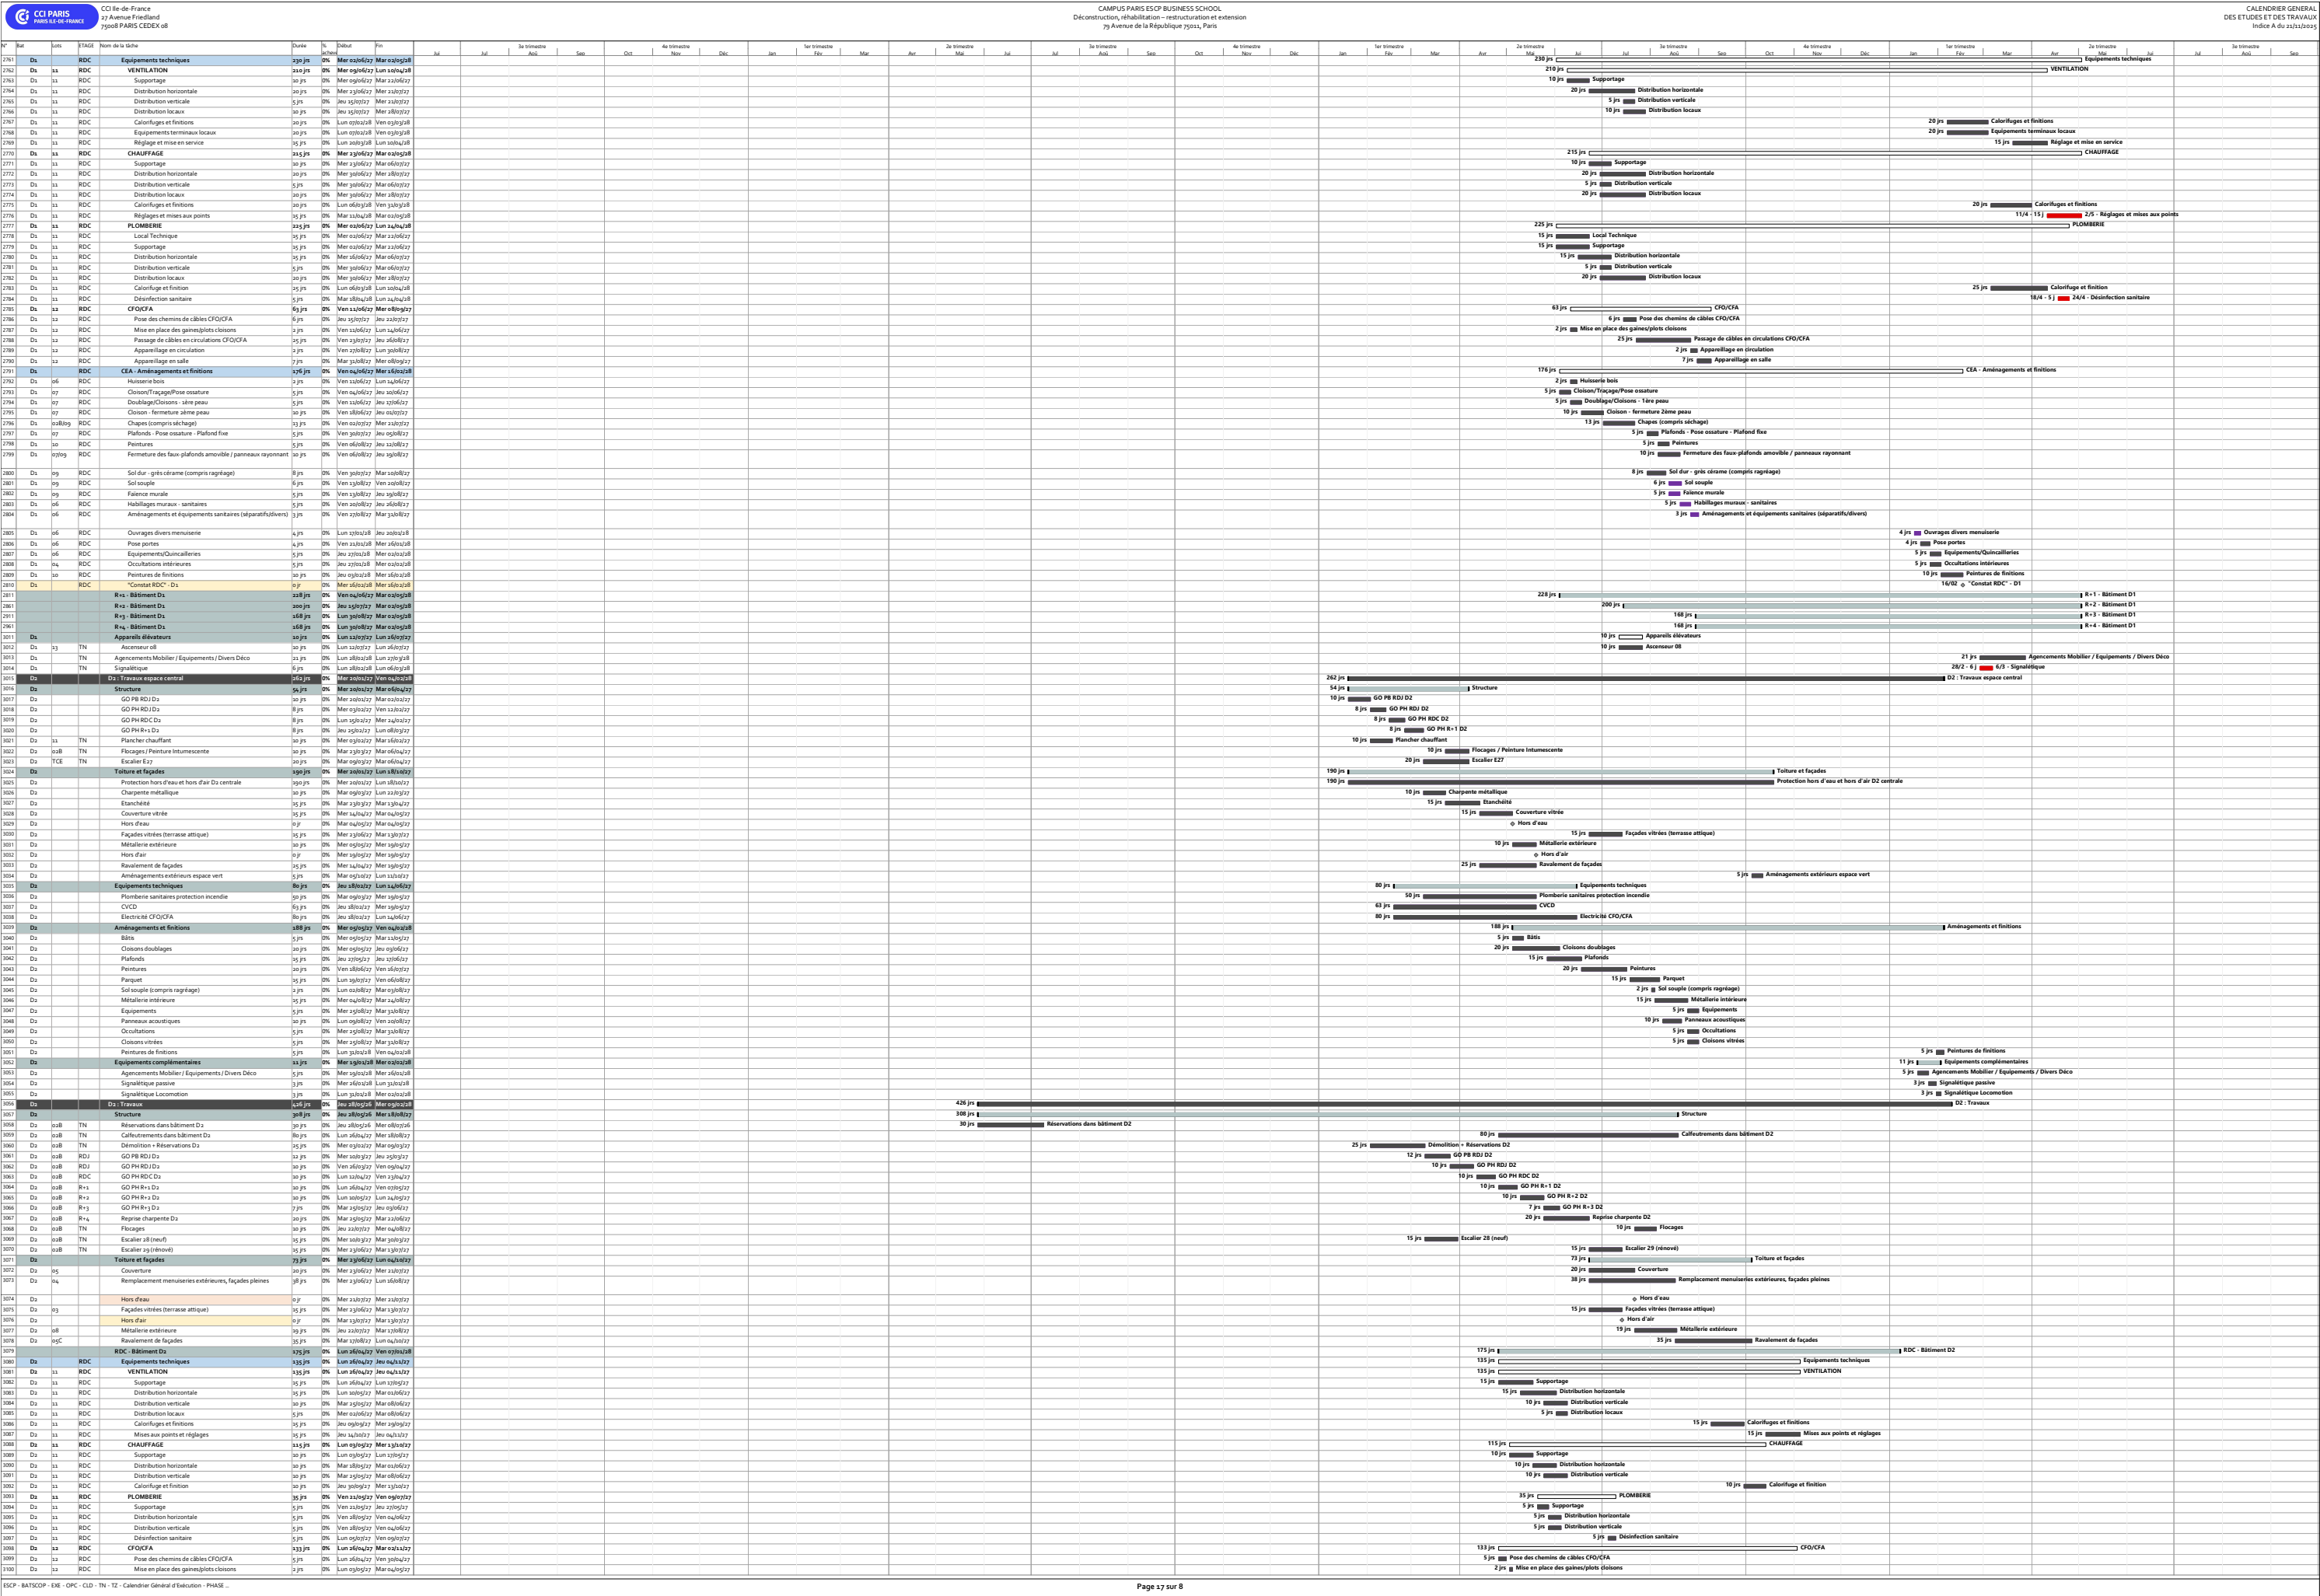

CCI PARIS PARIS E.C. FRANCE										CAMPUS PARIS ESOP BUSINESS SCHOOL Déconstruction, réhabilitation - restructuration et extension 79 Avenue de la République 75011, Paris										CALENDRIER GENERAL DES ETUDES ET DES TRAVAUX Indice A du 21/12/2025									
CCI Ile de France 12 Avenue Friedland 75008 PARIS CEDEX 08										CAMPUS PARIS ESOP BUSINESS SCHOOL Déconstruction, réhabilitation - restructuration et extension 79 Avenue de la République 75011, Paris										CALENDRIER GENERAL DES ETUDES ET DES TRAVAUX Indice A du 21/12/2025									
N°	Int	Lors	ETAGE	Nom de la tâche	Durée	%	Début	Fin		Ju	Ju	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre
1344	D2		TH	Signalétique passive	8 jrs	0%	Mer 05/04/28	Ven 05/04/28																					
1345	D2		TH	Signalétique Locomotion	8 jrs	0%	Mer 05/04/28	Mer 05/04/28																					
1346	D3		D3 : Travaux		279 jrs	0%	Mer 20/02/27	Mar 23/02/28																					
1347	D3		Structure		135 jrs	0%	Mer 20/02/27	Lun 02/03/27																					
1348	D3	02B	R0J	PB R0J D3 - Voies par passe	15 jrs	0%	Mer 20/02/27	Mar 09/03/27																					
1349	D3	02B	R0J	PB R0J D3 - Semelles - Radier	10 jrs	0%	Mer 20/02/27	Mar 23/02/27																					
1350	D3	02B	R0J	PB R0J D3 - Réseaux sous dallage / Dalle / Carreaux	10 jrs	0%	Mer 20/02/27	Mar 09/03/27																					
1351	D3	02B	R0J	PHR0J D3 - Verticaux / Plancher / Escalier	14 jrs	0%	Mer 20/02/27	Lun 29/02/27																					
1352	D3	02B	R0C	PHR0C D3 - Verticaux / Plancher / Escalier	14 jrs	0%	Mar 30/02/27	Lun 29/03/27																					
1353	D3	02B	R+1	PHR+1 D3 - Verticaux / Plancher / Escalier	14 jrs	0%	Mar 30/02/27	Ven 27/02/27																					
1354	D3	02B	R+2	PHR+2 D3 - Verticaux / Plancher / Escalier	14 jrs	0%	Lun 20/02/27	Ven 28/02/27																					
1355	D3	02B	R+3	PHR+3 D3 - Verticaux / Terrasse	14 jrs	0%	Mar 06/02/27	Ven 28/04/27																					
1356	D3	02B	TH	Flocages	10 jrs	0%	Mar 20/02/27	Lun 02/03/27																					
1357	D3	11	R0C	Plancher chauffant	10 jrs	0%	Mer 20/02/27	Mar 23/02/27																					
1358	D3			Touture et façades	110 jrs	0%	Ven 23/02/27	Lun 23/02/27																					
1359	D3	05A		Couverture	15 jrs	0%	Lun 21/02/27	Ven 09/03/27																					
1360	D3	05B		Etanchéité	15 jrs	0%	Lun 28/02/27	Lun 29/03/27																					
1361	D3			Hors d'eau	0 jr	0%	Lun 29/02/27	Lun 29/02/27																					
1362	D3	03		Façades vitrées	55 jrs	0%	Ven 22/02/27	Lun 09/03/27																					
1363	D3	04		Métallerie extérieure	15 jrs	0%	Mar 20/02/27	Lun 09/03/27																					
1364	D3			Hors d'air	0 jr	0%	Lun 09/02/27	Lun 09/03/27																					
1365	D3	15		Amenagements extérieurs espace vert	20 jrs	0%	Mar 28/02/27	Lun 29/02/27																					
1366	D3			Equipements élévateurs	20 jrs	0%	Lun 21/02/27	Lun 29/02/27																					
1367	D3	13		Ascenseur ou (PMR)	20 jrs	0%	Lun 28/02/27	Lun 29/02/27																					
1368	D3		R0J - Bâtiment D3		279 jrs	0%	Mar 30/02/27	Lun 13/03/27																					
1369	D3		R0J	Equipements techniques	279 jrs	0%	Mar 30/02/27	Mar 07/03/27																					
1370	D3	11	R0J	VENTILATION	57 jrs	0%	Mar 30/02/27	Lun 21/03/27																					
1371	D3	11	R0J	Local Technique - CTA B/g/10	40 jrs	0%	Mar 30/02/27	Mer 21/02/27																					
1372	D3	11	R0J	Supportage	10 jrs	0%	Lun 21/02/27	Lun 28/02/27																					
1373	D3	11	R0J	Distribution horizontale	10 jrs	0%	Mar 08/02/27	Lun 21/02/27																					
1374	D3	11	R0J	Distribution verticale	5 jrs	0%	Mar 15/02/27	Lun 21/02/27																					
1375	D3	11	R0J	CHAUFFAGE	135 jrs	0%	Jeu 27/02/27	Mar 07/02/27																					
1376	D3	11	R0J	Local Technique	20 jrs	0%	Jeu 27/02/27	Jeu 21/02/27																					
1377	D3	11	R0J	Supportage	10 jrs	0%	Mar 21/02/27	Lun 28/02/27																					
1378	D3	11	R0J	Distribution horizontale	10 jrs	0%	Mar 21/02/27	Lun 05/03/27																					
1379	D3	11	R0J	Distribution verticale	5 jrs	0%	Mar 29/02/27	Lun 05/03/27																					
1380	D3	11	R0J	Calorifuge et finition	20 jrs	0%	Lun 08/02/27	Mar 16/02/27																					
1381	D3	11	R0J	Equipement terminaux Locaux	5 jrs	0%	Mer 08/02/27	Mar 08/02/27																					
1382	D3	11	R0J	CFO/CFA	159 jrs	0%	Mar 30/02/27	Lun 13/03/27																					
1383	D3	12	R0J	Pose des chemins de câbles	2 jrs	0%	Mar 30/02/27	Mer 31/02/27																					
1384	D3	12	R0J	Passage de câbles en circulation CFO/CFA	3 jrs	0%	Jeu 01/03/27	Mar 01/03/27													</								

