

Chef de projet	
Dates du projet	1 avr. 2025 - 4 juil. 2028
Avancée	0%
Tâches	28
Ressources	0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Etudes	01/04/2025	26/10/2026
ESQ	01/04/2025	01/05/2025
Validation ESQ	02/05/2025	02/05/2025
AVP	02/05/2025	22/10/2025
Avis AMO (CT,CSPS...), SP2E, USID, BSSI, SAI + reprise - 2 mois	25/08/2025	22/10/2025
Appro. AVP	30/10/2025	26/12/2025
Validation AVP	29/12/2025	29/12/2025
Instruction du PC	29/12/2025	27/03/2026
Recours des tiers PC	31/03/2026	29/06/2026
Rédaction DCE	01/12/2025	31/03/2026
Approbation ACT	31/03/2026	27/05/2026
Publication	28/05/2026	28/05/2026
Appel d'offres	28/05/2026	27/07/2026
Jugement des offres - Attribution	27/07/2026	26/10/2026
Notification TVX	27/10/2026	27/10/2026
Marché 1 - TCE	01/12/2026	31/03/2028
PP Marché 1 - TCE	01/12/2026	26/02/2027
Travaux Marché 1 - TCE	01/03/2027	31/03/2028
Marché 2 - Électricité CFO/CFA - sécurité incendie	02/08/2027	31/03/2028
PP Marché 2 - Électricité CFO/CFA - sécurité incendie	02/08/2027	29/10/2027
Travaux Marché 2 - Électricité CFO/CFA - sécurité incendie	01/11/2027	31/03/2028
Marché 3 - CVC - plomberie sanitaire	02/08/2027	31/03/2028
PP Marché 3 - CVC - plomberie sanitaire	02/08/2027	29/10/2027
Travaux Marché 3 - CVC - plomberie sanitaire	01/11/2027	31/03/2028
Réalisation des OPR pour les 3 marchés	03/04/2028	03/05/2028
Réception des marchés 1 à 3	04/05/2028	04/05/2028
Livraison - remise à l'utilisateur	04/05/2028	03/07/2028
DIRISI - Raccordement	04/04/2028	28/04/2028

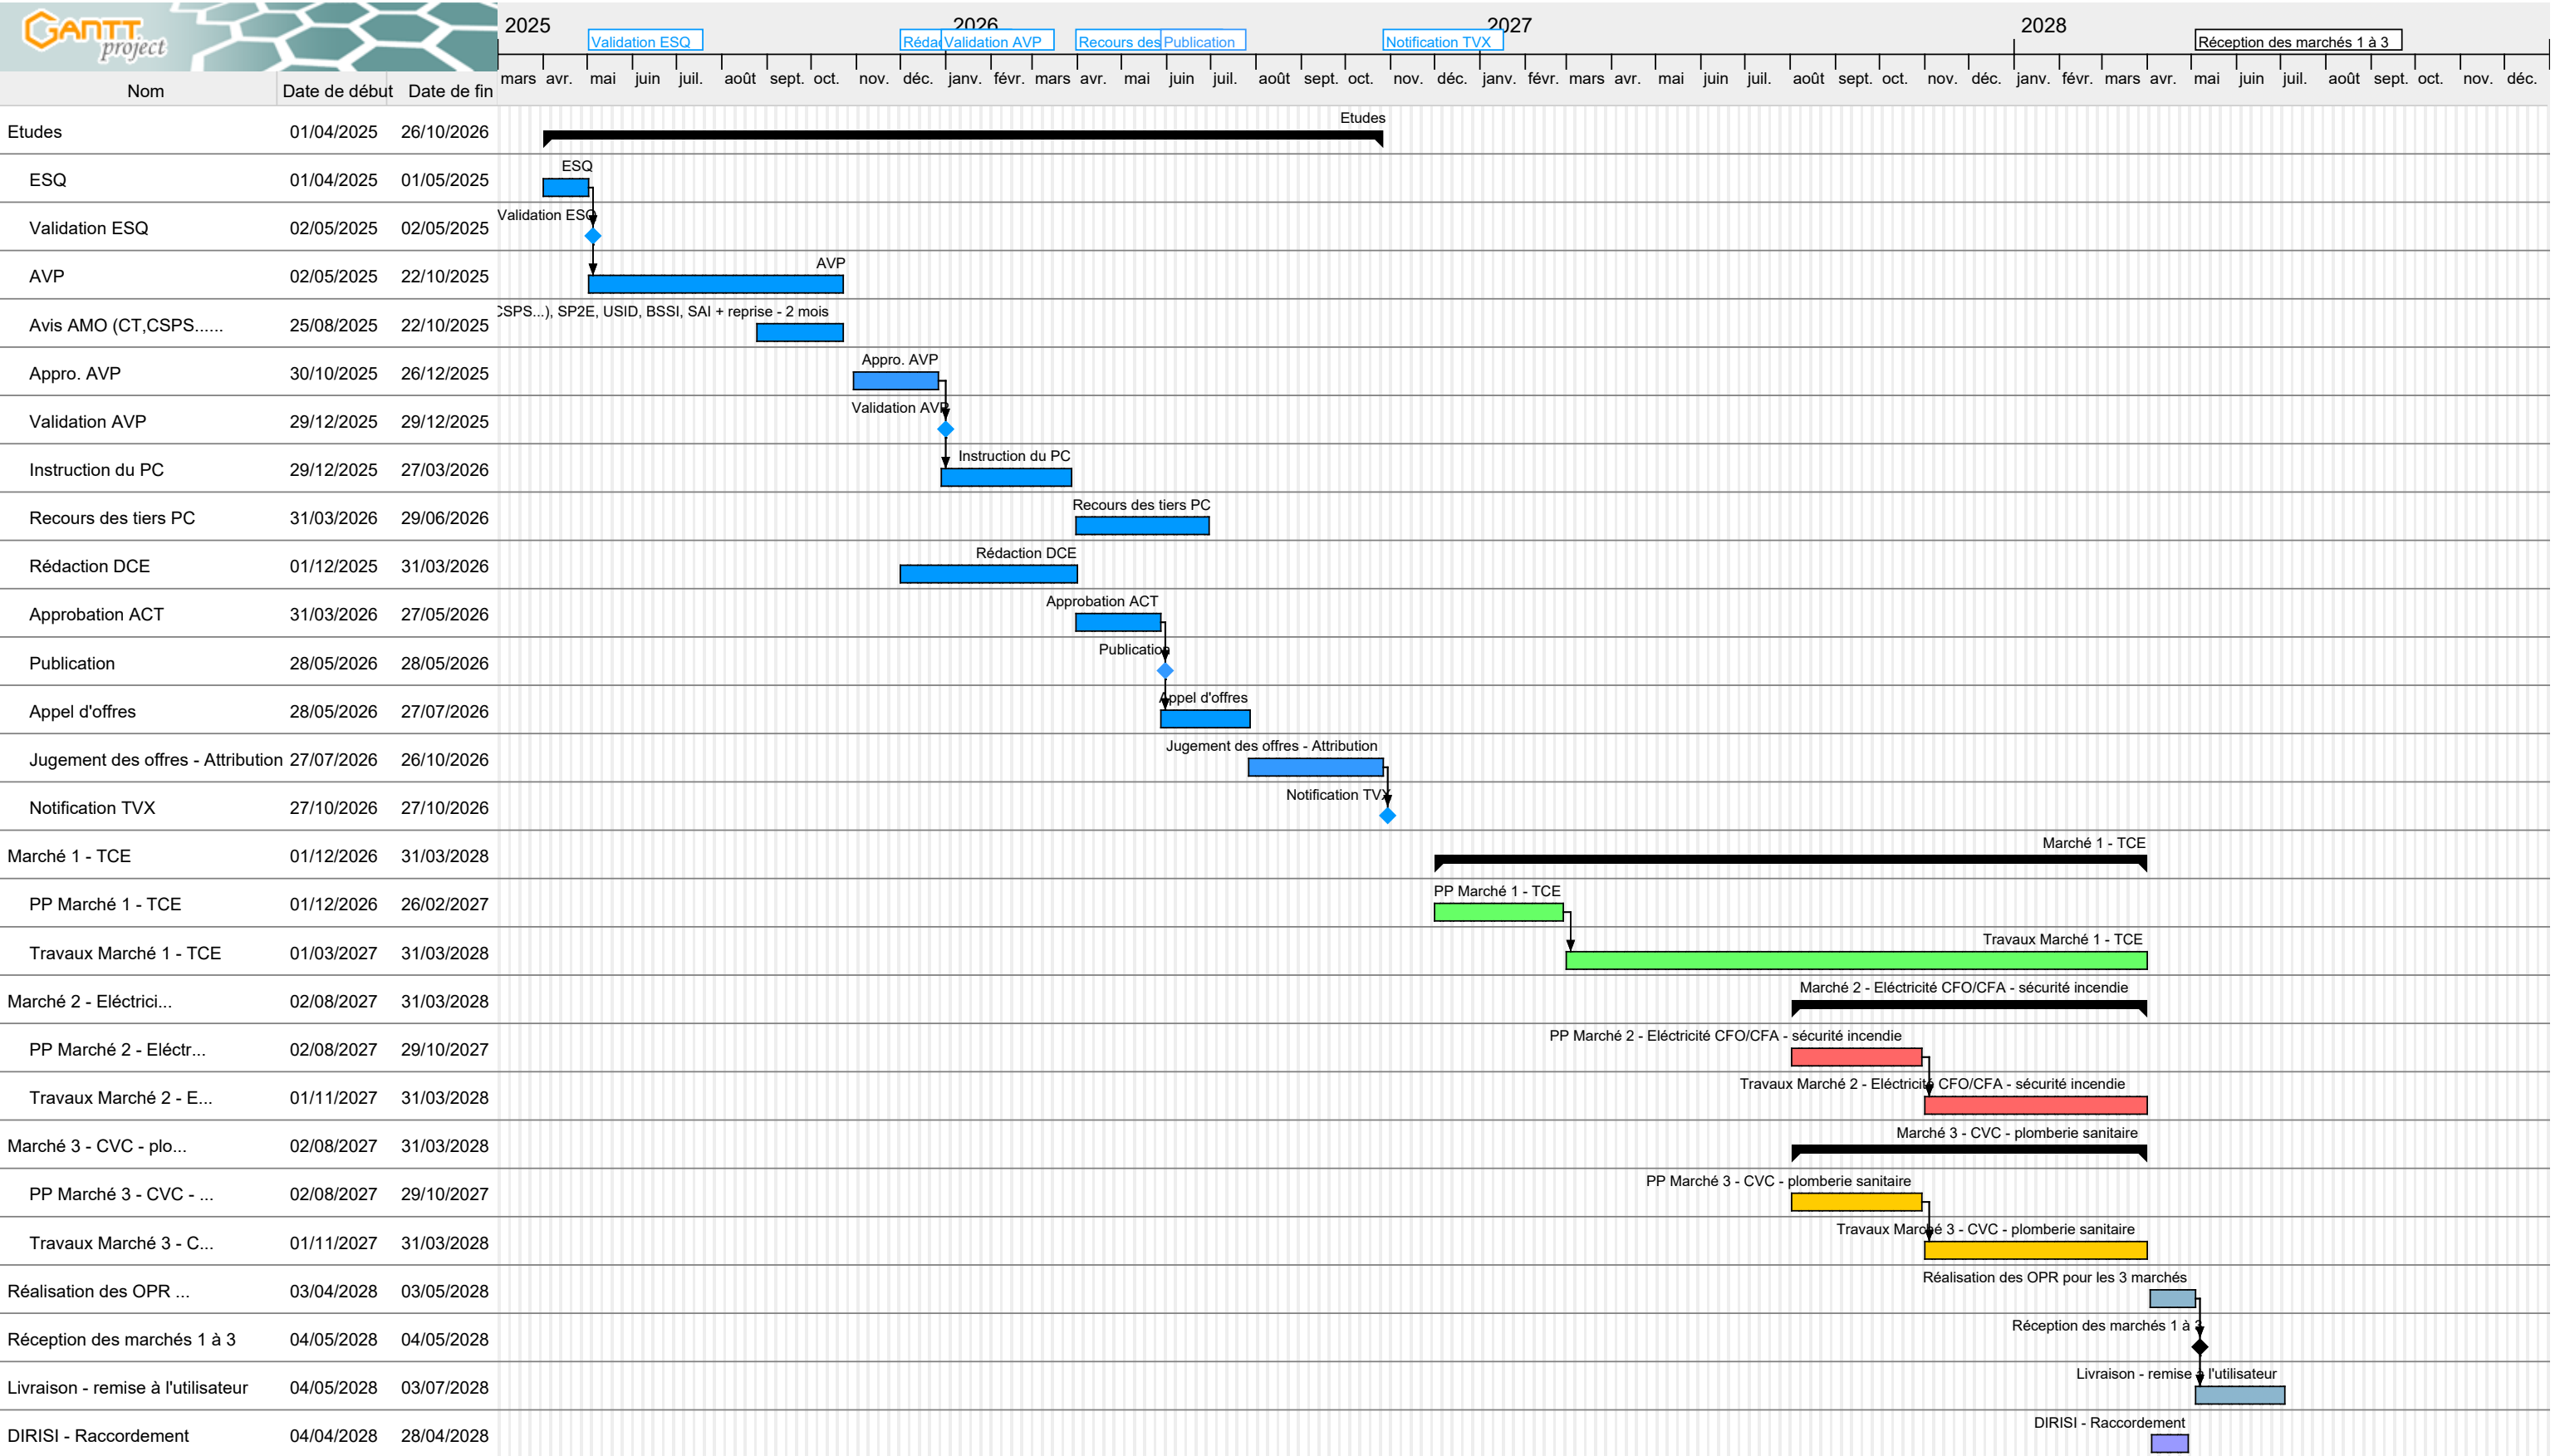


Diagramme des Ressources

