

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 29634968/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 30/01/2026**Référence au programme de travaux :**

Réaménagement intérieur & création d'une terrasse
CAF de la SAVOIE 25DBA03_CAF
SAVOIE_APD_Notice_251027 réalisé le 30/10/2025
par Architectes Maîtres d'Œuvre Experts

DONNEUR D'ORDRE

**CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DE LA SAVOIE****HUBERT JACOB**

20 AVENUE JEAN JAURES

73000 CHAMBERY

SITE D'INTERVENTION

CAF DE LA SAVOIE

20 AVENUE JEAN JAURES

73000 CHAMBERY

SIEGE**Code site : F73A001A**

Latitude : 45.569700 / Longitude : 5.912500

Date(s) d'intervention(s) :

Le 05/01/2026



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE


Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Laurent GREGIS	Diagnosticteur immobilier	Certification N° 20-1167	Laurent GREGIS
			

Le présent rapport comporte 80 pages, dont 55 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	7
2. CONCLUSIONS	8
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	8
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	10
2.3. Obligations réglementaires	11
3. INFORMATIONS GENERALES	12
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	12
3.2. Parties prenantes	12
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	12
4.1. Références réglementaires	12
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	13
5.1. Date(s) de visite(s)	13
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	13
5.3. Conditions spécifiques	13
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	13
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	14
6.1. Matériaux et produits repérés	14
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	25
7. ANNEXES	26
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	26
7.2. Photos prélèvements	28
7.3. Photos sondages	38
7.4. Photos inaccessibilités	42
7.5. Photos observations	43
7.6. Attestation d'assurance	46
7.7. Certificat de compétence	48
7.8. Croquis de repérage	49
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	63

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réaménagement intérieur : - Curage complet des installations électrique (Réseaux et équipements) des locaux modifiés suivant plans architecte - Curage partiel des installations de CVC et plomberie sanitaire (Réseaux et équipements) des locaux modifiés suivant plans architecte - Mise en peinture des murs, portes et autres menuiseries. - Reprise des revêtements de sol - Création d'un plénum par la pose d'un faux plafond - Agrandissement de la porte d'accès extérieure - Carottages dans les dalles pour le passage des réseaux et des fluides (selon relevé sur site), sur plusieurs niveaux (Y compris RDC & Sous-sol) - Reprise en sous-œuvre et linteau bétons après ouverture en façade (Porte vers terrasse) - Démolition des cloisons, portes intérieurs et éléments de menuiseries existantes situées dans les zones concernées par le réaménagement. - Ouvertures en sous-œuvre pour d'agrandir l'accès à la terrasse Création d'une terrasse en R+1

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Ardoises	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment
Bardeaux bitumineux	Bardeaux bitumineux ("shingles")
Conduits en toiture	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Éléments associés à la toiture	Chéneaux, Closoirs, Colles des solins en fibre ciment, Conduits, Costières, Couvre-joints, Éléments complémentaires de toiture, Faitages, Garnissages des joints de dilatation, Joints de dilatation, Jonctions bitumineuses, Mitres, Rives, Solins, Tresses d'étanchéité à l'air
Éléments sous toiture	Enduits projetés, Flocages, Isolants fibreux en sous toiture, Pare-pluie, Pare-vapeur
Étanchéité de toiture terrasse	Complexes asphaltés, Ecrans de semi indépendance, Pare-vapeur, Produits d'accrochage, Revêtements bitumineux parties planes, Revêtements bitumineux relevés
Fenêtres de toit	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Lanterneaux	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux, Revêtements anti condensation sous bac acier
Toitures	Accessoires de couverture composite hors fibres-ciment, Accessoires de couverture en fibres-ciment, Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bardeaux bitumineux, Plaques en fibres-ciment, Plaques en matériaux bitumineux
Verrières	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature, Mastics
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiment des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Peintures, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Aerothermes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Bacs à sable incendie	Eléments en fibres-ciment
Baignoires	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Câbles électriques	Gaine/Enveloppe, Tresses/isolant
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Chaudières (mixtes, collectives)	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Chauffes bains	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Coffres-forts	Parois, Portes
Convecteurs électriques	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Isolants thermiques cartonnés, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses des diffuseurs
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Etuves	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Eviers métalliques	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Fours	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Fusibles à broche	Carton, Tresses
Groupes électrogènes	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Jardinières	Eléments en fibres-ciment
Poêles	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Portes de placard	Plaques souples bitumineuses antivibratiles
Pots de fleur	Eléments en fibres-ciment
Radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés, Tresses des diffuseurs
Radiateurs gaz modulables	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
Tuyauteries	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses
09 - Fondations et soubassements	
Conduits	Conduits dans maçonnerie
Etanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Fourreaux	Fourreaux dans maçonnerie
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Toiture terrasse du R+1

Façade

RDC : Le Bocal / Local bannettes / Archives/ Bureau R09 / Vestiaire 1 et 2 / Circulation / Bureau gestion de la personne / Bureau manager gestion de la personne / Vestiaire gestion de la personne

R+1 : Local technique / Sanitaires 307 / Palier escalier / Circulation

R+2 : Archives / Local technique / Circulation / Sanitaires hommes

R+3 : Local technique / Sanitaires hommes / Bureau 303 bis / Bureau 302 / Circulation

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
17	R+3 -> Sanitaires hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir
17	R+3 -> Bureau 303 bis				
17	R+3 -> Bureau 302				
17	R+1 -> Sanitaires 307				
25	Rdc -> Le Bocal				
17	Rdc -> Le Bocal				
25	Rdc -> Vestiaire 1				
25	Rdc -> Vestiaire 2				
17	Rdc -> Bureau gestion de la personne				
17	Rdc -> Bureau manager gestion de la personne				
16	R+2 -> Archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/
19	R+3 -> Sanitaires hommes	Revêtements de sol (revêtement inférieur)	Colles de carrelage	Ciment	/
19	R+2 -> Sanitaires hommes				
19	R+1 -> Sanitaires 307				
9	R+3 -> Local technique	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
9	R+2 -> Local technique	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron
9	R+1 -> Local technique				
9	Rdc -> Archives				
27	R+3 -> Local technique	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Marron

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Terrasse r+1 (IA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades - bardage en place non démontable	Dépose de bardage requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Procéder à la dépose d'éléments par une entreprise qualifiée afin d'accéder aux parties d'ouvrages situées derrière les bardages

2.3. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CAF DE LA SAVOIE
20 AVENUE JEAN JAURES
73000 CHAMBERY

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CAF DE LA SAVOIE	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
HUBERT JACOB	Donneur d'ordre	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE	20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	04 79 96 62 12
HUBERT JACOB	Accompagnateur	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE	20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	+33 4 79 96 62 12 - hubert.jacob@caf73.caf.fr
HUBERT JACOB	Propriétaire	CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE	20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	+33 4 79 96 62 12 - hubert.jacob@caf73.caf.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 05/01/2026

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Réaménagement intérieur & création d'une terrasse CAF de la SAVOIE	Architectes Maîtres d'Œuvre Experts	30/10/2025	25DBA03_CAF SAVOIE_APD_Notice_251027	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO. Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	23	/	S25	AN	plénum	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	P34* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	24	Idem P 51	/	AN	plénum	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Local technique	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Compact	Blanc	14	P32* N	/	AN	enduit de rebouchage	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	11	P38* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron	9	P35* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Marron	27	P36* P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	10	P37* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires hommes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	20	/	S8	AN	petit rond blanc. revêtement antérieur	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	21	/	S9	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	22	/	S10	AN	revêtement supérieur	Non
	Revêtements de sol (revêtement inférieur)	Colles de carrelage	Ciment	/	19	/	S7	AN	revêtement inférieur	Oui
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	/	S1	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	/	S11	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	P33* P	/	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	Idem P 22	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Sanitaires hommes	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+3 -> Bureau 303 bis	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	/	S5	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	/	S3	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	/	S2	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact	/	18	P40* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+3 -> Bureau 302	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	/	S4	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+2 -> Archives	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	P22* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Archives	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	16	P30* P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	16	P31 P	/	AN	/	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	P19* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	15	P28* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	/	15	P29 N	/	AN	/	Non
	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact	/	18	P39 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+2 -> Local technique	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	11	P26 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Compact	Blanc	14	P27 N	/	AN	enduit de rebouchage	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron	9	P24 P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	10	P25 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
R+2 -> Circulation	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	P20* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Circulation	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	P18* N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	P17 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	/	S12	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	23	Idem P 50	/	AN	plénum	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	24	Idem P 51	/	AN	plénum	Non
R+2 -> Sanitaires hommes	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	P21* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol (revêtement inférieur)	Colles de carrelage	Ciment	/	19 (i)	P41* N	/	AN	revêtement inférieur	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	20	P42* N	/	AN	petit rond blanc. revêtement antérieur	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	21	P43* N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	22	P44* N	/	AN	revêtement supérieur	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	/	S6	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local technique	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	11	P12 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron	9	P10 P	/	AN	/	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Blanc	10	P11 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	/	S13	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Compact	Blanc	14	Idem P 32	/	AN	enduit de rebouchage	Non
R+1 -> Sanitaires 307	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	P49 P	/	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Revêtements de sol (revêtement inférieur)	Colles de carrelage	Ciment	/	19	P48 P	/	AN	revêtement inférieur	Oui
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	22	P45 N	/	AN	revêtement supérieur	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	/	21	P46 N	/	AN	/	Non
	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	/	20	P47 N	/	AN	petit rond blanc. revêtement antérieur	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	Idem P 22	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	23	P50* N	/	AN	plénum	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	24	P51* N	/	AN	plénum	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	/	S14	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	/	S15	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	/	S16	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
R+1 -> Palier escalier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	P59 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
Rdc -> Le Bocal	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	P4 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	P5 N	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	P6 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	25	P53* P	/	AN	baie vitrée bois	Oui
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rdc -> Le Bocal	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	P3 N	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	P1 N	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	/	S17	AN	mastic vitrier de porte	Oui
Rdc -> Circulation	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	23	P54 N	/	AN	plénum	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Bitumineux	Noir	24	P55 N	/	AN	plénum	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	Idem P 22	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rdc -> Local banettes	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	/	7	P7* N	/	AN	revêtement souple	Non
	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Ciment	/	7	P23 N	/	AN	revêtement souple	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rdc -> Local banettes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rdc -> Archives	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Blanc	11	Idem P 38	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Marron	9	Idem P 35	/	AN	/	Oui
Rdc -> Bureau R09	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Beige	8	P9* N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rdc -> Vestiaire 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	25	P56 P	/	AN	baie vitrée bois	Oui
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rdc -> Vestiaire 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	25	/	S18	AN	baie vitrée bois	Oui
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Lissé	Beige	8	P8 N	/	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	Idem P 21	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	1	Idem P 34	/	AN	/	Non
Rdc -> Bureau gestion de la personne	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	/	S19	AN	/	Non
	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	6	/	S21	AN	/	Non
	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact, Plâtre	/	5	/	S22	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	26	P57* N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	Idem P 33	/	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Compact	/	18	/	S24	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Noir	17	/	S23	AN	mastic vitrier de porte	Oui
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	/	S20	AN	/	Non
	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	/	26	P58 N	/	AN	/	Non
	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
Rdc -> Vestiaire gestion de la personne	Faux plafonds	Panneaux	Laine de roche	/	4	Idem P 20	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Moquettes	Toile	Gris	2	Idem P 18	/	AN	/	Non
	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	3	Idem P 19	/	AN	/	Non
Terrasse r+1	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	/	12	P13* N	/	AN	sol porte palière	Non
	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	/	12	P14 N	/	AN	sol porte palière	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	/	13	P15* N	/	AN	acrotère	Non
	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment	/	13	P16 N	/	AN	acrotère	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
16	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	40 ml
17	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	10 ml
25	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	9 ml
9	Revêtements de sol	Moquettes	20 m ²
19	Revêtements de sol (revêtement intérieur)	Colles de carrelage	60 m ²
27	Revêtements de sol	Ragréages	20 m ²

7. ANNEXES

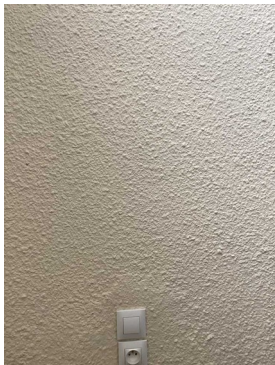
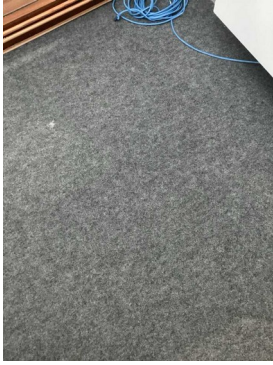
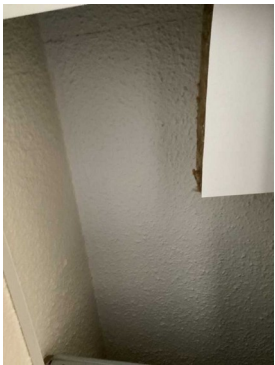
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

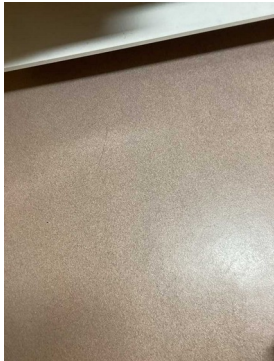
La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3	/
R+3 -> Circulation	/
R+3 -> Local technique	/
R+3 -> Sanitaires hommes	/
R+3 -> Bureau 303 bis	/
R+3 -> Bureau 302	/
R+2	/
R+2 -> Archives	/
R+2 -> Local technique	/
R+2 -> Circulation	/
R+2 -> Sanitaires hommes	/
R+1	/
R+1 -> Local technique	/
R+1 -> Sanitaires 307	/
R+1 -> Circulation	/
R+1 -> Palier escalier	/
Rdc	/
Rdc -> Le Bocal	/
Rdc -> Circulation	/
Rdc -> Local banettes	/
Rdc -> Archives	/
Rdc -> Bureau R09	/
Rdc -> Vestiaire 1	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Rdc -> Vestiaire 2	/
Rdc -> Bureau gestion de la personne	/
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	/
Rdc -> Vestiaire gestion de la personne	/
Terrasse r+1	/

7.2. Photos prélèvements

P1	ZPSO 1	P2	ZPSO 2
Rdc -> Le Bocal		Rdc -> Le Bocal	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés		Revêtements de sol -> Moquettes	
P3	ZPSO 3	P4	ZPSO 4
Rdc -> Le Bocal		Rdc -> Le Bocal	
			
Revêtements de sol -> Ragréages		Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	
P5	ZPSO 5	P6	ZPSO 6
Rdc -> Le Bocal		Rdc -> Le Bocal	
			
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés		Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P7	ZPSO 7
Rdc -> Local banettes	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses	

P8	ZPSO 8
Rdc -> Vestiaire 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P9	ZPSO 8
Rdc -> Bureau R09	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P10	ZPSO 9
R+1 -> Local technique	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

P11	ZPSO 10
R+1 -> Local technique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 11
R+1 -> Local technique	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P13	ZPSO 12
Terrasse r+1	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

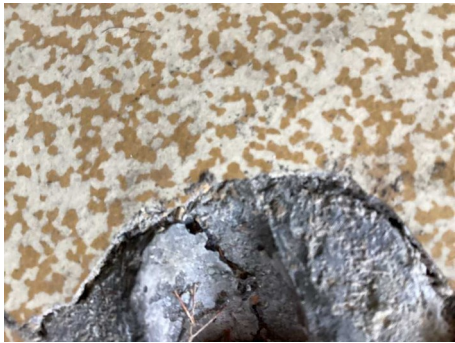
P14	ZPSO 12
Terrasse r+1	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P15	ZPSO 13
Terrasse r+1	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P16	ZPSO 13
Terrasse r+1	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P17	ZPSO 1
R+2 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P18	ZPSO 2
R+2 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

P19	ZPSO 3
R+2 -> Archives	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P20	ZPSO 4
R+2 -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P21	ZPSO 5
R+2 -> Sanitaires hommes	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 6
R+2 -> Archives	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 9
R+2 -> Local technique	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

P25	ZPSO 10
R+2 -> Local technique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 11
R+2 -> Local technique	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P27	ZPSO 14
R+2 -> Local technique	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P28	ZPSO 15
R+2 -> Archives	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P29	ZPSO 15
R+2 -> Archives	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P30	ZPSO 16
R+2 -> Archives	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P31	ZPSO 16
R+2 -> Archives	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P32	ZPSO 14
R+3 -> Local technique	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P33	ZPSO 17
R+3 -> Sanitaires hommes	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P34	ZPSO 1
R+3 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P35	ZPSO 9
R+3 -> Local technique	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

P36	ZPSO 27
R+3 -> Local technique	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

P37	ZPSO 10
R+3 -> Local technique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P37	ZPSO 10
R+3 -> Local technique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

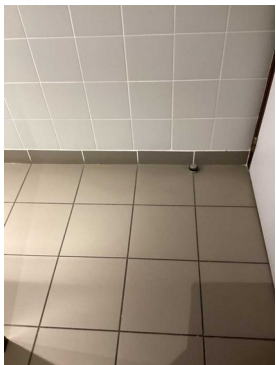
P38	ZPSO 11
R+3 -> Local technique	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

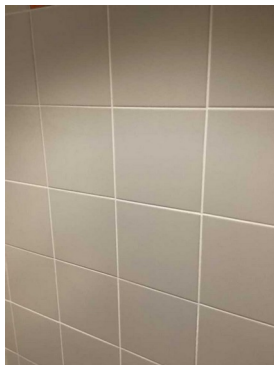
P39	ZPSO 18
R+2 -> Archives	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P40	ZPSO 18
R+3 -> Bureau 303 bis	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

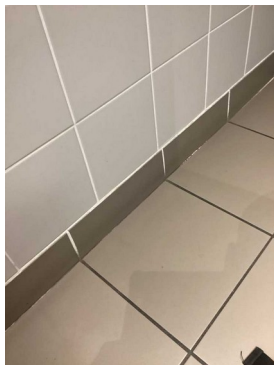
P41	ZPSO 19
R+2 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage (revêtement inférieur)	

P42	ZPSO 20
R+2 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P43	ZPSO 21
R+2 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P44	ZPSO 22
R+2 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P45	ZPSO 22
R+1 -> Sanitaires 307	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P46	ZPSO 21
R+1 -> Sanitaires 307	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P47	ZPSO 20
R+1 -> Sanitaires 307	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

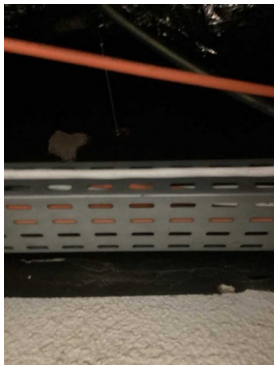
P48	ZPSO 19
R+1 -> Sanitaires 307	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage (revêtement inférieur)	

P49	ZPSO 17
R+1 -> Sanitaires 307	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P51	ZPSO 24
R+1 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P51	ZPSO 24
R+1 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P53	ZPSO 25
Rdc -> Le Bocal	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

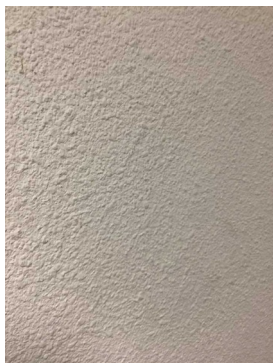
P54	ZPSO 23
Rdc -> Circulation	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P55	ZPSO 24
Rdc -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P56	ZPSO 25
Rdc -> Vestiaire 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

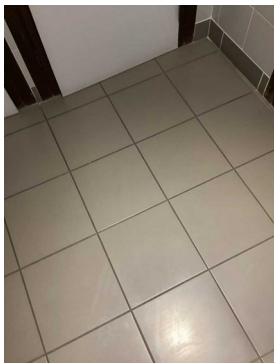
P57	ZPSO 26
Rdc -> Bureau gestion de la personne	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P58	ZPSO 26
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P59	ZPSO 1
R+1 -> Palier escalier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 4	S2	ZPSO 2
R+3 -> Sanitaires hommes		R+3 -> Bureau 303 bis	
			
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)		Revêtements de sol -> Moquettes	
S3	ZPSO 17	S4	ZPSO 17
R+3 -> Bureau 303 bis		R+3 -> Bureau 302	
			
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage		Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	
S5	ZPSO 1	S6	ZPSO 6
R+3 -> Bureau 303 bis		R+2 -> Sanitaires hommes	
			
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés		Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

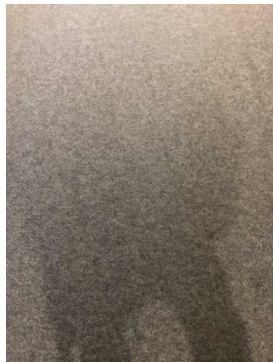
S7	ZPSO 19
R+3 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

S8	ZPSO 20
R+3 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S9	ZPSO 21
R+3 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

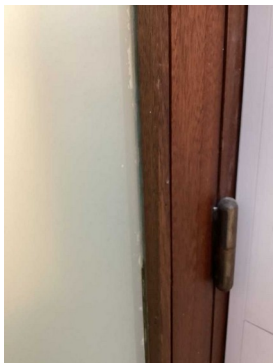
S10	ZPSO 22
R+3 -> Sanitaires hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

S13	ZPSO 3
R+1 -> Local technique	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

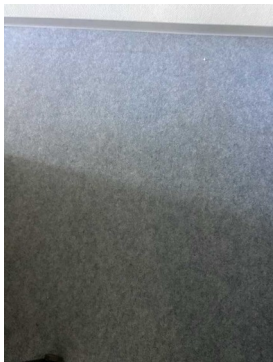
S14	ZPSO 2
R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

S15	ZPSO 3
R+1 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S16	ZPSO 4
R+1 -> Circulation	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S17	ZPSO 17
Rdc -> Le Bocal	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S18	ZPSO 25
Rdc -> Vestiaire 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S19	ZPSO 2
Rdc -> Bureau gestion de la personne	
	
Revêtements de sol -> Moquettes	

S20	ZPSO 3
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	
	
Revêtements de sol -> Ragréages	

S21	ZPSO 6
Rdc -> Bureau gestion de la personne	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S22	ZPSO 5
Rdc -> Bureau gestion de la personne	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S23	ZPSO 17
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S24	ZPSO 18
Rdc -> Bureau manager gestion de la personne	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

7.4. Photos inaccessibilités

Investigation(s) approfondie(s) à réaliser avant les travaux

Terrasse r+1		IA 1
2- Parois verticales extérieures et façades		
Dépose de bardage requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : bardage en place non démontable Procéder à la dépose d'éléments par une entreprise qualifiée afin d'accéder aux parties d'ouvrages situées derrière les bardages

7.5. Photos observations

Rdc -> Le Bocal		OBS 1
03 - Parois verticales intérieures		
Menuiseries intérieures		
	Observation :	
	baie vitré fixe bois	
Rdc -> Le Bocal		OBS 2
03 - Parois verticales intérieures		
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres		
	Observation :	
	panneaux bois	
Rdc -> Le Bocal		OBS 3
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	Observation :	
	panneaux bois non impactés par les travaux	

Rdc -> Local banettes		OBS 4
03 - Parois verticales intérieures		
Cloisons (légères et préfabriquées)		
	Observation : bardage bois	

Terrasse r+1		OBS 5
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Etanchéité de toiture terrasse		
	Observation : étanchéité de la toiture terrasse non impacté par les travaux	

Terrasse r+1		OBS 5
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités		
Etanchéité de toiture terrasse		
	Observation : étanchéité de la toiture terrasse non impacté par les travaux	

R+1 -> Palier escalier		OBS 6
03 - Parois verticales intérieures		
Portes coupe-feu		
		Observation : porte coupe feu de 2017. Marquage

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Tour Alto, 4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Diagnostics amiante et inventaires des matières dangereuses à bord des navires et matériel flottant
- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic et dépistage du radon dans les bâtiments, cavités, lieux souterrains, recherche des sources, voies d'entrées et de transfert, mesure de flux d'exhalation des sols
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Attestation d'assurance

Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) **1'000'000 EUR** par sinistre et par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2026 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 23 décembre 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Signed by: LORENZO BATTISTI
E-Mail: lorenzo.battisti1@allianz.com
Signing time: 2025 10:46:58
IP address: 163.225.202.119

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence

BUREAU VERITAS
Certification



Certificat attribué à

Laurent GREGIS

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Termites metropole	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/10/2020	20/10/2027
Plomb sans mention (CREP)	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/10/2020	20/10/2027
Gaz	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	21/10/2020	20/10/2027
Électricité	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	16/11/2027
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	27/11/2020	26/11/2027

Date : 20/10/2025
Numéro du certificat : **28827203**

Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. [Cliquez ici pour vérifier la validité de ce certificat](#)
Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
1 Place Zaha Hadid 92400 Courbevoie



7.8. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation	Date visite	Le 05/01/2026
R+3	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	1 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+3	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	2 / 13
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage Moquettes + Colle + Ragréage Colles de carrelage (revêtement inférieur)		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	3 / 13
R+3	Indice	1
Sondage	Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+2	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	4 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+2	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	5 / 13
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : --- Colles de plinthe Moquettes + Colle + Ragréage Colles de carrelage (revêtement inférieur)		



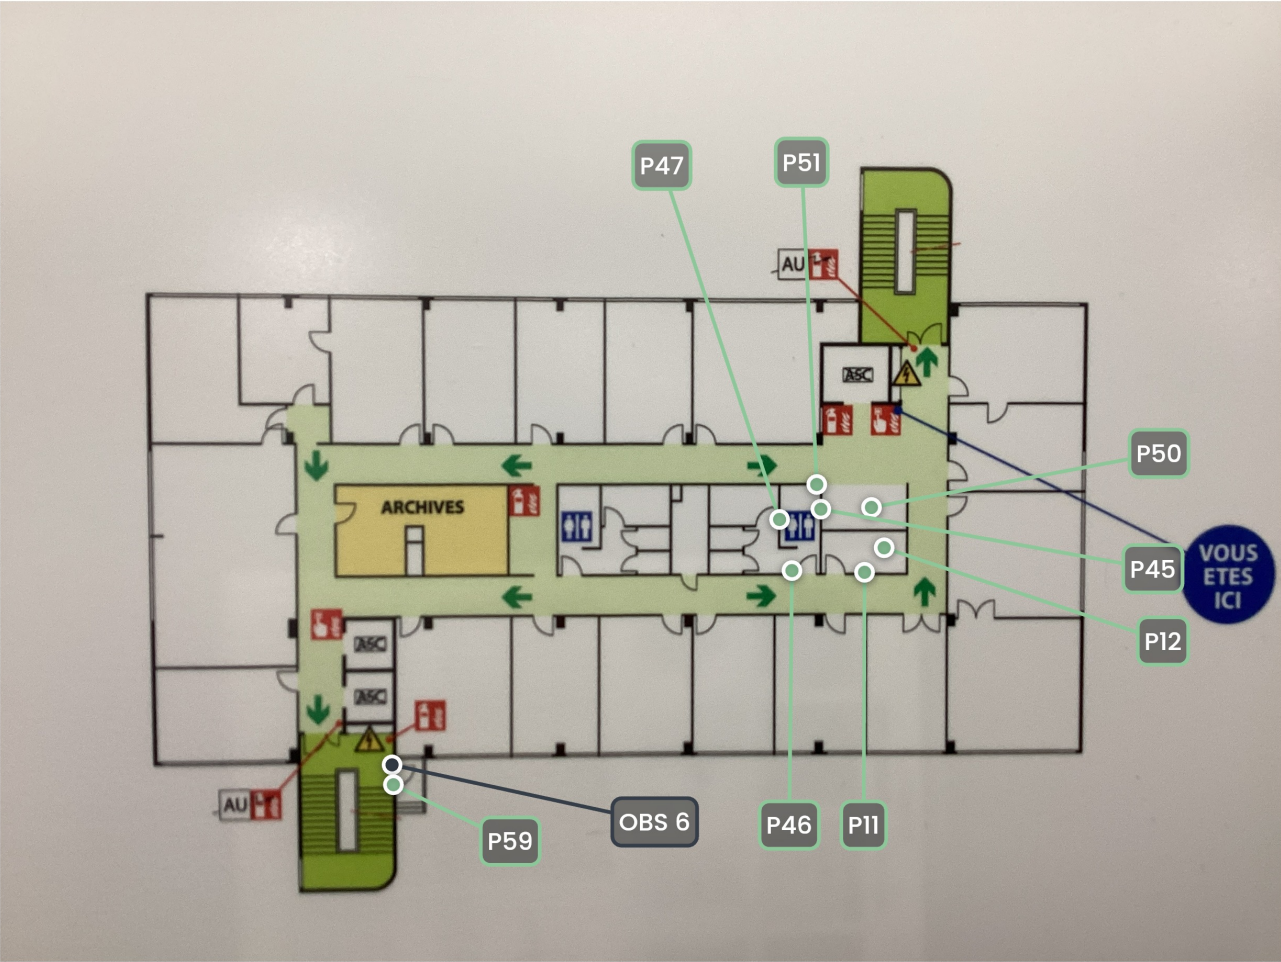
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+2	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	6 / 13
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



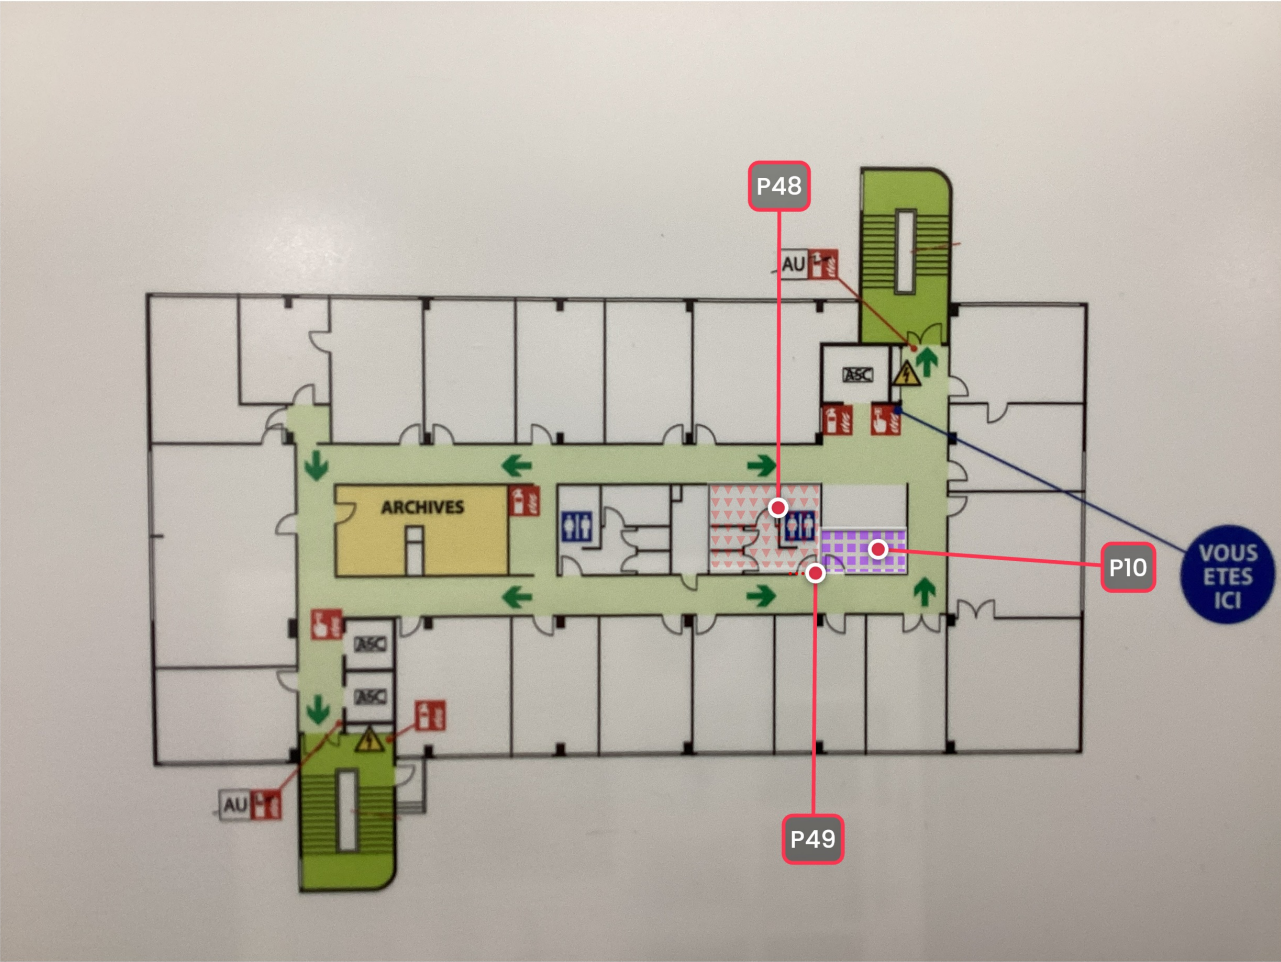
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+1	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	7 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



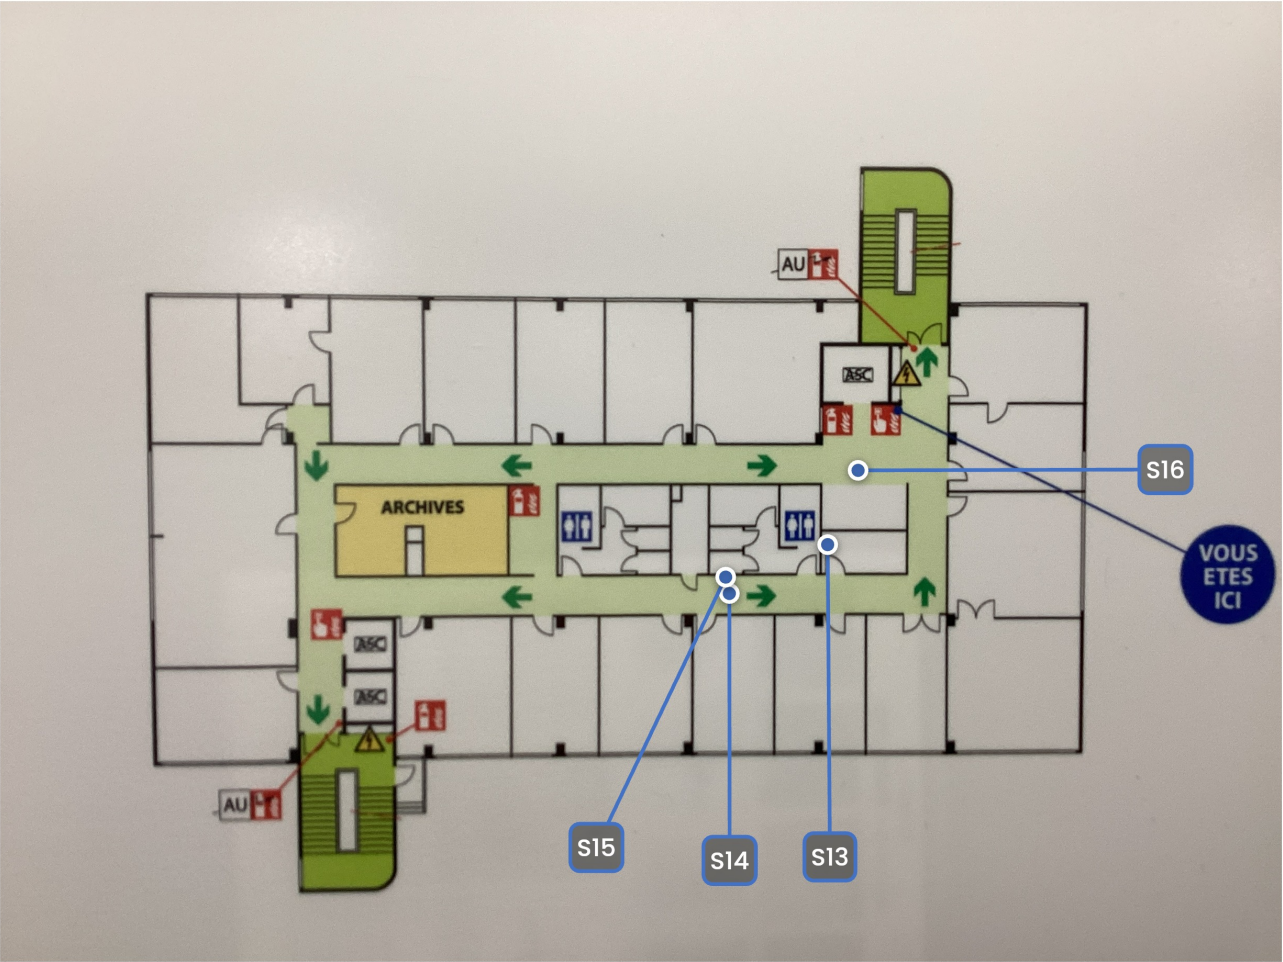
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+1	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	8 / 13
	Indice	1
Vue utilisée : Prélèvement positif		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joint de mastic de vitrage ■ Moquettes + Colle + Ragréage ■ Colles de carrelage (revêtement inférieur)		



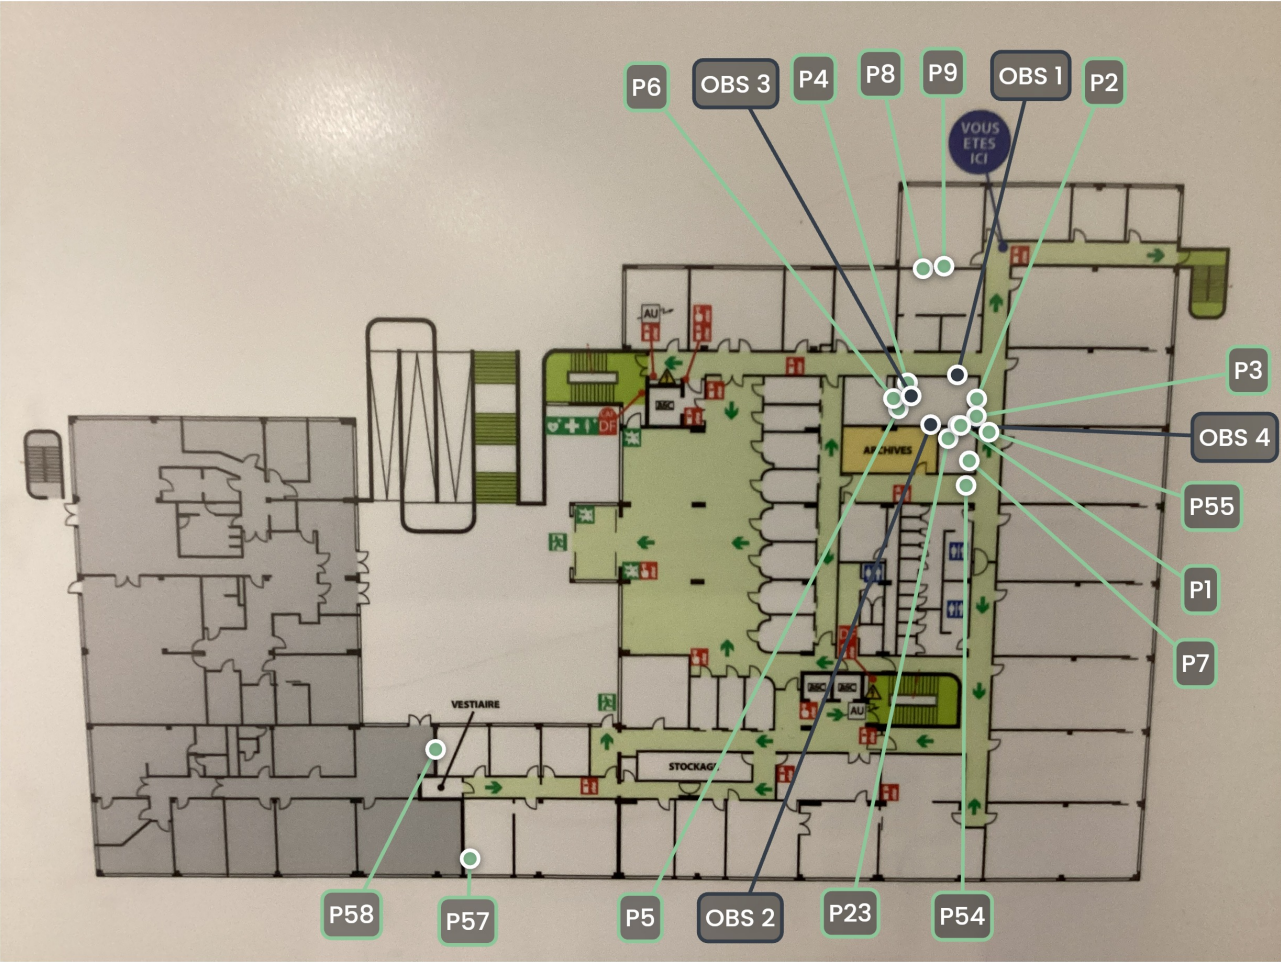
LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---	---	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation R+1	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	9 / 13
	Indice	1
Sondage		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation Rdc	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	10 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage

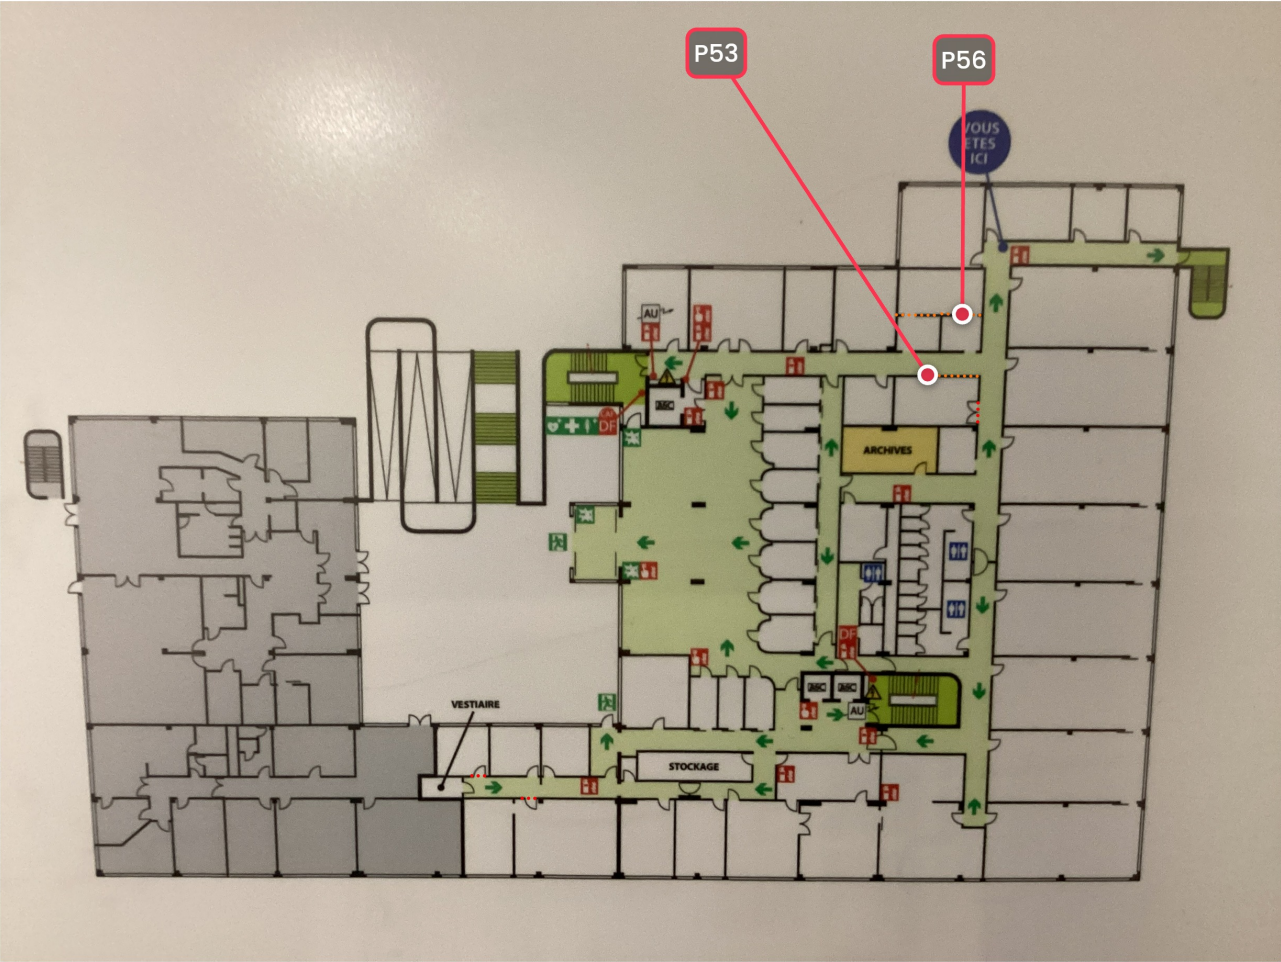


Inaccessibilité



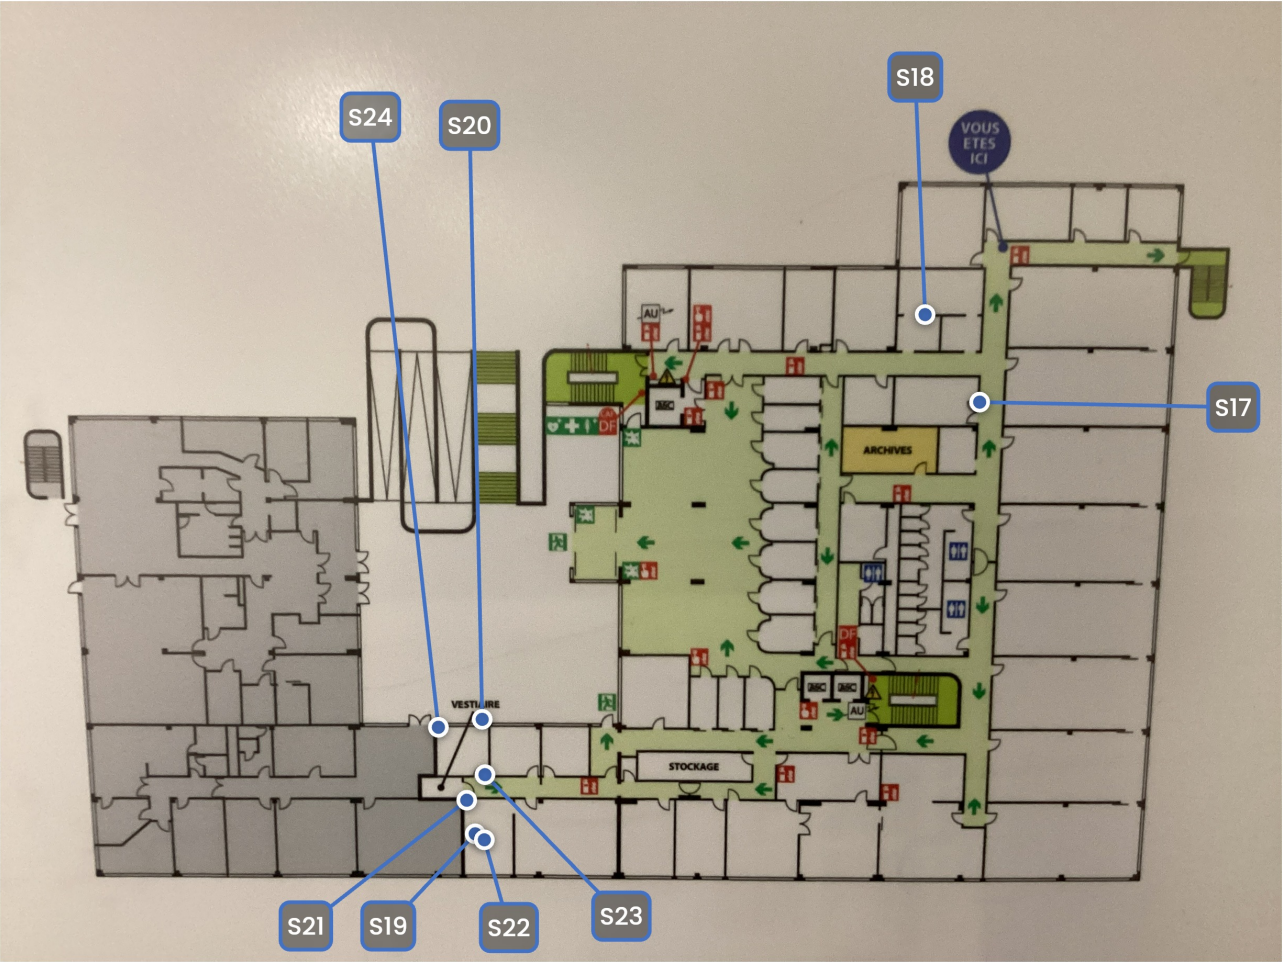
Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation	Date visite	Le 05/01/2026
Rdc	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	11 / 13
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u> Prélèvement positif		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u> Joints de mastic de vitrage		



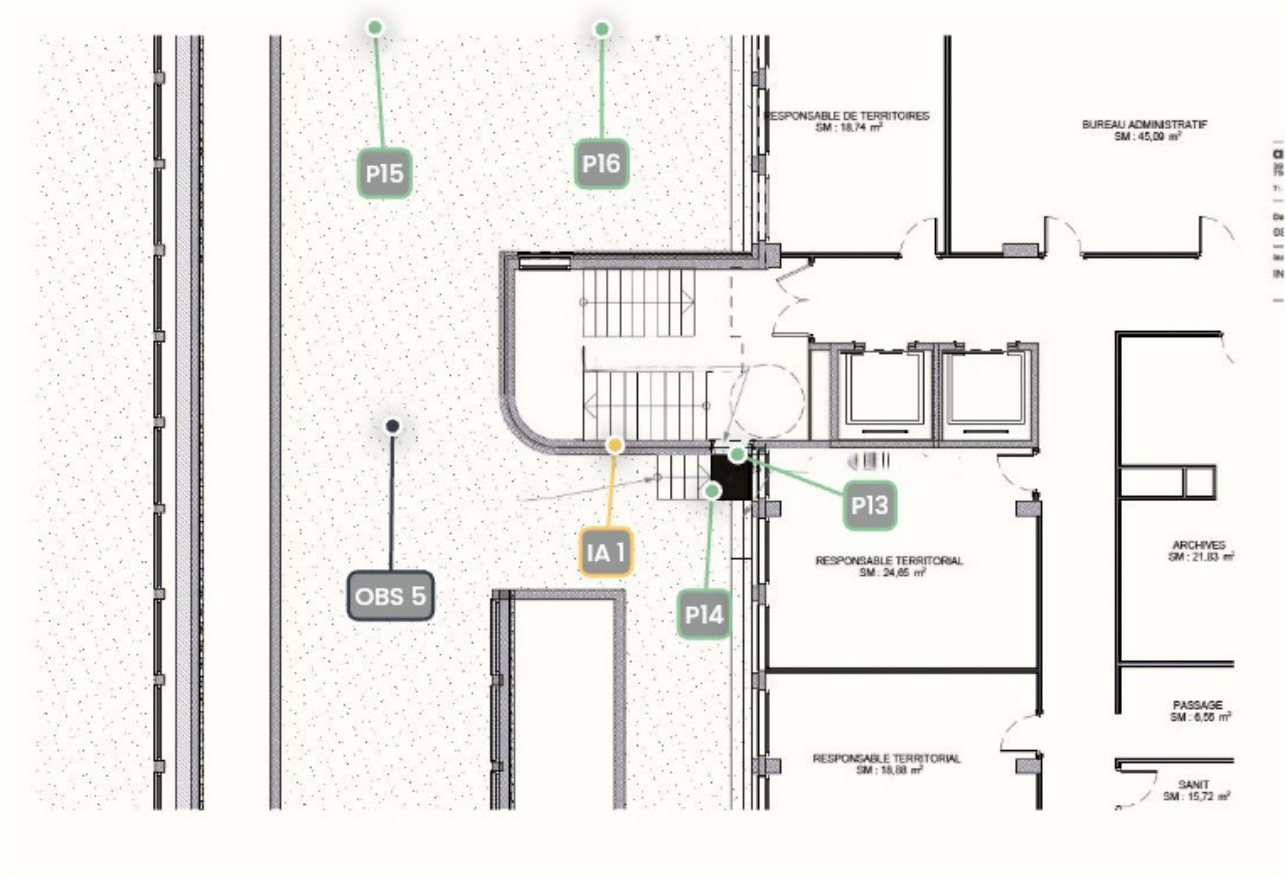
LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation Rdc	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	12 / 13
	Indice	1
Sondage		
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAF DE LA SAVOIE 20 AVENUE JEAN JAURES 73000 CHAMBERY	
Localisation Terrasse r+1	Date visite	Le 05/01/2026
	Auteur	Laurent GREGIS
	N° dossier	29634968/S1/1
	Planche	13 / 13
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



7.9. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Laurent GREGIS

Zi De La Grande Ile Techniparc

395 Rue du Dr Marmonnier

38190 VILLARD-BONNOT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 1/17

Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 26Y000194

Date de réception : 08/01/2026

Date d'analyse : 13/01/2026

Référence dossier Client:1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	BV3LJ3076 Réf. Prel : P1 Rdc - Le Bocal/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002 (1)	BV3LJ3083 Réf. Prel : P2 Rdc - Le Bocal/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Gris)	Matériau souple fibreux de type moquette (noir)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003 (1) (2)	BV3LJ3084 Réf. Prel : P3 Rdc - Le Bocal/Revêtements de sol : Ragrèages - (Ciment/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004 (1)	BV3LJ3087 Réf. Prel : P4 Rdc - Le Bocal/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (beige) en traces	MOLP * /AM7G	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 2/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005 (1) (2)	BV3LJ3092 Réf. Prel : P5 Rdc - Le Bocal/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006 (1)	BV3LJ3079 Réf. Prel : P6 Rdc - Le Bocal/Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007 (1)	BV3LJ3098 Réf. Prel : P7 Rdc - Local banettes/Revêtement s de sol : Colles non bitumineuses - (Ciment/)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (rouge)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008 (1)	BV3LJ3096 Réf. Prel : P8 Rdc - Vestiaire 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 3/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009 (1) (2)	BV3LJ3095 Réf. Prel : P9 Rdc - Bureau R09/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Lissé/Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010 (1)	BV3LJ3097 Réf. Prel : P10 R+1 - Local technique/Revêtement de sol : Moquettes - (Toile/Marron)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (foncé)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
011 (1)	BV3LJ3094 Réf. Prel : P11 R+1 - Local technique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 4/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012 (1)	BV3LJ3102 Réf. Prel : P12 R+1 - Local technique/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013 (1)	BV3LJ3107 Réf. Prel : P13 Terrasse r+1/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014 (1) (2)	BV3LJ3106 Réf. Prel : P14 Terrasse r+1/Revêtements de sol : Sols coulés à base ciment - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015 (1)	BV3LJ3104 Réf. Prel : P15 Terrasse r+1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 5/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016 (1)	BV3LJ3105 Réf. Prel : P16 Terrasse r+1/Façades lourdes y compris poteaux : Enduits pelliculaires de lissage/débullage - (Ciment/)	Matériau semi-dur de type enduit (gris) (granulaire)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017 (1)	BV3LJ3080 Réf. Prel : P17 R+2 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018 (1)	BV3LJ3077 Réf. Prel : P18 R+2 - Circulation/Revêtement s de sol : Moquettes - (Toile/Gris)	Matériau souple fibreux de type moquette (noir)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019 (1) (2)	BV3LJ3085 Réf. Prel : P19 R+2 - Archives/Revêtement s de sol : Ragréages - (Ciment/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 6/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020 (1)	BV3LJ3088 Réf. Prel : P20 R+2 - Circulation/Faux plafonds : Panneaux (Liste A) - (Laine de roche/)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (pulvérulent) (beige) en traces	MOLP * / AM7G	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
021 (1) (2)	BV3LJ3091 Réf. Prel : P21 R+2 - Sanitaire homme/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
022 (1) (2)	BV3LJ3093 Réf. Prel : P22 R+2 - Archives/Poutres : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
023 (1)	BV3LJ3099 Réf. Prel : P23 Rdc - Local banettes/Revêtement s de sol : Colles non bitumineuses - (Ciment/)	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (rouge) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 7/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024 (1)	BV3LJ3100 Réf. Prel : P24 R+2 - Local technique/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Marron)	Matériau souple fibreux de type moquette (noir) (foncé)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
025 (1)	BV3LJ3101 Réf. Prel : P25 R+2 - Local technique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026 (1) (2)	BV3LJ3103 Réf. Prel : P26 R+2 - Local technique/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Blanc)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)(ii)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1) (2)	BV3LJ3090 Réf. Prel : P27 R+2 - Local technique/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 8/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (1)	BV3LJ3086 Réf. Prel : P28 R+2 - Archives/Revêtement s de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	BV3LJ3089 Réf. Prel : P29 R+2 - Archives/Revêtement s de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	BV3LJ3114 Réf. Prel : P30 R+2 - Archives/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031 (1)	BV3LJ3078 Réf. Prel : P31 R+2 - Archives/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 9/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032 (1)	BV3LJ3113 Réf. Prel : P32 R+3 - Local technique/Plafonds : Enduits de ragréage, débullage, lissage - (Compact/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033 (1) (2)	BV3LJ3111 Réf. Prel : P33 R+3 - Sanitaire homme/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Noir)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
034 (1)	BV3LJ3109 Réf. Prel : P34 R+3 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035 (1)	BV3LJ3110 Réf. Prel : P35 R+3 - Local technique/Revêtements de sol : Moquettes - (Toile/Marron)	Matériau souple fibreux de type moquette (marron) (foncé)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 10/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)(i)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
036 (1) (2)	BV3LJ3112 Réf. Prel : P36 R+3 - Local technique/Revêtements de sol : Ragréages - (Ciment/)	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau (blanc)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
037 (1)	BV3LJ3108 Réf. Prel : P37 R+3 - Local technique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Plâtre/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038 (1)	BV3LJ3115 Réf. Prel : P38 R+3 - Local technique/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Granuleux/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 11/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039 (1) (2)	BV3LJ3120 Réf. Prel : P39 R+2 - Archives/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040 (1) (2)	BV3LJ3122 Réf. Prel : P40 R+3 - Bureau 303 bis/Poteaux : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041 (1) (2)	BV3LJ3117 Réf. Prel : P41 R+2 - Sanitaire homme/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042 (1) (2) (3)	BV3LJ3123 Réf. Prel : P42 R+2 - Sanitaire homme/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/)	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 12/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
043 (1)	BV3LJ3118 Réf. Prel : P43 R+2 - Sanitaire	Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044 (1) (2)	BV3LJ3131 Réf. Prel : P44 R+2 - Sanitaire	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET * /BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
045 (1) (2)	BV3LJ3124 Réf. Prel : P45 R+1 - Sanitaires 307/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046 (1)	BV3LJ3119 Réf. Prel : P46 R+1 - Sanitaires 307/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de plinthe - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 13/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047 (1)	BV3LJ3116 Réf. Prel : P47 R+1 - Sanitaires 307/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres : Colles de faïence - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
048 (1)	BV3LJ3121 Réf. Prel : P48 R+1 - Sanitaires 307/Revêtements de sol : Colles de carrelage - (Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)(iii)	MET * / <u>E6YE</u>	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	<u>Fibres d'amiante de type chrysotile</u> *
049 (1) (2)	BV3LJ3126 Réf. Prel : P49 R+1 - Sanitaires 307/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Noir)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
050 (1) (2)	BV3LJ3128 Réf. Prel : P50 R+1 - Circulation/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 14/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051 (1) (2)	BV3LJ3129 Réf. Prel : P51 R+1 - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052 (1) (2)	BV3LJ3133 Réf. Prel : P53 Rdc - Le Bocal/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Noir)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
053 (1) (2)	BV3LJ3125 Réf. Prel : P54 Rdc - Circulation/Plafonds : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
054 (1) (2)	BV3LJ3127 Réf. Prel : P55 Rdc - Circulation/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Bitumineux/Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 15/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
055 (1) (2)	BV3LJ3132 Réf. Prel : P56 Rdc - Vestiaire 1/Menuiseries intérieures : Joints de mastic de vitrage - (Dur/Noir)	Matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
056 (1) (2)	BV3LJ3135 Réf. Prel : P57 Rdc - Bureau gestion de la personne/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Plâtre, Papier/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP * / AM7G	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
057 (1) (2)	BV3LJ3134 Réf. Prel : P58 Rdc - Bureau manager gestion de la personne/Cloisons (légères et préfabriquées) : Bandes calicot - (Plâtre, Papier/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / BRZ8	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreuse de type papier, carton (marron)	MOLP * / AM7G	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 16/17
 Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.
 Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.
 Dossier N° : 26Y000194 Date de réception : 08/01/2026 Date d'analyse : 13/01/2026
 Référence dossier Client: 1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
058 (1)	BV3LJ3136 Réf. Prel : P59 R+1 - Palier escalier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" : Enduits lissés, projetés ou talochés - (Compact, Plâtre/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * /YS5D	1 / 1 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) suite QI on fait une v2
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3)

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Des fibres minérales non-asbestiformes susceptibles d'être inhalées ($l < 3 \mu m$) ont été observées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres sont non-amiantées.
- (iii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été réalisées et ont permis de confirmer le résultat.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-SG-001068-02 Date d'émission de rapport : 29/01/2026 13:06 Page 17/17

Annule et remplace la version AR-26-SG-001068-01 ayant pour date d'émission le 15/01/2026 à 03:47, qui doit être détruite ou nous être renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 26Y000194

Date de réception : 08/01/2026

Date d'analyse : 13/01/2026

Référence dossier Client:1510797822/29634968/S1/1/1_29634968/1/1

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Samuel FRANCON
Réfèrent(e) Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 17 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton ,CS 40265

F-42016 Saint-Etienne, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

