



APAVE
AGENCE DE GRENOBLE
16 avenue de Grugliasco BP 148
38431 ECHIROLLES CEDEX
N° SIRET : 90386907100360

DONNEUR D'ORDRE
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE

07200 AUBENAS
CONTACT : Mr TRUCHET



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuelles versions précédentes



Numéro d'offre :
RAAT CFA LANAS AVT 2026
Numéro de contrat : **C26160870-1**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260231312**
Date : **11/05/2026**

Lieu d'intervention :
CFA

640 ROUTE DE L' AERODROME
07200 LANAS

Destinataire rapport :
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE

Date d'intervention : **21/04/2026**

Intervenant : **Monsieur Antoine GONZALEZ**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 42 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **640 ROUTE DE L' AERODROME
07200 LANAS**

Étage :
 Bâtiment :
 Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Numéro de Lot :
 Référence Cadastre : **Non communiqué**
 Date du Permis de Construire :
 Date de construction : **Antérieur au 1er juillet 1997**
Non communiquée

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE**
 Adresse : **07200 AUBENAS**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : **CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE**
 Adresse : **07200 AUBENAS**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **GONZALEZ Antoine**

N° certification : **C3571**
 Date d'obtention : **25/02/2022**
 Organisme : **QUALIEXPERT**
 Adresse :

Date de la commande : **08/04/2026**
 Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud**
 Adresse laboratoire : **75C Avenue de Pascalet 30310 Vergèze**
 Numéro d'accréditation : **1-5922**

Organisme d'assurance professionnelle : **Allianz Global Corporate & Specialty SE**
 Adresse assurance : **1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex**
 N° de contrat d'assurance : **FRL003861**
 Date de validité : **31/12/2026**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : **Passage de cable de video surveillance**
Dépose des piellier de portails et portillons pour une continuité de la cloture

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	5
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	5
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	5
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	5
OBJECTIF	5
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	5
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	7
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	7
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	8
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	8
PRECONISATIONS	8
ANNEXE CROQUIS	9
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	12
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	32
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	38
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	39
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	40
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	41

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Baie informatique 1	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P009)	S009	Z008
		Plenum	Laine minérale	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S010	Z003
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P008)	S008	Z007
RDC	Local électrique 2	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	S006	Z004
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P002 - idem)	S004	Z002
		Plenum	Laine minérale	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S005	Z003
		Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P009 - idem)	S011	Z008
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P008 - idem)	S012	Z007
		Plenum	Laine minérale	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S013	Z003
		Murs donnant sur extérieur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P005)	S026	Z005
RDC	Baie informatique 2	Cloisons	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z002
		Plenum	Laine minérale	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z003
Extérieur	Façade	Facades lourdes y compris poteaux	Enduit - Peinture jaune	Résultat d'analyse (P007)	S014	Z006
		Facades lourdes y compris poteaux	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P006)	S007	Z006
		Facades lourdes y compris poteaux - sortie local électrique 1	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P010)	S015	Z009
Extérieur	Pilier portail 5	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P011)	S016	Z010
Extérieur	Poteaux portail 4B	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P012)	S017	Z011

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
Extérieur	Poteaux portail 4	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P013)	S018	Z012
Extérieur	pillier portail 2	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P014)	S019	Z013
Extérieur	Pillier portail 3 B	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P015)	S020	Z014
Extérieur	pillier portail 3	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P016)	S021	Z015
Extérieur	Pillier portail 2B	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P017)	S022	Z016
Extérieur	Murette portail 2 B	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P018)	S023	Z017
Extérieur	Pillier portail 1	Poteau	Enduit - Peinture blanche	Résultat d'analyse (P019 - idem)		Z018
Extérieur	Murette portail 1	Murs	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P019)	S024	Z018
Extérieur	Dalle béton sous goudron 1	Dalle s goudron	Béton - Revêtement bitumineux	Résultat d'analyse (P020)	S025	Z019

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
21/04/2026	Repérage amiante avant travaux

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Passage de cable de video surveillance

Dépose des piellier de portails et portillons pour une continuité de la cloture

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Baie informatique 1	OUI	
RDC	Local électrique 2	OUI	
RDC	local électrique 1	OUI	
RDC	Baie informatique 2	OUI	
Extérieur	Façade	OUI	
Extérieur	dalle béton d accès	OUI	
Extérieur	Pillier portail 5	OUI	
Extérieur	Poteaux protail 4B	OUI	
Extérieur	Poteaux portail 4	OUI	
Extérieur	pillier portail 2	OUI	
Extérieur	Pillier portail 3 B	OUI	
Extérieur	pilier protail 3	OUI	
Extérieur	Pillier portail 2B	OUI	
Extérieur	Murette portail 2 B	OUI	
Extérieur	Pillier protail 1	OUI	
Extérieur	Muerette portail 1	OUI	
Extérieur	Dalle béton sous goudron 1	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
3 - Parois verticales intérieures			
Murs et cloisons maçonnés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou	M	

	talochés	
Poteaux	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
4 - Plafonds et faux plafonds		
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.


Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

	Planche de repérage		
Client : N° rapport : N° planche : Type : Date : Intervenant : Origine du plan :	CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE T260231312 1/2 Croquis 13/04/2026 GONZALEZ Antoine Version : 0	Titre : Lieu d'intervention : Bâtiment : Etage : Commentaire :	Plan de repérage des prélèvements 640 ROUTE DE L' AERODROME 07200 LANAS



apave Planche de repérage			
Client :	CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	Titre :	plan de repérage extérieur pillier et clôture
N° rapport :	T260231312		
N° planche :	2/2	Version : 0	
Type :	Croquis	Lieu d'intervention :	640 ROUTE DE L' AERODROME 07200 LANAS
Date :	13/04/2026	Bâtiment :	
Intervenant :	GONZALEZ Antoine	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

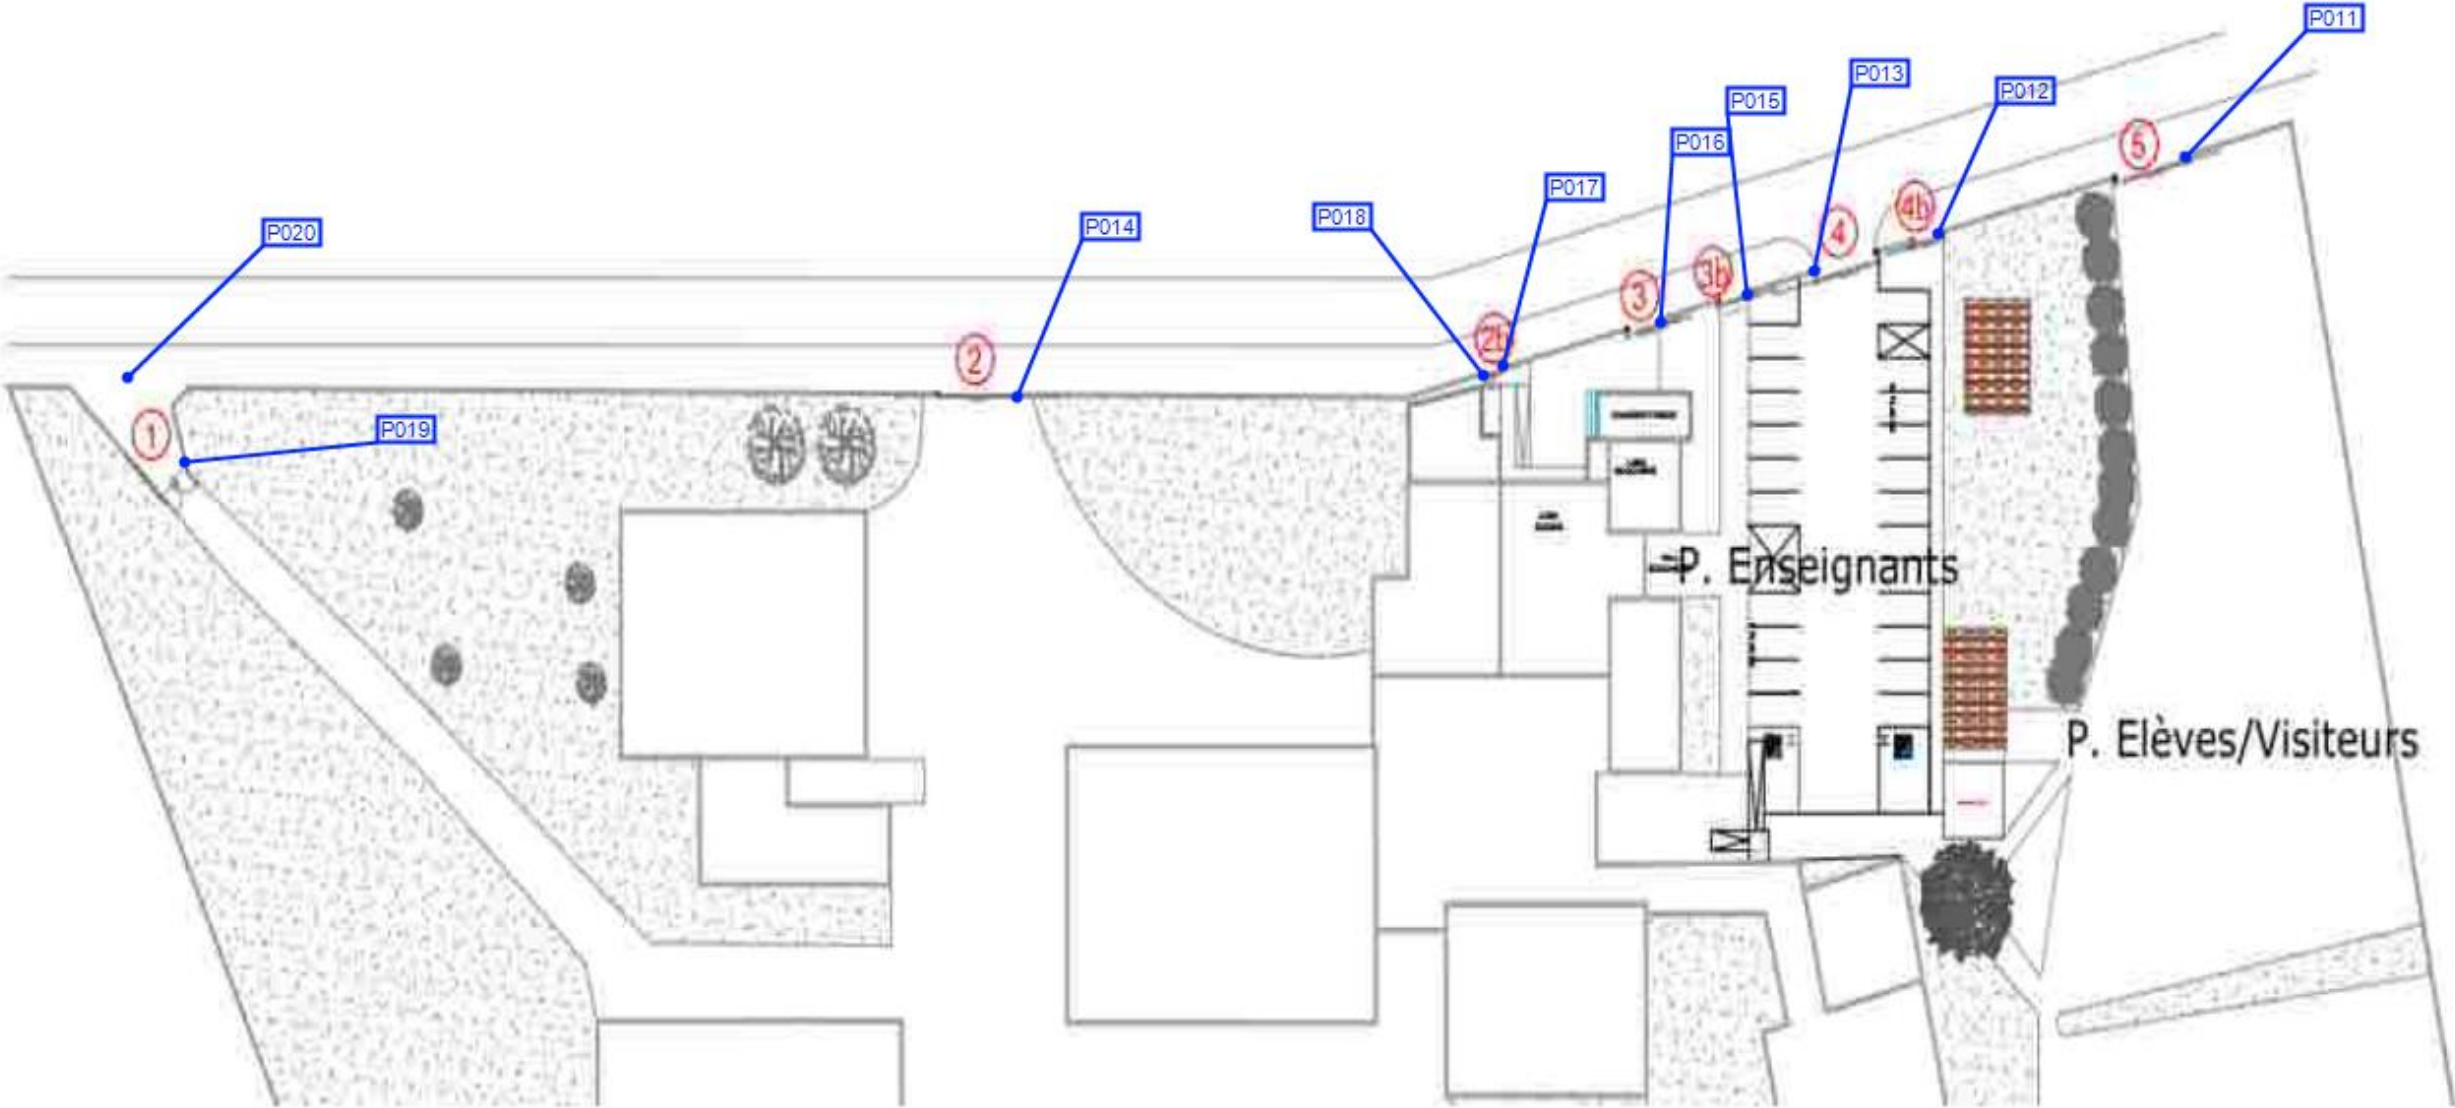

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Baie informatique 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Baie informatique 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Enduit blanc en faible quantité non séparable + matériau fibreux beige

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Baie informatique 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Laine minérale	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Plenum - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Laine minérale

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Local électrique 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Local électrique 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Murs donnant sur extérieur - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Facades lourdes y compris poteaux - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture jaune	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Facades lourdes y compris poteaux - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture jaune

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en vrac non séparable + enduit gris hétérogène non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement

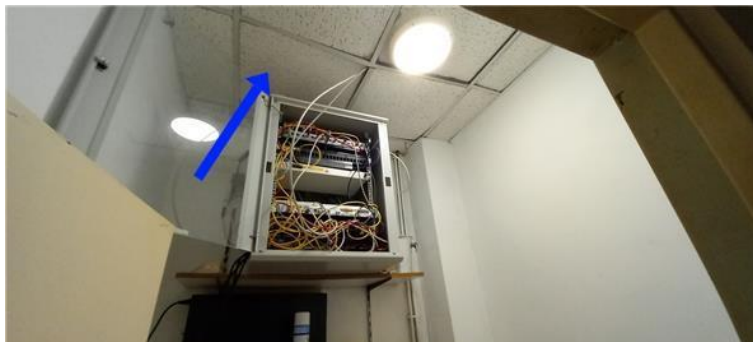

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Baie informatique 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Panneaux de faux-plafond	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet


Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture en faible quantité non séparable + enduit blanc non séparable + matériau fibreux belge

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

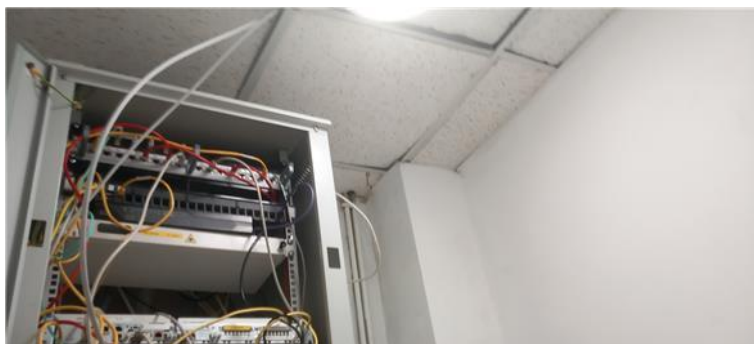PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	RDC - Baie informatique 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Façade
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Facades lourdes y compris poteaux - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Pillier portail 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Poteaux protail 4B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Poteaux portail 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - pillier portail 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Pillier portail 3 B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - pilier protail 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture non séparable + enduit gris en vrac hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Pillier portail 2B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture blanche	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Poteau - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture blanche

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Murette portail 2 B
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Peinture + enduit compact rose

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Muerette portail 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Enduit / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Enduit compact blanc + matériau gris hétérogène non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CCI TERRITORIALE DE L'ARDECHE	T260231312	Extérieur - Dalle béton sous goudron 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton - Revêtement bitumineux	21/04/2026	GONZALEZ Antoine

Localisation

Dalle s goudron - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton / Revêtement bitumineux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Couche 0	Matériau compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Couche 0	S.3719665.0.PDF	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

S.3719665.0.PDF



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967



Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-7595 EN DATE DU 29/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE - GRENOBLE 16 avenue de Grugliasco - BP 148 38431 ECHIROLLES	Réf. Commande ITGA : IT1126-7595 Réf. Commande Client : C26160870-1-141074-167626-0-143458120
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 23/04/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42060	
Réf échantillon client : P001 - RDC - Baie informatique 2 - Murs - Cloisons - Enduit - Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42061	
Réf échantillon client : P002 - RDC - Baie informatique 2 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond		Description ITGA : Enduit blanc en faible quantité / Matériau fibreux beige	
1 * Enduit blanc en faible quantité non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-7595 EN DATE DU 29/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42062	
Réf échantillon client : P003 - RDC - Baie informatique 2 - Plafond - Plenum - Laine minérale		Description ITGA : Papier bitumé / Matériau fibreux jaune	
1 * Papier bitumé non séparable + Matériau fibreux jaune (1)	MOLP + META (B) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : LDA (4)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42063	
Réf échantillon client : P004 - RDC - Local électrique 2 - Murs - Murs - Enduit - Peinture		Description ITGA : Peinture / Toile fibreuse blanche / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : GFP (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42064	
Réf échantillon client : P005 - RDC - Local électrique 2 - Murs - Murs donnant sur extérieur - Enduit - Peinture		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture en faible quantité non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42065	
Réf échantillon client : P006 - Extérieur - Façade - Murs - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène non séparable (1)	META (A) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42066	
Réf échantillon client : P007 - Extérieur - Façade - Murs - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit - Peinture jaune		Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit gris hétérogène	
1 * Peinture en vrac non séparable + Enduit gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42067	
Réf échantillon client : P008 - RDC - Baie informatique 1 - Plafond - Faux-plafond - Panneaux de faux-plafond		Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
1 * Peinture en faible quantité non séparable + Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige (1)	MOLP + META (A) le 28/04/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : YCD (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-7595 EN DATE DU 29/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42068	
Réf échantillon client : P009 - RDC - Baie informatique 1 - Murs - Cloisons - Enduit - Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
1 * Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42069	
Réf échantillon client : P010 - Extérieur - Façade - Murs - Facades lourdes y compris poteaux - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42070	
Réf échantillon client : P011 - Extérieur - Pilier portail 5 - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42071	
Réf échantillon client : P012 - Extérieur - Poteaux portail 4B - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène (1)	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42072	
Réf échantillon client : P013 - Extérieur - Poteaux portail 4 - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42073	
Réf échantillon client : P014 - Extérieur - pilier portail 2 - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-7595 EN DATE DU 29/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42074	
Réf échantillon client : P015 - Extérieur - Pilier portail 3 B - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42075	
Réf échantillon client : P016 - Extérieur - pilier portail 3 - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac hétérogène	
1 * Peinture non séparable + Enduit gris en vrac hétérogène (1)	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (3)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42076	
Réf échantillon client : P017 - Extérieur - Pilier portail 2B - Murs - Poteau - Enduit - Peinture blanche		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris hétérogène	
1 * Peinture + Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42077	
Réf échantillon client : P018 - Extérieur - Murette portail 2 B - Murs - Murs - Enduit - Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit compact rose	
1 * Peinture + Enduit compact rose	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42078	
Réf échantillon client : P019 - Extérieur - Murette portail 1 - Murs - Murs - Enduit - Peinture		Description ITGA : Enduit compact blanc / Matériau gris hétérogène	
1 * Enduit compact blanc + Matériau gris hétérogène non séparable (1)	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK (4)
Réf dossier client : C26160870-1 A		Réf échantillon ITGA : IT072604-42079	
Réf échantillon client : P020 - Extérieur - Dalle béton sous goudron 1 - Sol - Dalle s goudron - Béton - Revêtement bitumineux		Description ITGA : Matériau compact gris hétérogène	
1 * Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 29/04/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : FNK

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/5

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-7595 EN DATE DU 29/04/2026 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

1. accréditation n° 1-5967

Validé par : Ronan LE PENNEC Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/5

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

Constat de risque d'exposition au plomb	Certificat valable Du 25/05/2022 au 24/05/2029	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Amiante avec mention	Certificat valable Du 25/05/2022 au 24/05/2029	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures de gaz	Certificat valable Du 08/06/2022 au 07/06/2029	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Etat des installations intérieures d'électricité	Certificat valable Du 08/06/2022 au 07/06/2029	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments	Certificat valable Du 14/12/2023 au 06/12/2027	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.
Diagnostic de performance énergétique individuel	Certificat valable Du 01/07/2022 au 13/12/2023	Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

Date d'établissement le jeudi 14 décembre 2023

Marjorie ALBERT
Directrice Administrative

P/O Morgane MAS



Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de compétence version N 010120

LCC 17 rue Borel - 81100 Castres
Tél. : 05 63 73 06 13 - www.qualixpert.com
SAS au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société:

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.


Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

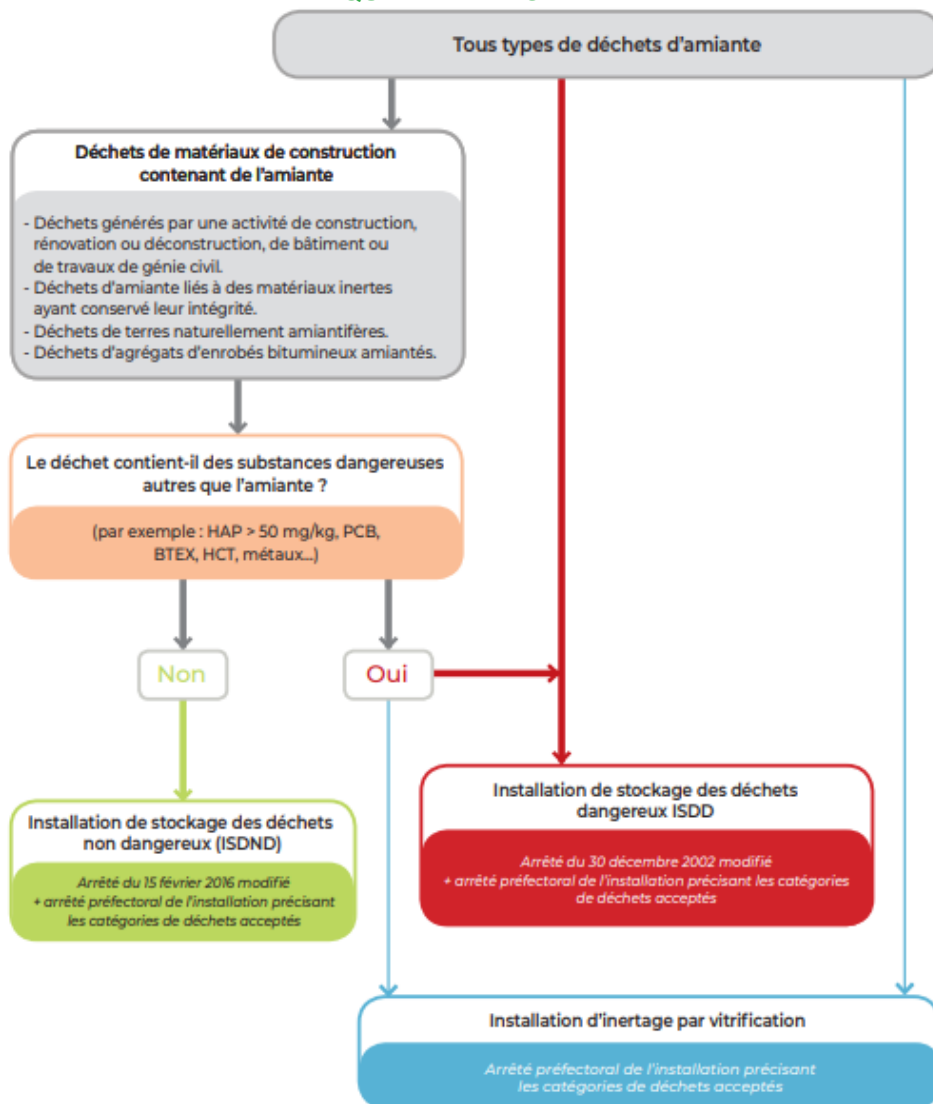

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>
