

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 26164023/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 29/04/2025

Référence au programme de travaux :

N°Q-2020589_0797812_250404.pdf réalisé le 25/02/2025 par

DONNEUR D'ORDRE

INTRADEF

REDA KORGHLOU

ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100

QUARTIER EL PARRAS

C15/1 BUREAUX SAP

30000 NIMES

SITE D'INTERVENTION

USID NIMES - Antenne NIMES

ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100

30000 NIMES

0014

Code site : 300189501B

Latitude : 43.834700 / Longitude : 4.351700



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Mathieu VERNIZEAU	Diagnosticteur	2368	Mathieu VERNIZEAU
Sabine HUET	0		

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	7
2.2. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	14
7. ANNEXES	14
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	14
7.2. Photos prélèvements	15
7.3. Photos sondages	20
7.4. Photos inaccessibilités	21
7.5. Attestation d'assurance	22
7.6. Certificat de compétence	24
7.7. Croquis de repérage	25
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	30

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Sols, murs, plafonds et revêtements.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Tous les locaux C 15 sauf le grand local au bout à droite qui ne communique pas avec le reste du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
BATIMENT 014 -> Local Sertim (MA 2)	Local complet	Accès refusé	Autoriser l'accès
BATIMENT 014 -> Salle de conférence (MA 1)	Local complet	Accès refusé	Autoriser l'accès

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : USID NIMES - Antenne NIMES
ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100
30000 NIMES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
USID NIMES - Antenne NIMES	Administrations, bureaux	ERP de la 5ème catégorie	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
REDA KORGHLOU	Donneur d'ordre	INTRADEF	ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100 30000 NIMES	/
Reda KORGHLOU	Autre	/	/	reda1.korghlou@intradef.gouv.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 17/04/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Q-2020589_0797812_250404.pdf	/	25/02/2025	Q-2020589_0797812_250404.pdf	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 014	Faux plafonds	Panneaux	/	/	6	P14* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P26* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	/	/	13	P27 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	Faux plafonds	Panneaux	Rigide, Plaque de plâtre	Blanc	8	P17* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	9	P16* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment, Dur	Gris	7	P15* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Bureau budget	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	3	P8* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Bureau budget	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	3	P9 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 014 -> Bureau budget	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	3	P10 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Bureau budget	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Blanc	5	P12* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Bureau budget	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Blanc	5	P13 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Faux plafonds	Panneaux	Rigide, Plaque de plâtre	Blanc	8	/	S1	AN	faux plafond dalle de plâtre	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	12	P22* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	12	P22* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	/	12	P23 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de sol	Ragréages	Ragréage	Rose	12	P23 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	10	P18* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	/	/	10	P19 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	11	P20* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	/	11	P21 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	Faux plafonds	Panneaux	Rigide, Plaque de plâtre	Blanc	8	/	S2	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de sol	Colles de carrelage	/	/	9	P24 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Gris	4	P7* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment, Dur	Gris	7	P25 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Dur	/	3	P5 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Epais	Beige, Rose	1	P1* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Revêtements durs	Epais	Beige, Rose	1	P2 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur, Lissé	/	2	P3* N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Dur, Lissé	/	2	P4 N	/	AN	/	Non
BATIMENT 014 -> Circulation	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment, Dur	Gris	4	P6 N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
BATIMENT 014	/
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	/
BATIMENT 014 -> Bureau administratif bureau vivre	/
BATIMENT 014 -> Bureau chef de service	/
BATIMENT 014 -> Bureau du commissaire	/
BATIMENT 014 -> Secrétariat et adjudant	/
BATIMENT 014 -> Bureau frais déplacement	/
BATIMENT 014 -> Bureau budget	/
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	/
BATIMENT 014 -> Bureau comptable	/
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	/
BATIMENT 014 -> Circulation	/


7.2. Photos prélèvements

P14	ZPSO 6
BATIMENT 014	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

P26	ZPSO 13
BATIMENT 014	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P27	ZPSO 13
BATIMENT 014	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P17	ZPSO 8
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

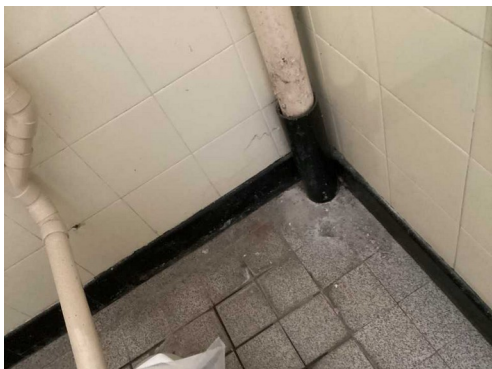P16	ZPSO 9
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P15	ZPSO 7
BATIMENT 014 -> Sanitaire masculins	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P8	ZPSO 3
BATIMENT 014 -> Bureau budget	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P9	ZPSO 3
BATIMENT 014 -> Bureau budget	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P10	ZPSO 3
BATIMENT 014 -> Bureau budget	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P12	ZPSO 5
BATIMENT 014 -> Bureau budget	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P13	ZPSO 5
BATIMENT 014 -> Bureau budget	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P22	ZPSO 12
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P23	ZPSO 12
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P18	ZPSO 10
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P19	ZPSO 10
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P20	ZPSO 11
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P21	ZPSO 11
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P24	ZPSO 9
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P7	ZPSO 4
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P25	ZPSO 7
BATIMENT 014 -> SANITAIRE FEMME	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P5	ZPSO 3
BATIMENT 014 -> Circulation	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P1	ZPSO 1
BATIMENT 014 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P2	ZPSO 1
BATIMENT 014 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Revêtements durs (Liste B)	

P3	ZPSO 2
BATIMENT 014 -> Circulation	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P6	ZPSO 4
BATIMENT 014 -> Circulation	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

7.3. Photos sondages

S1	ZPSO 8
BATIMENT 014 -> VOILERIE et ANNEXE	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

7.4. Photos inaccessibilités

BATIMENT 014 -> Local Sertim		MA 2
Local complet		
Accès refusé		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Autoriser l'accès	

BATIMENT 014 -> Salle de conférence		MA 1
Local complet		
Accès refusé		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Autoriser l'accès	

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°2368

MONSIEUR VERNIZEAU Mathieu

Amiante sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Amiante
Date d'effet : 05/02/2024 : - Date d'expiration : 04/02/2031

Amiante avec mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 05/02/2024 : - Date d'expiration : 04/02/2031

DPE individuel
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 23/02/2024 : - Date d'expiration : 22/02/2031

DPE avec mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation
Date d'effet : 23/02/2024 : - Date d'expiration : 22/02/2031

Electricité
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 05/02/2024 : - Date d'expiration : 04/02/2031

Gaz
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 05/02/2024 : - Date d'expiration : 04/02/2031

Plomb sans mention
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/02/2024 : - Date d'expiration : 22/02/2031

Termites métropole
Selon arrêté du 24 décembre 2021

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments
Date d'effet : 23/02/2024 : - Date d'expiration : 22/02/2031

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 23/02/2024, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Salles d'examens : 71/73, rue Desnouettes – 75015 PARIS
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800032 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 – Code APE : 7022 Z
Enr487@ LE CERTIFICAT V011 du 16-12-2022



7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID NIMES - Antenne NIMES ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100 30000 NIMES	
Localisation BATIMENT 014	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Mathieu VERNIZEAU
	N° dossier	26164023/S1/1
	Planche	2 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
Inaccessibilité		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

MA 1

MA 2



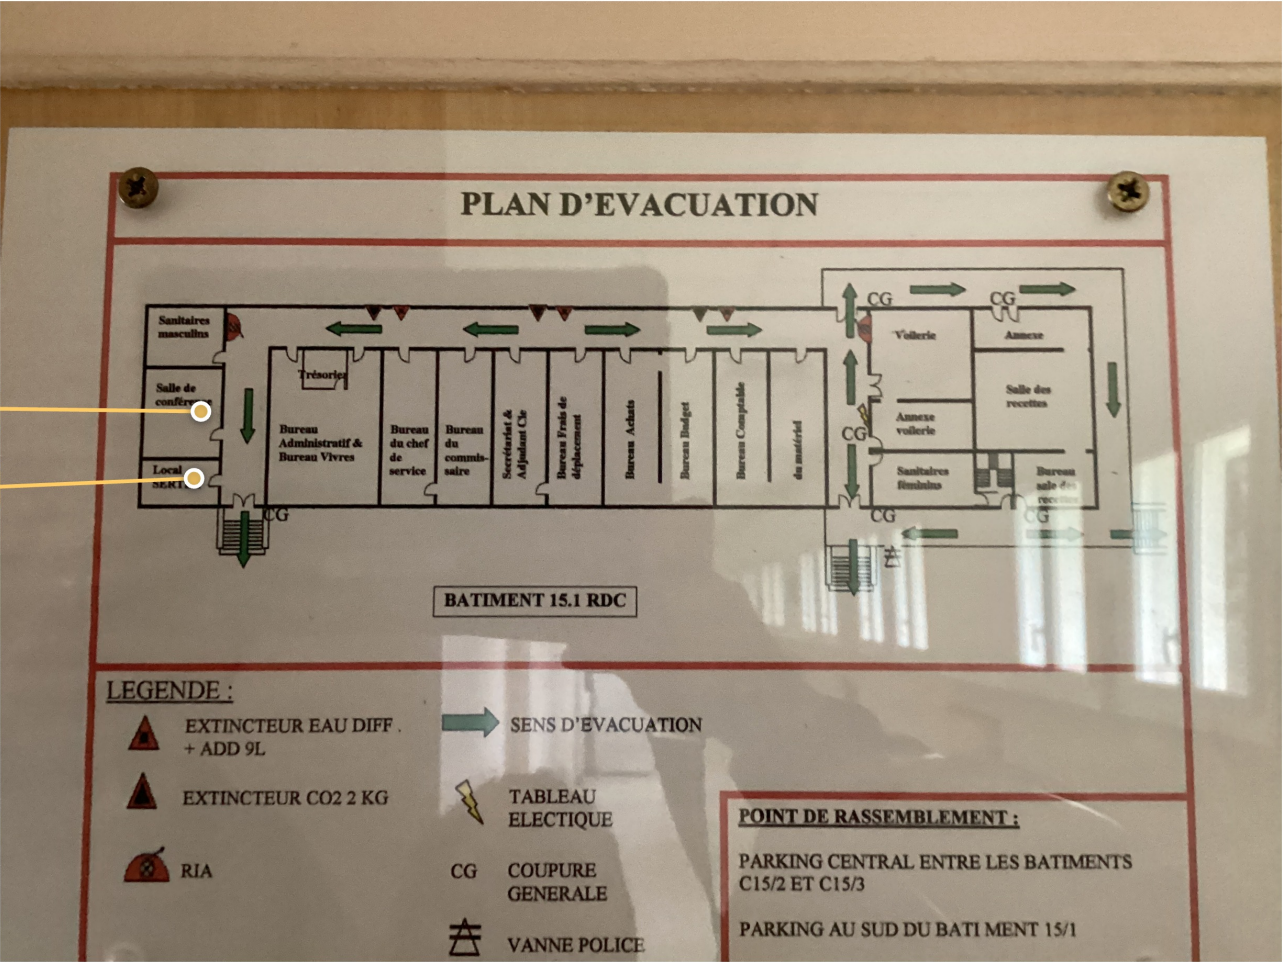


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID NIMES – Antenne NIMES ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100 30000 NIMES	
Localisation BATIMENT 014 > VOILERIE et ANNEXE	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Mathieu VERNIZEAU
	N° dossier	26164023/S1/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

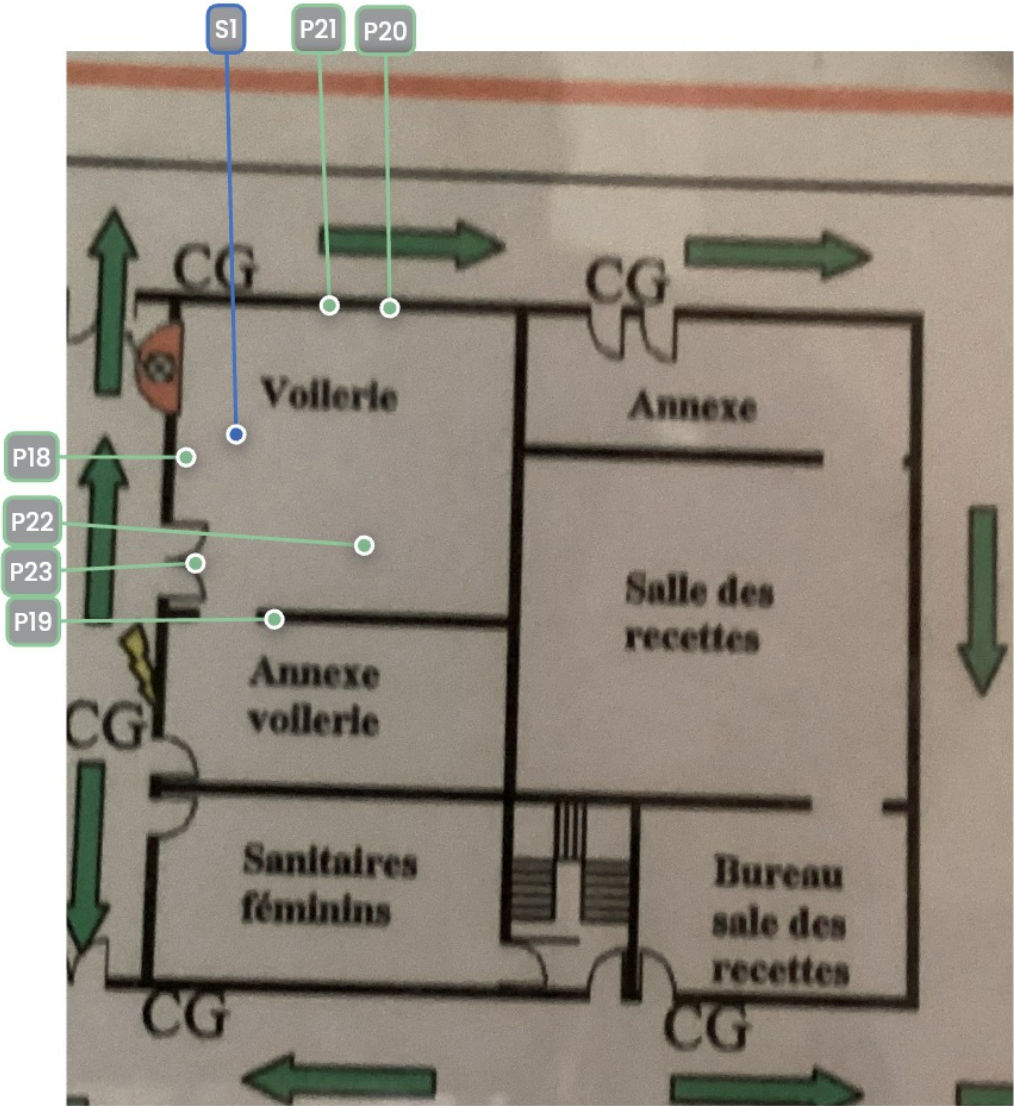

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	USID NIMES – Antenne NIMES ROUTE DE SAINT GILLES BP 49100 30000 NIMES	
Localisation BATIMENT 014 > SANITAIRE FEMME	Date visite	Le 17/04/2025
	Auteur	Mathieu VERNIZEAU
	N° dossier	26164023/S1/1
	Planche	4 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

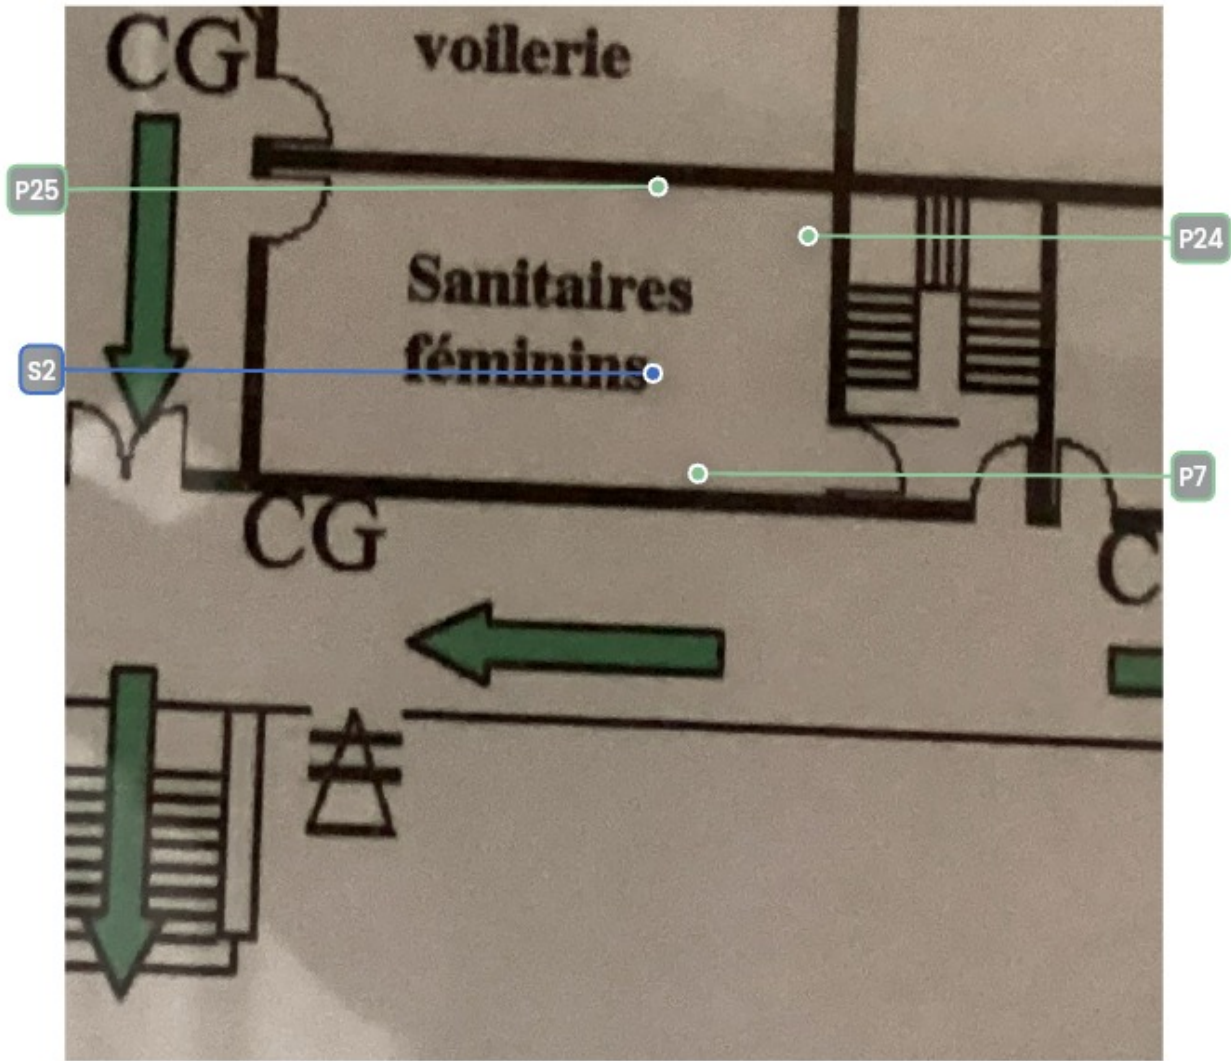

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Mathieu VERNIZEAU

450 Rue Baden Powell
34000 MONTPELLIER

Notre référence : AR-25-KE-019535-01

Numéro de dossier : 25KE011182

Référence de dossier : 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25KE011182-001 - Référence *EUROFINS240000095183 Réf. Prel : P1 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Rose, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-002 - Référence *EUROFINS240000099538 Réf. Prel : P2 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Rose, Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-003 - Référence *EUROFINS240000099537 Réf. Prel : P3 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Lissé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-004 - Référence *EUROFINS240000099536 Réf. Prel : P4 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Lissé/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-005 - Référence *EUROFINS240000095467 Réf. Prel : P5 BATIMENT 014/Revêtements de sol - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-006 - Référence *EUROFINS240000099535 Réf. Prel : P6 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-007 - Référence *EUROFINS240000099540* Réf. Prel : *P7 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-008 - Référence *EUROFINS240000100188* Réf. Prel : *P8 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de sol - (Dur, Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-009 - Référence *EUROFINS240000095189* Réf. Prel : *P9 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de sol - (Dur, Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-010 - Référence *EUROFINS240000100189* Réf. Prel : *P10 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de sol - (Dur, Ciment)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-011 - Référence *EUROFINS240000099534* Réf. Prel : *P12 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-012 - Référence *EUROFINS240000099533* Réf. Prel : *P13 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-013 - Référence *EUROFINS240000097605* Réf. Prel : *P14 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Faux plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-014 - Référence *EUROFINS240000097608* Réf. Prel : *P15 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-015 - Référence *EUROFINS240000097607* Réf. Prel : *P16 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-016 - Référence *EUROFINS240000097609 Réf. Prel : P17 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Faux plafonds - (Rigide, Plaque de plâtre/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-017 - Référence *EUROFINS240000095188 Réf. Prel : P18 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-018 - Référence *EUROFINS240000097610 Réf. Prel : P19 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Murs et cloisons maçonnées "en dur"*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-019 - Référence *EUROFINS240000095184 Réf. Prel : P20 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-020 - Référence *EUROFINS240000095185 Réf. Prel : P21 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-021 - Référence *EUROFINS240000095187 Réf. Prel : P22 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-022 - Référence *EUROFINS240000099541 Réf. Prel : P23 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-023 - Référence *EUROFINS240000095182 Réf. Prel : P24 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de sol*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-024 - Référence *EUROFINS240000095181 Réf. Prel : P25 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-025 - Référence *EUROFINS240000095186 Réf. Prel : P26 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

- N° 25KE011182-026 - Référence *EUROFINS240000097611 Réf. Prel : P27 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Plafonds*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud SAS

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD SAS**
Laboratoire Analyses Vergèze
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGEZE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page 1/10
Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
Date d'analyse : 25/04/2025
Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25KE011182-001 - EUROFINS240000095 183 Réf. Prel : P1 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Rose, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25KE011182-002 - EUROFINS240000099 538 Réf. Prel : P2 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Epais/Rose, Beige)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau de type polystyrène (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	25KE011182-003 - EUROFINS240000099 537 Réf. Prel : P3 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Lissé/)	Matériau de type système d'enduit peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page2/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception :22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client:25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25KE011182-004 - EUROFINS240000099 536 Réf. Prel : P4 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Dur, Lissé/)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25KE011182-005 - EUROFINS240000095 467 Réf. Prel : P5 BATIMENT 014/Revêtements de sol - (Dur, Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	25KE011182-006 - EUROFINS240000099 535 Réf. Prel : P6 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page3/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception :22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client:25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25KE011182-007 - EUROFINS240000099 540 Réf. Prel : P7 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment, Dur/Gris)	Matériau (noir) ; matériau semi-dur (beige) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25KE011182-008 - EUROFINS240000100 188 Réf. Prel : P8 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtemen ts de sol - (Dur, Ciment/)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	25KE011182-009 - EUROFINS240000095 189 Réf. Prel : P9 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtemen ts de sol - (Dur, Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page4/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25KE011182-010 - EUROFINS240000100 189 Réf. Prel : P10 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de sol - (Dur, Ciment/)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) + (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25KE011182-011 - EUROFINS240000099 534 Réf. Prel : P12 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	25KE011182-012 - EUROFINS240000099 533 Réf. Prel : P13 BATIMENT 014 - Sanitaire masculins/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (fibreuse) (blanc) ; matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page5/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception :22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client:25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25KE011182-013 - EUROFINS240000097 605 Réf. Prel : P14 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25KE011182-014 - EUROFINS240000097 608 Réf. Prel : P15 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25KE011182-015 - EUROFINS240000097 607 Réf. Prel : P16 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page6/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception :22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client:25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25KE011182-016 - EUROFINS240000097 609 Réf. Prel : P17 BATIMENT 014 - SANITAIRES HOMME/Faux plafonds - (Rigide, Plaque de plâtre/Blanc)	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreuse de type faux-plafonds (beige)	MET / VS8G	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25KE011182-017 - EUROFINS240000095 188 Réf. Prel : P18 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25KE011182-018 - EUROFINS240000097 610 Réf. Prel : P19 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / Y9LR	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page 7/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25KE011182-019 - EUROFINS240000095 184 Réf. Prel : P20 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25KE011182-020 - EUROFINS240000095 185 Réf. Prel : P21 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/)	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / NMJ6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	25KE011182-021 - EUROFINS240000095 187 Réf. Prel : P22 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtement s de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page8/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25KE011182-022 - EUROFINS240000099 541 Réf. Prel : P23 BATIMENT 014 - VOILERIE et ANNEXE/Revêtement s de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau de type peinture (blanc) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25KE011182-023 - EUROFINS240000095 182 Réf. Prel : P24 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25KE011182-024 - EUROFINS240000095 181 Réf. Prel : P25 BATIMENT 014 - SANITAIRE FEMME/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur, Ciment/Gris)	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de type peinture (bleu)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.
 6 Preciziei Street, ground floor ,6th District
 062203 Bucarest, România

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01 Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32 Page9/10
 Référence laboratoire N° : 25RB013415 Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182
 Reçu au laboratoire le : 25/04/2025 Date de réception : 22/04/2025
 Date d'analyse : 25/04/2025
 Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25KE011182-025 - EUROFINS240000095 186 Réf. Prel : P26 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Plafonds	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	25KE011182-026 - EUROFINS240000097 611 Réf. Prel : P27 BATIMENT 014 - CIRCULATION/Plafonds	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (fibreuse) (blanc)	MET / A4KE	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP : Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2,P-MO-SOP7718 Ed. 1.1/15.03.2022.

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021,P-ME-SOP7663 Ed.1.2/08.05.2023.

Eurofins Asbestos Testing Romania S.R.L.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RB-035637-01	Date d'émission de rapport : 28/04/2025 5:32	Page 10/10
Référence laboratoire N° : 25RB013415	Référence de suivi du dossier N° : 25KE011182	
Reçu au laboratoire le : 25/04/2025	Date de réception : 22/04/2025	
Date d'analyse : 25/04/2025		
Référence dossier Client: 25KE011182 - 1510797812/26164023/S1/1/1_26164023/1/1		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue roumaine et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° LI 1229 et est disponible sur <https://www.renar.ro/>

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 13 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Raluca Floricel
Tehnician laborator CRO 007
