


N°		Nom de la tâche	Début	Fin	Noms ressources	26				Semestre 2, 2026				Semestre 1, 2027							
						M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	
1																					
2		Préparation de chantier (Pilotage SCO)	Lun 07/09/26	Ven 06/11/26	DST/SCO																
3																					
4		Travaux (Pilotage SCO conjointement avec BIO & SEM)	Lun 09/11/26	Lun 01/03/27	DST/SCO																
5		Travaux (Pilotage SCO conjointement avec DSNIB & SEM)	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26																	
6		Zone 1 (Z1) : Entre STE043 et STE040 : Installation porte automatique	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26	DST/SCO/SEM																
7		Zone 2 (Z2) : Entre STE043 et STE039 : Installation porte automatique	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26	DST/SCO/SEM																
8		Zone 3 (Z3) : Entre STE039 - STE040 et STE030 et STE039 : Bouchement ancienne porte automatique et creation reservation SBT	Lun 07/12/26	Lun 28/12/26	DST/SCO/SEM/DSNIB																
9		Installation SBT	Mar 29/12/26	Lun 11/01/27	DSNIB/SCO																
10		Zone 4 (Z4) : STE010 : Decoupes Gaines existantes pour desalimenter Air sur piece dechargement coté laveurs	Mar 12/01/27	Mer 13/01/27	DST/SCO/SEM																
11		Zone 5 : partiellement STE008 et STE007	Jeu 14/01/27	Lun 01/03/27	DST/SCO/SEM																
12																					
13		Qualifications (Pilotage conjointement avec BIO & SEM & Pharmacie)	Mar 02/03/27	Lun 29/03/27	DST/SCO;Pharmacie																
14		Livraison à l'utilisateur	Mar 30/03/27	Mar 30/03/27																	

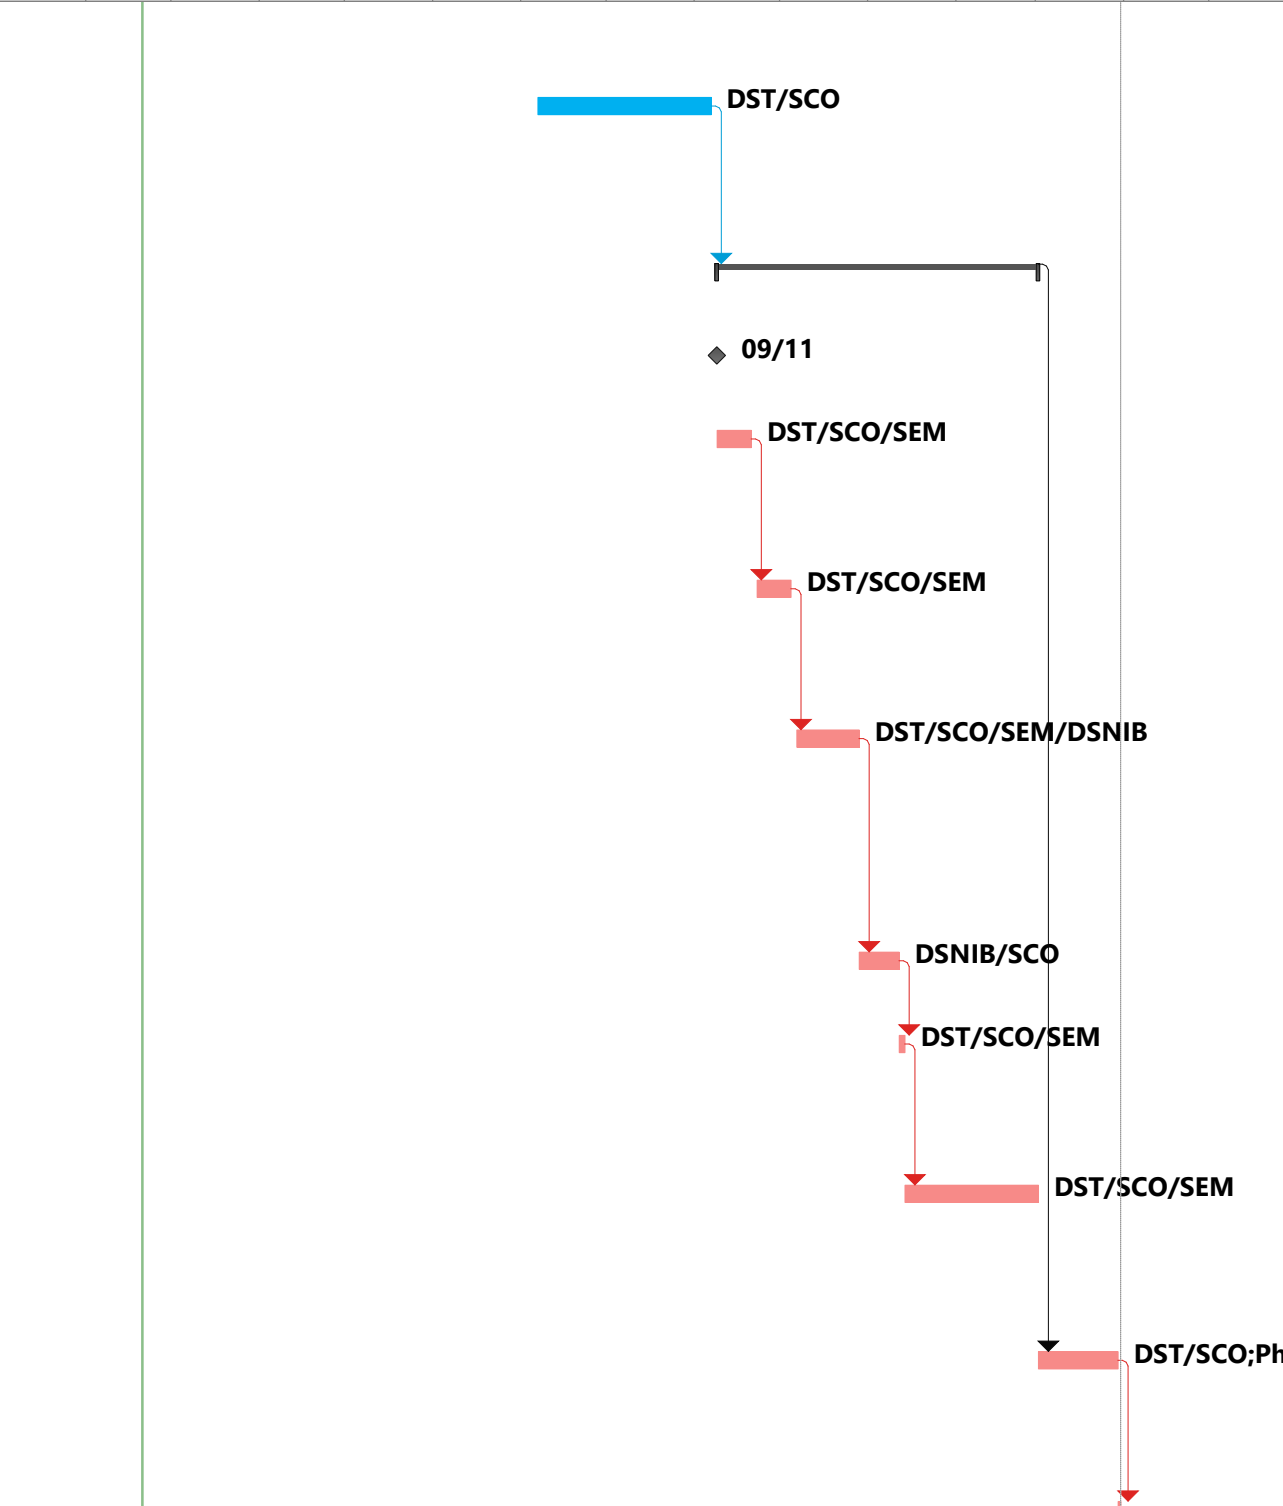

DST/SCO

09/11

DST/SCO/SEM

DST/SCO/SEM

DST/SCO/SEM/DSNIB

DSNIB/SCO

DST/SCO/SEM

DST/SCO/SEM

DST/SCO;Pha

