




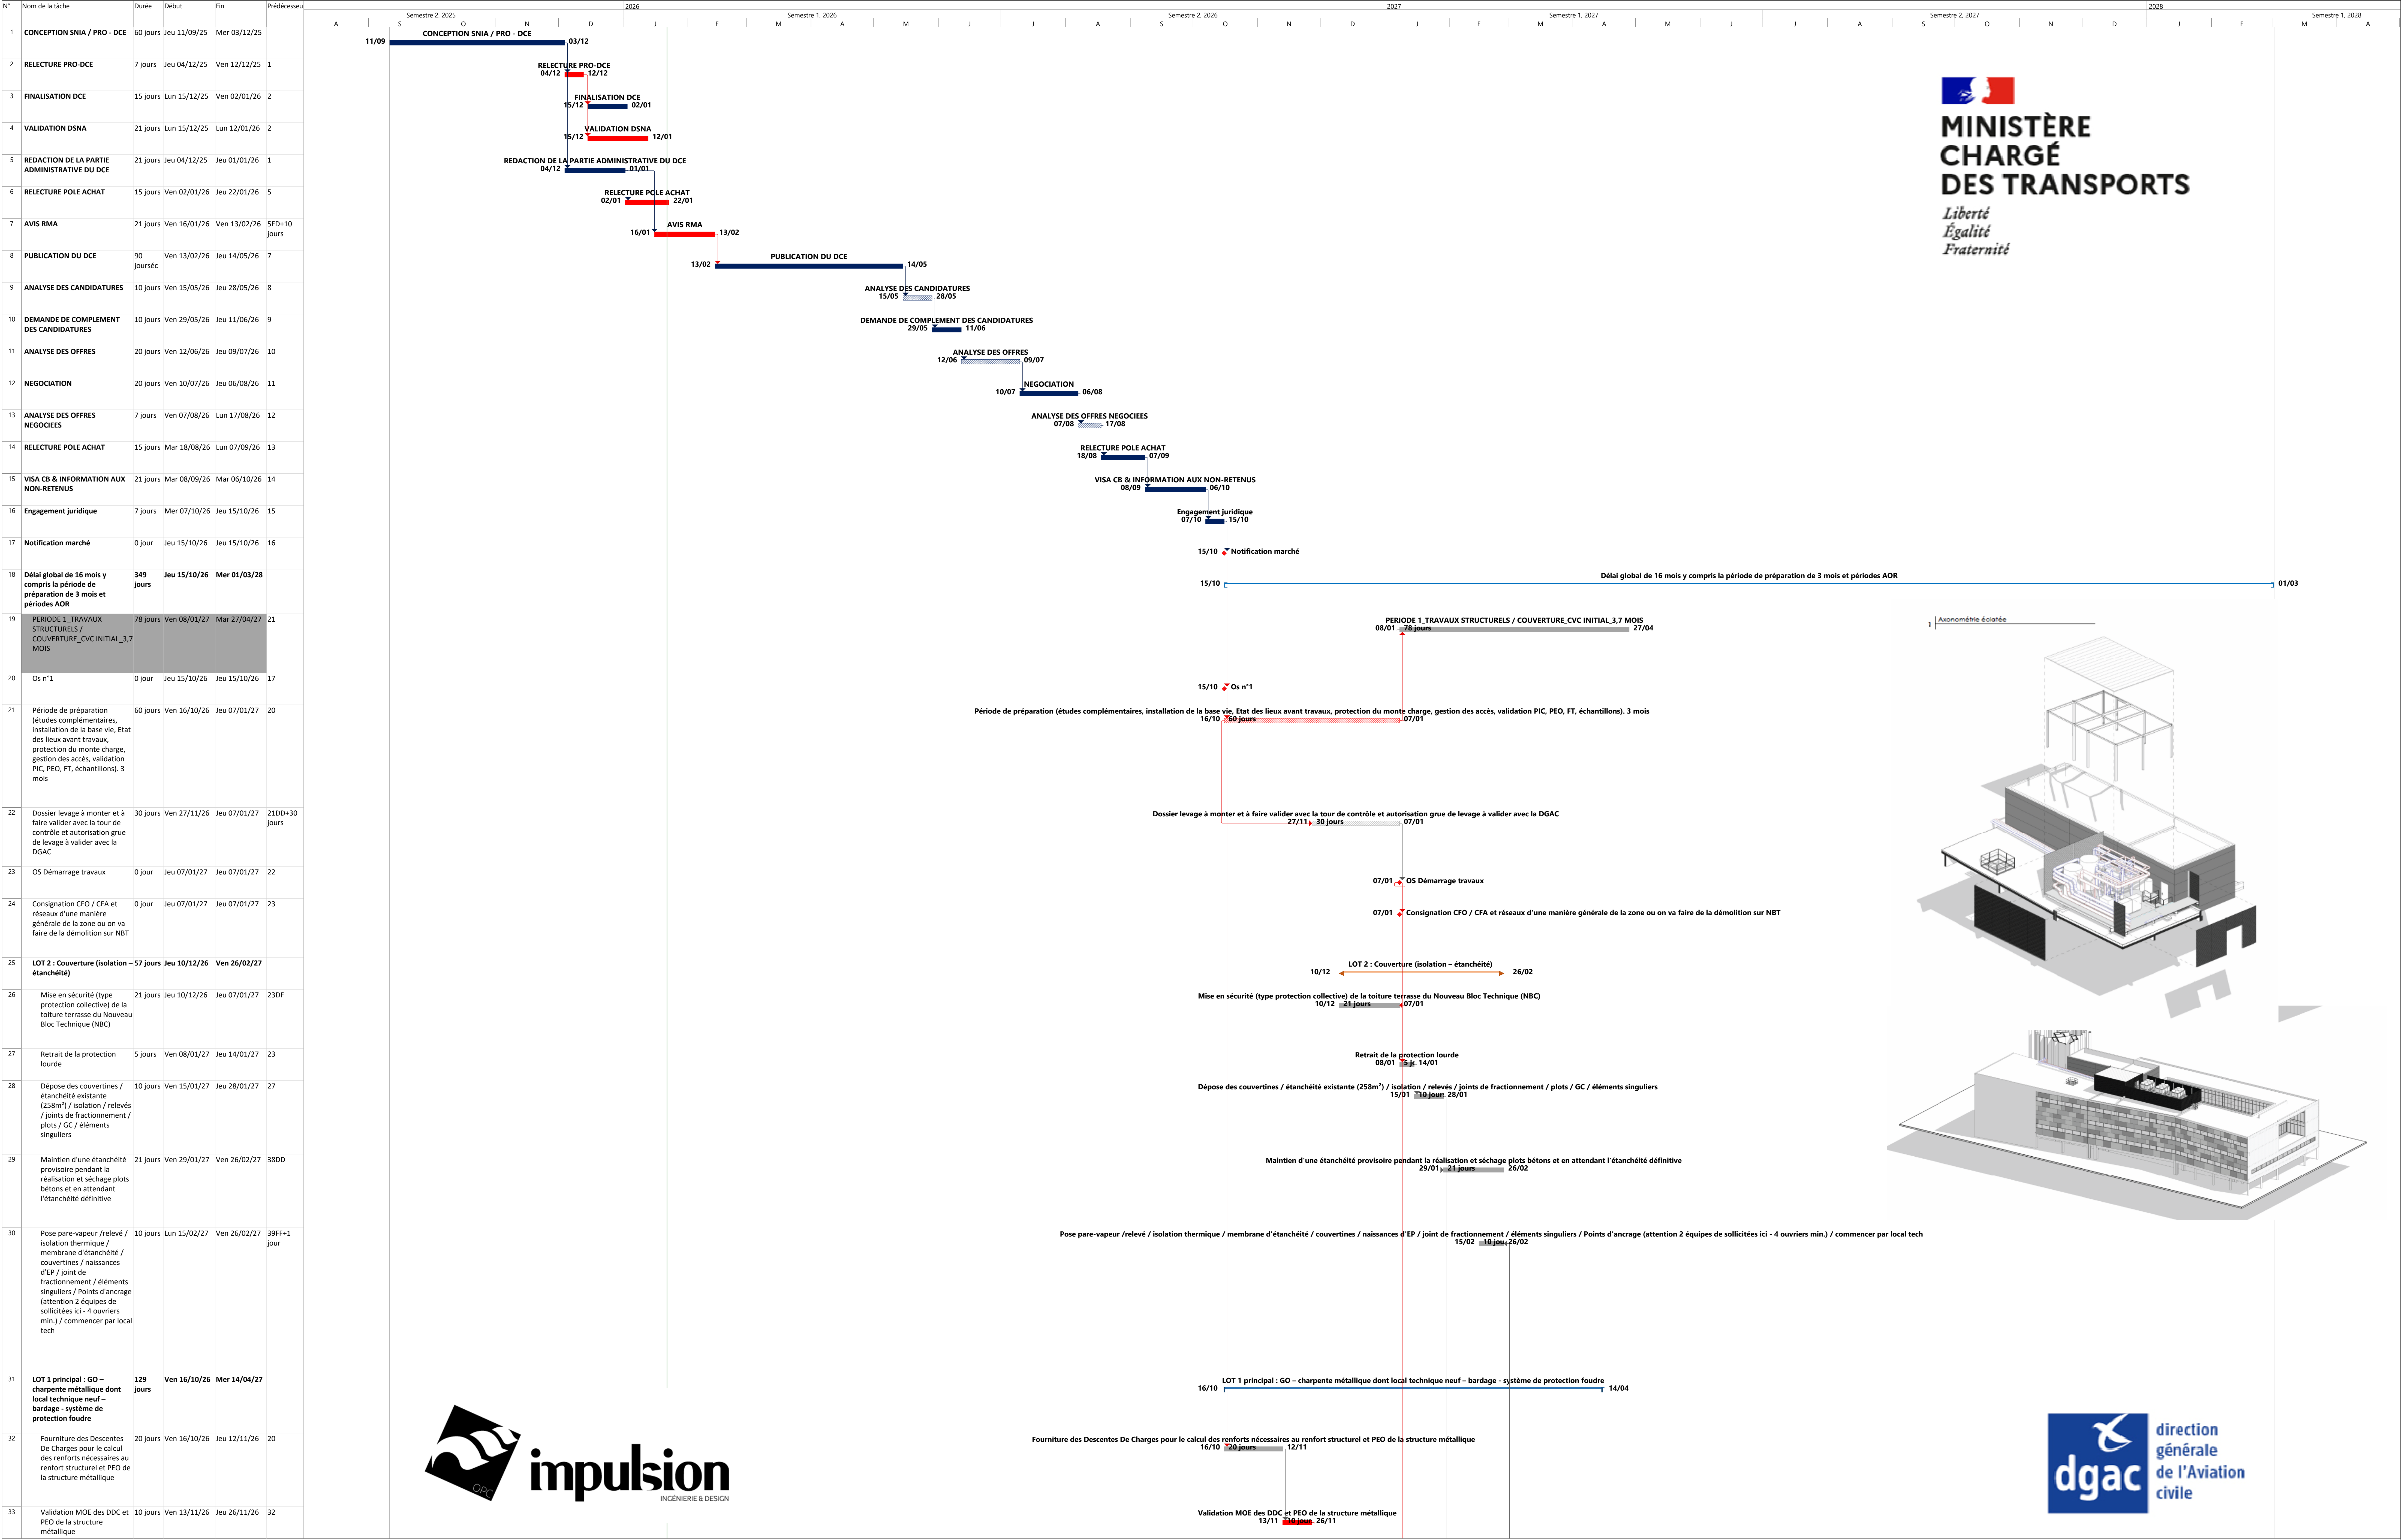

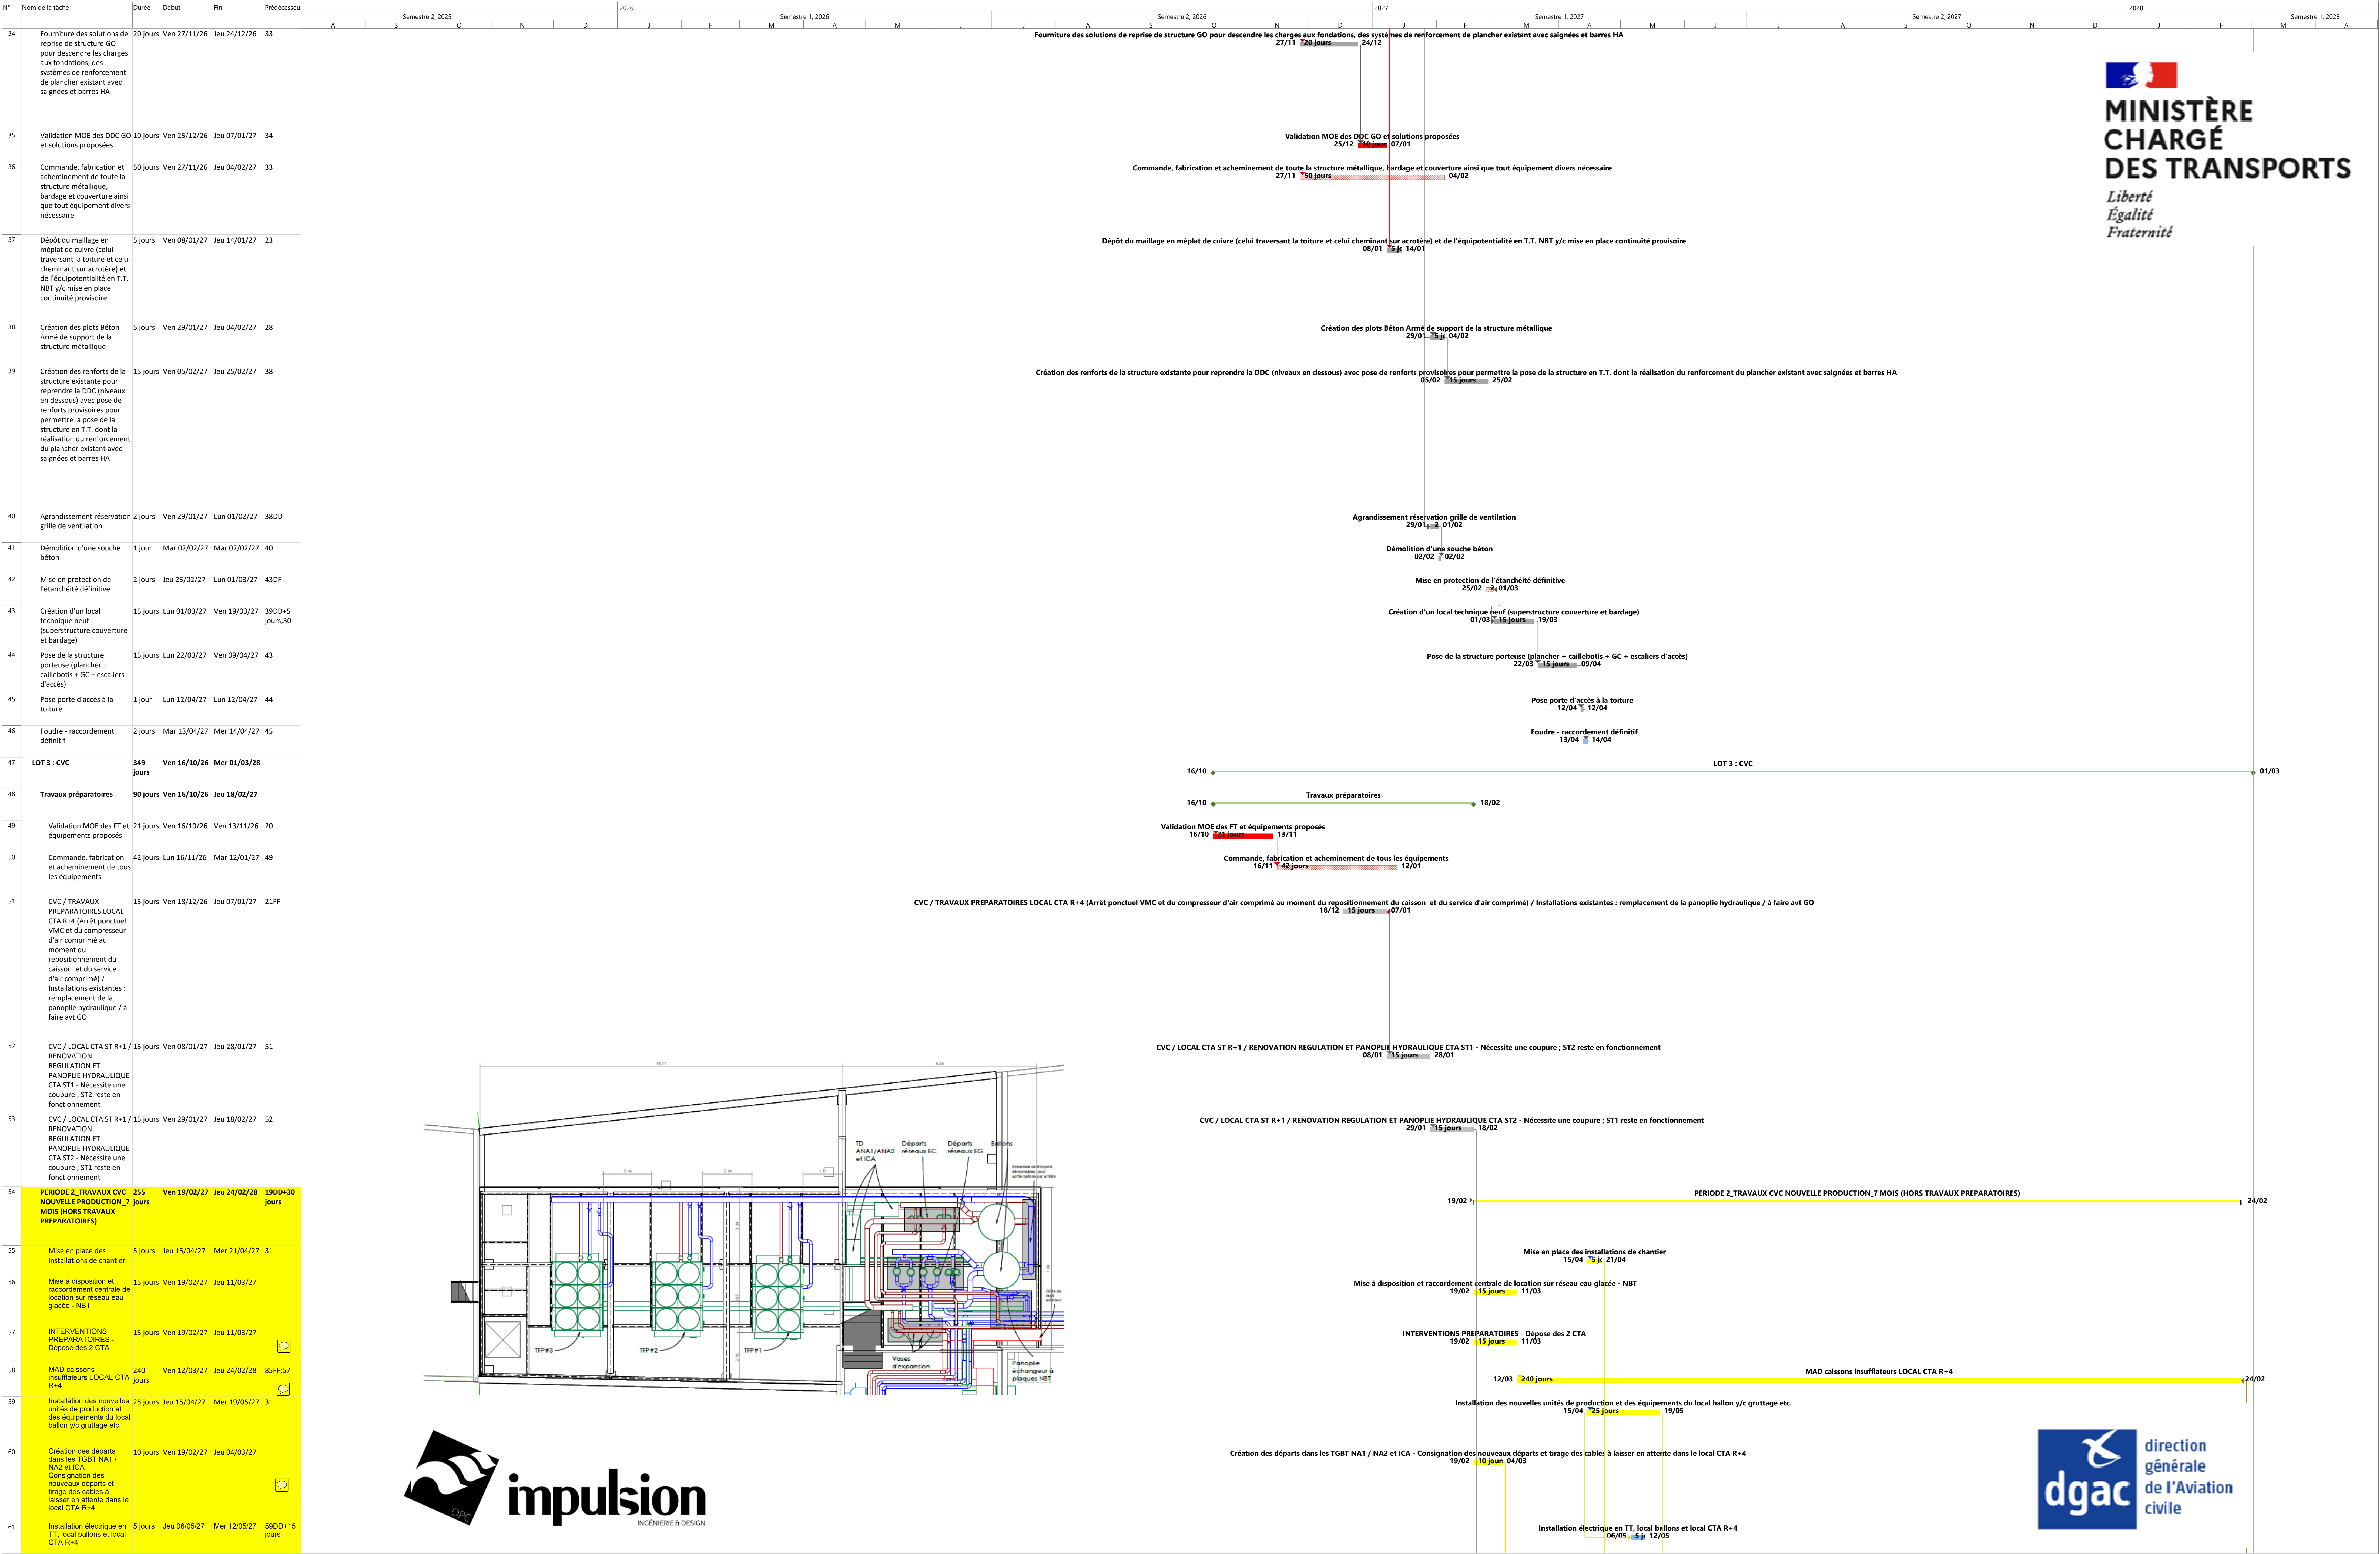

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Précédence
62	Finalisation travaux calorifuge + calefactements	15 jours	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27	59
63	Autres prestations : Extérieur, pied de la tour etc.	25 jours	Jeu 10/06/27	Mer 14/07/27	62
64	Rénovation régulation et panoplie hydraulique- Arrêt CTA IFR1, maintien IFR2	15 jours	Ven 05/03/27	Jeu 25/03/27	60
65	Rénovation régulation et panoplie hydraulique- Arrêt CTA IFR2, maintien IFR1	15 jours	Ven 26/03/27	Jeu 15/04/27	64
66	Modification régulation pupitre chef salle IFR	10 jours	Ven 05/03/27	Jeu 18/03/27	60
67	Dépose décalage CTA double flux / SOUS STATION TWR N-2	10 jours	Jeu 22/04/27	Mer 05/05/27	55
68	MAD saisons insufflateurs et extracteur - install prov. TWR	75 jours	Jeu 06/05/27	Mer 18/08/27	67
69	Modification hydraulique de la sous station eau glacée TWR N-2	15 jours	Ven 19/02/27	Jeu 11/03/27	53
70	Modification régulation de la sous station eau glacée TWR N-2	15 jours	Ven 12/03/27	Jeu 01/04/27	69
71	Modification hydraulique de la sous station eau chaude TWR N-2	15 jours	Jeu 01/07/27	Mer 21/07/27	78FD+10 jours
72	Modification régulation de la sous station eau chaude TWR N-2	20 jours	Jeu 22/07/27	Mer 18/08/27	71
73	Remplissage eau adoucie / SOUS STATION TWR N-2	3 jours	Ven 12/03/27	Mar 16/03/27	69
74	Fourniture et pose de la nouvelle Centrale de traitement d'air double flux TWR y compris raccordement hydraulique et aéraulique / SOUS STATION TWR N-2	30 jours	Jeu 19/08/27	Mer 29/09/27	72
75	Régulation et raccordement électrique de la CTA double flux TWR / SOUS STATION TWR N-2	20 jours	Jeu 30/09/27	Mer 27/10/27	74
76	Fourniture et pose des équipements du nouveau local échangeurs à plaques de l'ABT y compris raccordement hydrauliques des équipements / LOCAL ECHANGEURS	20 jours	Jeu 22/04/27	Mer 19/05/27	55
77	Raccordements électriques du local échangeurs à plaques	10 jours	Jeu 20/05/27	Mer 02/06/27	76
78	Rénovation panoplie secondaire échangeurs ACA et raccordements hydrauliques de l'échangeur	20 jours	Jeu 20/05/27	Mer 16/06/27	68DD+10 jours
79	BASCULE ET MISE EN SITUATION DE LA NOUVELLE PRODUCTION	5 jours	Jeu 28/10/27	Mer 03/11/27	75
80	Essais - rincage - équilibrage	5 jours	Jeu 04/11/27	Mer 10/11/27	79
81	Formation des utilisateurs	5 jours	Jeu 11/11/27	Mer 17/11/27	80
82	MESO - durée un mois minimum	20 jours	Jeu 18/11/27	Mer 15/12/27	81
83	PERIODE 3 TRAVAUX DEPOSE ANCIENNE INSTALLATION CVC	45 jours	Jeu 16/12/27	Mer 01/03/28	82
84	Interventions préparatoires - dépose des réseaux hydrauliques obsolètes / LOCAL CTA R+4	5 jours	Jeu 16/12/27	Mer 05/01/28	82
85	Fourniture et pose de la nouvelle CTA double flux NBT y compris, gainages, raccordements hydrauliques / LOCAL CTA R+4	15 jours	Jeu 06/01/28	Mer 26/01/28	84
86	Raccordements électriques de la CTA double flux NBT / LOCAL CTA R+4	5 jours	Jeu 27/01/28	Mer 02/02/28	85
87	Raccordement 2 ème branche inverseur de source TFP sur TGBT / LOCAL CTA R+4	5 jours	Jeu 03/02/28	Mer 09/02/28	86
88	Dépose des installations existantes obsolètes / TOITURE TERRASSE ABT	5 jours	Jeu 10/02/28	Mer 16/02/28	87
89	Finalisation travaux dans local CTA R+4	5 jours	Jeu 17/02/28	Mer 23/02/28	88
90	Repli des installations de chantier	5 jours	Jeu 24/02/28	Mer 01/03/28	89
91	Trève aéroportuaire - plus de consignation possible entre le 15/04/27 et le 15/10/27	132 jours	Jeu 15/04/27	Ven 15/10/27	
92	OPR - GO / Couverture	15 jours	Jeu 15/04/27	Mer 05/05/27	46
93	Réception - GO / couverture	0 jour	Mer 05/05/27	Mer 05/05/27	92
94	Réception - CVC	0 jour	Mer 15/12/27	Mer 15/12/27	82

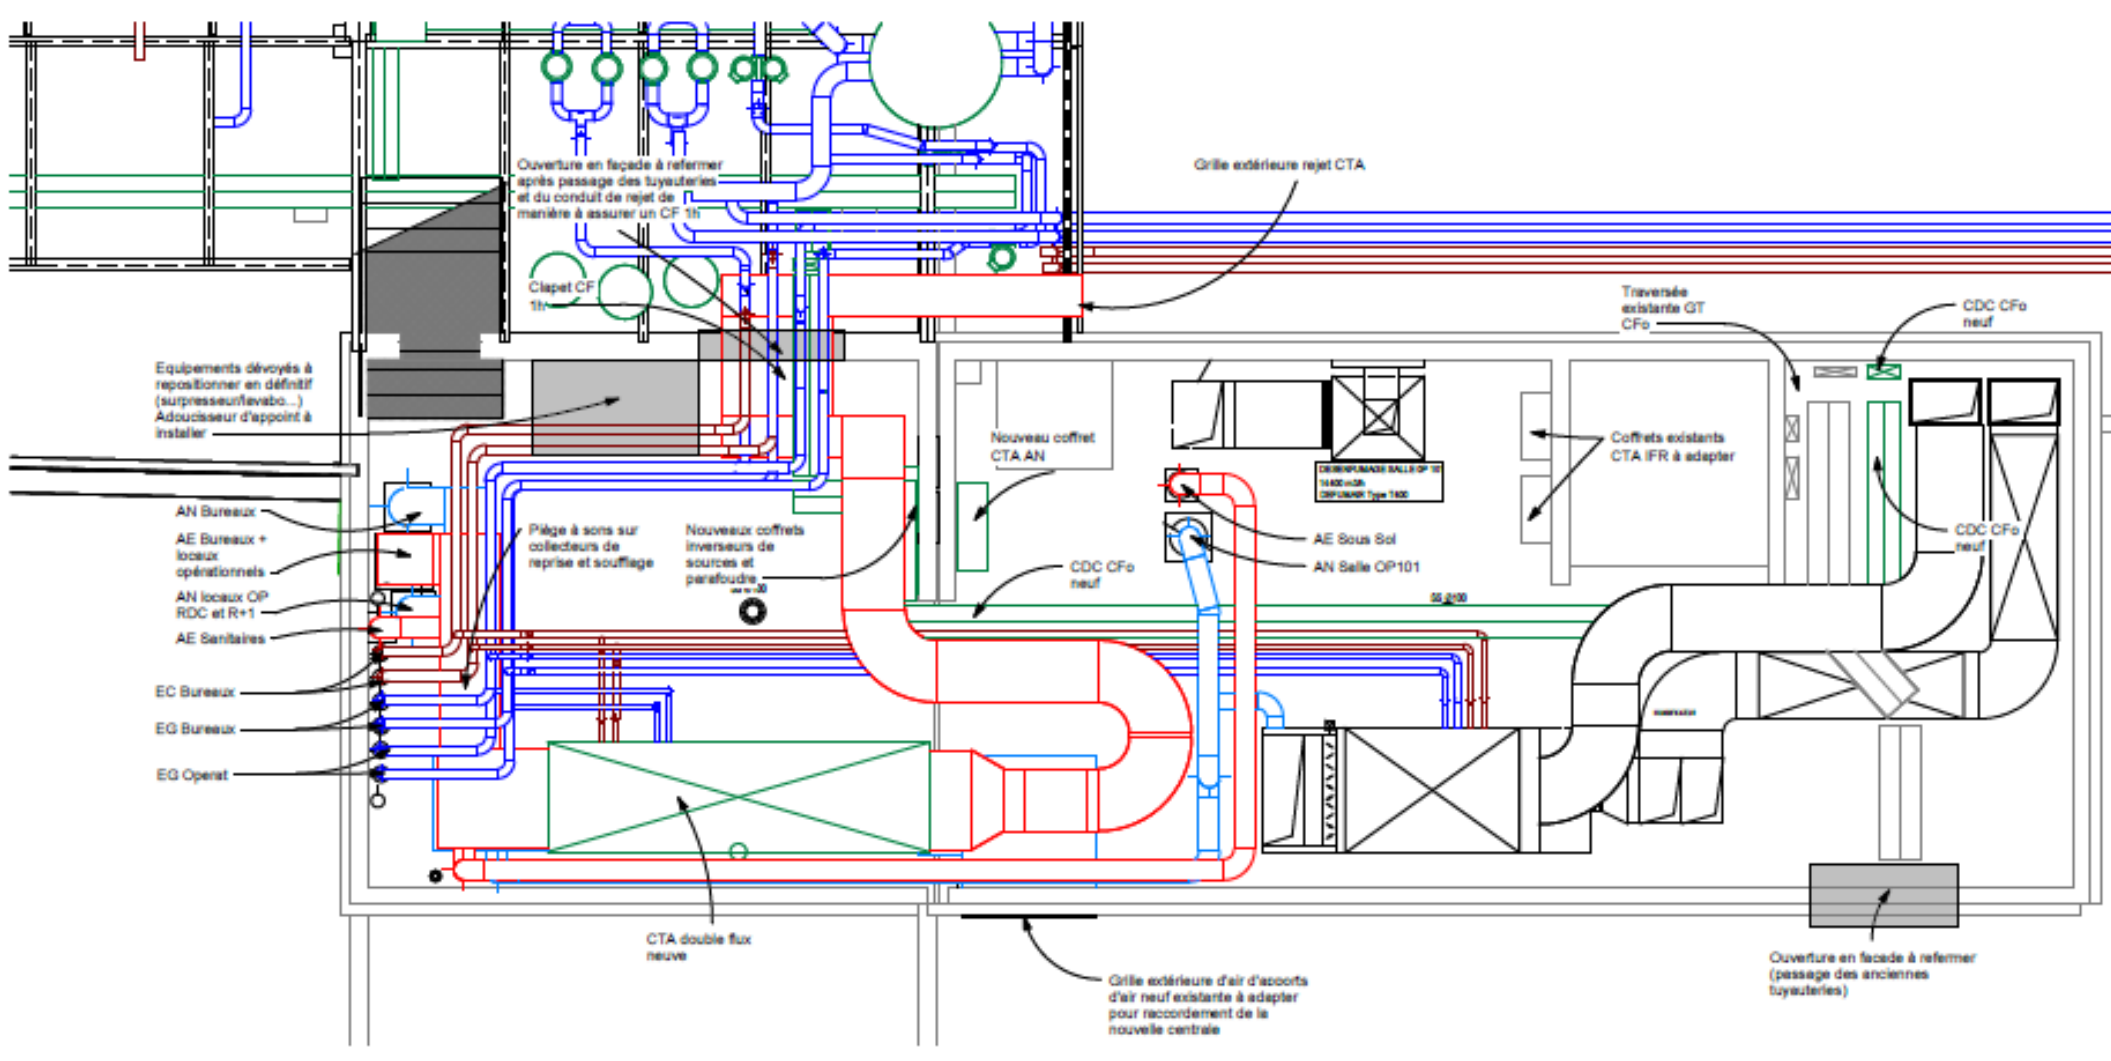

08 Local CTA R+4 - Projet

