


MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS

Planning prévisionnel

Date MAJ : 22/05/2026

Nom de la tâche	Durée		Début	Fin
Concours MOE			avr-26	mars-27
Etudes de MOE P18			avr-27	mai-28
Etudes de MOE Picasso 2030			avr-27	janv-29
ESQ (reprise) / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr.-27	avr.-27
Validation ESQ / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr.-27	avr.-27
APS global	12 sem.		mai-27	juil.-27
Analyse et validation APS	8 sem.		juil.-27	sept.-27
APD P18	8 sem.		sept-27	nov.-27
Analyse et validation APD P18	5 sem.		nov.-27	déc.-27
Production dossier autorisation admin. P18	3 sem.		déc.-27	janv.-28
Validation dossier autorisation admin. P18	1 sem.		janv.-28	janv.-28
Autorisations administratives P18 (PSMV - ABF)	6 mois		janv.-28	juil.-28
APD Picasso 2030*	20 sem.		sept.-27	févr.-28
Analyse, passage CMPI validation APD	10 sem.		févr.-28	avr.-28
Constitution dossier PC	5 sem.		avr.-28	mai-28
Instruction PC (ERP - PSMV - ABF)	6 mois		mai-28	nov.-28
PRO P18	8 sem.		déc.-27	févr.-28
Analyse PRO P18	4 sem.		févr.-28	mars-28
DCE P18	2 sem.		mars-28	mars-28
PRO Picasso 2030*	20 sem.		avr.-28	août-28
Analyse PRO Picasso 2030	5 sem.		sept.-28	oct.-28
DCE	4 sem.		oct.-28	nov.-28
Consultation travaux P18	5 mois		mars-28	août-28
Consultation travaux Picasso 2030*	6 mois		nov.-28	mai-29
Travaux			oct-28	mai-32
Phase 1 - Travaux anticipés P18	10 mois		sept-28	juin-29
Emménagement P18	1 mois		juil-29	juil-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (préparation de chantier)	3,5 mois		mai-29	août-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (travaux)	22 mois		sept-29	juil-31

*Picasso 2030 = Phase 2,3&4 du programme : Transformation aile jardin - Hôtel Salé et finalisation aménagement jardin

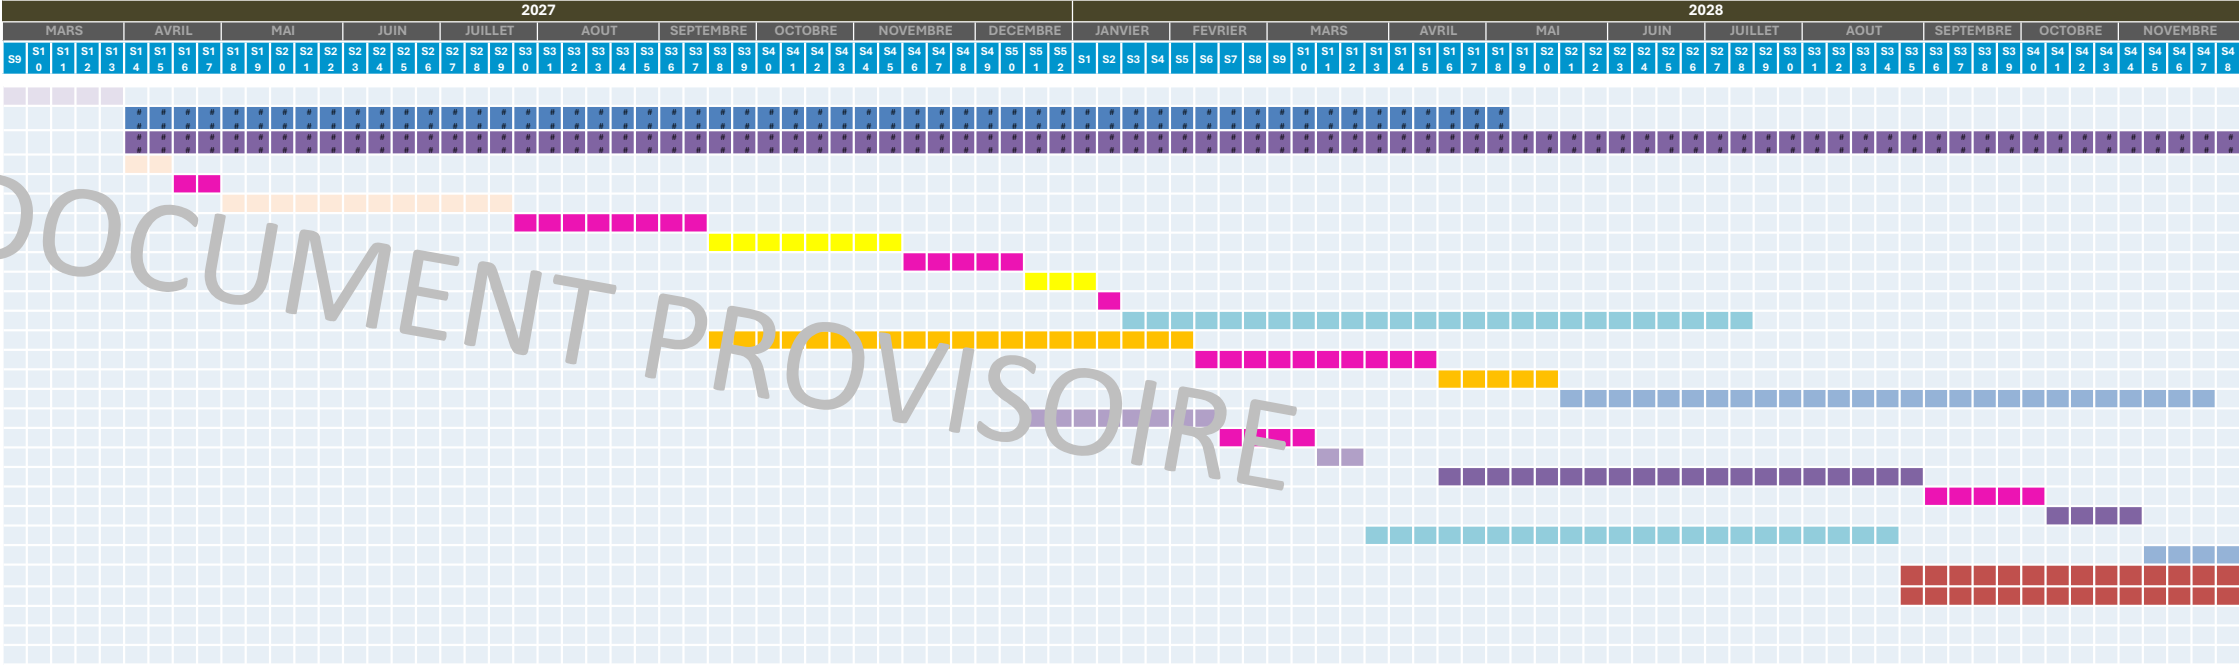


MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS

Planning prévisionnel

Date MAJ : 22/05/2026

Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
Concours MOE		avr-26	mars-27
Etudes de MOE P18		avr-27	mai-28
Etudes de MOE Picasso 2030		avr-27	janv-29
ESQ (reprise) / Etudes préliminaires BIM	2 sem.	avr.-27	avr.-27
Validation ESQ / Etudes préliminaires BIM	2 sem.	avr.-27	avr.-27
APS global	12 sem.	mai-27	juil.-27
Analyse et validation APS	8 sem.	juil.-27	sept.-27
APD P18	8 sem.	sept.-27	nov.-27
Analyse et validation APD P18	5 sem.	nov.-27	déc.-27
Production dossier autorisation admin. P18	3 sem.	déc.-27	janv.-28
Validation dossier autorisation admin. P18	1 sem.	janv.-28	janv.-28
Autorisations administratives P18 (PSMV - ABF)	6 mois	janv.-28	juil.-28
APD Picasso 2030*	20 sem.	sept.-27	févr.-28
Analyse, passage CMPI validation APD	10 sem.	févr.-28	avr.-28
Constitution dossier PC	5 sem.	avr.-28	mai-28
Instruction PC (ERP - PSMV - ABF)	6 mois	mai-28	nov.-28
PRO P18	8 sem.	déc.-27	févr.-28
Analyse PRO P18	4 sem.	févr.-28	mars-28
DCE P18	2 sem.	mars-28	mars-28
PRO Picasso 2030*	20 sem.	avr.-28	août-28
Analyse PRO Picasso 2030	5 sem.	sept.-28	oct.-26
DCE	4 sem.	oct.-28	nov.-28
Consultation travaux P18	5 mois	mars-28	août-28
Consultation travaux Picasso 2030*	6 mois	nov.-28	mai-29
Travaux		oct-28	mai-32
Phase 1 - Travaux anticipés P18	10 mois	sept-28	juin-29
Emménagement P18	1 mois	juil-29	juil-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (préparation de chantier)	3,5 mois	mai-29	août-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (travaux)	22 mois	sept-29	juil-31

*Picasso 2030 = Phase 2,3&4 du programme : Transformation aile jardin - Hôtel Salé et finalisation aménagement jardin

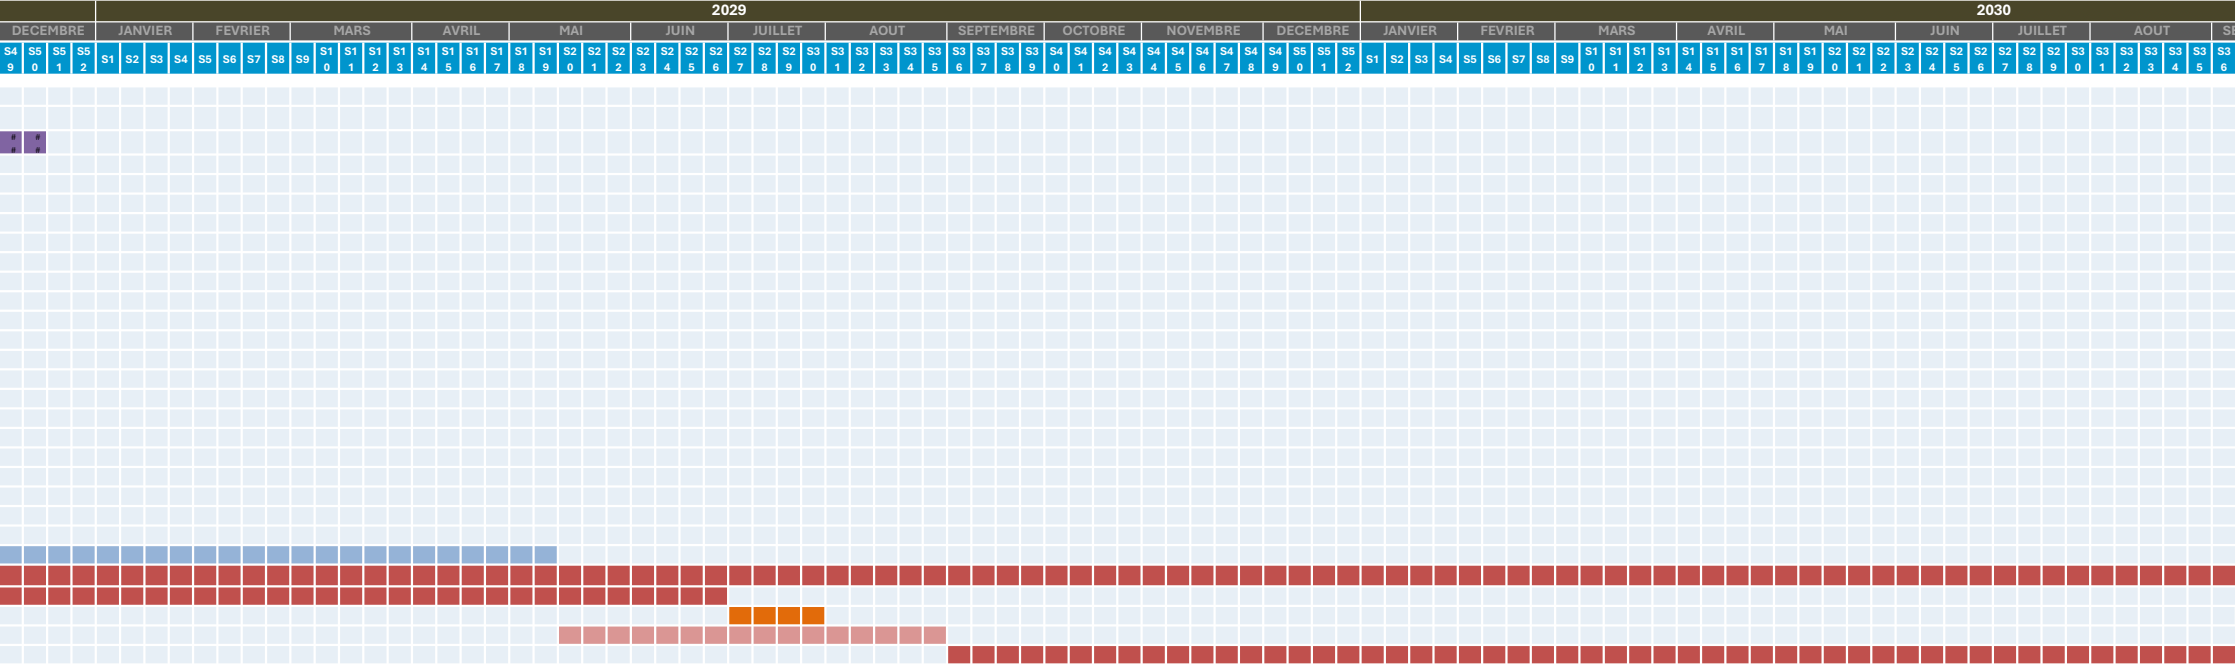


MUSEE NATIONAL PICASSO PARIS

Planning prévisionnel

Date MAJ : 22/05/2026

Nom de la tâche	Durée		Début	Fin
Concours MOE			avr-26	mars-27
Etudes de MOE P18			avr-27	mai-28
Etudes de MOE Picasso 2030			avr-27	janv-29
ESQ (reprise) / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr.-27	avr.-27
Validation ESQ / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr.-27	avr.-27
APS global	12 sem.		mai-27	juil.-27
Analyse et validation APS	8 sem.		juil.-27	sept.-27
APD P18	8 sem.		sept.-27	nov.-27
Analyse et validation APD P18	5 sem.		nov.-27	déc.-27
Production dossier autorisation admin. P18	3 sem.		déc.-27	janv.-28
Validation dossier autorisation admin. P18	1 sem.		janv.-28	janv.-28
Autorisations administratives P18 (PSMV - ABF)	6 mois		janv.-28	juil.-28
APD Picasso 2030*	20 sem.		sept.-27	févr.-28
Analyse, passage CMPI validation APD	10 sem.		févr.-28	avr.-28
Constitution dossier PC	5 sem.		avr.-28	mai-28
Instruction PC (ERP - PSMV - ABF)	6 mois		mai-28	nov.-28
PRO P18	8 sem.		déc.-27	févr.-28
Analyse PRO P18	4 sem.		févr.-28	mars-28
DCE P18	2 sem.		mars-28	mars-28
PRO Picasso 2030*	20 sem.		avr.-28	août-28
Analyse PRO Picasso 2030	5 sem.		sept.-28	oct.-26
DCE	4 sem.		oct.-28	nov.-28
Consultation travaux P18	5 mois		mars-28	août-28
Consultation travaux Picasso 2030*	6 mois		nov.-28	mai-29
Travaux			oct-28	mai-32
Phase 1 - Travaux anticipés P18	10 mois		sept-28	juin-29
Emménagement P18	1 mois		juil-29	juil-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (préparation de chantier)	3,5 mois		mai-29	août-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (travaux)	22 mois		sept-29	juil-31

*Picasso 2030 = Phase 2,3&4 du programme : Transformation aile jardin - Hôtel Salé et finalisation aménagement jardin

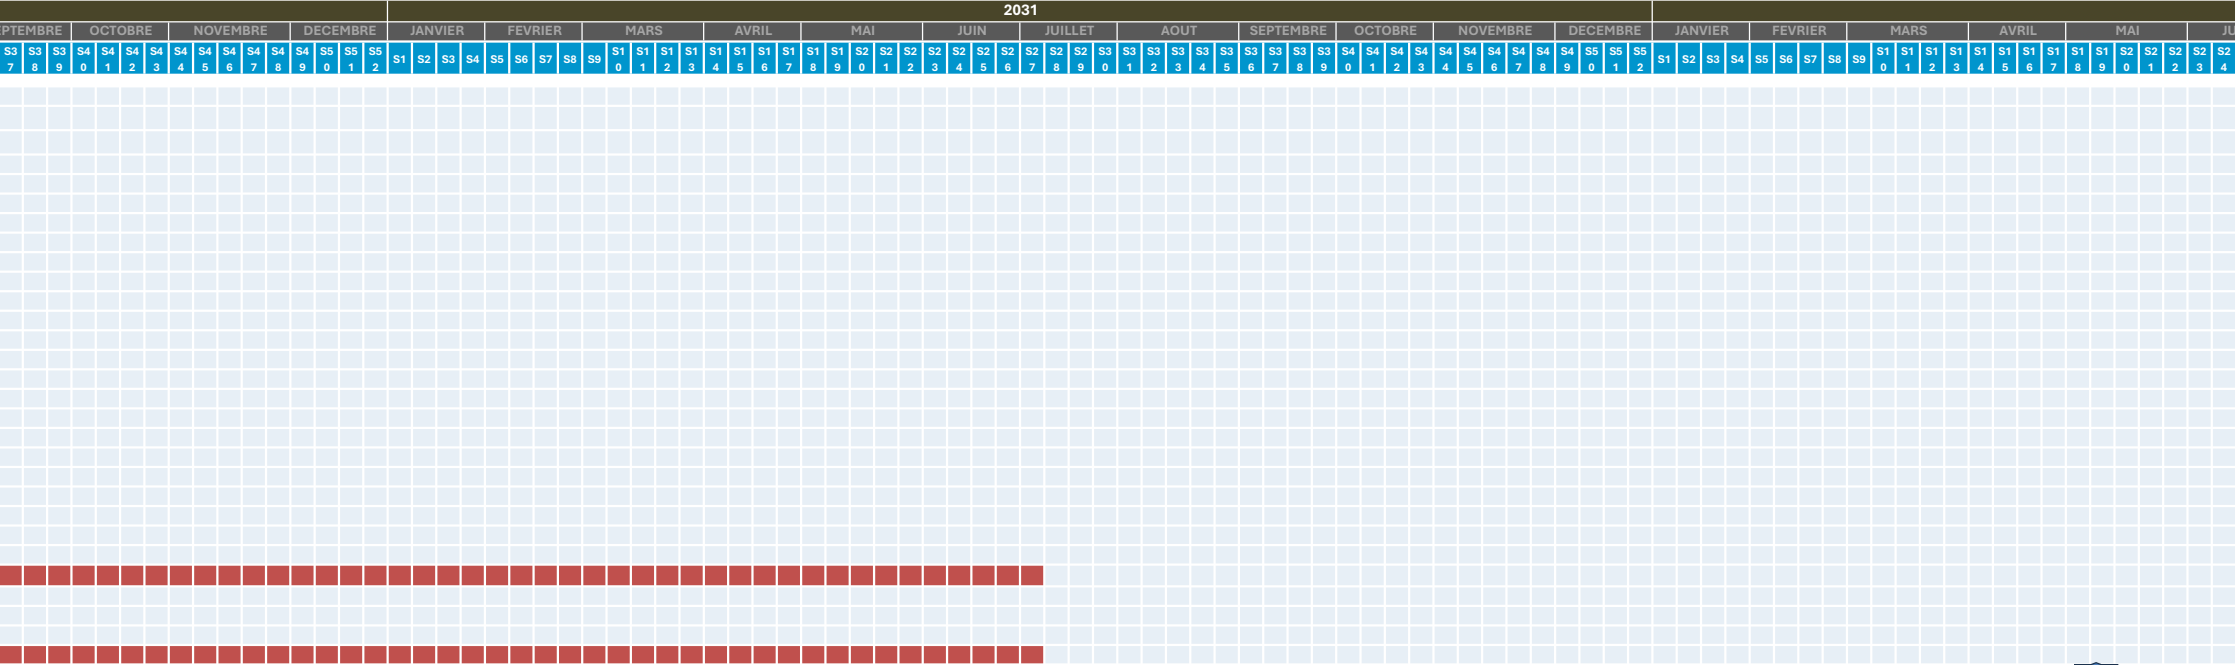

Date MAJ : 22/05/2026

Concours MOE			avr-26	mars-27
Etudes de MOE P18			avr-27	mai-28
Etudes de MOE Picasso 2030			avr-27	janv-29
ESQ (reprise) / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr-27	avr-27
Validation ESQ / Etudes préliminaires BIM	2 sem.		avr-27	avr-27
APS global	12 sem.		mai-27	juil.-28
Analyse et validation APS	8 sem.		juil.-27	sept.-27
APD P18	8 sem.		sept.-27	nov.-27
Analyse et validation APD P18	5 sem.		nov.-27	déc.-27
Production dossier autorisation admin. P18	3 sem.		déc.-27	janv.-28
Validation dossier autorisation admin. P18	1 sem.		janv.-28	janv.-28
Autorisations administratives P18 (PSMV - ABF)	6 mois		janv.-28	juil.-28
APD Picasso 2030*	20 sem.		sept.-27	févr.-28
Analyse, passage CMPI validation APD	10 sem.		févr.-28	avr.-28
Constitution dossier PC	5 sem.		avr.-28	mai-28
Instruction PC (ERP - PSMV - ABF)	6 mois		mai-28	nov.-28
PRO P18	8 sem.		déc.-27	févr.-28
Analyse PRO P18	4 sem.		févr.-28	mars-28
DCE P18	2 sem.		mars-28	mars-28
PRO Picasso 2030*	20 sem.		avr.-28	août-28
Analyse PRO Picasso 2030	5 sem.		sept.-28	oct.-26
DCE	4 sem.		oct.-28	nov.-28
Consultation travaux P18	5 mois		mars-28	août-28
Consultation travaux Picasso 2030*	6 mois		nov.-28	mai-29
Travaux			oct-28	mai-32
Phase 1 - Travaux anticipés P18	10 mois		sept-28	juin-29
Emménagement P18	1 mois		juil-29	juil-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (préparation de chantier)	3,5 mois		mai-29	août-29
Phase 2,3&4 - Picasso 2030 - (travaux)	22 mois		sept-29	juil-31

[illegible]

Picasso 2030 = Phase 2,3&4 du programme : Transformation aile jardin - Hôtel Salé et finalisation aménagement jardin
