

Hall Concorde - Remplacement du Tableau Général Basse tension (TGBT)

1 juin 2026

<http://>

Chef de projet	Guido BOROLI
Dates du projet	24 juil. 2026 - 2 déc. 2026
Avancée	0%
Tâches	13
Ressources	5

Ce planning provisionnelle/d'execution concerne le Marché de travaux pour le remplacement du Tableau Général Basse tension (TGBT) du Hall Concorde au Musée de l'Air et de l'Espace (MAE).

Décomposition des lots:

Lot 01 – Electricité CFO/CFA

Lot 02 – Maçonnerie, cloisons, faux plafonds, bloc porte, peinture.


Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Notification OS démarrage	24/07/2026	24/07/2026	0
Réunion de démarrage	31/07/2026	31/07/2026	0
TRAVAUX	31/07/2026	01/12/2026	87
Préparation du chantier	31/07/2026	27/08/2026	20
Réalisation des travaux	28/08/2026	20/11/2026	60
Finalisation installation pour "60 ans du Salon des Véhicules de Loisirs "	24/09/2026	24/09/2026	0
Événement "60 ans du Salon des Véhicules de Loisirs "	28/09/2026	28/09/2026	0
Finalisation installation pour "Aérorun"	15/10/2026	15/10/2026	0
Événement "Aérorun"	19/10/2026	19/10/2026	0
Repli des installations	23/11/2026	24/11/2026	2
Operation préalable à la réception	25/11/2026	25/11/2026	1
levée des réserves	26/11/2026	01/12/2026	4
Réception des travaux	02/12/2026	02/12/2026	0

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Christel MEYRE	Responsable de pôle Bâtiments et Maintenance des Infrastrutctures (BMI)
Guido BOROLI	Chef de projet
BAJ	Bureau des Affaires Juridiques
Lot 01	Electricité CFO/CFa
Lot 02	Démolition, maçonnerie

Diagramme de Gantt

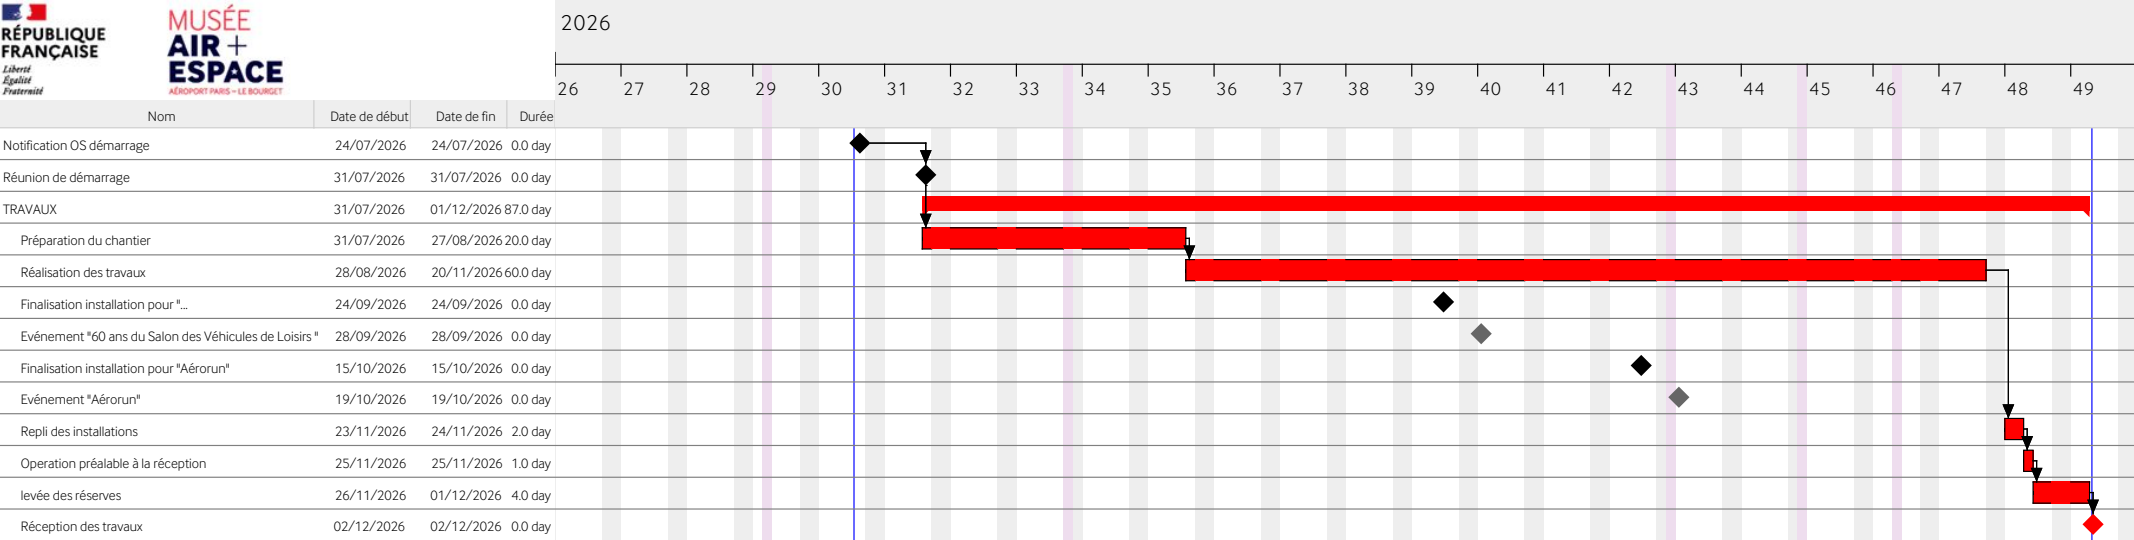



A horizontal number line is shown, ranging from 26 to 49. The line has tick marks for every integer. Vertical pink lines are drawn at the following integer values: 29, 33, 43, 45, and 46. These lines represent the boundaries of the shaded regions.

Nom	Rôle par défaut
• Christel MEYRE	Responsable de p...
• Guido BOROLI	Chef de projet
• BAJ	Bureau des Affaire...
• Lot 01	Electricité CFO/CFa
• Lot 02	Démolition, maço...
