




APAVE
AGENCE DE CAEN
Le Citis
5 rue d'Atalante CS 90200
14205 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
CEDEX
N° SIRET : 90386907100022

DONNEUR D'ORDRE
Madame Sablerie
Esplanade de la Paix
14000 CAEN
CONTACT :



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti



Numéro d'offre : **2965246.1**
Numéro de contrat : **C25259473**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251933029**
Date : **31/10/2025**

Lieu d'intervention :
Bâtiment
batiment L/sciences E du Campus 1
Esplanade de la Paix
14000 CAEN

Destinataire rapport :
Madame Sablerie Juliette

Date d'intervention :
Du **21/10/2025**

Intervenant : **Monsieur Gaylor ORFEUIL**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 66 pages

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **batiment L/sciences E du Campus 1
Esplanade de la Paix
14000 CAEN**

Étage :
 Bâtiment :
 Nature du bâtiment : **Bâtiment**

Numéro de Lot :
 Référence Cadastre : **000HD - 0113**
 Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**
 Date de construction : **Non communiquée**

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : **Madame Sablerie Juliette**
 Adresse : **Esplanade de la Paix
14000 CAEN**

DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE

Nom : **UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE**
 Adresse : **Esplanade de la Paix
14000 CAEN**

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : **ORFEUIL Gaylor**
 N° certification : **CPDI6430**
 Date d'obtention : **12/09/2022**
 Organisme : **I.CERT**
 Adresse : **Parc d'Affaires, Espace Performance -
Bât K
35760 SAINT-GRÉGOIRE**

Date de la commande : **20/10/2025**
 Accompagnateur : **Aucun**

Laboratoire d'Analyses : **ACEPE**
 Adresse laboratoire : **209 rue Jean Moulin 50110
TOURLAVILLE**
 Numéro d'accréditation : **1-6133**

Organisme d'assurance professionnelle : **AXA FRANCE IARD**
 Adresse assurance : **313 Terrasse de l'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX**
 N° de contrat d'assurance : **10800807204**
 Date de validité : **31/12/2025**

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :
 Nature des travaux envisagés : Nous avons besoins d'un DAT pour toutes les pièces du plan joint à l'exception de l'amphi SE 113 et escaliers Se 112 et SE 115.
 Le projet consiste à la suppression de la cloison entre SE 119 et SE 117, au changement de disposition des Sanitaires et à la remise en état globale des locaux (sols et murs).

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	9
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	9
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	9
OBJECTIF	9
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	9
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	9
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	11
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	11
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	11
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	13
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	13
PRECONISATIONS	14
ANNEXE CROQUIS	15
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	17
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	43
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	52
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	53
ANNEXE AUTRES DOCUMENTS.....	59
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	62
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	63
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	65

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Absence

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
R+1	SE 124	Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P001)	S001	Z001
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P002)	S002	Z001
		Faïence bleu	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P004)	S004	Z003
		Faïence rectangulaire bleu	Colle de faïence grise	Résultat d'analyse (P005)	S005	Z004
		Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006)	S006	Z005
		Faïence rectangulaire bleu	Colle de faïence grise	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z004
		Faïence bleu	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P009)	S008	Z003
		Poteau	Toile de verre tissée/enduit ciment	Résultat d'analyse (P008)	S009	Z006
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P010)	S010	Z001
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003)	S003	Z002
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011)	S011	Z007
		Plancher haut	Béton			
R+1	SE 117	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P014)	S012	Z005
		Faïence bleu	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S013	Z003
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P017)	S014	Z001
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S015	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Poteau	Toile de verre tissée/enduit ciment	Résultat d'analyse (P015)	S016	Z006
		Faïence rectangulaire bleu	Colle de faïence grise	Résultat d'analyse (P013)	S017	Z004
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P016)	S018	Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Colle de faïence blanche	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P012)		
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018)		Z008
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P019)	S019	Z001
		Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P020)	S020	Z005
R+1	SE 116a	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S024	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P025)	S028	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S025	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S026	Z002
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P024)	S027	Z001
R+1	SE 116	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P022)	S021	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P023)	S022	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P021)	S023	Z002
R+1	SE 119	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S029	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S030	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S031	Z002
R+1	SE 118	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S032	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S033	Z007
		Plancher haut	Béton			

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S034	Z002
R+1	SE 120	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S035	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S036	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S037	Z002
R+1	SE 111	Cloisons /doublage	Enduit bande/calicot	Résultat d'analyse (P027)	S040	Z010
		Faïence bleu	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P028)	S038	Z003
		Plancher haut	Béton			
		Plinthe grise	Colle de plinthes blanche	Résultat d'analyse (P030)	S042	Z012
		Cloisons légères	Matériaux dur noir	Résultat d'analyse (P031)	S043	Z013
		Ensemble des fenêtres	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Joints de vitrage	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P026)	S039	Z009
		Carrelage gris	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P029)	S041	Z011
R+1	SE 110	Cloisons légères	Matériaux dur noir	Résultat d'analyse (P034)	S044	Z013
		Cloisons /doublage	Enduit bande/calicot	Résultat d'analyse (P037)	S045	Z010
		Faïence bleu	Colle de faïence blanche	Résultat d'analyse (P033)	S046	Z003
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P032)	S047	Z009
		Plancher haut	Béton			
		Carrelage gris	Carrelage + Colle	Résultat d'analyse (P035)	S048	Z011
		Plinthes grise	Colle de plinthes grise	Résultat d'analyse (P036)	S049	
		Joints de vitrage	Caoutchouc	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
				pas d'amiante		
		Ensemble des fenêtres	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		
R+1	SE 109	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P038)	S050	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S051	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S052	Z002
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P040)	S054	Z001
		Faïence blanche	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P039)	S053	
R+1	SE 107	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S055	Z005
		Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S056	Z001
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S057	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S058	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Poteau	enduit ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P042)	S061	
		Moquette grise	Moquette +colle jaune	Résultat d'analyse (P041)	S060	Z014
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S059	Z002
R+1	SE 108	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S062	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S063	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S064	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Moquette grise	Moquette +colle jaune	Résultat d'analyse (P043)	S065	Z014
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S066	Z002
R+1	SE 106	Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P044)	S067	Z001

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P045)	S068	Z002
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S069	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S070	Z007
		Plancher haut	Béton			
R+1	SE 105	Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P046)	S071	Z001
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S072	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S073	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S074	Z002
		Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S090	Z005
R+1	SE 104	Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S075	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S076	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S077	Z002
		Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S078	Z005
R+1	SE 103	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P047)	S079	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P048)	S080	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S081	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S082	Z002
R+1	SE 121	Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S083	Z005
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S084	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et	Résultat d'analyse	S085	Z002

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
			ragréage	(P003 - idem)		
R+1	SE 122	Murs béton	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Résultat d'analyse (P001 - idem)	S086	Z001
		Plinthes plastique	Colle jaune	Résultat d'analyse (P018 - idem)	S087	Z008
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P011 - idem)	S088	Z007
		Plancher haut	Béton			
		Dalle grise 60/60	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P003 - idem)	S089	Z002
		Cloisons	Enduit bande /calicot	Résultat d'analyse (P006 - idem)	S091	Z005

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
21/10/2025	RAAT

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Pour des raisons d'accessibilité, les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les éventuels coffrages perdus n'ont pu être repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Nous avons besoins d'un DAT pour toutes les pièces du plan joint à l'exception de l'amphi SE 113 et escaliers Se 112 et SE 115.

Le projet consiste à la suppression de la cloison entre SE 119 et SE 117, au changement de disposition des sanitaires et à la remise en état globale des locaux (sols et murs).

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	SE 124	OUI	
R+1	SE 117	OUI	
R+1	SE 116a	OUI	
R+1	SE 116	OUI	
R+1	SE 119	OUI	
R+1	SE 118	OUI	
R+1	SE 120	OUI	
R+1	SE 111	OUI	
R+1	SE 110	OUI	
R+1	SE 109	OUI	
R+1	SE 107	OUI	
R+1	SE 108	OUI	
R+1	SE 106	OUI	
R+1	SE 105	OUI	
R+1	SE 104	OUI	
R+1	SE 103	OUI	
R+1	SE 121	OUI	
R+1	SE 122	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
---	---	---------------------	-------------

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons maçonnés	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits de ragréage, débullage, lissage	M
	Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupefeu	M
	Fourreaux (carton, fibres-ciment...)	P
Poteaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison	M
	Entourages de poteau (carton-amiante, fibres-ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus	P
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Flocages	M
	Plots de colle fixant les cloisons au mur	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	P
	Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac	M
	Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-ciment	P
Gaines et coffres verticaux	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)	M
	Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage)	M
	Bandes calicot	M
	enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	P
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris occulus, et sur serrurerie)	P
	Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite	P
	Isolants intérieurs des portes	P
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures intumescentes	M

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds	Flocages	P
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M
	Panneaux collés vissés ou cloués	P
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M
	Bandes calicot	M
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M
	Sous couches des tissus muraux	M
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M

Poutres et charpentes	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
	Résines	M
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibreciment, matériaux sandwich)	P
	Peintures intumescentes	M
	Revêtements bitumineux	M
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M
Gaines et coffres horizontaux	Jonctions avec la façade, calfeutrements, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)	M
	Flocages	M
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)	M
	Bandes calicot	P
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné	M
	Panneaux (fibres-ciment, ...)	P
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)	M
Faux plafonds	Panneaux et plaques	P
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux	P
	Pare vapeur	P
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond	P
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)	P
Suspentes et contrevents	Flocages	M
	Protections en plâtre	M
	Peintures intumescentes	M
5 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sols	Dalles de sol	P
	Nez de marche	P
	Dalles moquettes avec entrecouche noire	P
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M
	Colles bitumineuses	M
	Colles non bitumineuses	M
	Moquette	M
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P
	Peintures de sol	M
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M
	Revêtements de sols sportifs	P
	Joints de dilatation et d'assemblage	P
	Joints de cantonnement sur faux planchers	P
	Enduit de cuvelage	M
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

Client :	UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	Titre :	Croquis N°1
N° rapport :	T251933029		
N° planche :	1/1	Lieu d'intervention :	batiment L/sciences E du Campus 1 Esplanade de la Paix 14000 CAEN
Type :	Croquis		
Date :	31/10/2025	Bâtiment :	
Intervenant :	ORFEUIL Gaylor	Etage :	
Origine du plan :		Commentaire :	

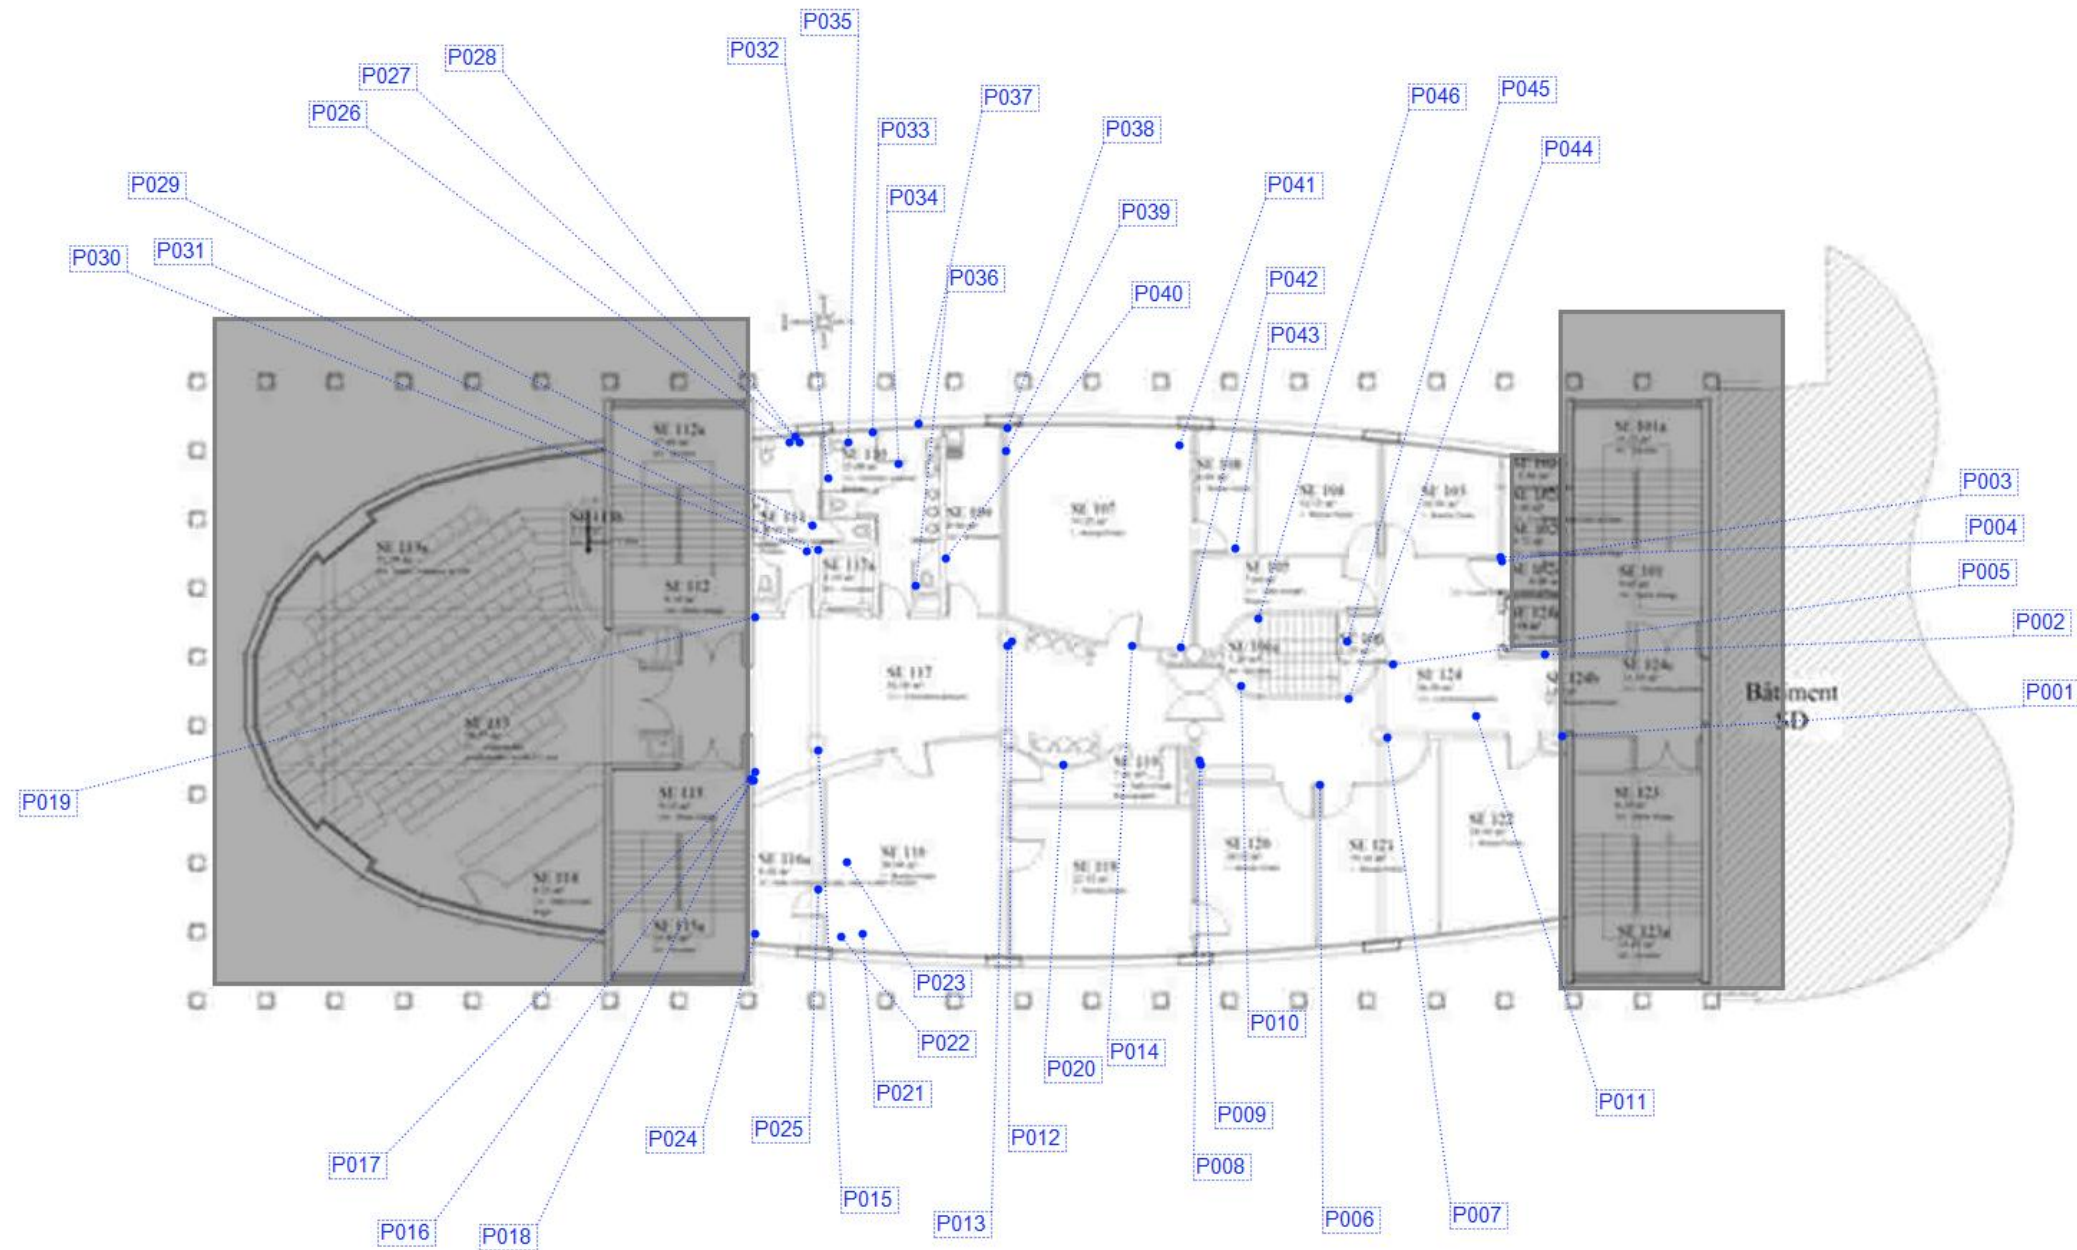

Direction du Patrimoine & de la Linguistique	N°Fichier : XGZP_1M_PLA_R-1_A-d-g Date Création : 28-06-2007 Dessinée par : UNICAEN	BATIMENT SCIENCES E (L) PLAN ARCHITECTURE BATIMENT	Code Bât : INR Niv : ETAGE												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Incl.</th> <th>Forn.</th> <th>Ech.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>A1</td> <td>1/250</td> </tr> </tbody> </table>	Incl.	Forn.	Ech.	A	A1	1/250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Incl.</th> <th>Date:</th> <th>Description:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>15-04-2021</td> <td>EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE UCBN</td> </tr> </tbody> </table>	Incl.	Date:	Description:	A	15-04-2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE UCBN	
Incl.	Forn.	Ech.													
A	A1	1/250													
Incl.	Date:	Description:													
A	15-04-2021	EDITION ORIGINALE AVEC CARTOUCHE UCBN													

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Ensemble des fenêtres
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Aluminium		ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Ensemble des fenêtres - Menuiserie extérieure		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Joints de vitrage
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Caoutchouc		ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Joints de vitrage - Menuiserie extérieure		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

ELEMENT : Plancher haut
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton		ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Plancher haut - Plénum		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet


Enduits ciment/voile blanc/peinture

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Dalle grise 60/60 - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol, colle et ragréage		

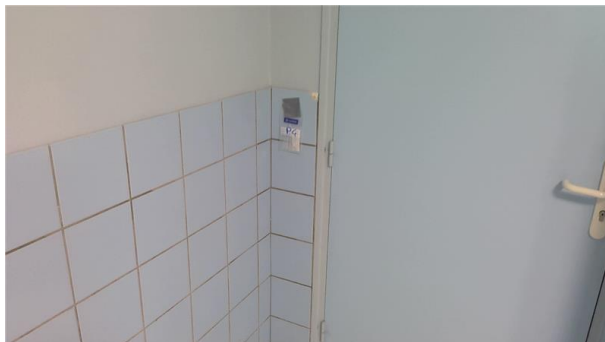PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence bleu - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence blanche		

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence grise	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence rectangulaire bleu - Poteaux		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence grise		

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence grise	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence rectangulaire bleu - Poteaux		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence grise		

PRELEVEMENT : P008


Emplacement




Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre tissée/enduit ciment	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Poteau - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Toile de verre tissée/enduit ciment		

PRELEVEMENT : P009

Emplacement

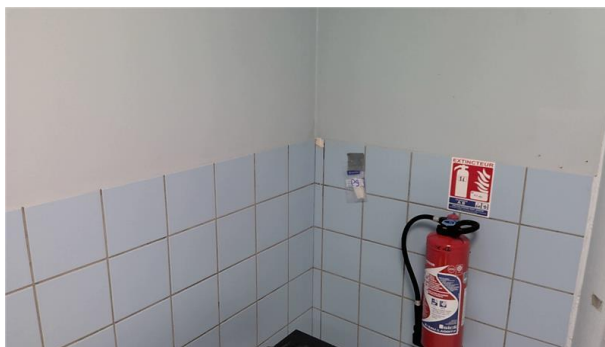

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence bleu - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence blanche		

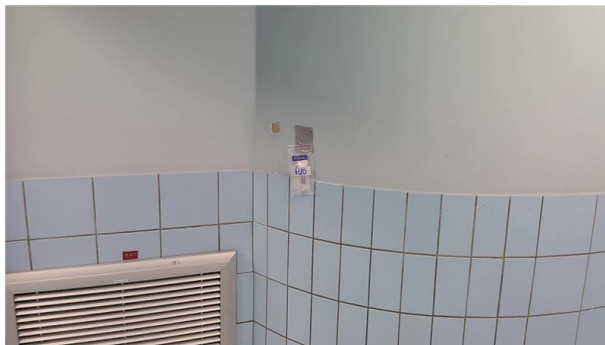PRELEVEMENT : P010
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P011
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 124
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

PRELEVEMENT : P012
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor

Localisation

Colle de faïence blanche - Poteau

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence blanche

PRELEVEMENT : P013
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence grise	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor

Localisation

Faïence rectangulaire bleu - Poteaux

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Colle de faïence grise

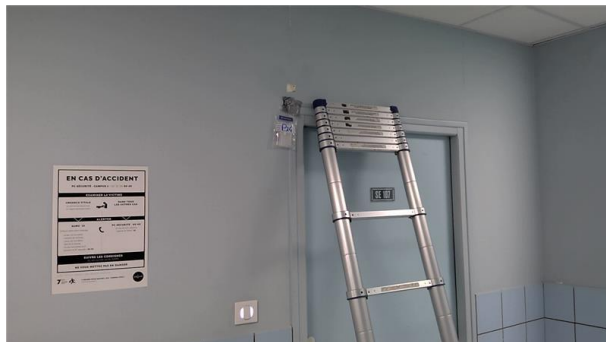PRELEVEMENT : P014
Emplacement


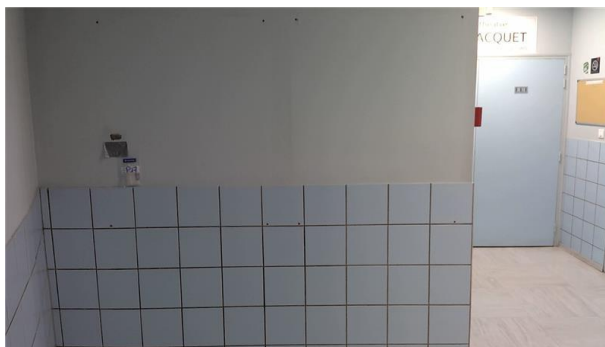
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Toile de verre tissée/enduit ciment	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Poteau - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Toile de verre tissée/enduit ciment		

PRELEVEMENT : P016
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Dalle grise 60/60 - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol, colle et ragréage		

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Plinthes plastique - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle jaune		

PRELEVEMENT : P019
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P020
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 117
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P021
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 116
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Dalle grise 60/60 - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol, colle et ragréage		

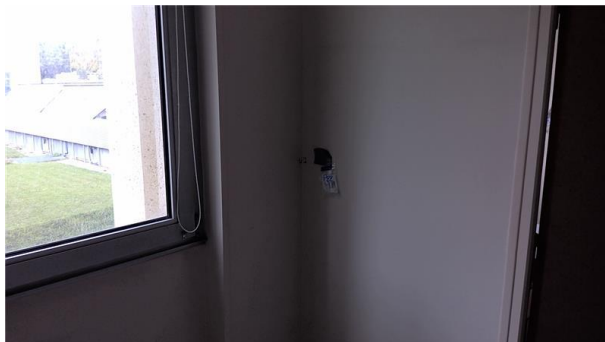PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 116
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 116
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

PRELEVEMENT : P024
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 116a
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 116a
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle jaune	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Plinthes plastique - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle jaune		

PRELEVEMENT : P026
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Plaque de faux-plafond

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande/calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor

Localisation

Cloisons /doublage - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

Enduit bande/calicot

PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence bleu - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence blanche		

PRELEVEMENT : P029
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Carrelage gris - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle		

PRELEVEMENT : P030

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Plinthe grise - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes blanche		

PRELEVEMENT : P031

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 111
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériaux dur noir	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons légères - Menuiserie intérieure		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Matériaux dur noir		

PRELEVEMENT : P032
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faux-plafond - Plafond		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Plaque de faux-plafond		

PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence blanche	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence bleu - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence blanche		

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériaux dur noir	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons légères - Menuiserie intérieure		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Matériaux dur noir		

PRELEVEMENT : P035

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage + Colle	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Carrelage gris - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Carrelage + Colle		

PRELEVEMENT : P036

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes grise	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Plinthes grise - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de plinthes grise		

PRELEVEMENT : P037


Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 110
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande/calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons /doublage - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande/calicot		

PRELEVEMENT : P038


Emplacement

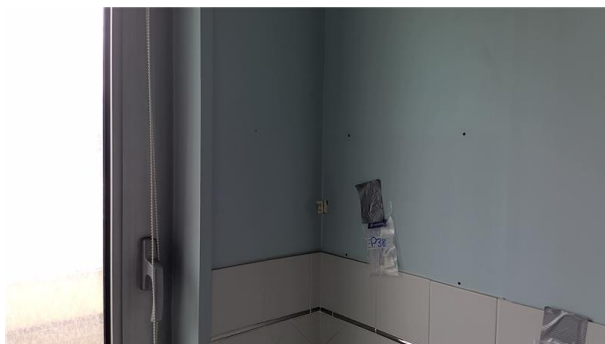

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P039


Emplacement

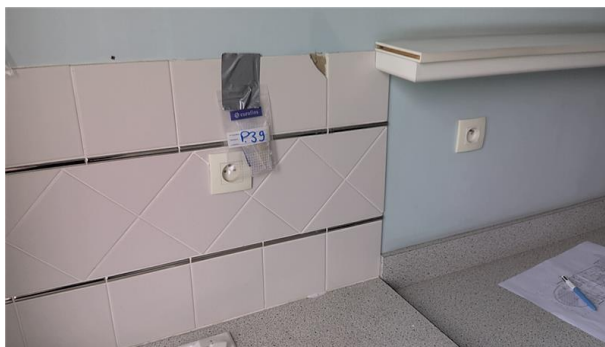


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Faïence blanche - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Colle de faïence		

PRELEVEMENT : P040
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 109
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

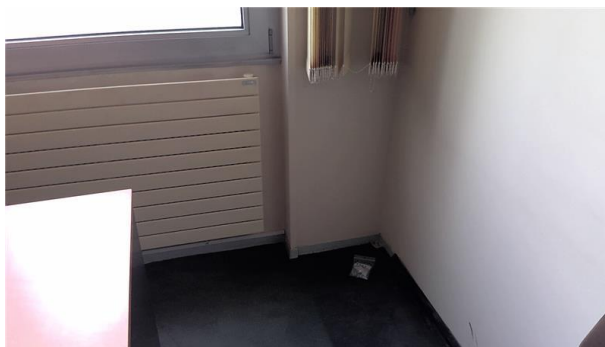PRELEVEMENT : P041
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette +colle jaune	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Moquette grise - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette +colle jaune		

PRELEVEMENT : P042
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 107
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Poteau - Poteau		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
enduit ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P043
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 108
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette +colle jaune	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Moquette grise - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Moquette +colle jaune		

PRELEVEMENT : P044
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P045
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 106
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol, colle et ragréage	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Dalle grise 60/60 - Sol		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Dalle de sol, colle et ragréage		

PRELEVEMENT : P046


Emplacement

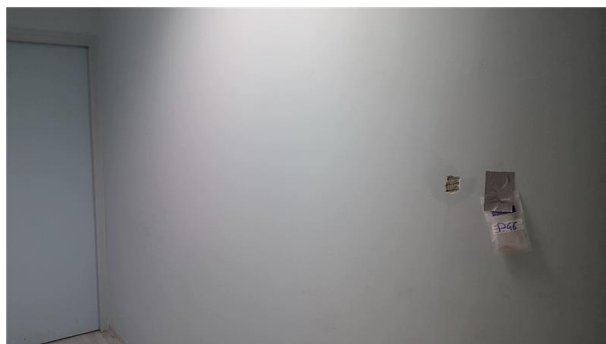

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 105
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduits ciment/voile blanc/peinture	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Murs béton - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduits ciment/voile blanc/peinture		

PRELEVEMENT : P047

Emplacement

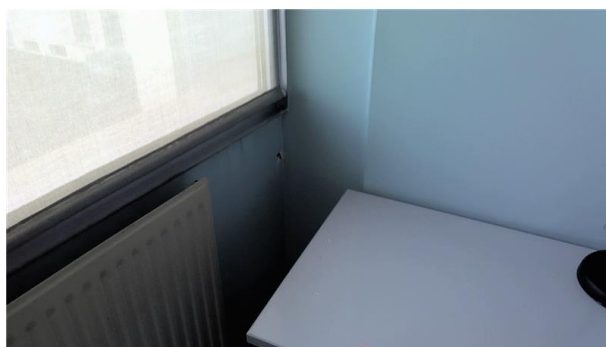

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE	T251933029	R+1 - SE 103
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande /calicot	21/10/2025	ORFEUIL Gaylor
Localisation		
Cloisons - Murs		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit bande /calicot		

PRELEVEMENT : P048

Emplacement



Nom du client

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

Numéro de dossier

T251933029

Partie d'ouvrage

R+1 - SE 103

Matériau

Colle jaune

Date de prélèvement

21/10/2025

Nom de l'opérateur

ORFEUIL Gaylor

Localisation

Plinthes plastique - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Colle jaune

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Document 1



1/8



RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025

Analyse Amiante dans les Matériaux

Selon la version en vigueur de l'Arrêté du 01/10/2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Client : APAVE APAVE Infrastructures et Construction France Le Citis 5 rue d'Atalante CS 90200 14205 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX	Chantier : Adresse : UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE batiment L/sciences E du Campus 1 Esplanade de la Paix 14000 CAEN	Ref. Affaire 23-1097-1257
Interlocuteur : ORFEUIL G.	Dossier : C25259473 A	

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole "♦" sont couverts par l'accréditation - Les essais identifiés par le symbole "○" ont été réalisés par un laboratoire externe
Les informations du client identifiées par le symbole "☒" ne sont pas couvertes par l'accréditation

ANALYSE			Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025						
N° Echantillon	■ Informations client			Echantillon apte à prépa- ration	Préparation		Analyse Nb de grilles ou lames		Analyste	Résultat	
	Référence	Localisation	Description		Description Laboratoire	Nb	Type	Méthode			
♦ 25-M-76-667	P001	(R+1) SE 124 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	2	Méthode Interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
♦ 25-M-76-668	P002	(R+1) SE 124 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	4	Méthode Interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
♦ 25-M-76-669	P003	(R+1) SE 124 - Dalle grise 60/60 - Sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple bleu non fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				Matériau semi-dur rose non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	fibres d'amiant non détectées

Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai.

La préparation est réalisée par broyage manuel, attaque chimique (Acide et/ou solvant), passage en cuve US selon Méthodes Internes MO 16-009/MO 20-037 reprenant les parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1.

La méthode d'analyse employée META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique) est réalisée selon la norme NF X 43-050 (Juillet 2021).

La méthode d'analyse employée MOLP (Microscopie Optique à Lumière Polarisée) est réalisée selon le guide HSG 248 Annexe 2 et les parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1.

La limite de détection garantie de l'amiante est < 0,1% en masse pour des échantillons composés de moins de 3 couches indissociables.

Sont prises en compte toutes les fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 0,5 micromètre et dont le rapport longueur sur largeur est supérieure à 3.

Fibres d'amiante non détectées :

- Analyse par META : l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

- Analyse par MOLP : l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection ; pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 µm.

OBSERVATIONS (Avis, Interprétations, Réserves...)

Couches indissociables du support : Ech. 25-M-76-667 à 76-668 / 76-670 / 76-672 / 76-674 à 76-676 / 76-680 à 76-681 / 76-683 / 76-685 à 76-686 / 76-688 / 76-690 à 76-691 / 76-693 à 76-694 / 76-703 à 76-704 / 76-706 / 76-708 / 76-710 / 76-712 à 76-713 (Mélange de divers matériaux + Ecailles indissociables du support) - Ech. 25-M-76-669 couches 1 & 2 / 76-671 / 76-673 / 76-678 à 76-679 / 76-682 couches 1 & 2 / 76-687 couches 1 & 2 et 3 & 4 / 76-695 à 76-696 / 76-699 / 76-701 à 76-702 / 76-705 / 76-707 / 76-709 / 76-711 couches 2 & 3 / 76-714 (Mélange de divers matériaux) - Ech. 25-M-76-677 / 76-689 / 76-692 / 76-698 (Ecailles indissociables du support)

NOM - FONCTION	DATE	VISA
A. JESTIN Responsable Technique Analyse	30/10/2025	

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE		Date de réception : 24/10/2025				Date d'analyse : 29/10/2025				
N° Echantillon	Référence	Informations client	Description	Description Laboratoire	apte à préparation	Nb	Préparation	Méthode	Analyse	Résultat
25-M-76-670	P004	(R+1) SE 124 - Faïence bleu - Murs	Colle de faïence blanche	Matériau dur bleu-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
				Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau souple jaune fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-671	P005	(R+1) SE 124 - Faïence rectangulaire bleu - Poteaux	Colle de faïence grise	Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau semi-dur gris-beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-672	P006	(R+1) SE 124 - Cloisons - Murs	Enduit bande /calicot	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-673	P007	(R+1) SE 124 - Faïence rectangulaire bleu - Poteaux	Colle de faïence grise	Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau semi-dur gris-beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-674	P008	(R+1) SE 124 - Poteau - Poteau	Toile de verre tissée/enduit ciment	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau souple blanc fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-675	P009	(R+1) SE 124 - Faïence bleu - Murs	Colle de faïence blanche	Matériau dur bleu-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau souple beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM REM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOULAVILLE Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.08

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025					
N° Echantillon	■ Informations client			Echantillon		Préparation		Analyse		Résultat	
	Référence	Localisation	Description	Description Laboratoire	apte à préparation	Nb	Type	Méthode	Nb de grilles ou lames		Analyste
◆ 25-M-76-676	P010	(R+1) SE 124 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-677	P011	(R+1) SE 124 - Faux-plafond - Plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi-dur beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-678	P012	(R+1) SE 117 - Colle de faïence blanche - Poteau	Colle de faïence blanche	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-679	P013	(R+1) SE 117 - Faïence rectangulaire bleu - Poteaux	Colle de faïence grise	Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau semi-dur gris-beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-680	P014	(R+1) SE 117 - Cloisons - Murs	Enduit bande /calicot	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-681	P015	(R+1) SE 117 - Poteau - Poteau	Toile de verre tissée/enduit ciment	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau souple blanc fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM RIM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURNAI Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.08

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025				
N° Echantillon	Informations client			Echantillon		Préparation		Analyse		Résultat
	Référence	Localisation	Description	Description Laboratoire	apte à préparation	Nb	Type	Méthode	Nb de grilles ou lames	
25-M-76-682	P016	(R+1) SE 117 - Dalle grise 60/60 - Sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple bleu non fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	fibres d'amiante non détectées
				Matériau semi-dur rose non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	fibres d'amiante non détectées
25-M-76-683	P017	(R+1) SE 117 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-684	P018	(R+1) SE 117 - Plinthes plastique - Murs	Colle jaune	Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	fibres d'amiante non détectées
25-M-76-685	P019	(R+1) SE 117 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-686	P020	(R+1) SE 117 - Cloisons - Murs	Enduit bande /calicot	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	fibres d'amiante non détectées
					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	
25-M-76-687	P021	(R+1) SE 116 - Dalle grise 60/60 - Sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple bleu non fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	fibres d'amiante non détectées
				Matériau semi-dur rose non fibreux / Matériau semi-dur gris clair non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	fibres d'amiante non détectées

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM REM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURNAI Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.06

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025					
N° Echantillon	■ Informations client			Echantillon		Préparation		Analyse			Résultat
	Référence	Localisation	Description	Description Laboratoire	apte à préparation	Nb	Type	Méthode	Nb de grilles ou lames	Analyste	
♦ 25-M-76-688	P022	(R+1) SE 116 - Cloisons - Murs	Enduit bande /calicot	Matériau semi-dur rose non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE		
♦ 25-M-76-689	P023	(R+1) SE 116 - Faux-plafond - Plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi dur beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE		
♦ 25-M-76-690	P024	(R+1) SE 116a - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur rose non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE		
♦ 25-M-76-691	P025	(R+1) SE 116a - Plinthes plastique - Murs	Colle jaune	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau souple jaune non fibreux / Matériau souple marron fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ALE		
♦ 25-M-76-692	P026	(R+1) SE 111 - Faux-plafond - Plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi dur beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE		
♦ 25-M-76-693	P027	(R+1) SE 111 - Cloisons /doublage - Murs	Enduit bande/calicot	Matériau semi-dur jaune-beige non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
♦				oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE		

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM REM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURNAI TELL : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.08

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025					
N° Echantillon	✱ Informations client			Echantillon Description Laboratoire	apte à prépa- ration	Préparation		Analyse Nb de grilles ou lames		Analyste	Résultat
	Référence	Localisation	Description			Nb	Type	Méthode			
◆ 25-M-76-694	P028	(R+1) SE 111 - Faïence bleu - Murs	Colle de faïence blanche	Matériau dur bleu-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau semi-dur jaune non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau souple beige fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-695	P029	(R+1) SE 111 - Carrelage gris - Sol	Carrelage + Colle	Matériau dur gris-beige non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-696	P030	(R+1) SE 111 - Plinthe grise - Murs	Colle de plinthes blanche	Matériau dur gris-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-697	P031	(R+1) SE 111 - Cloisons légères - Menuiserie intérieure	Matériaux dur noir	Matériau dur bleu-noir fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-698	P032	(R+1) SE 110 - Faux-plafond - Plafond	Plaque de faux-plafond	Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau semi-dur beige fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ALE	
◆ 25-M-76-699	P033	(R+1) SE 110 - Faïence bleu - Murs	Colle de faïence blanche	Matériau dur bleu-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux / Matériau souple marron fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-700	P034	(R+1) SE 110 - Cloisons légères - Menuiserie intérieure	Matériaux dur noir	Matériau dur bleu-noir fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM RIM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURNAI Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.08

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025						
N° Echantillon	Informations client			Echantillon Description Laboratoire	apte à préparation	Préparation		Analyse Nb de grilles ou lames		Analyste	Résultat	
	Référence	Localisation	Description			Nb	Type	Méthode				
◆ 25-M-76-701	P035	(R+1) SE 110 - Carrelage gris - Sol	Carrelage + Colle	Matériau dur gris-beige non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	fibres d'amiante non détectées	
◆	25-M-76-702	P036	(R+1) SE 110 - Plinthes grise - Murs	Colle de plinthes grise	Matériau semi-dur gris clair non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux / Matériau souple marron-jaune fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiante non détectées
◆						oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	
◆	25-M-76-703	P037	(R+1) SE 110 - Cloisons /doublage - Murs	Enduit bande/calicot	Matériau semi-dur jaune-beige non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiante non détectées
◆						oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	
◆	25-M-76-704	P038	(R+1) SE 109 - Cloisons - Murs	Enduit bande/calicot	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple marron fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiante non détectées
◆						oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	
◆	25-M-76-705	P039	(R+1) SE 109 - Faïence blanche - Murs	Colle de faïence	Matériau dur beige-marron non fibreux / Matériau semi-dur gris clair non fibreux / Matériau semi-dur vert non fibreux / Matériau souple jaune-marron fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiante non détectées
◆						oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	
◆ 25-M-76-706	P040	(R+1) SE 109 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	fibres d'amiante non détectées	
◆	25-M-76-707	P041	(R+1) SE 107 - Moquette grise - Sol	Moquette +colle jaune	Matériau souple gris-beige fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiante non détectées
◆						oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ADU	

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM REM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURLAVALLE Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.06

RAPPORT D'ESSAI n° 25-RE-M12100 rév. A du 30/10/2025
Analyse Amiante dans les Matériaux

ANALYSE				Date de réception : 24/10/2025		Date d'analyse : 29/10/2025					
N° Echantillon	■ Informations client			Echantillon Description Laboratoire	apte à prépa- ration	Préparation		Analyse Nb de grilles ou lames		Analyste	Résultat
	Référence	Localisation	Description			Nb	Type	Méthode			
◆ 25-M-76-708	P042	(R+1) SE 107 - Poteau - Poteau	enduit ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur rose non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau semi-dur gris fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	
◆ 25-M-76-709	P043	(R+1) SE 108 - Moquette grise - Sol	Moquette +colle jaune	Matériau souple gris-beige fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Méthode interne MO 20-037	MOLP	2	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆					oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ADU	
◆ 25-M-76-710	P044	(R+1) SE 106 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-711	P045	(R+1) SE 106 - Dalle grise 60/60- Sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple bleu non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ADU	fibres d'amiant non détectées
◆						Matériau souple jaune non fibreux / Matériau semi-dur rose non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4
◆ 25-M-76-712	P046	(R+1) SE 105 - Murs béton - Murs	Enduits ciment/voile blanc/peinture	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau semi-dur gris non fibreux	oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	2	ADU	fibres d'amiant non détectées
◆ 25-M-76-713	P047	(R+1) SE 103 - Cloisons - Murs	Enduit bande /calicot	Matériau semi-dur bleu non fibreux / Matériau semi-dur beige non fibreux / Matériau souple beige fibreux / Matériau semi-dur blanc-beige non fibreux / Matériau souple marron- jaune fibreux / Matériau semi-dur blanc non fibreux	oui	4	Méthode interne MO 20-037	MOLP	4	ALE	fibres d'amiant non détectées
◆							oui	1	Traitement acide (méthode interne MO 16-009)	META	
◆ 25-M-76-714	P048	(R+1) SE 103 - Plinthes plastique - Murs	Colle jaune	Matériau dur bleu non fibreux / Matériau souple jaune non fibreux	oui	2	Traitement acide + Traitement acétone (méthode interne MO 16-009)	META	4	ADU	fibres d'amiant non détectées

Ce rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans sa version intégrale, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

Ce rapport comporte 8 page(s) et 0 annexe(s)

FORM REM Rév. K - doc source PRD 15-016 Rapport d'Essai
SAS au capital de 50 000 € - SIRET 811 373 943 00018
209 Rue Jean Moulin 50 110 TOURNAI Tél. : +33.2.33.88.56.70 Fax : +33.2.33.71.10.06

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

SANS OBJET

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Murs béton Enduits ciment/voile blanc/peinture						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélève	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Murs béton	X	Enduits ciment/voile blanc/peinture	S001	P001	Non
		Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S002	P002	Non
		Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S010	P010	Non
R+1	SE 117	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S014	P017	Non
		Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S019	P019	Non
R+1	SE 116a	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S027	P024	Non
R+1	SE 109	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S054	P040	Non
R+1	SE 107	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S056	P001 - idem	Non
R+1	SE 106	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S067	P044	Non
R+1	SE 105	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S071	P046	Non
R+1	SE 122	Murs béton		Enduits ciment/voile blanc/peinture	S086	P001 - idem	Non

Z002 - Dalle grise 60/60 Dalle de sol, colle et ragréage							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Dalle grise 60/60	X	Dalle de sol, colle et ragréage	S003	P003	Non
R+1	SE 117	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S018	P016	Non
R+1	SE 116a	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S026	P003 - idem	Non
R+1	SE 116	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S023	P021	Non
R+1	SE 119	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S031	P003 - idem	Non
R+1	SE 118	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S034	P003 - idem	Non
R+1	SE 120	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S037	P003 - idem	Non
R+1	SE 109	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S052	P003 - idem	Non
R+1	SE 107	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S059	P003 - idem	Non
R+1	SE 108	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S066	P003 - idem	Non
R+1	SE 106	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S068	P045	Non
R+1	SE 105	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S074	P003 - idem	Non
R+1	SE 104	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S077	P003 - idem	Non
R+1	SE 103	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S082	P003 - idem	Non
R+1	SE 121	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S085	P003 - idem	Non
R+1	SE 122	Dalle grise 60/60		Dalle de sol, colle et ragréage	S089	P003 - idem	Non

Z003 - Faïence bleu Colle de faïence blanche							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoïn	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Faïence bleu	X	Colle de faïence blanche	S004	P004	Non
		Faïence bleu		Colle de faïence blanche	S008	P009	Non
R+1	SE 117	Faïence bleu		Colle de faïence blanche	S013	P004 - idem	Non
R+1	SE 111	Faïence bleu		Colle de faïence blanche	S038	P028	Non
R+1	SE 110	Faïence bleu		Colle de faïence blanche	S046	P033	Non

Z004 - Faïence rectangulaire bleu Colle de faïence grise							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Faïence rectangulaire bleu	X	Colle de faïence grise	S005	P005	Non
		Faïence rectangulaire bleu		Colle de faïence grise	S007	P007	Non
R+1	SE 117	Faïence rectangulaire bleu		Colle de faïence grise	S017	P013	Non

Z005 - Cloisons Enduit bande /calicot							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Cloisons	X	Enduit bande /calicot	S006	P006	Non
R+1	SE 117	Cloisons		Enduit bande /calicot	S012	P014	Non
		Cloisons		Enduit bande /calicot	S020	P020	Non
R+1	SE 116a	Cloisons		Enduit bande /calicot	S024	P006 - idem	Non
R+1	SE 116	Cloisons		Enduit bande /calicot	S021	P022	Non
R+1	SE 119	Cloisons		Enduit bande /calicot	S029	P006 - idem	Non
R+1	SE 118	Cloisons		Enduit bande /calicot	S032	P006 - idem	Non
R+1	SE 120	Cloisons		Enduit bande /calicot	S035	P006 - idem	Non
R+1	SE 109	Cloisons		Enduit bande /calicot	S050	P038	Non
R+1	SE 107	Cloisons		Enduit bande /calicot	S055	P006 - idem	Non
R+1	SE 108	Cloisons		Enduit bande /calicot	S062	P006 - idem	Non
R+1	SE 105	Cloisons		Enduit bande /calicot	S090	P006 - idem	Non
R+1	SE 104	Cloisons		Enduit bande /calicot	S078	P006 - idem	Non
R+1	SE 103	Cloisons		Enduit bande /calicot	S079	P047	Non
R+1	SE 121	Cloisons		Enduit bande /calicot	S083	P006 - idem	Non
R+1	SE 122	Cloisons		Enduit bande /calicot	S091	P006 - idem	Non

Z006 - Poteau Toile de verre tissée/enduit ciment							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Poteau	X	Toile de verre tissée/enduit ciment	S009	P008	Non
R+1	SE 117	Poteau		Toile de verre tissée/enduit ciment	S016	P015	Non

Z007 - Faux-plafond Plaque de faux-plafond							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 124	Faux-plafond	X	Plaque de faux-plafond	S011	P011	Non
R+1	SE 117	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S015	P011 - idem	Non
R+1	SE 116a	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S025	P011 - idem	Non
R+1	SE 116	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S022	P023	Non
R+1	SE 119	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S030	P011 - idem	Non
R+1	SE 118	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S033	P011 - idem	Non
R+1	SE 120	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S036	P011 - idem	Non
R+1	SE 109	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S051	P011 - idem	Non
R+1	SE 107	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S058	P011 - idem	Non
R+1	SE 108	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S064	P011 - idem	Non
R+1	SE 106	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S070	P011 - idem	Non
R+1	SE 105	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S073	P011 - idem	Non
R+1	SE 104	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S076	P011 - idem	Non
R+1	SE 103	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S081	P011 - idem	Non
R+1	SE 121	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S084	P011 - idem	Non
R+1	SE 122	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S088	P011 - idem	Non

2008 - Plinthes plastique Colle jaune						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 117	Plinthes plastique	X	Colle jaune		P018	Non
R+1	SE 116a	Plinthes plastique		Colle jaune	S028	P025	Non
R+1	SE 116	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 119	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 118	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 120	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 109	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 107	Plinthes plastique		Colle jaune	S057	P018 - idem	Non
R+1	SE 108	Plinthes plastique		Colle jaune	S063	P018 - idem	Non
R+1	SE 106	Plinthes plastique		Colle jaune	S069	P018 - idem	Non
R+1	SE 105	Plinthes plastique		Colle jaune	S072	P018 - idem	Non
R+1	SE 104	Plinthes plastique		Colle jaune	S075	P018 - idem	Non
R+1	SE 103	Plinthes plastique		Colle jaune	S080	P048	Non
R+1	SE 121	Plinthes plastique		Colle jaune		P018 - idem	Non
R+1	SE 122	Plinthes plastique		Colle jaune	S087	P018 - idem	Non

2009 - Faux-plafond Plaque de faux-plafond						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 111	Faux-plafond	X	Plaque de faux-plafond	S039	P026	Non
R+1	SE 110	Faux-plafond		Plaque de faux-plafond	S047	P032	Non

2010 - Cloisons /doublage Enduit bande/calicot						Continue : NON	
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 111	Cloisons /doublage	X	Enduit bande/calicot	S040	P027	Non
R+1	SE 110	Cloisons /doublage		Enduit bande/calicot	S045	P037	Non

Z011 - Carrelage gris Carrelage + Colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 111	Carrelage gris	X	Carrelage + Colle	S041	P029	Non
R+1	SE 110	Carrelage gris		Carrelage + Colle	S048	P035	Non

Z012 - Plinthe grise Colle de plinthes blanche							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 111	Plinthe grise	X	Colle de plinthes blanche	S042	P030	Non

Z013 - Cloisons légères Matériaux dur noir							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 111	Cloisons légères	X	Matériaux dur noir	S043	P031	Non
R+1	SE 110	Cloisons légères		Matériaux dur noir	S044	P034	Non

Z014 - Moquette grise Moquette +colle jaune							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	SE 107	Moquette grise	X	Moquette +colle jaune	S060	P041	Non
R+1	SE 108	Moquette grise		Moquette +colle jaune	S065	P043	Non

ANNEXE AUTRES DOCUMENTS

Document :

Document 1

26/09/2025 09:37

Messagerie APAVE - Fwd: DAT campus 1 SE



Marc DUFRESNE <marc.dufresne@apave.com>

Fwd: DAT campus 1 SE

1 message

Manuel SANTOS DO MOINHO <manuel.santosdomoinho@apave.com>

23 septembre 2025 à 16:12

À : Marc DUFRESNE <marc.dufresne@apave.com>

Cc : Caroline KARAGULIAN <caroline.karagulian@apave.com>, Philippe PLOUVIEZ <philippe.plouviez@apave.com>, Gaylor ORFEUIL <gaylor.orfeuil@apave.com>

Bonjour,
c'est Marc qui va s'en occuper, on vu ensemble à l'instant
Merci

----- Forwarded message -----

De : Cellule AO DIAGIMMO <cellule-ao.diagimmo@apave.com>

Date: lun. 22 sept. 2025 à 12:21

Subject: Fwd: DAT campus 1 SE

To: Philippe PLOUVIEZ <philippe.plouviez@apave.com>, Manuel SANTOS DO MOINHO <manuel.santosdomoinho@apave.com>

Bonjour,

Bonne réception,

Caroline

----- Forwarded message -----

De : Juliette Sablerie <juliette.sablerie@unicaen.fr>

Date: lun. 22 sept. 2025 à 11:55

Subject: DAT campus 1 SE

To: <cellule-ao.diagimmo@apave.com>

Bonjour,

Dans le cadre de l'accord cadre qui nous lie, et sur le projet "Centre Léa Vion " qui concerne la réhabilitation du premier étage du bâtiment L/sciences E du Campus 1, Veuillez trouver ci-joint les éléments pour un DAT.

Nous avons besoins d'un DAT pour toutes les pièces du plan joint à l'exception de l'amphi SE 113 et escaliers Se 112 et SE 115.

Le projet consiste à la suppression de la cloison entre SE 119 et SE 117, au changement de disposition des sanitaires et à la remise en état globale des locaux (sols et murs).

Je suis à votre disposition pour échanger sur cette commande avant l'édition de votre devis.

Cordialement,

Juliette SABLERIE

Chargée d'opérations immobilières

02 31 56 53 86

06 07 69 61 26

Direction du patrimoine et de la logistique

UNICAEN | université de Caen Normandie

Esplanade de la Paix · Bâtiment K

CS 14032 · 14032 Caen cedex 05

--

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b7b9b5e390&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1844058249561993671%7Cmsg-f:1844064306104564...> 1/2

26/09/2025 09:37

Messagerie APAVE - Fwd: DAT campus 1 SE



Manuel SANTOS DO MOINHO

Apave Infrastructures et Construction France

Responsable de groupe Diagnostics Immobiliers

Région Normandie

Portable : 06 35 58 12 03

Accueil Agence Bâtiment Haute Normandie : 02 35 52 60 10

mail : manuel.santosdomoinho@apave.com

<https://www.apave.com>

 **XREF_1SE_PLA_R+1_A.pdf**
167K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b7b9b5e390&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1844058249561993671%7Cmsg-f:1844064306104564...> 2/2

Commentaire :

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI6430 Version 008

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur ORFEUIL Gaylor

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 29/11/2022 - Date d'expiration : 28/11/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 29/11/2022 - Date d'expiration : 28/11/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 30/11/2022 - Date d'expiration : 29/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2022 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4 0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DISPONIBLE SUR
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DIFR 11 rev19

ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulées autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	2 500 000 € par année d'assurance *
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

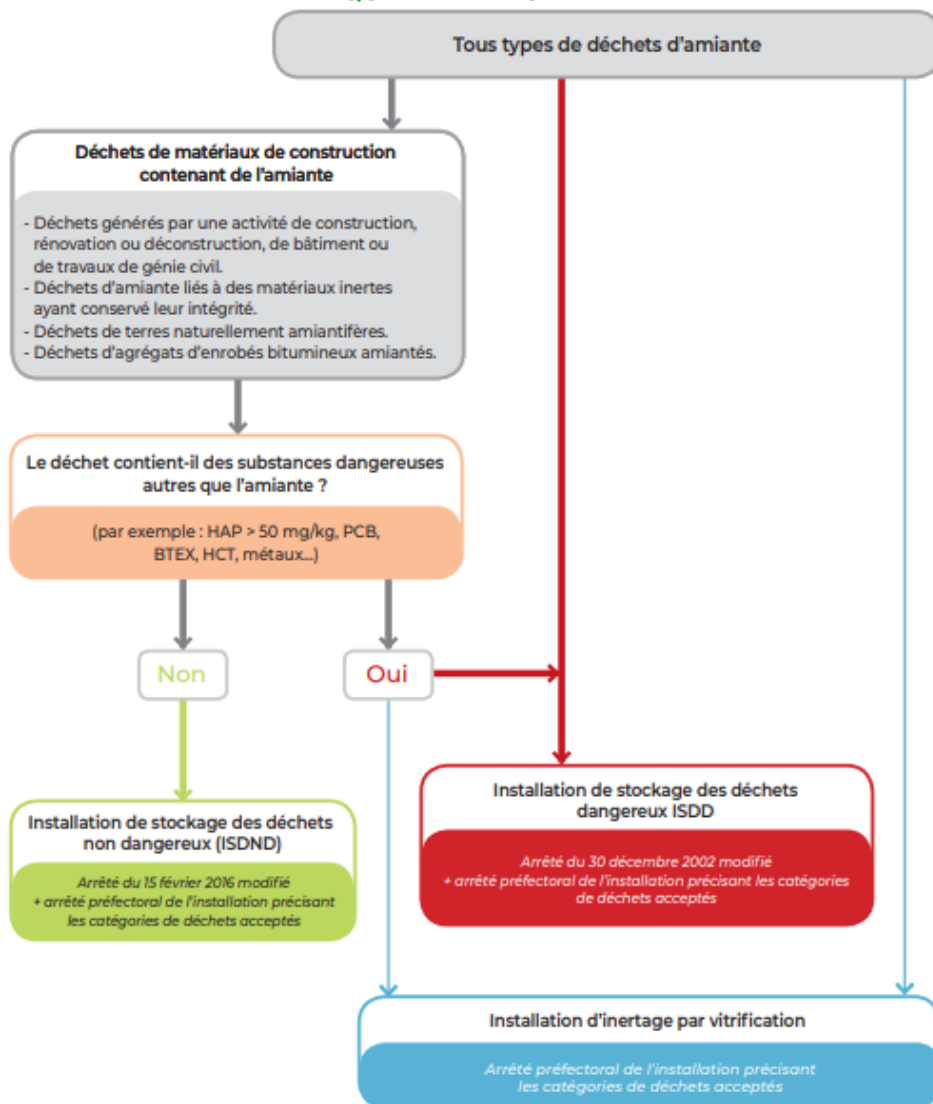

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>
