

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



Bien concerné

CPAM DU LOIRET
9 PL DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

Propriétaire

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET
9 PL DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

Donneur d'ordre

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET
9 PL DU GENERAL DE GAULLE
45000 ORLEANS

CONCLUSION DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Date du rapport : 20/06/2023

Date de visite : 07/06/2023

Fait à : SAINT AVERTIN

Référence du dossier : CPAM

Référence du rapport :

AT_CPAM_ORLEANS 20/06/2023 -
19:20

Nombre de prélèvements : 86

Auteur du rapport : Guillaume ROGEZ

Fonction : Opérateur de repérage

Certificat de compétence : n° DTI/2004-009

Le présent rapport est établi par une personne
dont les compétences sont certifiées par :

SOCOTEC Certification France
Tour Pacific - 13 cours Valmy
92977 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

Contrat d'assurance :

AXA France
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso. Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

SOMMAIRE

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE.....	3
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PERIMETRE DU REPERAGE	3
II. CONCLUSIONS.....	3
III. OBJET DE LA MISSION	3
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE	4
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES	4
IV. DEROULEMENT DE LA MISSION	6
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE.....	7
4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE.....	7
V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	8
1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	8
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	8
VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE	26
1. Conservation et transmission de ce rapport	26
2. Obligations consecutives aux travaux de retrait ou de confinement	26
ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....	27
ANNEXE 2 - PV ANALYSES.....	52
ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS.....	71
ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES.....	72
ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE	73
ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS.....	74

I. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Repérage amiante avant travaux sur les blocs sanitaires non rénovés

2. PERIMETRE DU REPERAGE

Pièces concernées	Travaux	Ouvrages ou composants de la construction	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Remarques particulières
Tous les blocs sanitaires non rénovés	Rénovation	Sols, Murs et Plafonds	Colles, Enduits, Bandes calicots...	

II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. L'identification de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Rappel réglementaire :

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Il est de la responsabilité du donneur d'ordre ou de tout utilisateur du présent rapport de vérifier la cohérence du périmètre de repérage et du programme de travaux avec d'une part l'état du bâtiment et d'autre part le contenu et l'étendu des travaux prévus.

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive)

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utilisés, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : ERP, Bureaux

Date de construction / PC : Date du permis de construire non connue

Réf. Cadastre : NC

2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveau	Local	Concernée
R+5 - ZONE 1	WC 1	Concerné
R+5 - ZONE 1	WC 2	Concerné
R+5 - ZONE 1	Sanitaires 1	Concerné
R+5 - ZONE 1	Local ménage	Concerné
R+4 - ZONE 1	Sanitaires 1	Concerné
R+4 - ZONE 1	Local 1	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 1	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 2	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 4	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 3	Concerné
R+4 - ZONE 1	Sanitaires 2	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 6	Concerné
R+4 - ZONE 1	WC 5	Concerné
R+4 - ZONE 2	Sanitaire 3	Concerné
R+4 - ZONE 2	WC 7	Concerné
R+4 - ZONE 3	Sanitaire 4	Concerné
R+4 - ZONE 3	WC 10	Concerné
R+4 - ZONE 3	WC 9	Concerné
R+4 - ZONE 3	WC 8	Concerné
R+4 - ZONE 3	Sanitaire 5	Concerné

Niveau	Local	Concernée
R+4 - ZONE 3	WC 13	Concerné
R+4 - ZONE 3	WC 12	Concerné
R+4 - ZONE 3	WC 11	Concerné
R+3 - ZONE 1	WC 4	Concerné
R+3 - ZONE 1	WC 3	Concerné
R+3 - ZONE 1	Sanitaires 1	Concerné
R+3 - ZONE 1	Sanitaires 2	Concerné
R+3 - ZONE 1	Local ménage	Concerné
R+3 - ZONE 1	WC 2	Concerné
R+3 - ZONE 1	Rgt 1	Concerné
R+3 - ZONE 1	WC 1	Concerné
R+3 - ZONE 2	Sanitaire 3	Concerné
R+3 - ZONE 2	WC 5	Concerné
R+3 - ZONE 3	Sanitaire 5	Concerné
R+3 - ZONE 3	Sanitaire 4	Concerné
R+3 - ZONE 3	WC 8	Concerné
R+3 - ZONE 3	WC 6	Concerné
R+3 - ZONE 3	WC 7	Concerné
R+3 - ZONE 3	WC 9	Concerné
R+3 - ZONE 3	WC 10	Concerné
R+2- ZONE 1	WC 4	Concerné
R+2- ZONE 1	Sanitaires 2	Concerné
R+2- ZONE 1	WC PMR	Concerné
R+2- ZONE 1	Local ménage	Concerné
R+2- ZONE 1	Sanitaires 1	Concerné
R+2- ZONE 1	WC 3	Concerné
R+2- ZONE 1	WC 1	Concerné
R+2- ZONE 1	WC 2	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 5	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 6	Concerné
R+2- ZONE 3	Sanitaires 1	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 8	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 7	Concerné
R+2- ZONE 3	Sanitaires 2	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 10	Concerné
R+2- ZONE 3	WC 9	Concerné
R+1 - ZONE 1	Sanitaires 1	Concerné
R+1 - ZONE 1	WC 1	Concerné
R+1 - ZONE 1	WC 2	Concerné
R+1 - ZONE 2	WC 5	Concerné
R+1 - ZONE 2	WC 4	Concerné
R+1 - ZONE 2	Sas	Concerné
R+1 - ZONE 2	Sanitaires 2	Concerné
R+1 - ZONE 2	WC 3	Concerné
R+1 - ZONE 2	Sanitaire 3	Concerné

IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : ITGA 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre I. 2.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de l'absence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.


L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.


La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulière et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Sens du repérage pour évaluer un local :

Pour les croquis réalisés après le 15/02/2020



Pour les croquis réalisés avant le 15/02/2020



3. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) : NEANT

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Parties non visitées

Pièce et étage	Justification
NEANT	

Eléments non inspectés et justification

PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT			

Eléments à sonder ou à analyser non présents :

NEANT

Autres informations sur le déroulement de la mission

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Commentaire :

Occupation des locaux :

RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	NEANT
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	NEANT
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	NEANT

V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de l'amiante (§ 5.1),

> Les composants repérés sans amiante (§5.2)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonne « Identification », figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
NEANT						

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

Identification	Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants	Quantité
NEANT			

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P001 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P001 (Fr2)	ZPSO	
WC 2 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P001 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colle plinthe	P002 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P002 (Fr2)	ZPSO	
Local ménage - R+5 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P003 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colle plinthe	P004 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colle plinthe	P004 (Fr2)	ZPSO	
WC 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P005 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+5 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P005 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P006	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+5 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
WC 1 - R+5 - ZONE 1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P006	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+5 - ZONE 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Peinture	P007	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P008 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colle plinthe	P009 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C	Colle plinthe	P009 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Enduit / Peinture	P010	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture	P010	ZPSO	
Local 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P011 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P011 (Fr2)	ZPSO	
WC 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P011 (Fr2)	ZPSO	
WC 3 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P011 (Fr2)	ZPSO	
WC 4 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P011 (Fr2)	ZPSO	
Local 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P012 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local 1 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P012 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P013 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P013 (Fr2)	ZPSO	
WC 6 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P013 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colle plinthe	P014 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Colle plinthe	P014 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Enduit / Peinture	P015	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture	P015	ZPSO	
WC 6 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P016 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 6 - R+4 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P016 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 3 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P017 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 7 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P017 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 3 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colle plinthe	P018 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colle plinthe	P018 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaire 3 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Enduit / Peinture	P019	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur H	Enduit / Peinture	P019	ZPSO	
WC 7 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P020 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 7 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P020 (Fr2)	ZPSO	
WC 7 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P021	RESULTAT ANALYSE	Faïence blanche
WC 7 - R+4 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P021	ZPSO	Faïence blanche
Sanitaire 4 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P022 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 4 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A	Colle plinthe	P023 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 4 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P023 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 4 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Enduit / Peinture	P024	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaire 4 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture	P024	ZPSO	
WC 9 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Enduit / Peinture	P024	ZPSO	
WC 9 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P025 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 9 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P025 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P026 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 11 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P026 (Fr2)	ZPSO	
WC 12 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P026 (Fr2)	ZPSO	
WC 13 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P026 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur G	Colle plinthe	P027 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 5 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Colle plinthe	P027 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Enduit / Peinture	P028	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 5 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture	P028	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 13 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P029 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 13 - R+4 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P029 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P030 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P030 (Fr2)	ZPSO	
WC 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P030 (Fr2)	ZPSO	
WC 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P030 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colle plinthe	P031 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C	Colle plinthe	P031 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Enduit / Peinture	P032	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture	P032	ZPSO	
Local ménage - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P033 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P033 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P034 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 4 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P034 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Colle plinthe	P035 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Colle plinthe	P035 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A	Enduit / Peinture	P036	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture	P036	ZPSO	
WC 3 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P037 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 3 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P038 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 3 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P038 (Fr2)	ZPSO	
WC 3 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P039 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 3 - R+3 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P039 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 3 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P040 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 5 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P040 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 3 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Colle plinthe	P041 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B	Colle plinthe	P041 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 3 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Enduit / Peinture	P042	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur H	Enduit / Peinture	P042	ZPSO	
WC 5 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P043 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P043 (Fr2)	ZPSO	
WC 5 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P044	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+3 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P044	ZPSO	
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P045 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 7 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P045 (Fr2)	ZPSO	
WC 8 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P045 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P046 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	2 rangées de carrelage blanc brillant à l'entrée
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colle plinthe	P047 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P047 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur E	Enduit / Peinture	P048	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 4 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture	P048	ZPSO	
WC 6 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P049 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 6 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P050 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 6 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P050 (Fr2)	ZPSO	
WC 6 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P051	RESULTAT ANALYSE	
WC 6 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P051	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P052 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 10 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P052 (Fr2)	ZPSO	
WC 9 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P052 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur F	Colle plinthe	P053 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur H	Colle plinthe	P053 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Bandes calicot	P054	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Enduit / Peinture	P055	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 5 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture	P055	ZPSO	
WC 9 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P056 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 9 - R+3 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P056 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P057 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 3 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P057 (Fr2)	ZPSO	
WC 4 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P057 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Colle plinthe	P058 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Colle plinthe	P058 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur E	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P059 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P059 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Enduit / Peinture	P060	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture	P060	ZPSO	
WC 4 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P061 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 4 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P061 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Bandes calicot	P062	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P063 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Local ménage - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P063 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
WC 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P063 (Fr2)	ZPSO	
WC 2 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P063 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colle plinthe	P064 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Colle plinthe	P064 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P065 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P065 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Enduit / Peinture	P066	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture	P066	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Bandes calicot	P067	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P068 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+2 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P068 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P069 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P069 (Fr1)	ZPSO	
WC 6 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P069 (Fr1)	ZPSO	
WC 7 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P069 (Fr1)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur G	Colle plinthe	P070 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur H	Colle plinthe	P070 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur E	Enduit / Peinture	P071	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur F, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture	P071	ZPSO	
WC 5 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P072 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P072 (Fr2)	ZPSO	
WC 5 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P073	RESULTAT ANALYSE	
WC 5 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P073	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P074 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A	Colle plinthe	P075 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H	Colle plinthe	P075 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur H	Enduit / Peinture	P076	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 2 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture	P076	ZPSO	
WC 8 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P077 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 8 - R+2 - ZONE 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P077 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P078 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P078 (Fr2)	ZPSO	
WC 2 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P078 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colle plinthe	P079 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I, Mur J	Colle plinthe	P079 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaires 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur J	Enduit / Peinture	P080	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaires 1 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G, Mur H, Mur I	Enduit / Peinture	P080	ZPSO	
WC 2 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P081 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
WC 2 - R+1 - ZONE 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P081 (Fr2)	ZPSO	
Sas - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	ZPSO	
WC 3 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	ZPSO	
WC 4 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	ZPSO	
WC 5 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de sols	Sol	Colles et joints de carrelage	P082 (Fr2)	ZPSO	
Sas - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A	Colle plinthe	P083 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P083 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Colle plinthe	P083 (Fr2)	ZPSO	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sas - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D	Colle plinthe	P083 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Enduit / Peinture	P084	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture	P084	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture	P084	ZPSO	
Sas - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture	P084	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Bandes calicot	P085	RESULTAT ANALYSE	
Sanitaire 3 - R+1 - ZONE 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Bandes calicot	P085	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Bandes calicot	P085	ZPSO	
Sas - R+1 - ZONE 2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Bandes calicot	P085	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P086 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	

Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
Sanitaire 3 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur B, Mur C, Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P086 (Fr2)	ZPSO	
Sanitaires 2 - R+1 - ZONE 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Mur C, Mur D	Colles et joints de carrelage ou de faïence	P086 (Fr2)	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. Conservation et transmission de ce rapport

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

2. Obligations consecutives aux travaux de retrait ou de confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :

- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.

ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

Identification : P001 (Fr1)

Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P001 (Fr2)

Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)

Descriptif Laboratoire : Colle beige + joint cassant gris non séparable

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P002 (Fr1)


Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P002 (Fr2)

Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1

Localisation : Mur F

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)

Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau noir

Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P003 (Fr1)


Pièce et étage : Local ménage R+5 - ZONE 1

Localisation : Sol

Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)

Descriptif Laboratoire : Carrelage

Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P003 (Fr2)


Pièce et étage : Local ménage R+5 - ZONE 1


Localisation : Sol


Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)


Descriptif Laboratoire : Colle grise


Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P004 (Fr1)
Pièce et étage : Local ménage R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P004 (Fr2)
Pièce et étage : Local ménage R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P005 (Fr1)
Pièce et étage : WC 1 R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P005 (Fr2)
Pièce et étage : WC 1 R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P006
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Murs et cloisons maçonnés (Enduit / Peinture béton)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit compact gris
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P007
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+5 - ZONE 1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P008 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P008 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P009 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P009 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P010
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P011 (Fr1)
Pièce et étage : Local 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P011 (Fr2)
Pièce et étage : Local 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P012 (Fr1)
Pièce et étage : Local 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P012 (Fr2)
Pièce et étage : Local 1 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P013 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P013 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+4 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche beige non séparable + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P014 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P014 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P015
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P016 (Fr1)
Pièce et étage : WC 6 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P016 (Fr2)
Pièce et étage : WC 6 R+4 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P017 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+4 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage beige + carrelage blanc
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P017 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+4 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + colle grise hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P018 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P018 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau compact beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P019
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P020 (Fr1)
Pièce et étage : WC 7 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P020 (Fr2)
Pièce et étage : WC 7 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P021
Pièce et étage : WC 7 R+4 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P022 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+4 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P022 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+4 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P023 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P023 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P024
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P025 (Fr1)
Pièce et étage : WC 9 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P025 (Fr2)
Pièce et étage : WC 9 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P026 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+4 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + carrelage blanc
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P026 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+4 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + colle beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P027 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur G
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P027 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur G
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P028
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P029 (Fr1)
Pièce et étage : WC 13 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P029 (Fr2)
Pièce et étage : WC 13 R+4 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P030 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P030 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + colle grise + joint cassant gris non séparable + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P031 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P031 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P032
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P033 (Fr1)
Pièce et étage : Local ménage R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P033 (Fr2)
Pièce et étage : Local ménage R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P034 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P034 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P035 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P035 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle beige
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P036
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P037 (Fr1)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P037 (Fr2)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P038 (Fr1)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P038 (Fr2)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P039 (Fr1)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P039 (Fr2)
Pièce et étage : WC 3 R+3 - ZONE 1
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P040 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+3 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P040 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+3 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Matériau compact gris non séparable + colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P041 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P041 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P042
Pièce et étage : Sanitaire 3 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P043 (Fr1)
Pièce et étage : WC 5 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P043 (Fr2)
Pièce et étage : WC 5 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P044
Pièce et étage : WC 5 R+3 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P045 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P045 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P046 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P046 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + joint cassant gris non séparable + matériau gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P047 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P047 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + matériau compact gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P048
Pièce et étage : Sanitaire 4 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peintures multiples en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P049 (Fr1)
Pièce et étage : WC 6 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P049 (Fr2)
Pièce et étage : WC 6 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P050 (Fr1)
Pièce et étage : WC 6 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P050 (Fr2)
Pièce et étage : WC 6 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P051
Pièce et étage : WC 6 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P052 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P052 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact gris non séparable + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P053 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P053 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P054
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P055
Pièce et étage : Sanitaire 5 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P056 (Fr1)
Pièce et étage : WC 9 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P056 (Fr2)
Pièce et étage : WC 9 R+3 - ZONE 3
Localisation : Mur D
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P057 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P057 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + joint cassant beige non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P058 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P058 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P059 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P059 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + couche plâreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P060
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P061 (Fr1)
Pièce et étage : WC 4 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P061 (Fr2)
Pièce et étage : WC 4 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P062
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P063 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage beige + carrelage blanc
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P063 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + colle grise hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P064 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P064 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau compact gris hétérogène non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P065 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P065 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P066
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P067
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + papier non séparable + matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P068 (Fr1)
Pièce et étage : WC 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P068 (Fr2)
Pièce et étage : WC 1 R+2 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P069 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + colle grise non séparable + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P069 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + carrelage blanc
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P070 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur G
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P070 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur G
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P071
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur E
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P072 (Fr1)
Pièce et étage : WC 5 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P072 (Fr2)
Pièce et étage : WC 5 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P073
Pièce et étage : WC 5 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur C
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + colle beige en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P074 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage gris + carrelage beige
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P074 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 3
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + colle grise hétérogène non séparable + joint cassant gris non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P075 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P075 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P076
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur H
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P077 (Fr1)
Pièce et étage : WC 8 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P077 (Fr2)
Pièce et étage : WC 8 R+2 - ZONE 3
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + matériau plâtreux blanc non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P078 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+1 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + carrelage blanc
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P078 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+1 - ZONE 1
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + colle grise hétérogène
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P079 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage + bois aggloméré
Résultat (justification) : Non Analysé



Identification : P079 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P080
Pièce et étage : Sanitaires 1 R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur J
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit gris en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P081 (Fr1)
Pièce et étage : WC 2 R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P081 (Fr2)
Pièce et étage : WC 2 R+1 - ZONE 1
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle blanche
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P082 (Fr1)
Pièce et étage : Sas R+1 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P082 (Fr2)
Pièce et étage : Sas R+1 - ZONE 2
Localisation : Sol
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de sols (Colles et joints de carrelage)
Descriptif Laboratoire : Colle grise
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)



Identification : P083 (Fr1)
Pièce et étage : Sas R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P083 (Fr2)
Pièce et étage : Sas R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur A
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colle plinthe)
Descriptif Laboratoire : Colle grise + couche plâtrée blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P084
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Enduit / Peinture)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtré blanc en vrac
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P085
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur F
Parties d'ouvrages ou de composants : Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) (Bandes calicot)
Descriptif Laboratoire : Peinture non séparable + enduit plâtré blanc non séparable + papier
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


Identification : P086 (Fr1)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Carrelage
Résultat (justification) : Non Analysé


Identification : P086 (Fr2)
Pièce et étage : Sanitaires 2 R+1 - ZONE 2
Localisation : Mur B
Parties d'ouvrages ou de composants : Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres (Colles et joints de carrelage ou de faïence)
Descriptif Laboratoire : Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable
Résultat (justification) : Amiante non détectée (RESULTAT ANALYSE)


ANNEXE 2 - PV ANALYSES



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher 37550 SAINT AVERTIN	Réf. Commande ITGA : IT0723-32561 Réf. Commande Client : AT_CPAM_ORLEANS-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/06/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie.
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO37 / WC 3 Sol Colles et joints de carrelage		Réf échantillon ITGA : IT152306-5712 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO38 / WC 3 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Réf échantillon ITGA : IT152306-5713 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5714	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO39 / / WC 3 Mur D Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (2) Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5715	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO40 / / Sanitaire 3 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Matériau compact gris / Colle grise / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Matériau compact gris non séparable + Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5716	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO41 / / Sanitaire 3 Mur H Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5717	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO42 / / Sanitaire 3 Mur B Enduit Peinture		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtrux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Enduit plâtrux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5718	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO43 / / WC 5 Mur F Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5719	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS044 / / WC 5 Mur 8 Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Colle blanche en vrac	
* Colle blanche en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5720	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS045 / / Sanitaire 4 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5721	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS046 / / Sanitaire 4 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Joint cassant gris non séparable + Matériau gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5722	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS047 / / Sanitaire 4 Mur D Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5723	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS048 / / Sanitaire 4 Mur E Enduit Peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5724	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO49 / / WC 6 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5725	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO50 / / WC 6 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtrée blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5726	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO51 / / WC 6 Mur C Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Colle beige en vrac	
* Colle beige en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5727	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO52 / / Sanitaire 5 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau compact gris non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5728	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO53 / / Sanitaire 5 Mur F Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau beige non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5729	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO54 / / Sanitaire 5 Mur H Bandes calicot		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5730	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO55 / / Sanitaire 5 Mur C Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5731	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO56 / / WC 9 Mur D Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5732	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO57 / / Sanitaires 2 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Joint cassant beige non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5733	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO58 / / Sanitaires 2 Mur H Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5734	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO59 / / Sanitaires 2 Mur E Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Autres fibres inhalables distingues par M. (2) Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5735	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO60 / / Sanitaires 2 Mur H Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5736	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO61 / / WC 4 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5737	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO62 / / Sanitaires 2 Mur C Bandes calicot		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5738	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO63 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage beige / Colle grise / Carrelage blanc / Colle grise hétérogène	
Carrelage beige + Carrelage blanc	---	Non analysé	
* Colle grise + Colle grise hétérogène	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5739	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO64 / / Sanitaires 1 Mur B Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau compact gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau compact gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5740	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO65 / / Sanitaires 1 Mur A Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5741	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO66 / / Sanitaires 1 Mur B Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5742	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO67 / / Sanitaires 1 Mur F Bandes calicot		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc / Papier / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
* Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable + Papier non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5743	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO68 / / WC 1 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5744	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO69 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carrelage blanc / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage + Carrelage blanc	---	Non analysé	
* Colle beige + Colle grise non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5745	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO70 / / Sanitaires 1 Mur G Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5746	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO71 / / Sanitaires 1 Mur E Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit beige en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit beige en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5747	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO72 / / WC 5 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5748	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO73 / / WC 5 Mur C Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Peinture / Colle beige en vrac	
* Peinture non séparable + Colle beige en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5749	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO74 / / Sanitaires 2 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage gris / Colle grise / Colle grise hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage beige	
Carrelage gris + Carrelage beige	---	Non analysé	
* Colle grise + Colle grise hétérogène non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5750	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO75 / / Sanitaires 2 Mur A Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5751	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO76 / / Sanitaires 2 Mur H Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5752	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO77 / / WC 8 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau plâtreux blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5753	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO78 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Carrelage blanc / Colle grise hétérogène	
Carrelage + Carrelage blanc	---	Non analysé	
* Colle beige + Colle grise hétérogène	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 9/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5754	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO79 / / Sanitaires 1 Mur B Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Bois aggloméré	
Carrelage + Bois aggloméré	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5755	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO80 / / Sanitaires 1 Mur J Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5756	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO81 / / WC 2 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : CTP
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5757	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO82 / / Sas Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5758	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO83 / / Sas Mur A Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (4)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 10/11

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32561 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5759	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO84 / / Sanitaires 2 Mur B Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5760	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO85 / / Sanitaires 2 Mur F Bandes calicot		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc / Papier	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc non séparable + Papier	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (4)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5761	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO86 / / Sanitaires 2 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (4)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres ont pu être différenciées de fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).
(3) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(4) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 11/11



3 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tel : 02.99.35.41.41
www.itga.fr



Accréditation n° 1-5967

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : 

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC TOURS (CCETO) les Granges Galand 2 Allée du Petit Cher 37550 SAINT AVERTIN	Réf. Commande ITGA : IT0723-32563 Réf. Commande Client : AT_CPAM_ORLEANS-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/06/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5676	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS001 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5677	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANS002 / / Sanitaires 1 Mur F Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau noir	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau noir	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5678	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO03 / / Local ménage Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5679	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO04 / / Local ménage Mur B Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5680	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO05 / / WC 1 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5681	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO06 / / Sanitaires 1 Mur A Enduit Peinture béton		Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris	
* Peinture non séparable + Enduit compact gris	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5682	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO07 / / Sanitaires 1 Mur E Peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
* Peintures multiples en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5683	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO08 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5684	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO09 / / Sanitaires 1 Mur D Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau beige non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5685	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO10 / / Sanitaires 1 Mur D Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5686	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO11 / / Local 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5687	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO12 / / Local 1 Mur C Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtruse blanche / Papier	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtruse blanche non séparable + Papier non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 3/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5688	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO13 / / Sanitaires 2 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche beige / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche beige non séparable + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : NBI (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5689	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO14 / / Sanitaires 2 Mur F Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau gris hétérogène	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau gris hétérogène non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5690	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO15 / / Sanitaires 2 Mur F Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5691	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO16 / / WC 6 Mur D Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5692	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO17 / / Sanitaire 3 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage beige / Colle grise / Carrelage blanc / Colle grise hétérogène	
Carrelage beige + Carrelage blanc	---	Non analysé	
* Colle grise + Colle grise hétérogène	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 4/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5693	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO18 / / Sanitaire 3 Mur D Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau compact beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau compact beige non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5694	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO19 / / Sanitaire 3 Mur B Enduit Peinture		Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DIA (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5695	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO20 / / WC 7 Mur F Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5696	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO21 / / WC 7 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Colle beige en vrac	
* Colle beige en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5697	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO22 / / Sanitaire 4 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 5/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5698	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO23 / / Sanitaire 4 Mur A Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5699	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO24 / / Sanitaire 4 Mur H Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5700	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO25 / / WC 9 Mur D Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Matériau plâtreux blanc	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5701	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO26 / / Sanitaire 5 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Carrelage blanc / Colle beige	
Carrelage + Carrelage blanc	---	Non analysé	
* Colle grise + Colle beige	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5702	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO27 / / Sanitaire 5 Mur G Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 6/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5703	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO28 / / Sanitaire 5 Mur H Enduit Peinture		Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5704	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO29 / / WC 13 Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche plâtreuse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Couche plâtreuse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5705	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO30 / / Sanitaires 1 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris / Matériau beige	
* Peinture non séparable + Colle grise + Joint cassant gris non séparable + Matériau beige non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5706	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO31 / / Sanitaires 1 Mur D Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Matériau gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Matériau gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5707	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO32 / / Sanitaires 1 Mur C Enduit Peinture		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtreux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 7/8

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0723-32563 EN DATE DU 15/06/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5708	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO33 / / Local ménage Mur B Colles et joints de carrelage ou de faïence		Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtruse blanche	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle blanche + Couche plâtruse blanche non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5709	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO34 / / Sanitaires 2 Sol Colles et joints de carrelage		Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle grise + Joint cassant gris non séparable	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : HEC (3)
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5710	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO35 / / Sanitaires 2 Mur H Colle plinthe		Description ITGA : Carrelage / Colle beige	
Carrelage	---	Non analysé	
* Colle beige	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MWA
Réf dossier client : AT_CPAM_ORLEANS-01 - CPAM 9 PL DU GENERAL DE GAULLE 45000 ORLEANS		Réf échantillon ITGA : IT152306-5711	
Réf échantillon client : AT_CPAM_ORLEANSPO36 / / Sanitaires 2 Mur A Enduit Peinture		Description ITGA : Peintures multiples / Enduit plâtrux blanc en vrac	
* Peintures multiples non séparable + Enduit plâtrux blanc en vrac	META (A) le 15/06/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : RMT (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Hélène COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 8/8

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS

Aucun document disponible

ANNEXE 4 - CERTIFICAT DE COMPÉTENCES



CERTIFICAT

N° DTI / 2004-009

Certifie par la présente que :

Guillaume ROGEZ

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	19/06/2020	18/06/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	19/06/2020	18/06/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	09/10/2022	08/10/2029
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	29/12/2022	28/12/2029
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	25/10/2022	24/10/2029
TERMITES Métropole	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment en métropole	09/10/2022	08/10/2029

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans l'annuaire des certifiés disponible sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : www.socotec-certification-international.fr.
SOCOTEC Certification France - 13, cours Valmy 92877 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Créteil 490 864 309 - www.socotec-certification-international.fr


Thomas Hennion, Directeur opérationnel

ANNEXE 5 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
 Département Construction
 Tour Ariane
 5, Place des Pyramides
 La Défense 9
 92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**
 📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**
 Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
 civile professionnelle et
 exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
 Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
 21 Route d'Albert
 62450 AVESNES LES BAPAUME
 N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022

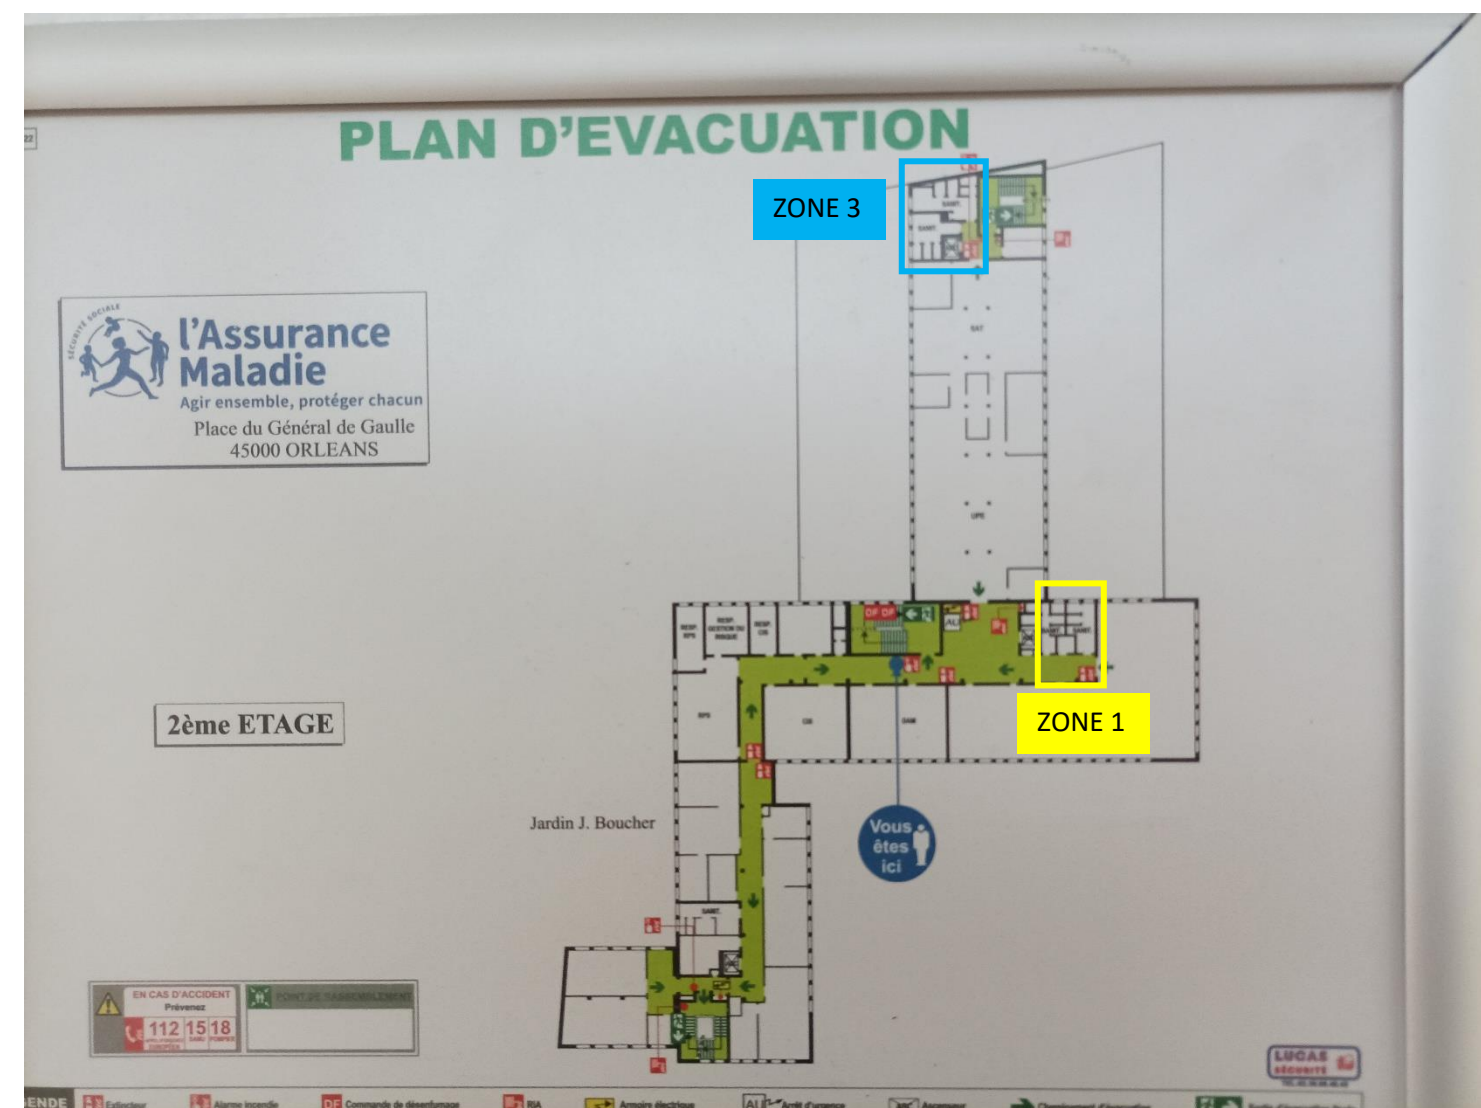
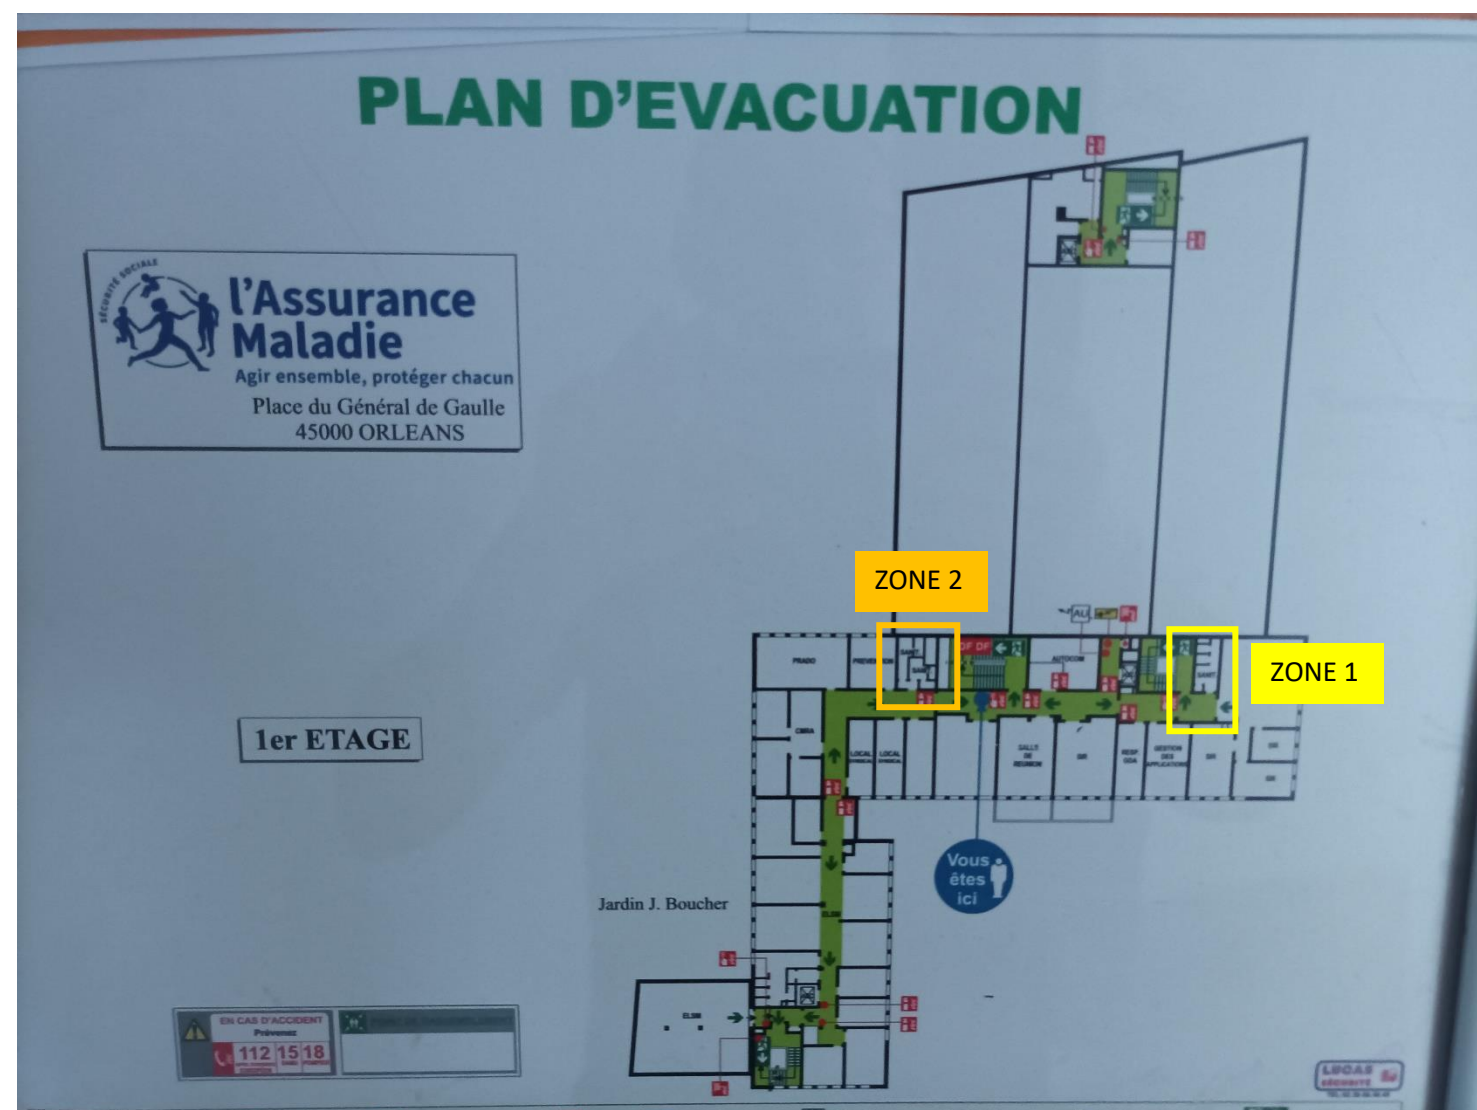
POUR LA SOCIÉTÉ :

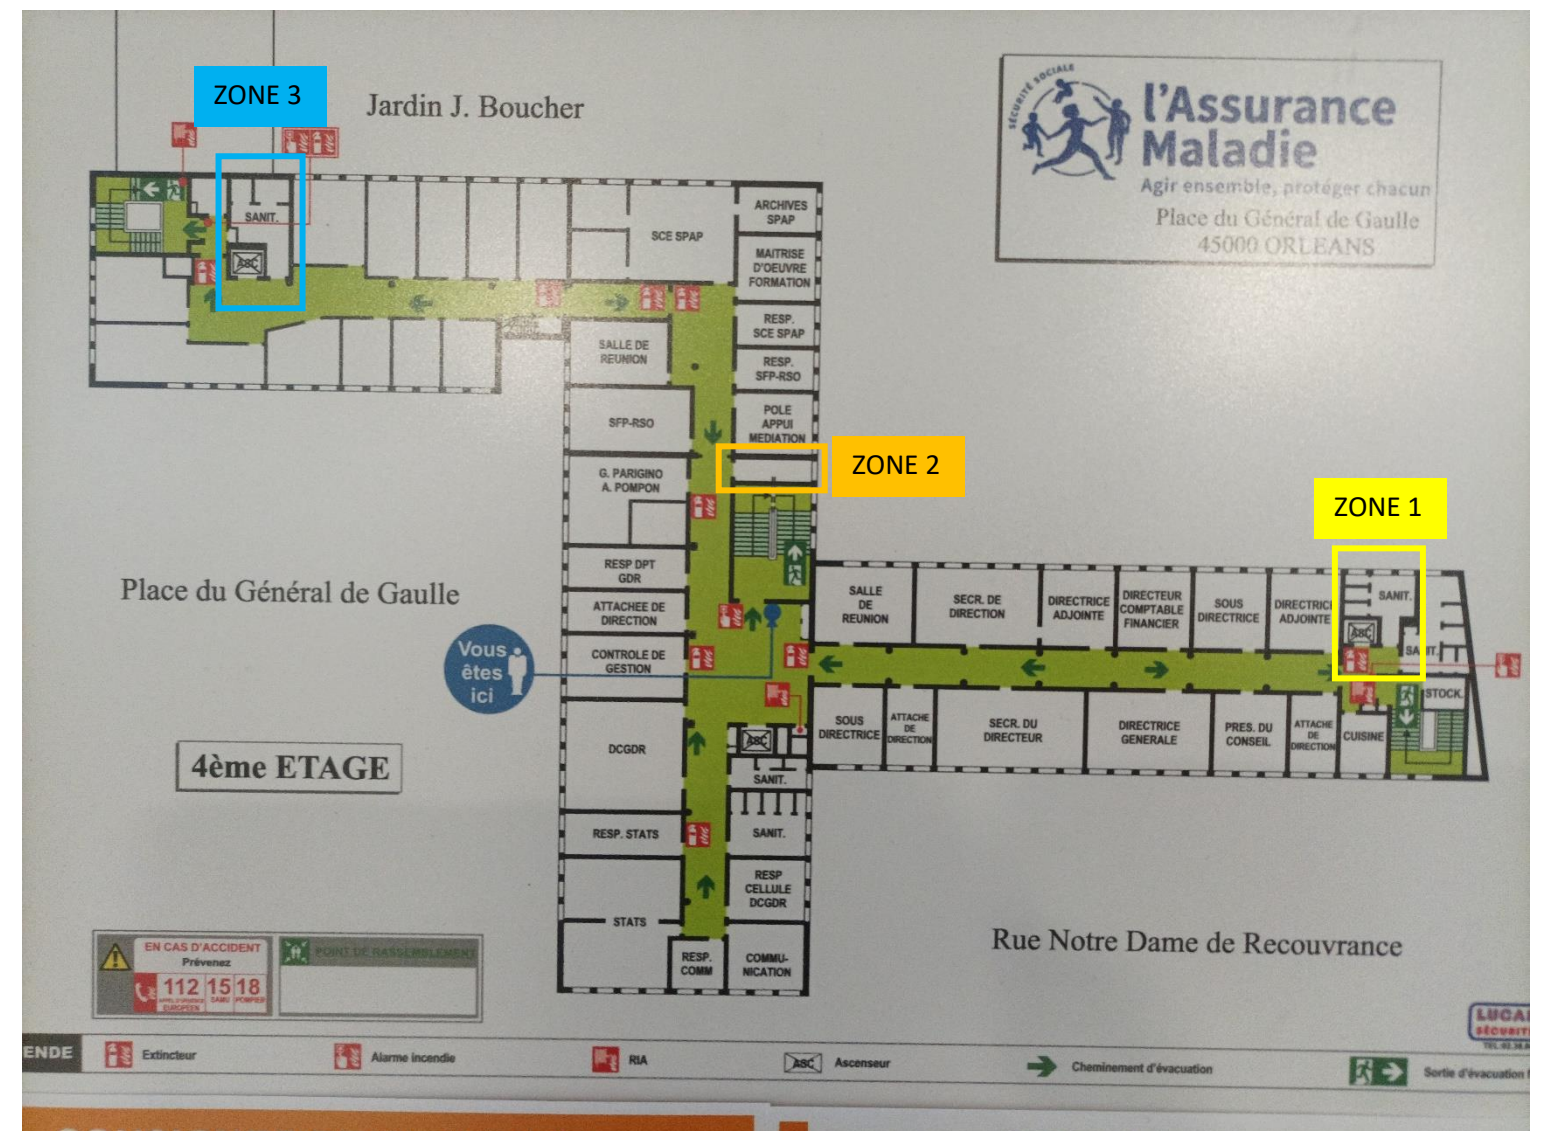
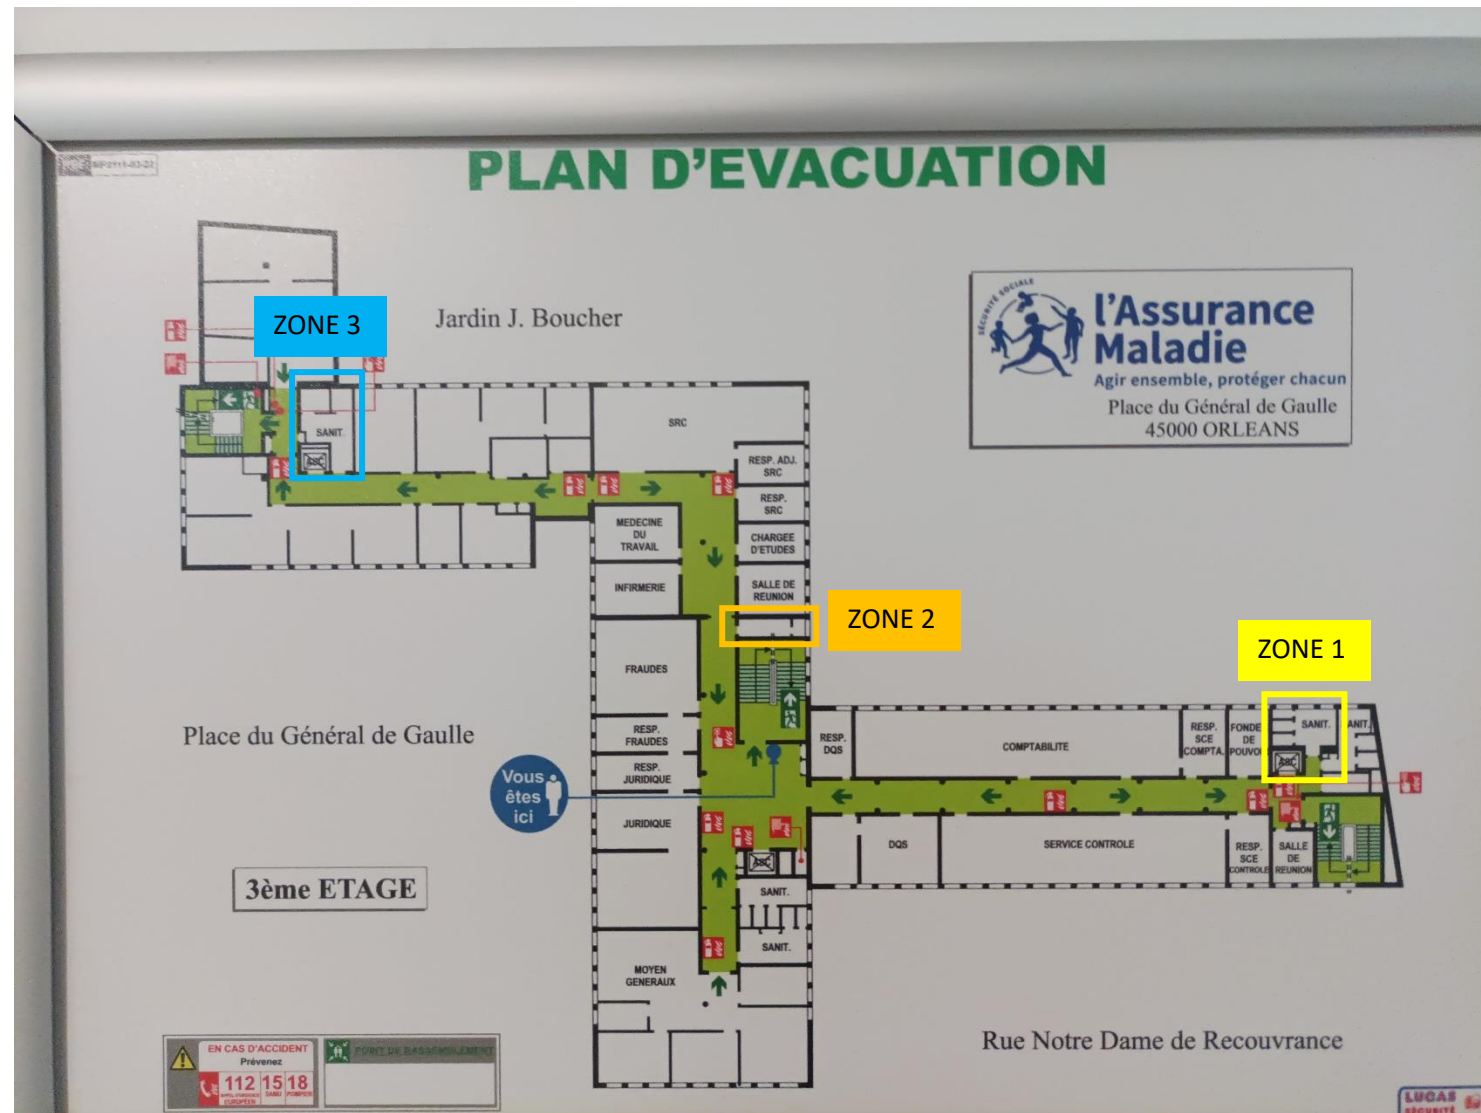
Guillaume BORIE
 Directeur Général Délégué d'AXA France

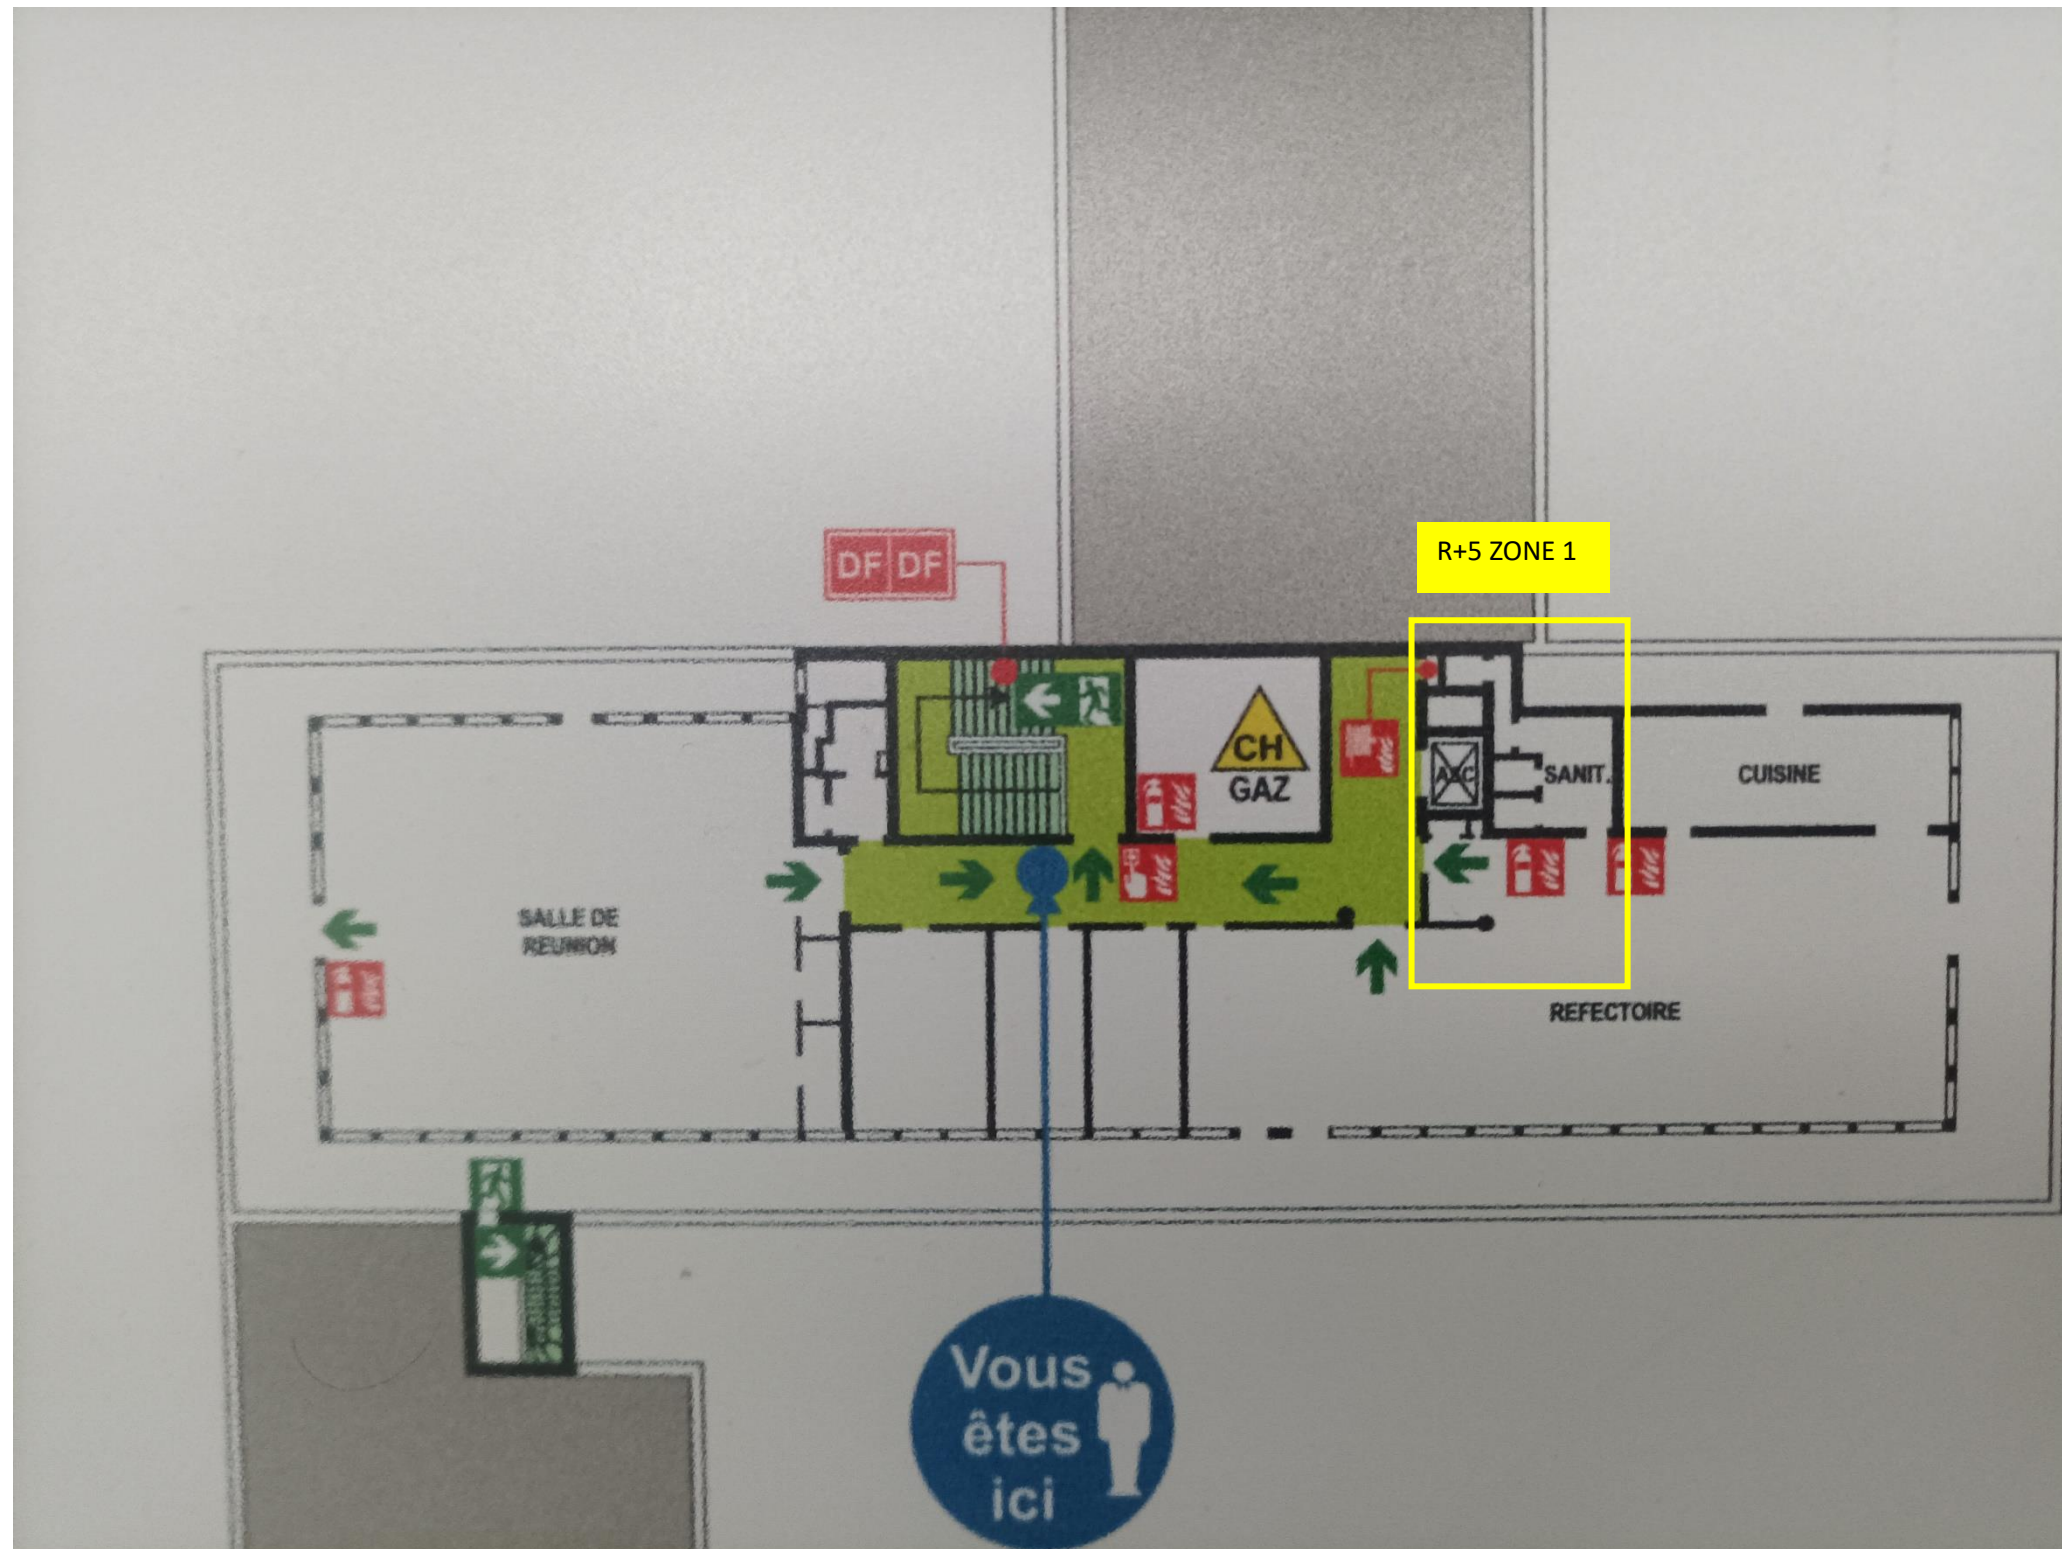


AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre, TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers, Siren 775 699 309, TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 553 457 245 - Siège sociaux : 313, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,00 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 6 - PLANS / CROQUIS







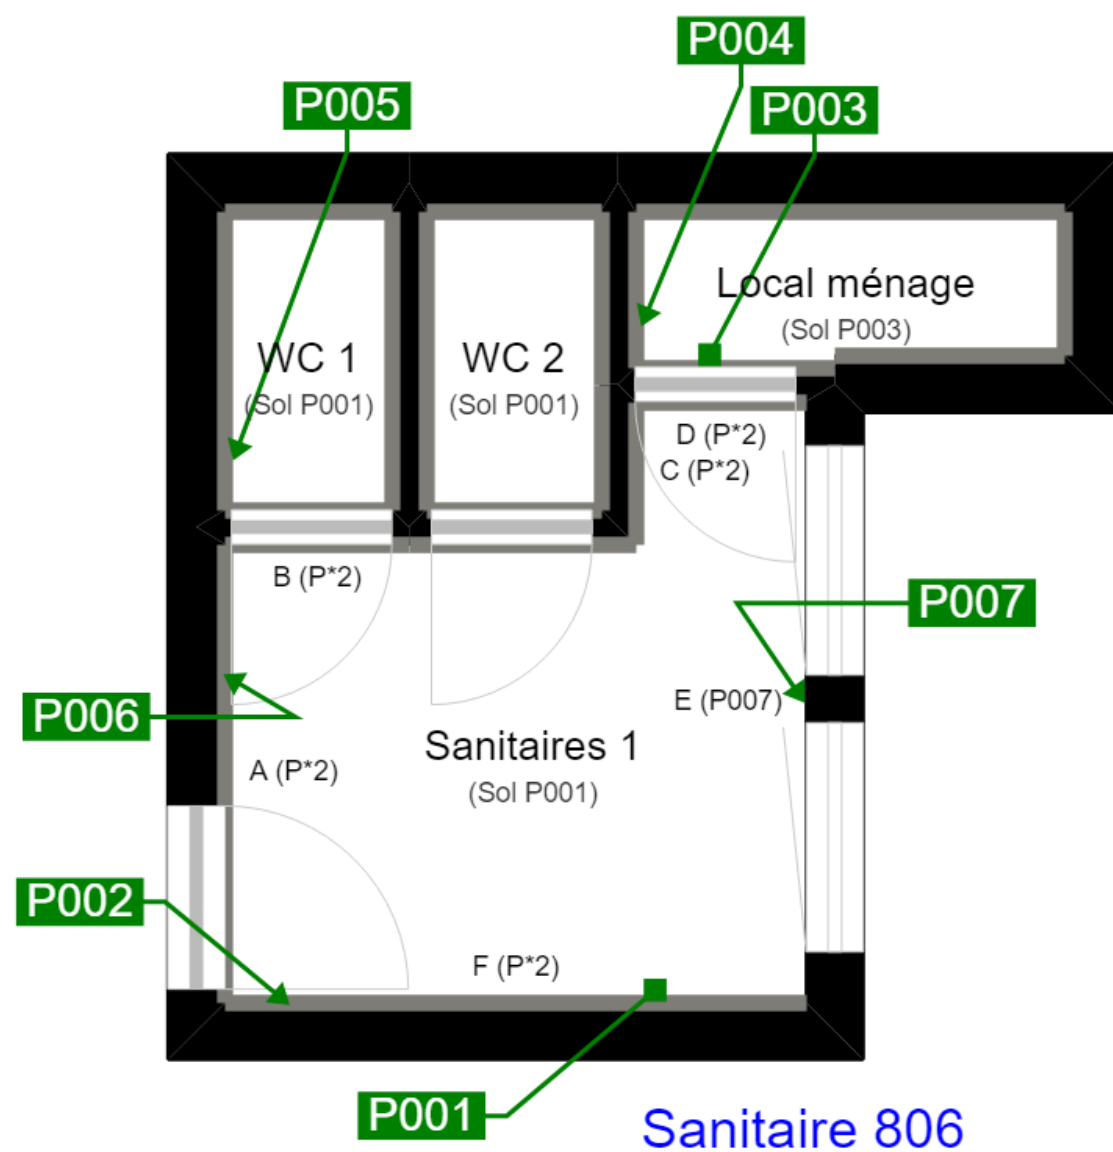


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+5 - ZONE 1

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :1/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

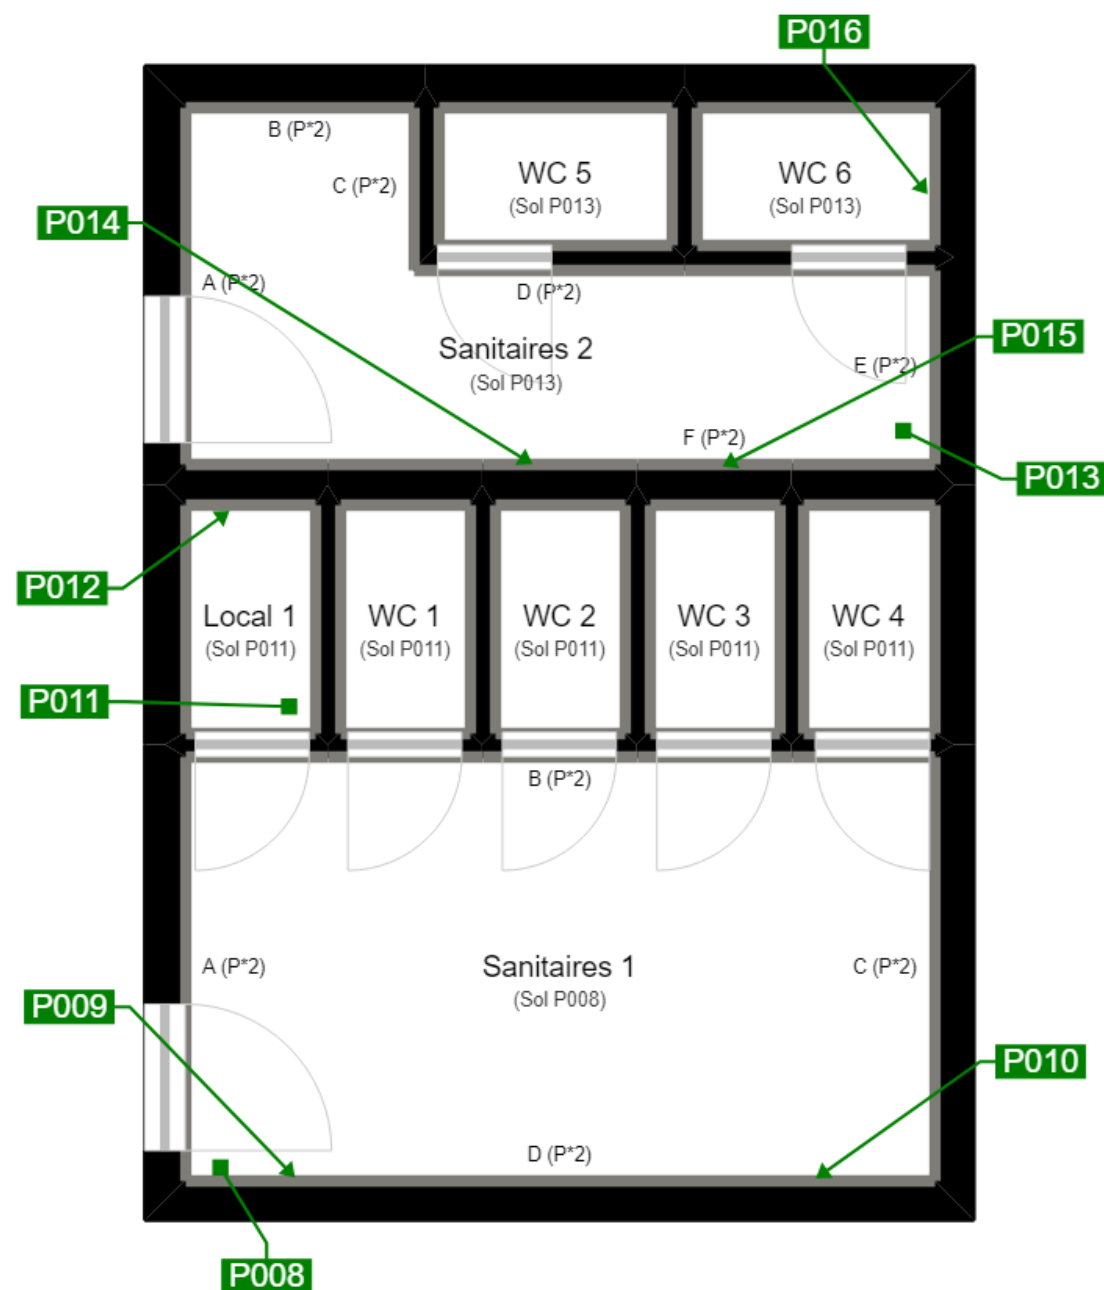


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+4 - ZONE 1

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :2/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

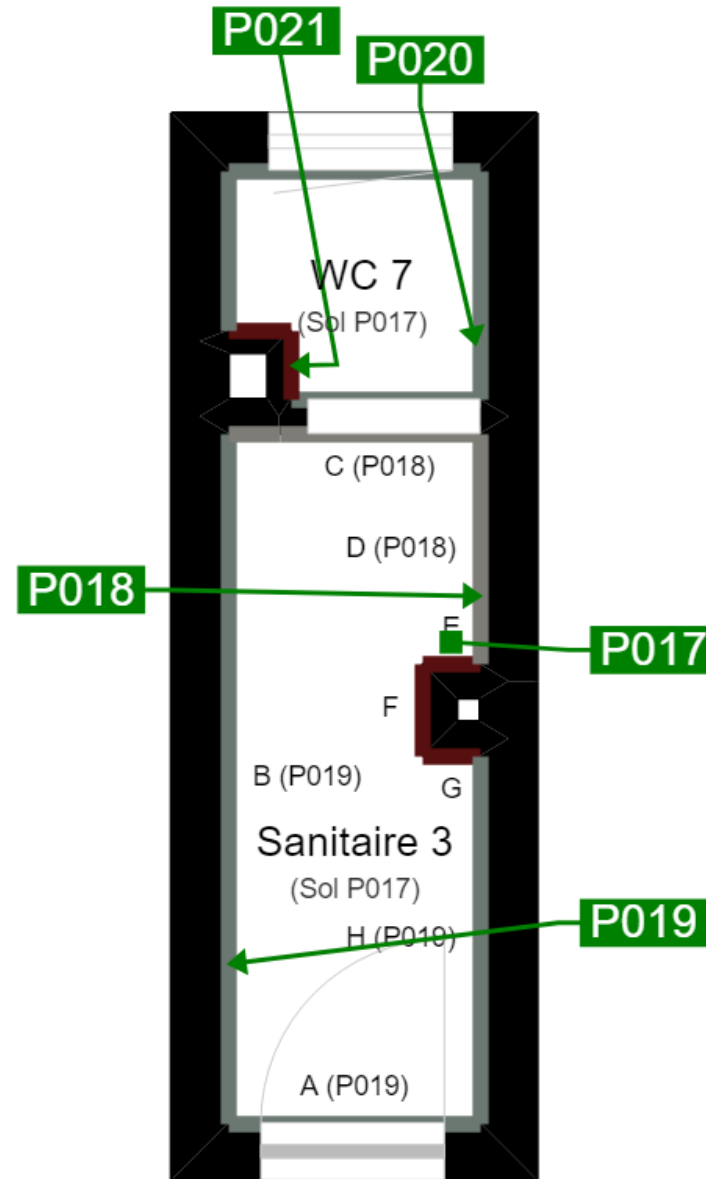


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+4 - ZONE 2

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :3/11

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

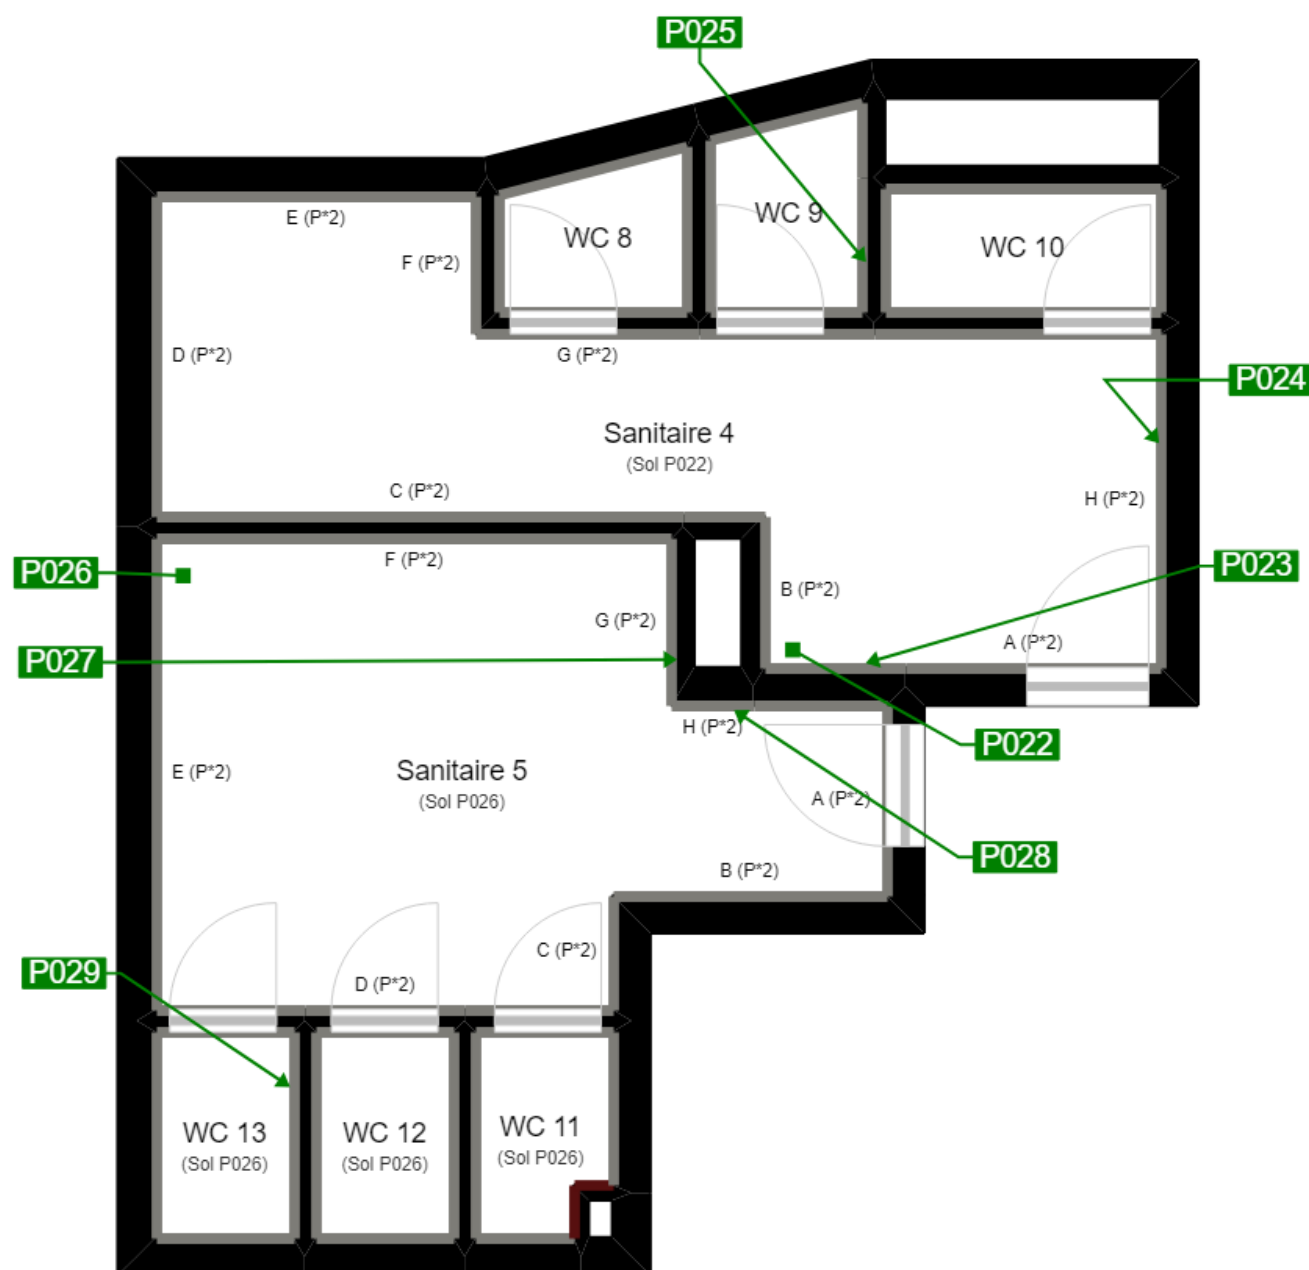


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+4 - ZONE 3

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :4/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

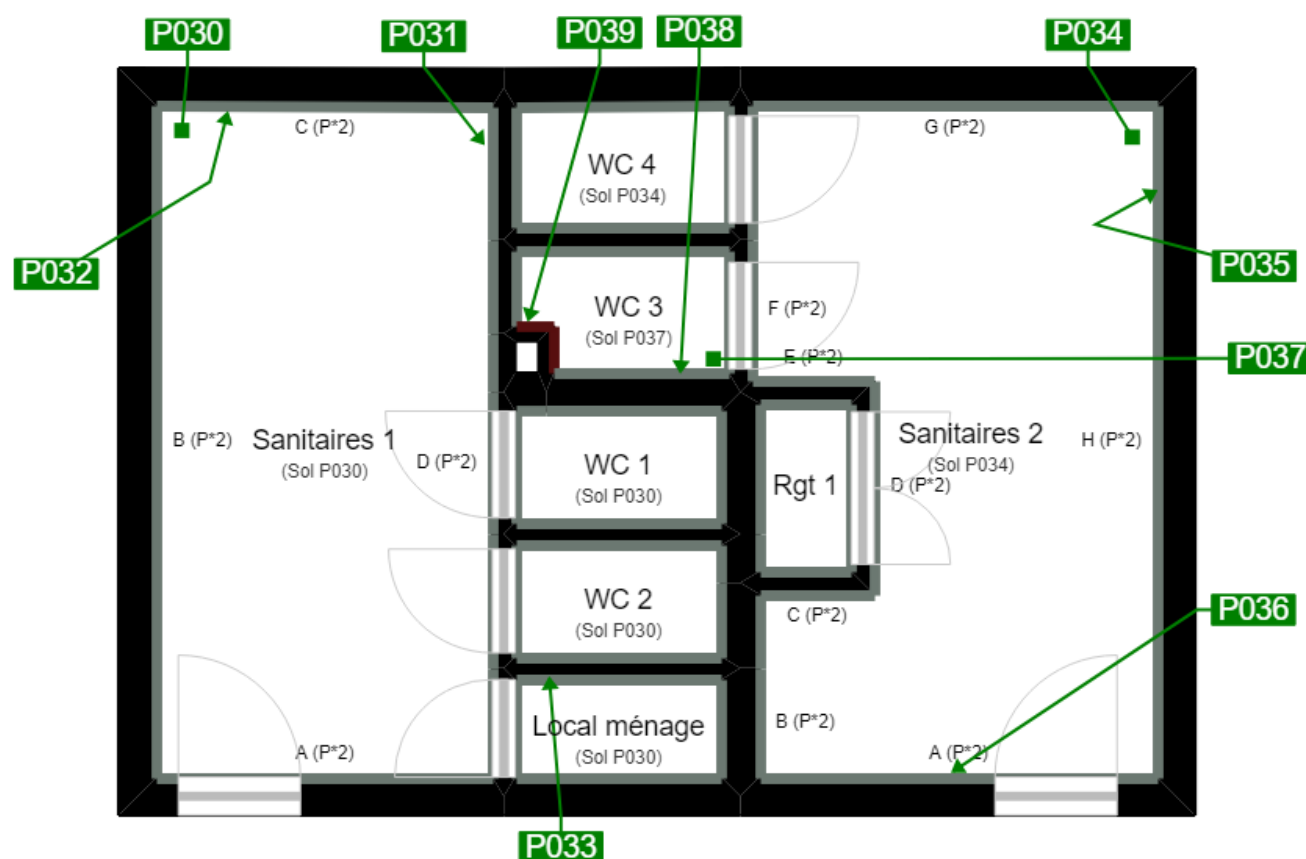


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+3 - ZONE 1

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :5/11

Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

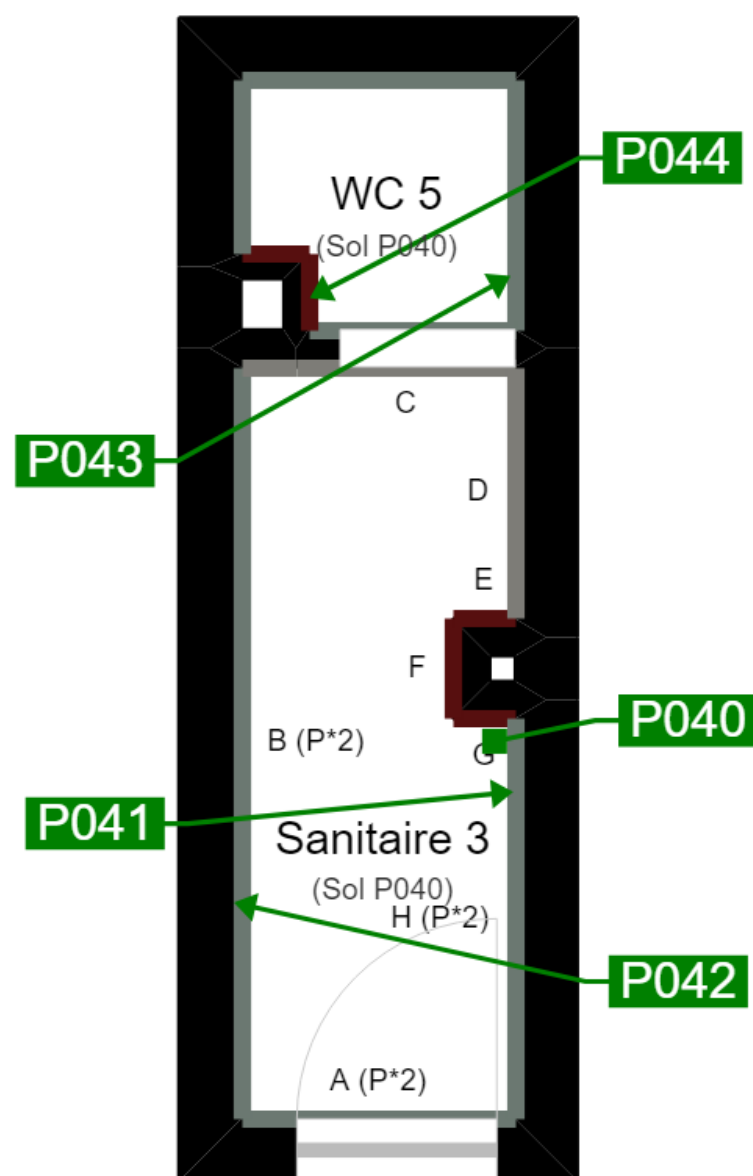


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+3 - ZONE 2

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :6/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

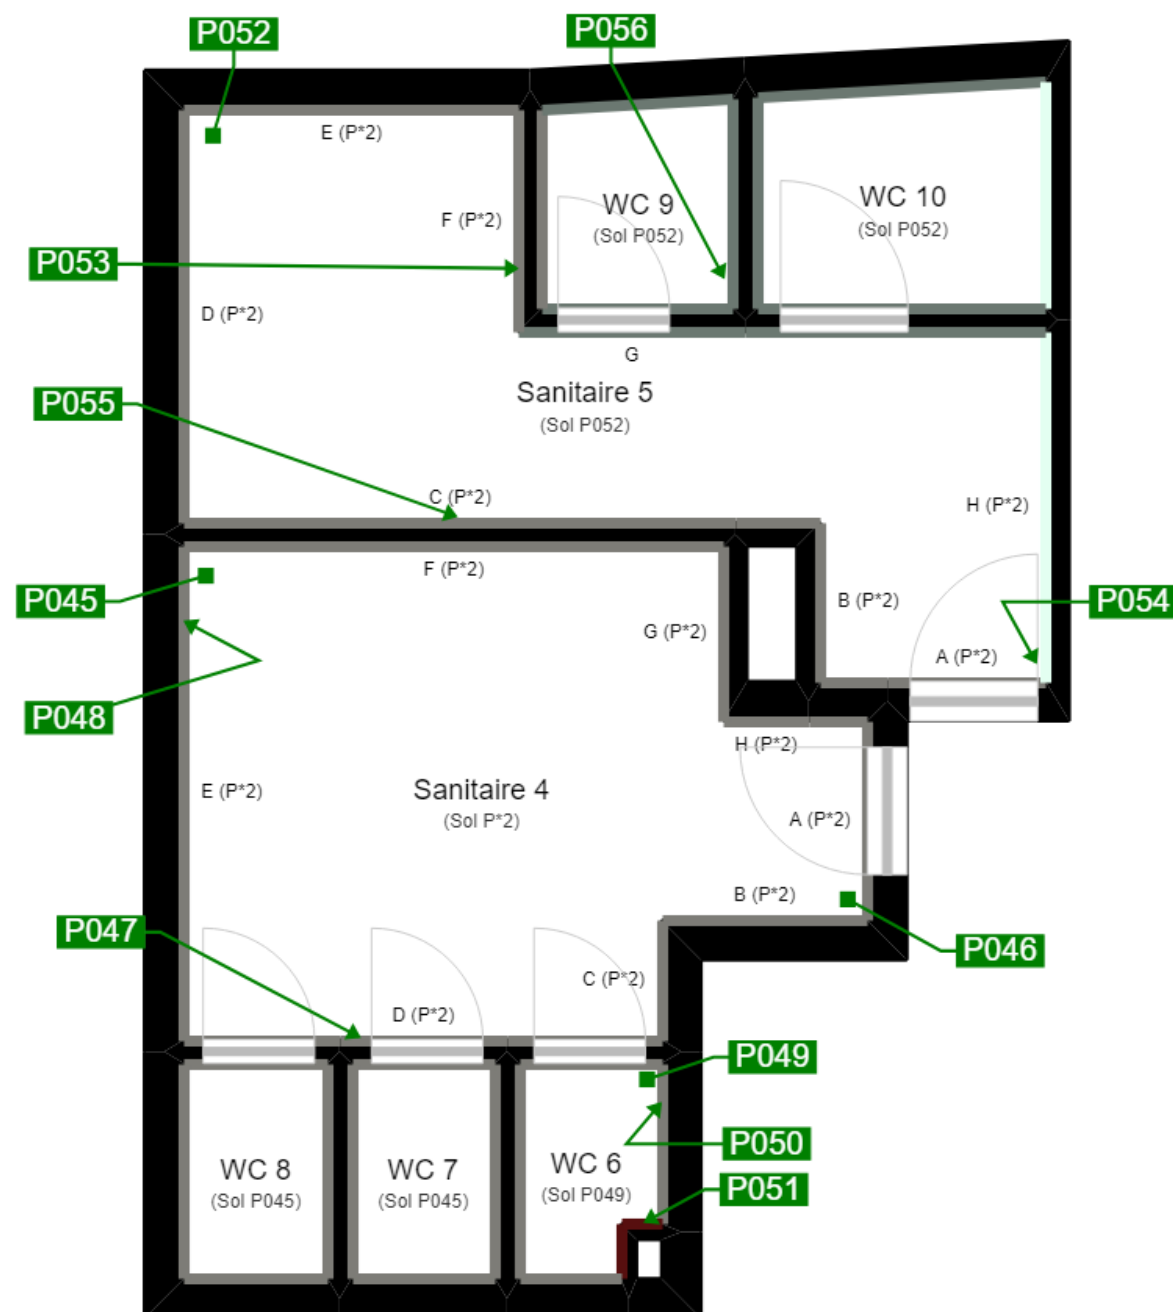


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+3 - ZONE 3

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :7/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

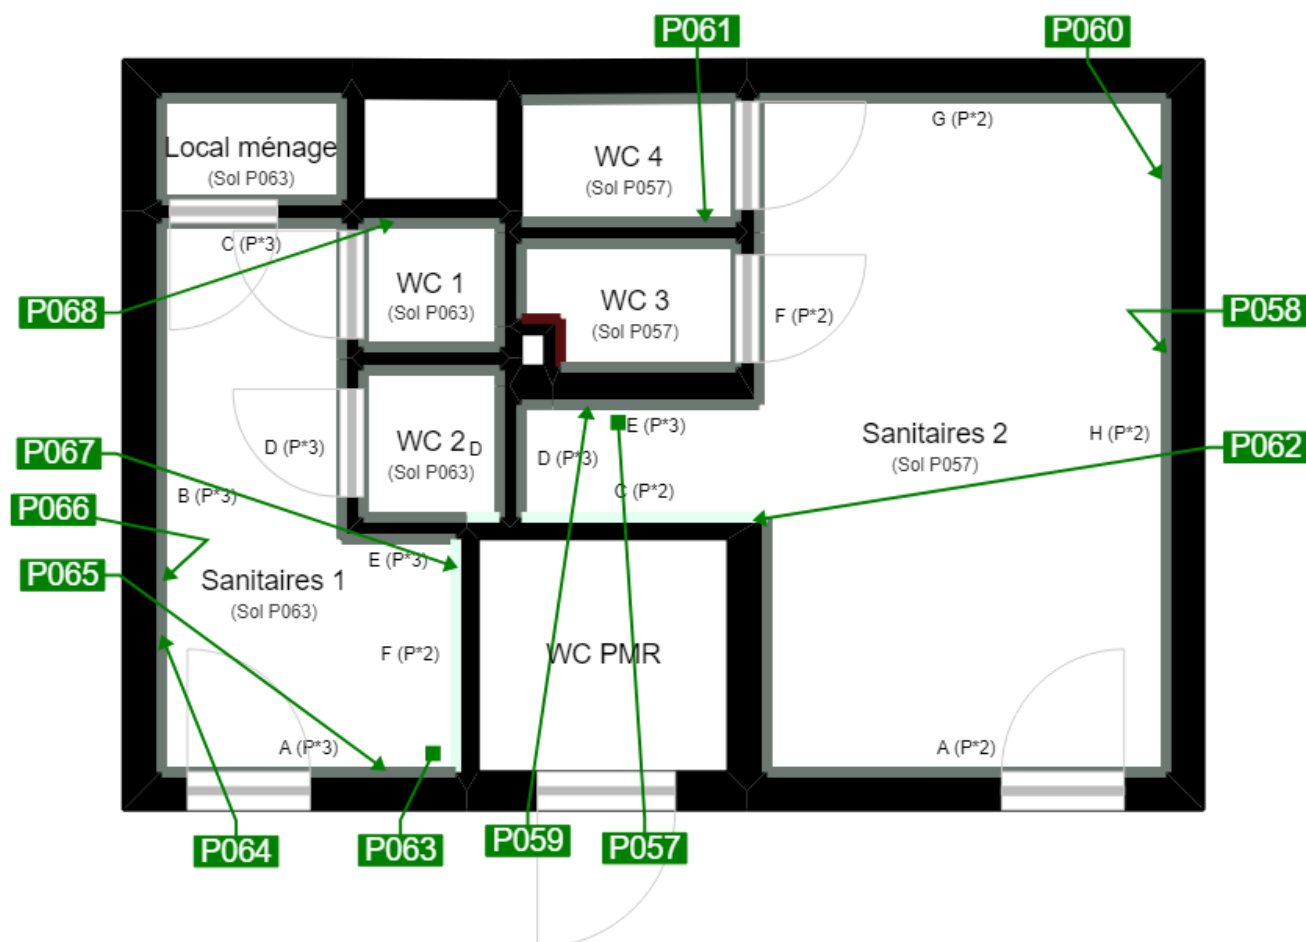


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+2 - ZONE 1

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :8/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

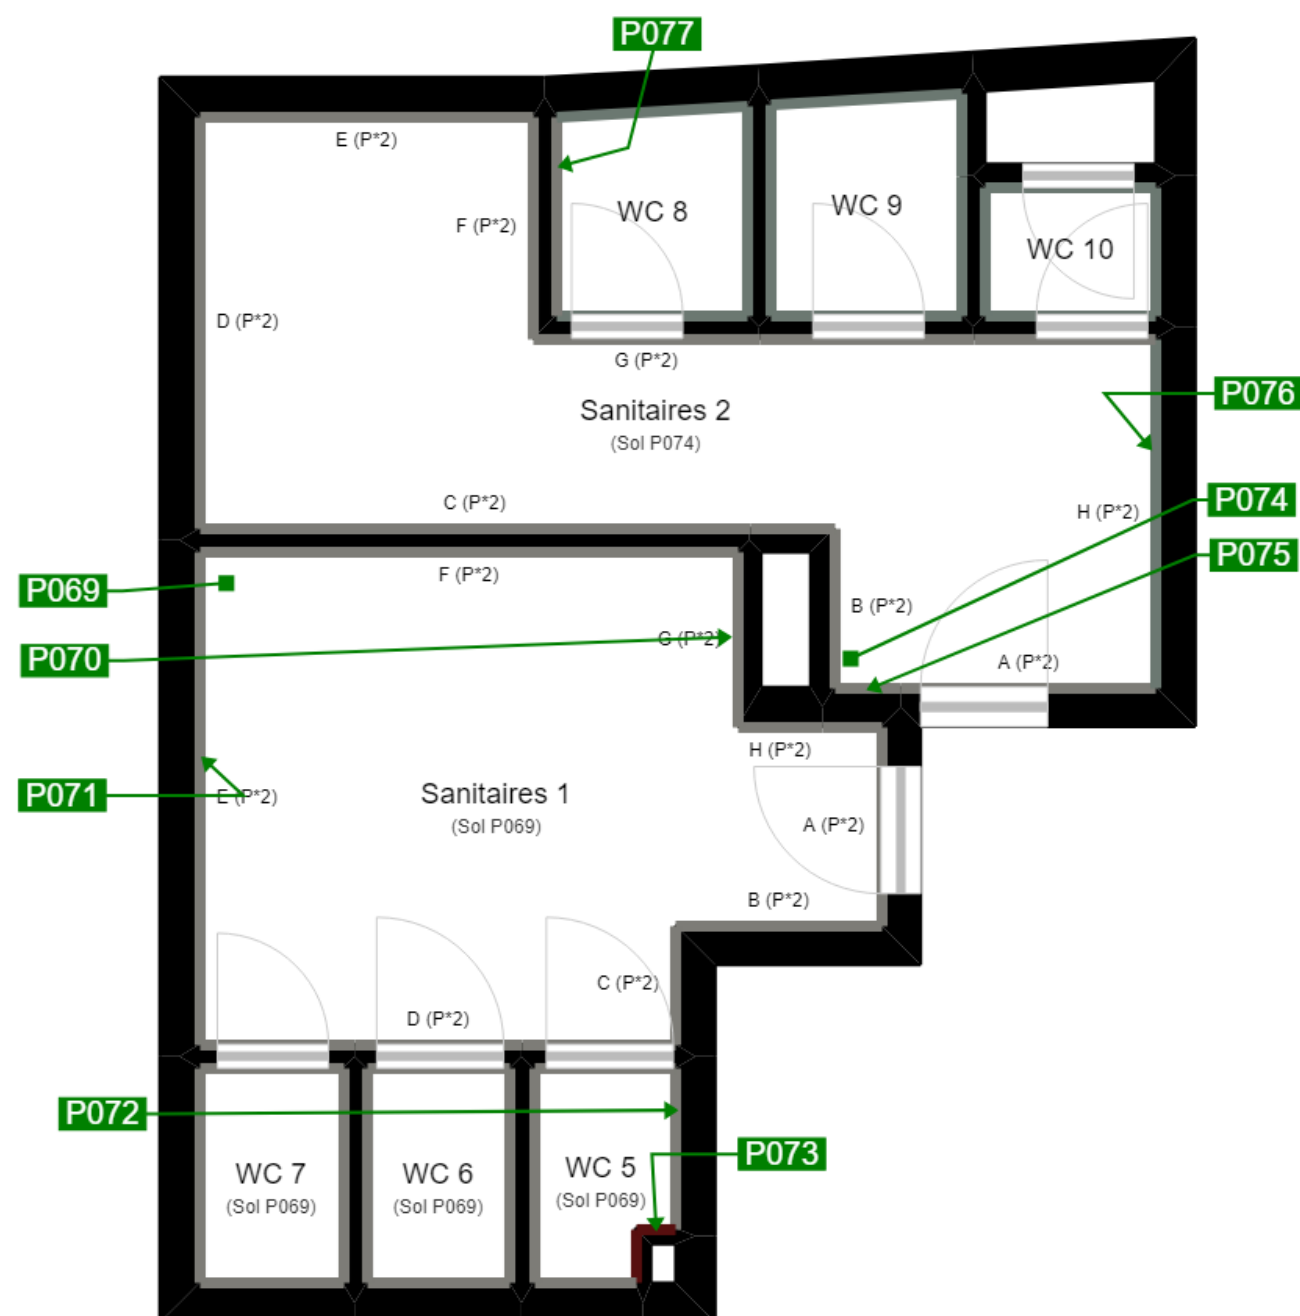


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+2 - ZONE 3

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :9/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

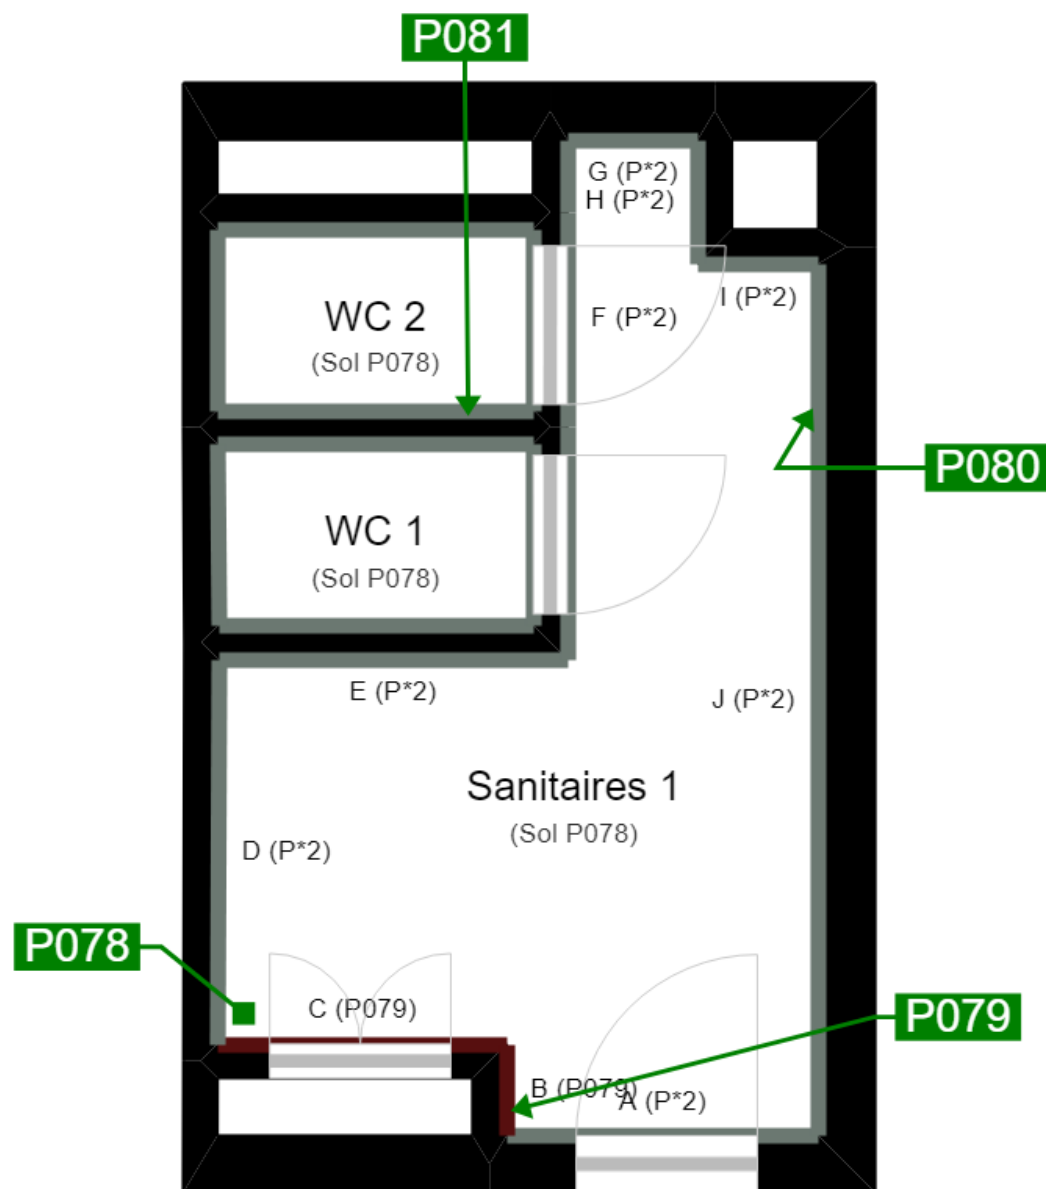


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+1 - ZONE 1

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :10/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- ➔ Prélèvement de mur amianté
- ➔ Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage

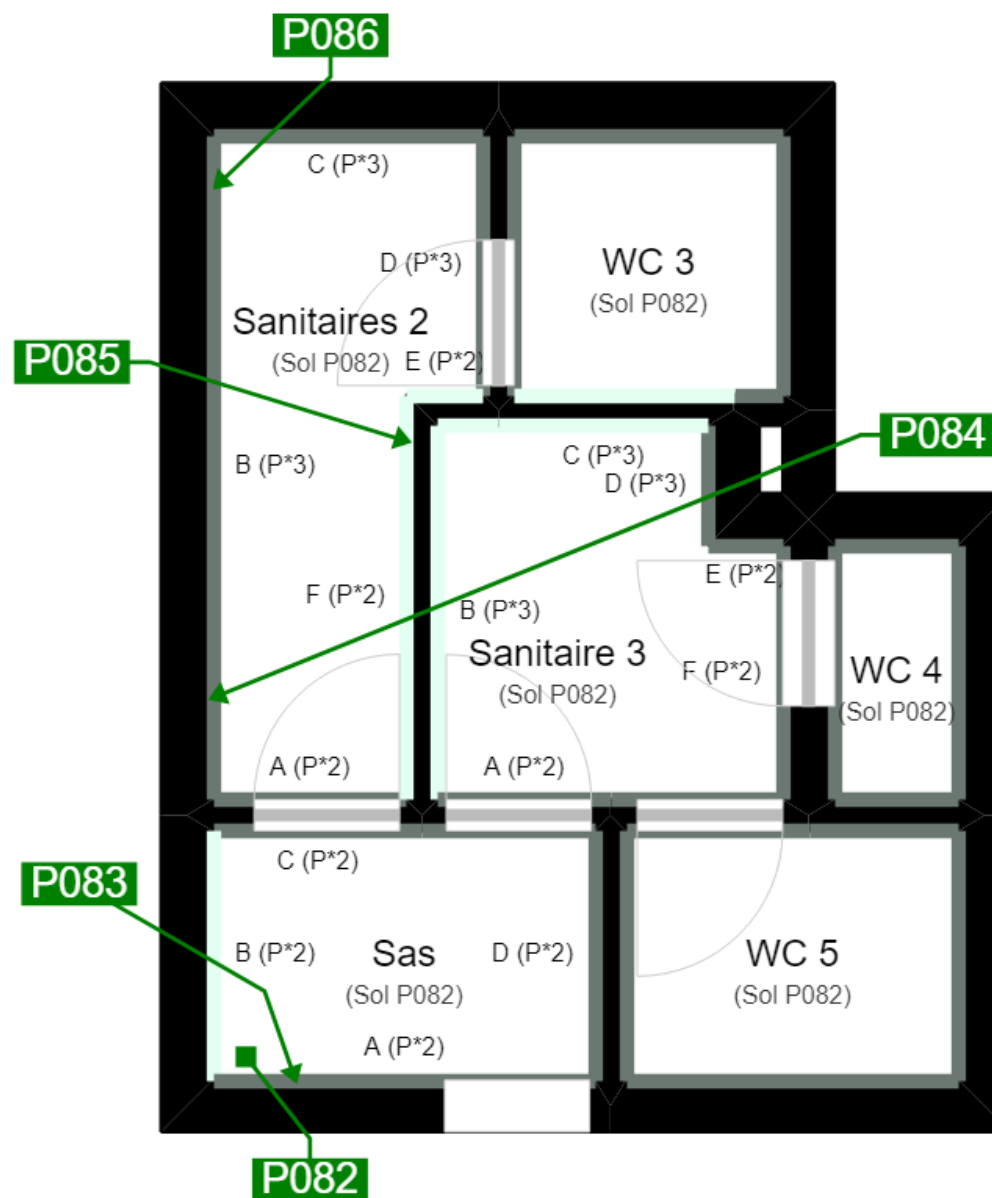


PLANCHE DE REPERAGE

Bien : AT_CPAM_ORLEANS - 9 PL
DU GENERAL DE GAULLE 45000
ORLEANS

Zone :R+1 - ZONE 2

Plan

Auteur :ROGEZ Guillaume

N° de planche :11/11

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- X Autre type de prélèvement amianté
- X Autre type de prélèvement non amianté
- ▨ Sols amiantés
- ▨ Plafonds amiantés
- ▨ Sols et plafonds amiantés

Le présent schéma de repérage est indissociable du rapport qui l'accompagne. Les deux forment un tout nécessaire à la compréhension des résultats du repérage
