

Rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27677678/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 29/09/2025

Référence au programme de travaux :

Mail du 12 Juin 2025 - DAAT-marche UGAP-Institut
Agro-bat 20 Mail du 12 Juin 2025 - DAAT-marche
UGAP-Institut Agro-bat 20 réalisé le 12/06/2025 par
Philippe ESNAULT - INSTITUT AGRO

DONNEUR D'ORDRE

INSTITU AGRO

Philippe Esnault

65 rue de Saint Briec

35000 RENNES

SITE D'INTERVENTION

BVS- MULTI SITES - SITE DE RENNES

65 rue de Saint Briec

35000 RENNES

Batiments 20- Ateliers

Latitude : 48.113600 / Longitude : -1.705300

Date(s) d'intervention(s) :

Du 14/08/2025 au 14/08/2025



SYNTHESE DE CONCLUSION



OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Romain BOURDONNAY	Diagnostiqueur	Certification N° CPD11556	Romain BOURDONNAY
			

Le présent rapport comporte 61 pages, dont 40 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Obligations réglementaires	6
3. INFORMATIONS GENERALES	7
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	7
3.2. Parties prenantes	7
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	7
4.1. Références réglementaires	7
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	8
5.1. Date(s) de visite(s)	8
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	8
5.3. Conditions spécifiques	8
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	8
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	9
6.1. Matériaux et produits repérés	9
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	21
7. ANNEXES	22
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	22
7.2. Photos prélèvements	24
7.3. Photos sondages	31
7.4. Photos observations	33
7.5. Attestation d'assurance	34
7.6. Certificat de compétence	36
7.7. Croquis de repérage	37
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	41

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Réfection complète du Bâtiment 20

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Toitures	Plaques en fibres-ciment
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Eléments associés à la façade	Conduits
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Peintures
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage , Peintures décoratives
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés, Peinture
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence, Joints de faïence, Peintures décoratives
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	
Faux plafonds	Plaques
Plafonds	Bandes calicot, Peintures décoratives
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Joints de carrelage, Peintures de sol, Ragréages, Sols coulés à base ciment , Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits	Conduits

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
12	RDC -> Local 02	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris
24	RDC -> Local 03	Conduits	Conduits	Ciment, Fibres-ciment	Beige, Blanc, Gris
18	RDC -> Local 04	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc
17	RDC -> Local 04	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc
17	RDC -> Local 05	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc
17	RDC -> Local 06	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc
17	RDC -> Local 07	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc
11	RDC -> Local 16	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Blanc, Gris
21	R+1 -> Local 20	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris
21	R+1 -> Local 22	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris
21	Extérieurs -> Toitures	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : BVS- MULTI SITES - SITE DE RENNES
65 rue de Saint Brieuc
35000 RENNES

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
BVS- MULTI SITES - SITE DE RENNES	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
Philippe Esnault	Donneur d'ordre	INSTITU AGRO	65 rue de Saint Brieuc 35000 RENNES	0223485202

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 14/08/2025 au 14/08/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Mail du 12 Juin 2025 - DAAT-marche UGAP- Institut Agro-bat 20	Philippe ESNAULT - INSTITUT AGRO	12/06/2025	Mail du 12 Juin 2025 - DAAT-marche UGAP-Institut Agro- bat 20	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :

AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 01	Charpentes	Peintures décoratives	Epais	Gris, Orange	23	P39* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 01	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Compact, Ciment, Dur	Beige, Gris	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> Local 02	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Gris	12	P21* P	/	AN	Conduits de ventilation au-travers de murs périphériques	Oui
RDC -> Local 02	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Compact, Ciment, Dur	Beige, Gris	8	P14* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 03	Conduits	Conduits	Inox, Métallique	Gris	29	/	S9	PN	Conduits de fumée métal inox	Non
RDC -> Local 03	Conduits	Conduits	Ciment, Fibres-ciment	Beige, Blanc, Gris	24	P41* P	/	AN	Conduit d'évacuation des eaux usées	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	P9* N	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	P9* N	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	6	P11* N	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 03	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	6	P11* N	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 03	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 04	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	18 (i)	P31* N	/	AN	/	Oui
RDC -> Local 04	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	17	P29* P	/	AN	Bandes calicots plafonds	Oui
RDC -> Local 04	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	18	P30 P	/	AN	/	Oui
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Bleu, Jaune, Rouge, Blanc	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Beige, Jaune, Vert	1	P1* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Ragréage	Jaune, Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Bleu, Jaune, Rouge, Blanc	1	P2 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Beige, Jaune, Vert	1	P2 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 04	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Ragréage	Jaune, Gris	1	P2 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	4	P8* N	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	4	P8* N	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	16	P27* N	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 04	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	16	P27* N	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 04	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	S4	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 05	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	17	P28 P	/	AN	Bandes calicots plafonds	Oui
RDC -> Local 05	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Ciment	Beige, Blanc	19	P32* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 05	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Beige, Blanc	19	P32* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 05	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	3	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Local 05	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment, Dur	Gris	3	Idem P 6	/	AN	/	Non
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	4	Idem P 8	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	4	Idem P 8	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	16	Idem P 27	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 05	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	16	Idem P 27	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 05	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 06	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	3	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 06	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment, Dur	Gris	3	P6* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 06	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	17	Idem P 29	/	AN	Bandes calicots plafonds	Oui
RDC -> Local 06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	4	Idem P 8	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	4	Idem P 8	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	16	Idem P 27	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 06	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	16	Idem P 27	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 06	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 07	Revêtements de sol	Peintures de sol	Décoratif	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 07	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment, Dur	Gris	3	P5 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	4	P7 N	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	4	P7 N	/	AN	Enduits projetés zones humides sur briques	Non
RDC -> Local 07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	16	P26 N	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non
RDC -> Local 07	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	16	P26 N	/	AN	Enduits projetés sur murs périphériques zones humides	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 07	Plafonds	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	17	Idem P 29	/	AN	Bandes calicots plafonds	Oui
RDC -> Local 07	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 08	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Compact, Ciment, Dur	Beige, Gris	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
RDC -> Local 09	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	22	P37* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Jaune, Noir, Blanc	2	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	2	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Ragréage	Bleu, Gris	2	P3* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	Beige, Jaune, Noir, Blanc	2	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	Semi-dur	Jaune	2	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment, Ragréage	Bleu, Gris	2	P4 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Ciment	Beige, Blanc	19	P33 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Beige, Blanc	19	P33 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 10	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige, Blanc, Gris	15	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 11	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	15	P24* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 11	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Beige, Blanc, Gris	15	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 11	Revêtements de sol	Joints de carrelage	Ciment	Gris	15	P25 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 11	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre, Toile	Beige, Jaune, Blanc	22	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 11	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 11	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 12	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	/	S8	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
RDC -> Local 13	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
RDC -> Local 14	Conduits	Conduits	Inox, Métallique	Gris	29	/	S2	PN	Conduits de fumée métal inox	Non
RDC -> Local 14	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	S6	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	P10 N	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	P10 N	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	6	P12 N	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 14	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	6	P12 N	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 14	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 16	Conduits	Conduits	Fibres-ciment	Blanc, Gris	11	P20* P	/	AN	/	Oui
RDC -> Local 16	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
RDC -> Local 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Ciment	Beige, Blanc	20	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Beige, Blanc	20	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Plâtreux, Ciment	Beige, Blanc	20	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 17	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Ciment	Beige, Blanc	20	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 17	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
RDC -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
RDC -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> Local 17	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
RDC -> Local 17	Conduits	Conduits	PVC	Gris	31	/	/	PN	Conduits d'évacuation des eaux usées	Non
RDC -> Local 18	Conduits	Conduits	PVC	Gris	28	/	S1	PN	Chutes de gouttières intérieures	Non
RDC -> Local 18	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Compact, Ciment, Dur	Beige, Gris	8	P15 N	/	AN	/	Non
RDC -> Local 19	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Compact, Ciment, Dur	Beige, Gris	8	Idem P 14	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 20	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris	21	/	S7	AN	/	Oui
R+1 -> Local 21	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	P13* N	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
R+1 -> Local 22	Charpentes	Peintures décoratives	Epais	Gris, Orange	23	P40 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 22	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris	21	P36* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> Local 22	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non
R+1 -> Local 23	Charpentes	Peintures décoratives	Epais	Gris, Orange	23	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 24	Faux plafonds	Plaques	Aluminium, Fibreux, Laine de verre	Jaune, Noir, Gris	7	Idem P 13	/	AN	Plaques de faux-plafonds laine de verre avec aluminium et goudron	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Local 24	Charpentes	Peintures décoratives	Epais	Gris, Orange	23	Idem P 39	/	AN	/	Non
R+1 -> Local 24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
R+1 -> Local 24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Beige	5	Idem P 9	/	AN	Enduits projetés distributions intérieures zones sèches	Non
R+1 -> Local 24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint	Gris	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
R+1 -> Local 24	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	Epais	Blanc	6	Idem P 11	/	AN	Enduits projetés murs périphériques intérieurs	Non
R+1 -> Local 25	Conduits	Conduits	PVC	Gris	28	/	S10	PN	Chutes de gouttières intérieures	Non
Extérieurs -> Façades	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	Fonte	Beige, Marron	30	/	S3	PN	Pieds de chutes de gouttières	Non
Extérieurs -> Façades	Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales	PVC	Gris	32	/	S5	PN	Chutes de gouttières	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint	Blanc, Gris	9	P16* N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint	Blanc, Gris	9	P17 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur, Fibreux	Blanc, Gris	10	P18* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur, Fibreux	Blanc, Gris	10	P19 N	/	AN	/	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc	13	P22* N	/	AN	Mastic de vitrage porte-fenêtre façade est	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Fibreux	Beige, Blanc	14	P23* N	/	AN	Mastic de vitrage fenêtre façade est	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	25	P42* N	/	AN	Peintures fenêtres basses	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	26	P43* N	/	AN	Peintures porte-fenêtre	Non
Extérieurs -> Façades	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	27	P44* N	/	AN	Peintures fenêtres hautes	Non
Extérieurs -> Toitures	Toitures	Plaques en fibres-ciment	Dur, Fibreux	Gris	21	Idem P 36	/	AN	/	Oui

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
17	Plafonds	Bandes calicot	28 m ²
18	Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot	3 m ²
21	Toitures	Plaques en fibres-ciment	1400 m ²
11	Conduits	Conduits	3 ml
12	Conduits	Conduits	4 U
24	Conduits	Conduits	1 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> Local 01	/
RDC -> Local 02	/
RDC -> Local 03	/
RDC -> Local 04	/
RDC -> Local 05	/
RDC -> Local 06	/
RDC -> Local 07	/
RDC -> Local 08	/
RDC -> Local 09	/
RDC -> Local 10	/
RDC -> Local 11	/
RDC -> Local 12	/
RDC -> Local 13	/
RDC -> Local 14	/
RDC -> Local 15	/
RDC -> Local 16	/
RDC -> Local 17	/
RDC -> Local 18	/
RDC -> Local 19	/
R+1	/
R+1 -> Local 20	/
R+1 -> Local 21	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> Local 22	/
R+1 -> Local 23	/
R+1 -> Local 24	/
R+1 -> Local 25	/
Extérieurs	/
Extérieurs -> Façades	/
Extérieurs -> Toitures	/

7.2. Photos prélèvements

P39	ZPSO 23
RDC -> Local 01	
	
Charpentes -> Peintures décoratives	

P21	ZPSO 12
RDC -> Local 02	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P14	ZPSO 8
RDC -> Local 02	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P9	ZPSO 5
RDC -> Local 03	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P11	ZPSO 6
RDC -> Local 03	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P31	ZPSO 18
RDC -> Local 04	
	
Gaines et coffres horizontaux -> Bandes calicot	

P29	ZPSO 17
RDC -> Local 04	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P30	ZPSO 18
RDC -> Local 04	
	
Gaines et coffres horizontaux -> Bandes calicot	

P1	ZPSO 1
RDC -> Local 04	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P2	ZPSO 1
RDC -> Local 04	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P8	ZPSO 4
RDC -> Local 04	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P27	ZPSO 16
RDC -> Local 04	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P28	ZPSO 17
RDC -> Local 05	
	
Plafonds -> Bandes calicot	

P32	ZPSO 19
RDC -> Local 05	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P6	ZPSO 3
RDC -> Local 06	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P5	ZPSO 3
RDC -> Local 07	
	
Revêtements de sol -> Peintures de sol Sols coulés à base ciment	

P7	ZPSO 4
RDC -> Local 07	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P26	ZPSO 16
RDC -> Local 07	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P37	ZPSO 22
RDC -> Local 09	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P3	ZPSO 2
RDC -> Local 10	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P4	ZPSO 2
RDC -> Local 10	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Colles non bitumineuses Ragréages	

P33	ZPSO 19
RDC -> Local 10	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

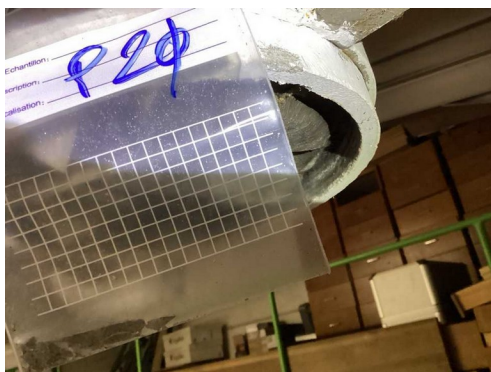
P24	ZPSO 15
RDC -> Local 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P25	ZPSO 15
RDC -> Local 11	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage Joints de carrelage	

P38	ZPSO 22
RDC -> Local 11	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P10	ZPSO 5
RDC -> Local 14	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P12	ZPSO 6
RDC -> Local 14	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés Peinture	

P20	ZPSO 11
RDC -> Local 16	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

P34	ZPSO 20
RDC -> Local 17	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P35	ZPSO 20
RDC -> Local 17	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P15	ZPSO 8
RDC -> Local 18	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P13	ZPSO 7
R+1 -> Local 21	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

P40	ZPSO 23
R+1 -> Local 22	
	
Charpentes -> Peintures décoratives	

P36	ZPSO 21
R+1 -> Local 22	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	

P16	ZPSO 9
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

P17	ZPSO 9
Extérieurs -> Façades	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs	

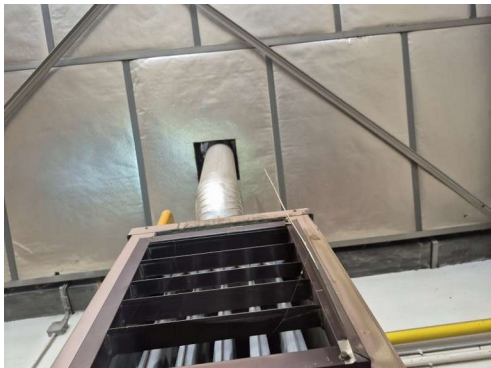
P18	ZPSO 10
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P19	ZPSO 10
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

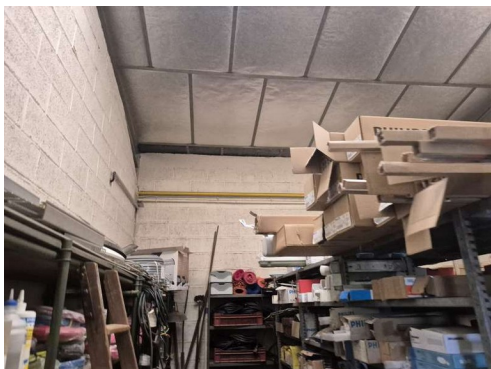
P22	ZPSO 13
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P23	ZPSO 14
Extérieurs -> Façades	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

7.3. Photos sondages

S9	ZPSO 29
RDC -> Local 03	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S4	ZPSO 31
RDC -> Local 04	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S8	ZPSO 7
RDC -> Local 12	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	

S2	ZPSO 29
RDC -> Local 14	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S6	ZPSO 31
RDC -> Local 14	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S1	ZPSO 28
RDC -> Local 18	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S7	ZPSO 21
R+1 -> Local 20	
	
Toitures -> Plaques en fibres-ciment (Liste B)	

S10	ZPSO 28
R+1 -> Local 25	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S3	ZPSO 30
Extérieurs -> Façades	
	
Conduits en façade -> Conduits d'eaux pluviales (Liste B)	

S5	ZPSO 32
Extérieurs -> Façades	
	
Conduits en façade -> Conduits d'eaux pluviales (Liste B)	

7.4. Photos observations

RDC -> Local 03		OBS 2
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Menuiseries extérieures		
		Observation : Absence de joint de pré cadre
RDC -> Local 16		OBS 1
02 - Parois verticales extérieures et façades		
Menuiseries extérieures		
		Observation : Absence de joint de pré cadre

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI1556 Version 017

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOURDONNAY Romain

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 25/10/2022 - Date d'expiration : 24/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 25/10/2022 - Date d'expiration : 24/10/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 20/06/2023 - Date d'expiration : 19/06/2030
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 20/06/2023 - Date d'expiration : 19/06/2030
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 07/04/2021 - Date d'expiration : 06/04/2028
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 27/06/2021 - Date d'expiration : 26/06/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 16/07/2022 - Date d'expiration : 15/07/2029

En foi de quoy ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BVS- MULTI SITES - SITE DE RENNES 65 rue de Saint Briec 35000 RENNES	
Localisation RDC	Date visite	Du 14/08/2025 au 14/08/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	27677678/S1/1
	Planche	1 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		
Bandes calicot Bandes calicot Conduits (Liste B) Conduits (Liste B) Conduits (Liste B)		
LEGENDE Prélèvement positif Prélèvement négatif Sondage Inaccessibilité Observation		

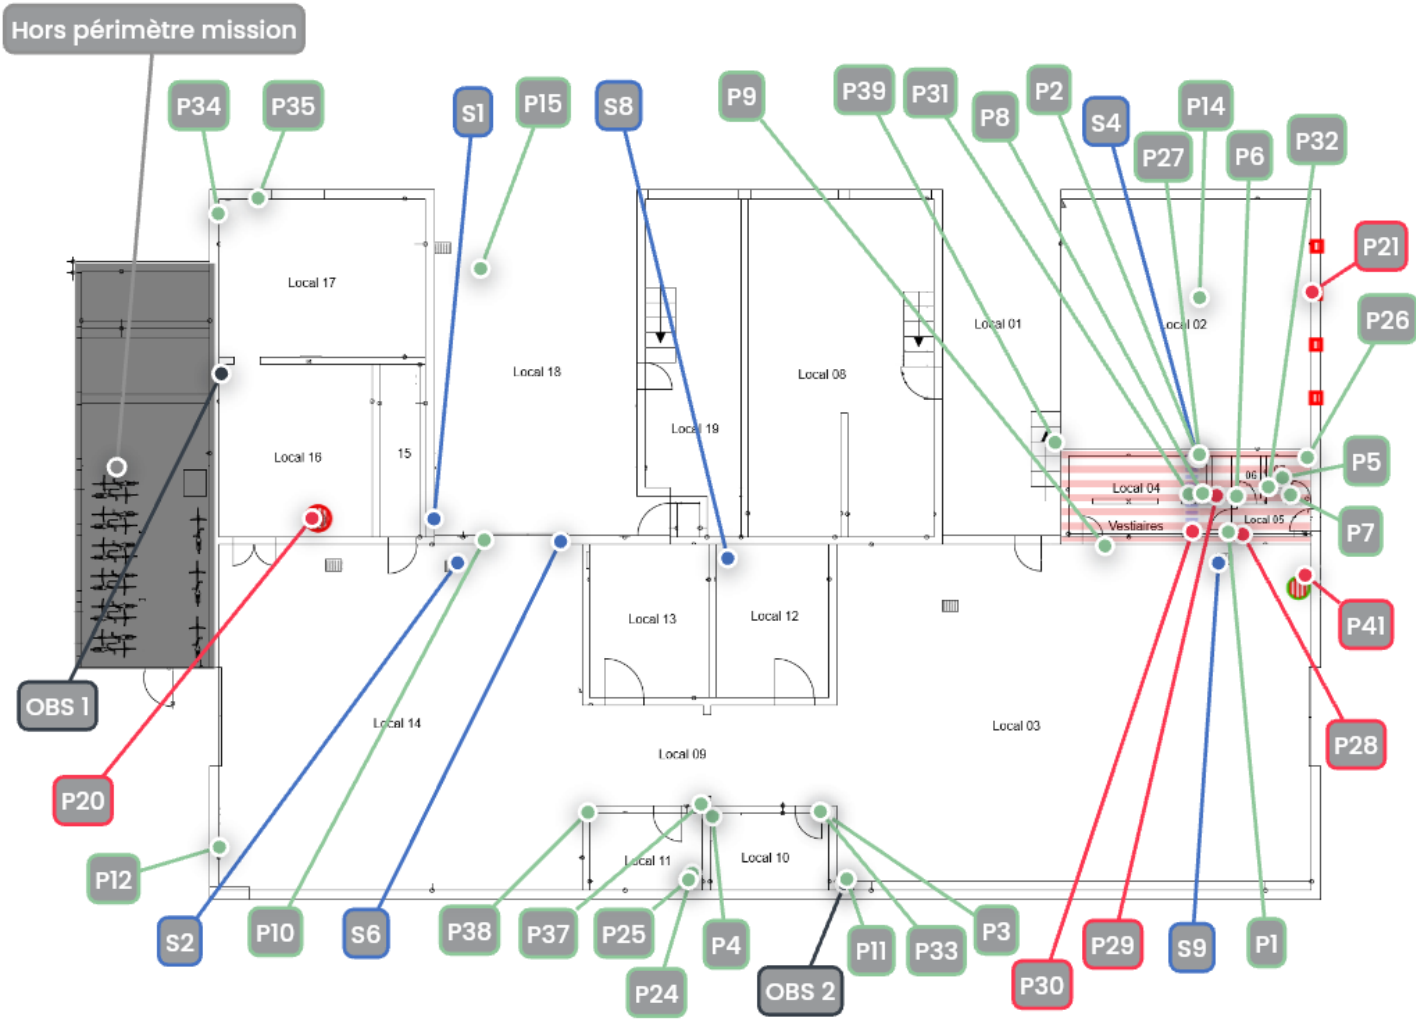
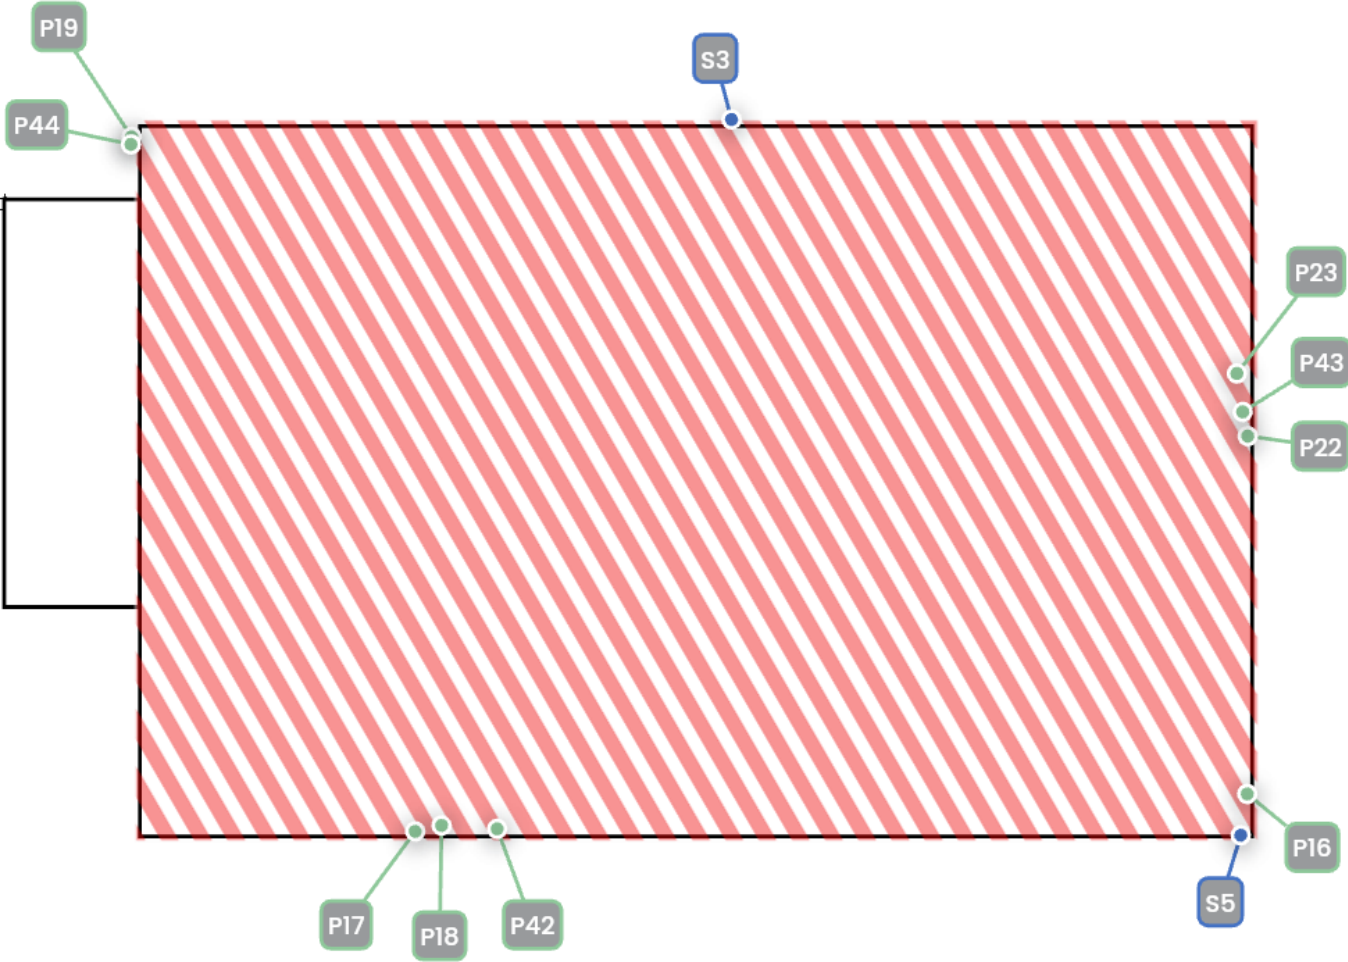


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BVS- MULTI SITES – SITE DE RENNES 65 rue de Saint Briec 35000 RENNES	
Localisation R+1	Date visite	Du 14/08/2025 au 14/08/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	27677678/S1/1
	Planche	2 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	BVS- MULTI SITES – SITE DE RENNES 65 rue de Saint Briec 35000 RENNES	
Localisation Extérieurs	Date visite	Du 14/08/2025 au 14/08/2025
	Auteur	Romain BOURDONNAY
	N° dossier	27677678/S1/1
	Planche	3 / 3
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Plaques en fibres-ciment (Liste B)		



LEGENDE	Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------	-------------------------

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Romain BOURDONNAY

Agence de Saint-Brieuc
Carré Rosengart - 16 Quai Armez
22000 SAINT BRIEUC

Notre référence : AR-25-NS-087649-01

Numéro de dossier : 25W027114

Référence de dossier : 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25W027114-001 - Référence *BV3MS2911 Réf. Prel : P1 RDC - Local 04/Revêtements de sol - (Lé/Blanc, Bleu, Rouge, Beige, Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-002 - Référence *BV3MS2912 Réf. Prel : P2 RDC - Local 04/Revêtements de sol - (Lé/Blanc, Bleu, Rouge, Beige, Jaune)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-003 - Référence *BV3MS2913 Réf. Prel : P3 RDC - Local 10/Revêtements de sol - (Lé/Beige, Blanc, Jaune, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-004 - Référence *BV3MS2914 Réf. Prel : P4 RDC - Local 10/Revêtements de sol - (Lé/Beige, Blanc, Jaune, Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-005 - Référence *BV3MS2915 Réf. Prel : P5 RDC - Local 07/Revêtements de sol - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-006 - Référence *BV3MS2916 Réf. Prel : P6 RDC - Local 06/Revêtements de sol - (Décoratif/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-007 - Référence BV3MS2917 Réf. Prel : P7 RDC - Local 07/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-008 - Référence BV3MS2918 Réf. Prel : P8 RDC - Local 04/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-009 - Référence BV3MS2919 Réf. Prel : P9 RDC - Local 03/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-010 - Référence BV3MS2920 Réf. Prel : P10 RDC - Local 14/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-011 - Référence BV3MS2921 Réf. Prel : P11 RDC - Local 03/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-012 - Référence BV3MS2922 Réf. Prel : P12 RDC - Local 14/Murs et cloisons maçonnerées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-013 - Référence BV3MS2923 Réf. Prel : P13 R+1 - Local 21/Faux plafonds - (Laine de verre, Aluminium, Fibreux/Jaune, Gris, Noir), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-014 - Référence BV3MS2924 Réf. Prel : P14 RDC - Local 02/Revêtements de sol - (Chape, Ciment, Dur, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-015 - Référence BV3MS2925 Réf. Prel : P15 RDC - Local 18/Revêtements de sol - (Chape, Ciment, Dur, Compact/Gris, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-016 - Référence BV3MS2926 Réf. Prel : P16 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint/Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-017 - Référence BV3MS2927 Réf. Prel : P17 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint/Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-018 - Référence BV3MS2928 Réf. Prel : P18 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux, Dur/Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-019 - Référence BV3MS2929 Réf. Prel : P19 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux, Dur/Gris, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-020 - Référence BV3MS2930 Réf. Prel : P20 RDC - Local 16/Conduits - (Fibres-ciment/Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-021 - Référence BV3MS2931 Réf. Prel : P21 RDC - Local 02/Conduits - (Fibres-ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-022 - Référence BV3MS2932 Réf. Prel : P22 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-023 - Référence BV3MS2933 Réf. Prel : P23 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-024 - Référence BV3MS2934 Réf. Prel : P24 RDC - Local 11/Revêtements de sol - (Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-025 - Référence BV3MS2935 Réf. Prel : P25 RDC - Local 11/Revêtements de sol - (Ciment/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-026 - Référence BV3MS2936 Réf. Prel : P26 RDC - Local 07/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-027 - Référence BV3MS2937 Réf. Prel : P27 RDC - Local 04/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris, Blanc, Beige), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-028 - Référence BV3MS2938 Réf. Prel : P28 RDC - Local 05/Plafonds - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-029 - Référence BV3MS2939 Réf. Prel : P29 RDC - Local 06/Plafonds - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-030 - Référence BV3MS2940 Réf. Prel : P30 RDC - Local 04/Gaines et coffres horizontaux - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-031 - Référence BV3MS2941 Réf. Prel : P31 RDC - Local 04/Gaines et coffres horizontaux - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-032 - Référence BV3MS2942 Réf. Prel : P32 RDC - Local 05/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-033 - Référence BV3MS2943 Réf. Prel : P33 RDC - Local 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-034 - Référence BV3MS2944 Réf. Prel : P34 RDC - Local 17/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-035 - Référence BV3MS2945 Réf. Prel : P35 RDC - Local 17/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-036 - Référence BV3MS2946 Réf. Prel : P36 R+1 - Local 22/Toitures - (Dur, Fibreux/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-037 - Référence BV3MS2947 Réf. Prel : P37 RDC - Local 09/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-038 - Référence BV3MS2948 Réf. Prel : P38 RDC - Local 11/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-039 - Référence BV3MS2949 Réf. Prel : P39 RDC - Local 01/Charpentes - (Epais/Gris, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-040 - Référence BV3MS2950 Réf. Prel : P40 R+1 - Local 22/Charpentes - (Epais/Gris, Orange), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-041 - Référence BV3MS2951 Réf. Prel : P41 RDC - Local 03/Conduits - (Fibres-ciment, Ciment/Gris, Beige, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-042 - Référence BV3MS2952 Réf. Prel : P42 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-043 - Référence BV3MS2953 Réf. Prel : P43 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

- N° 25W027114-044 - Référence BV3MS2954 Réf. Prel : P44 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre

F-44308 Nantes

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT OUEST SAS

Sous-traitance Bâtiment Nantes

EUROFINS ABO

Site de la Géraudière

Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01	Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42	Page 1/14
Dossier N° : 25K027782	Date de réception : 27/08/2025	Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782	Référence de suivi du dossier N° : 25W027114	
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025	Date de réception : 26/08/2025	
Date d'analyse : 28/08/2025		
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25W027114-001 - BV3MS2911 Réf. Prel : P1 RDC - Local 04/Revêtements de sol - (Lé/Blanc, Bleu, Rouge, Beige, Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (de différentes couleurs)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (gris) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25W027114-002 - BV3MS2912 Réf. Prel : P2 RDC - Local 04/Revêtements de sol - (Lé/Blanc, Bleu, Rouge, Beige, Jaune)	Matériau souple de type dalle de sol (de différentes couleurs)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 2/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25W027114-003 - BV3MS2913 Réf. Prel : P3 RDC - Local 10/Revêtements de sol - (Lé/Beige, Blanc, Jaune, Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	25W027114-004 - BV3MS2914 Réf. Prel : P4 RDC - Local 10/Revêtements de sol - (Lé/Beige, Blanc, Jaune, Noir)	Matériau souple de type revêtement de sol (de différentes couleurs)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25W027114-005 - BV3MS2915 Réf. Prel : P5 RDC - Local 07/Revêtements de sol - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01	Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42	Page 3/14
Dossier N° : 25K027782	Date de réception : 27/08/2025	Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782	Référence de suivi du dossier N° : 25W027114	
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025	Date de réception : 26/08/2025	
Date d'analyse : 28/08/2025		
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S/1/1/1_27677678/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25W027114-006 - BV3MS2916 Réf. Prel : P6 RDC - Local 06/Revêtements de sol - (Décoratif/Gris)	Matériau de type peinture (gris) + (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	25W027114-007 - BV3MS2917 Réf. Prel : P7 RDC - Local 07/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25W027114-008 - BV3MS2918 Réf. Prel : P8 RDC - Local 04/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25W027114-009 - BV3MS2919 Réf. Prel : P9 RDC - Local 03/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) (cimenteux)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 4/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S/1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25W027114-010 - BV3MS2920 Réf. Prel : P10 RDC - Local 14/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25W027114-011 - BV3MS2921 Réf. Prel : P11 RDC - Local 03/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25W027114-012 - BV3MS2922 Réf. Prel : P12 RDC - Local 14/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	25W027114-013 - BV3MS2923 Réf. Prel : P13 R+1 - Local 21/Faux plafonds - (Laine de verre, Aluminium, Fibreux/Jaune, Gris, Noir)	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type aluminium (gris)	MOLP * / D5UE	- / - *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 5/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
014	25W027114-014 - BV3MS2924 Réf. Prel : P14 RDC - Local 02/Revêtements de sol - (Chape, Ciment, Dur, Compact/Gris, Beige)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25W027114-015 - BV3MS2925 Réf. Prel : P15 RDC - Local 18/Revêtements de sol - (Chape, Ciment, Dur, Compact/Gris, Beige)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur (jaune)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	25W027114-016 - BV3MS2926 Réf. Prel : P16 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint/Gris, Blanc)	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 6/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
017	25W027114-017 - BV3MS2927 Réf. Prel : P17 Extérieurs - Façades/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Epais, Granuleux, Lissé, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (cémenteux)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25W027114-018 - BV3MS2928 Réf. Prel : P18 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux, Dur/Gris, Blanc)	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	25W027114-019 - BV3MS2929 Réf. Prel : P19 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Compact, Fibreux, Dur/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020 (1)	25W027114-020 - BV3MS2930 Réf. Prel : P20 RDC - Local 16/Conduits - (Fibres-ciment/Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 7/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
021	25W027114-021 - BV3MS2931 Réf. Prel : P21 RDC - Local 02/Conduits - (Fibres-ciment/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	25W027114-022 - BV3MS2932 Réf. Prel : P22 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25W027114-023 - BV3MS2933 Réf. Prel : P23 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Fibreux, Compact/Beige, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	25W027114-024 - BV3MS2934 Réf. Prel : P24 RDC - Local 11/Revêtements de sol - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) (blanc) en traces(ii)	MET * / ZV8V	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 8/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S/1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	25W027114-025 - BV3MS2935 Réf. Prel : P25 RDC - Local 11/Revêtements de sol - (Ciment/Beige, Blanc, Gris)	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur de type joint (gris)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25W027114-026 - BV3MS2936 Réf. Prel : P26 RDC - Local 07/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	25W027114-027 - BV3MS2937 Réf. Prel : P27 RDC - Local 04/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Peint/Gris, Blanc, Beige)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
028	25W027114-028 - BV3MS2938 Réf. Prel : P28 RDC - Local 05/Plafonds - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 9/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	25W027114-029 - BV3MS2939 Réf. Prel : P29 RDC - Local 06/Plafonds - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (brillant)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
030	25W027114-030 - BV3MS2940 Réf. Prel : P30 RDC - Local 04/Gaines et coffres horizontaux - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	25W027114-031 - BV3MS2941 Réf. Prel : P31 RDC - Local 04/Gaines et coffres horizontaux - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25W027114-032 - BV3MS2942 Réf. Prel : P32 RDC - Local 05/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01	Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42	Page 10/14
Dossier N° : 25K027782	Date de réception : 27/08/2025	Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782	Référence de suivi du dossier N° : 25W027114	
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025	Date de réception : 26/08/2025	
Date d'analyse : 28/08/2025		
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	25W027114-033 - BV3MS2943 Réf. Prel : P33 RDC - Local 10/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25W027114-034 - BV3MS2944 Réf. Prel : P34 RDC - Local 17/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	25W027114-035 - BV3MS2945 Réf. Prel : P35 RDC - Local 17/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Plâtreux, Ciment/Beige, Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	25W027114-036 - BV3MS2946 Réf. Prel : P36 R+1 - Local 22/Toitures - (Dur, Fibreux/Gris)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 11/14
Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
Date d'analyse : 28/08/2025
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
037	25W027114-037 - BV3MS2947 Réf. Prel : P37 RDC - Local 09/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
038	25W027114-038 - BV3MS2948 Réf. Prel : P38 RDC - Local 11/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Papier, Plâtre, Toile/Beige, Blanc, Jaune)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) + (blanc)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
039	25W027114-039 - BV3MS2949 Réf. Prel : P39 RDC - Local 01/Charpentes - (Epais/Gris, Orange)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01 Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42 Page 12/14
 Dossier N° : 25K027782 Date de réception : 27/08/2025 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782 Référence de suivi du dossier N° : 25W027114
 Reçu au laboratoire le : 27/08/2025 Date de réception : 26/08/2025
 Date d'analyse : 28/08/2025
 Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
040 (2)	25W027114-040 - BV3MS2950 Réf. Prel : P40 R+1 - Local 22/Charpentes - (Épais/Gris, Orange)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
041	25W027114-041 - BV3MS2951 Réf. Prel : P41 RDC - Local 03/Conduits - (Fibres-ciment, Ciment/Gris, Beige, Blanc)	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
042 (3)	25W027114-042 - BV3MS2952 Réf. Prel : P42 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Épais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (2)	25W027114-043 - BV3MS2953 Réf. Prel : P43 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Épais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MOLP * / D5UE	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01	Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42	Page 13/14
Dossier N° : 25K027782	Date de réception : 27/08/2025	Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782	Référence de suivi du dossier N° : 25W027114	
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025	Date de réception : 26/08/2025	
Date d'analyse : 28/08/2025		
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	25W027114-044 - BV3MS2954 Réf. Prel : P44 Extérieurs - Façades/Menuiseries extérieures - (Epais/Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / EU83	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibres-ciment gris ». Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (2) La totalité de l'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
- (ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
 4 Chemin des Maures , CS 60134
 33172 Gradignan, FRANCE
 Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5840
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-KC-069981-01	Date d'émission de rapport : 01/09/2025 23:42	Page 14/14
Dossier N° : 25K027782	Date de réception : 27/08/2025	Date d'analyse : 28/08/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25K027782	Référence de suivi du dossier N° : 25W027114	
Reçu au laboratoire le : 27/08/2025	Date de réception : 26/08/2025	
Date d'analyse : 28/08/2025		
Référence dossier Client: 1510797476/27677678/S1/1/1_27677678/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le commanditaire. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n° 0238 du 13 octobre 2022, texte n° 10),), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN° 0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Nathan Pouquette
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

