




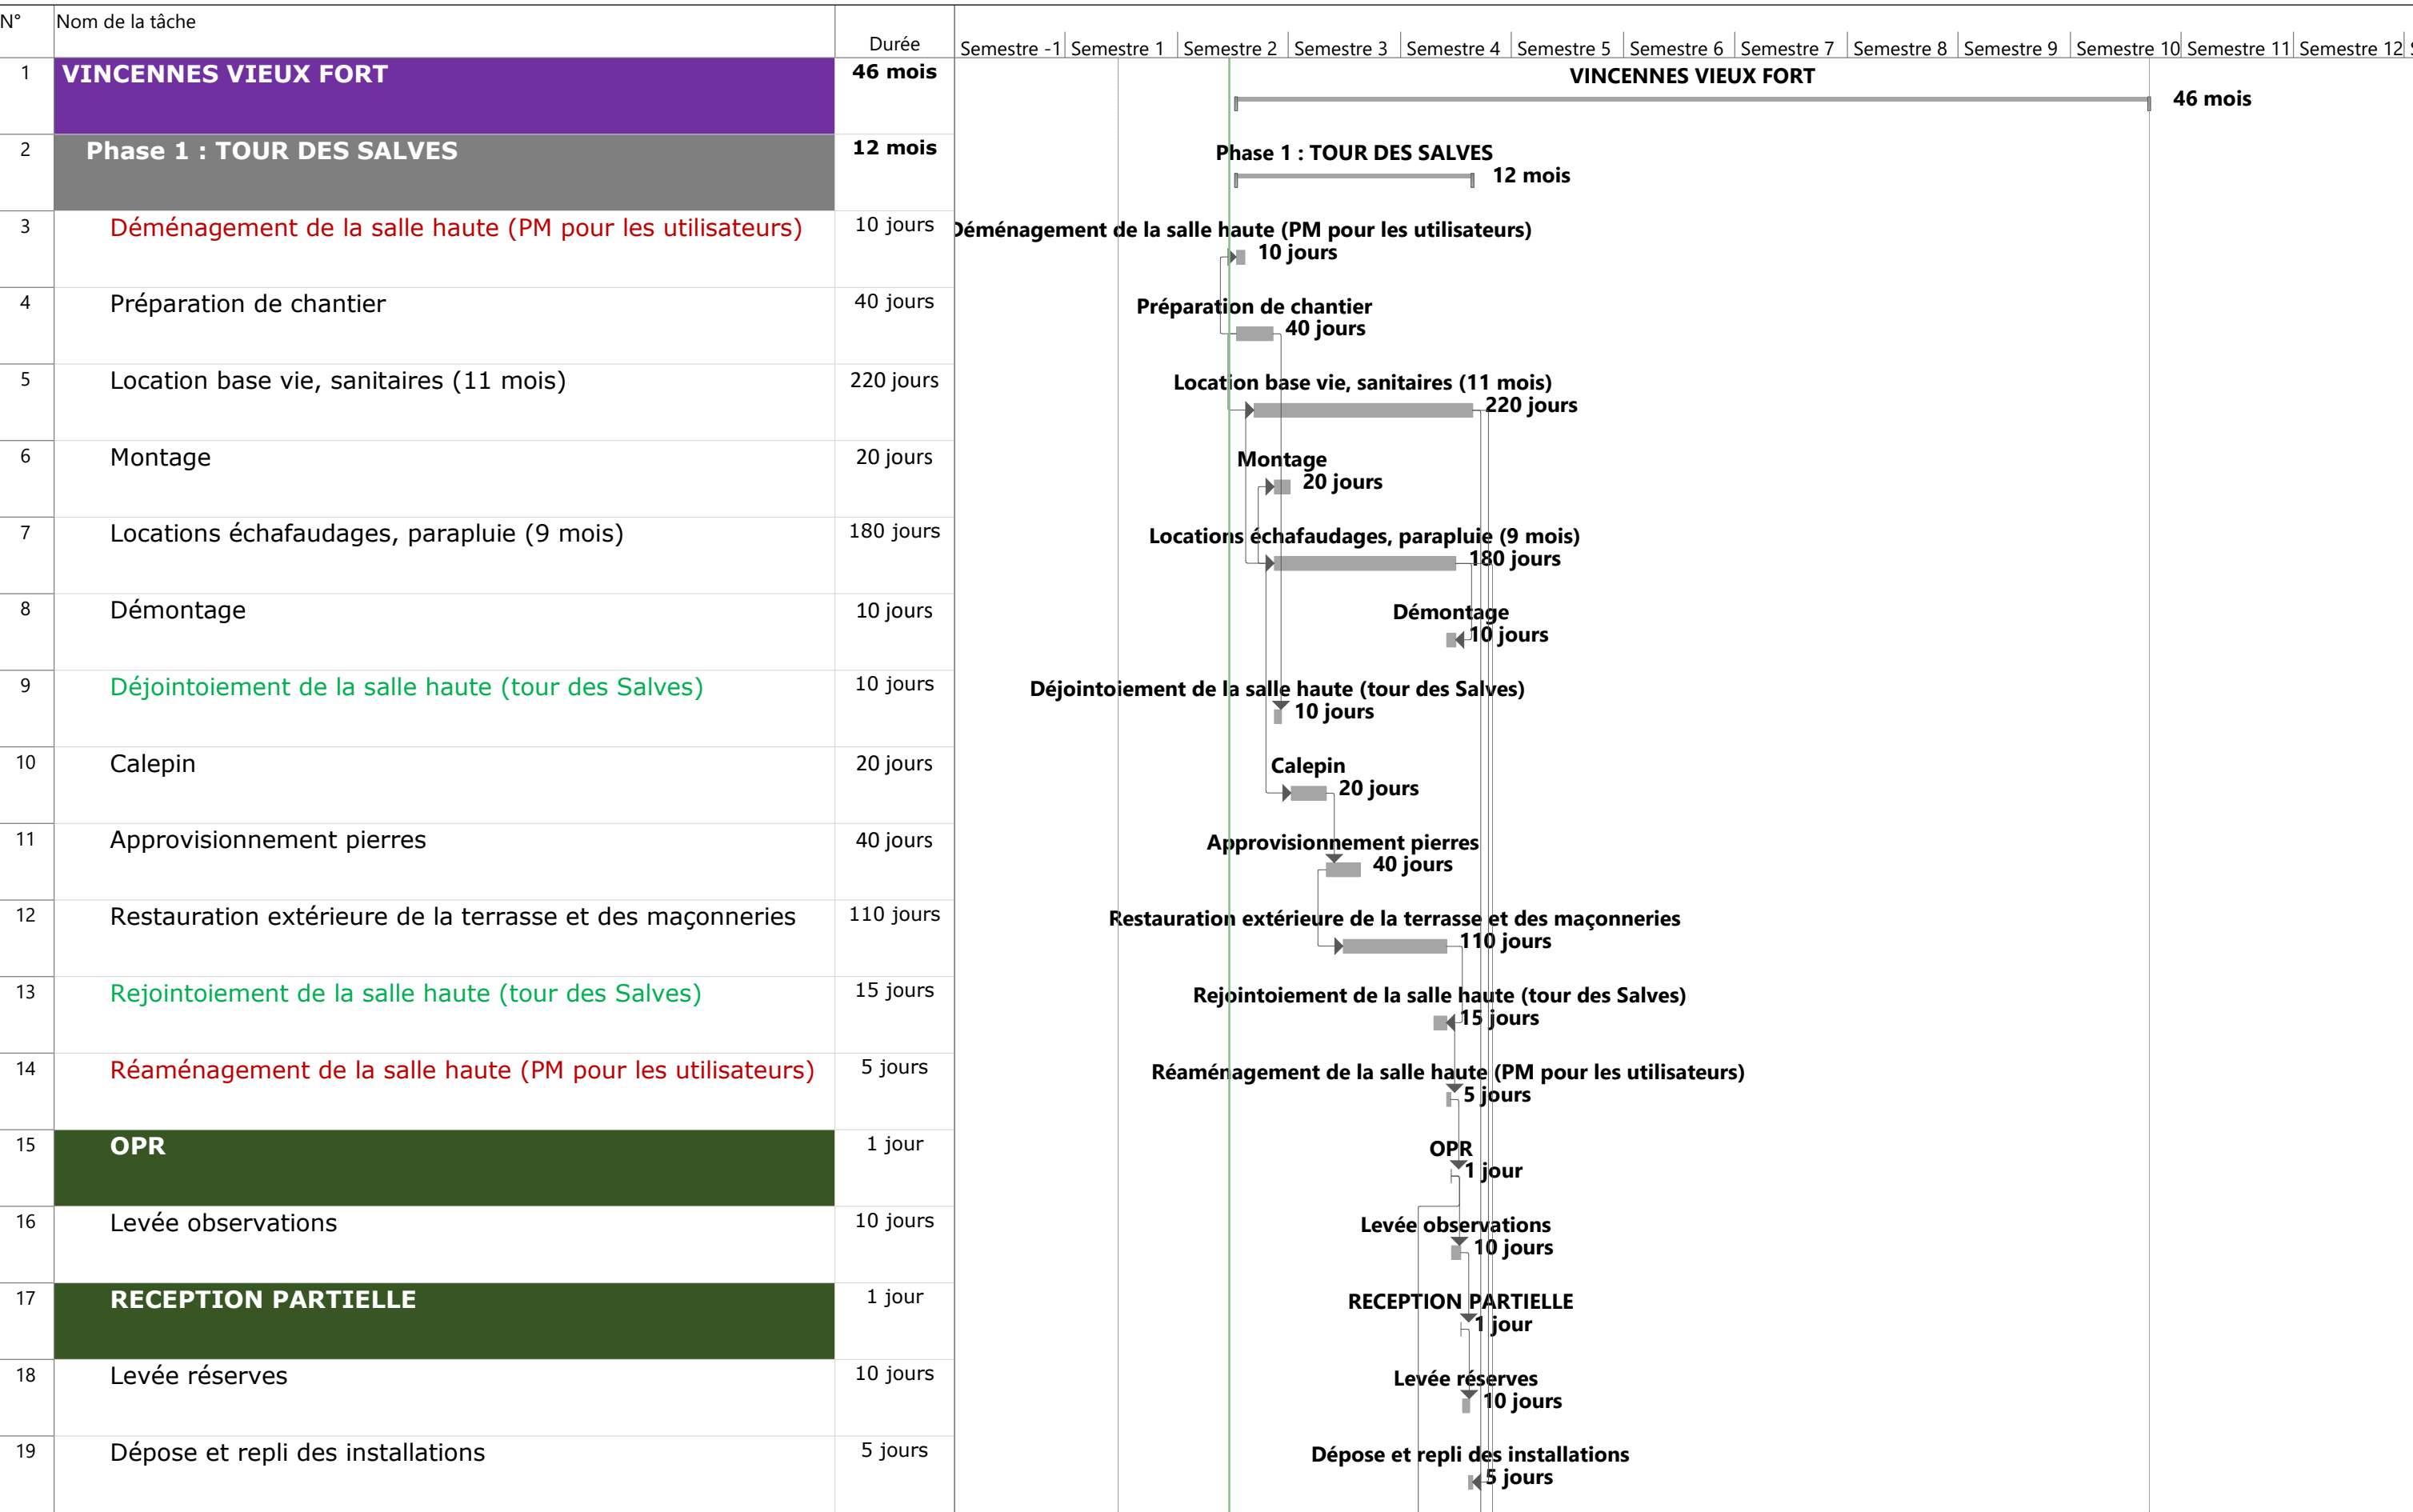

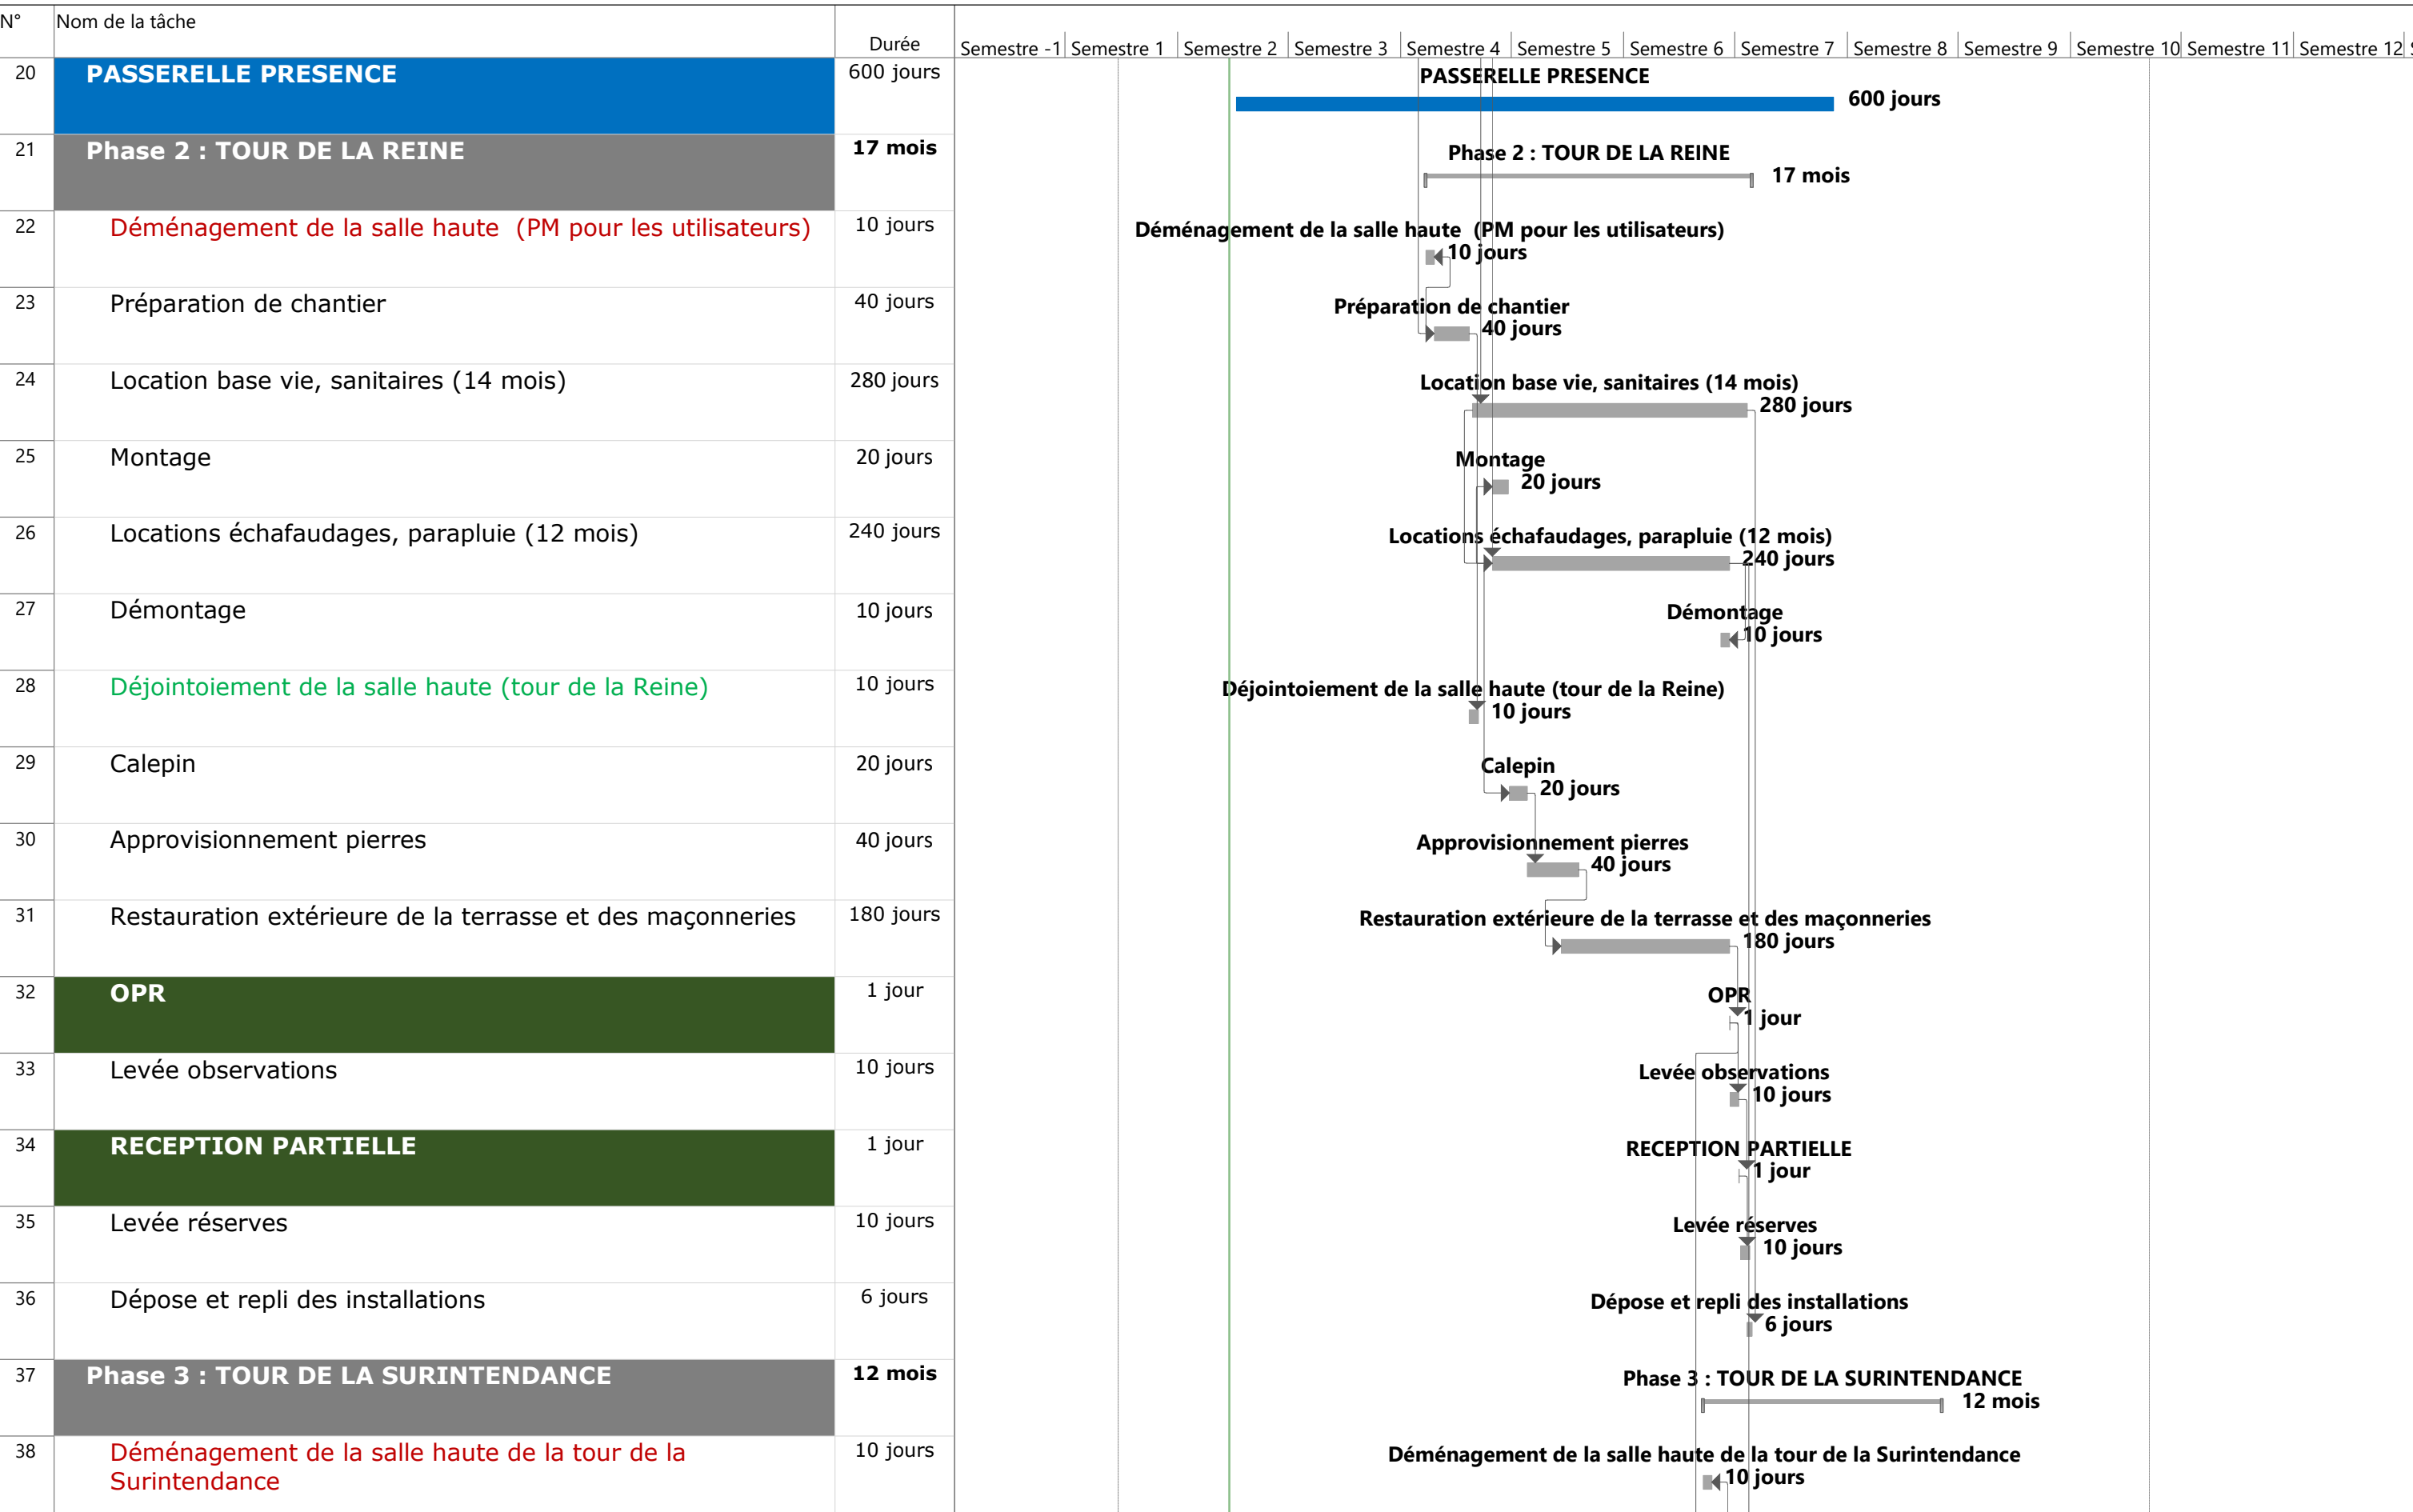

N°	Nom de la tâche	Durée	Semestre -1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	Semestre 10	Semestre 11	Semestre 12	S
39	Préparation de chantier	40 jours														
40	Location base vie, sanitaires (10 mois)	200 jours														
41	Montage	20 jours														
42	Locations échafaudages, parapluie (8 mois)	160 jours														
43	Démontage	10 jours														
44	Bâchage de la tour du Diable	20 jours														
45	Déjointoiement de la salle haute (tour de la Surintendance)	10 jours														
46	Calepin	20 jours														
47	Approvisionnement pierres	40 jours														
48	Restauration extérieure de la terrasse et des maçonneries	108 jours														
49	Rejointoiement de la salle haute (tour de la Reine)	15 jours														
50	Réaménagement de la salle haute (tour de la Reine)	5 jours														
51	OPR	1 jour														
52	Levée observations	10 jours														
53	RECEPTION PARTIELLE	1 jour														
54	Levée réserves	10 jours														
55	Dépose et repli des installations	5 jours														
56	Phase 4 : TOUR DU DIABLE	12,5 mois														
57	Déménagement de la salle haute (tour du Diable)	10 jours														

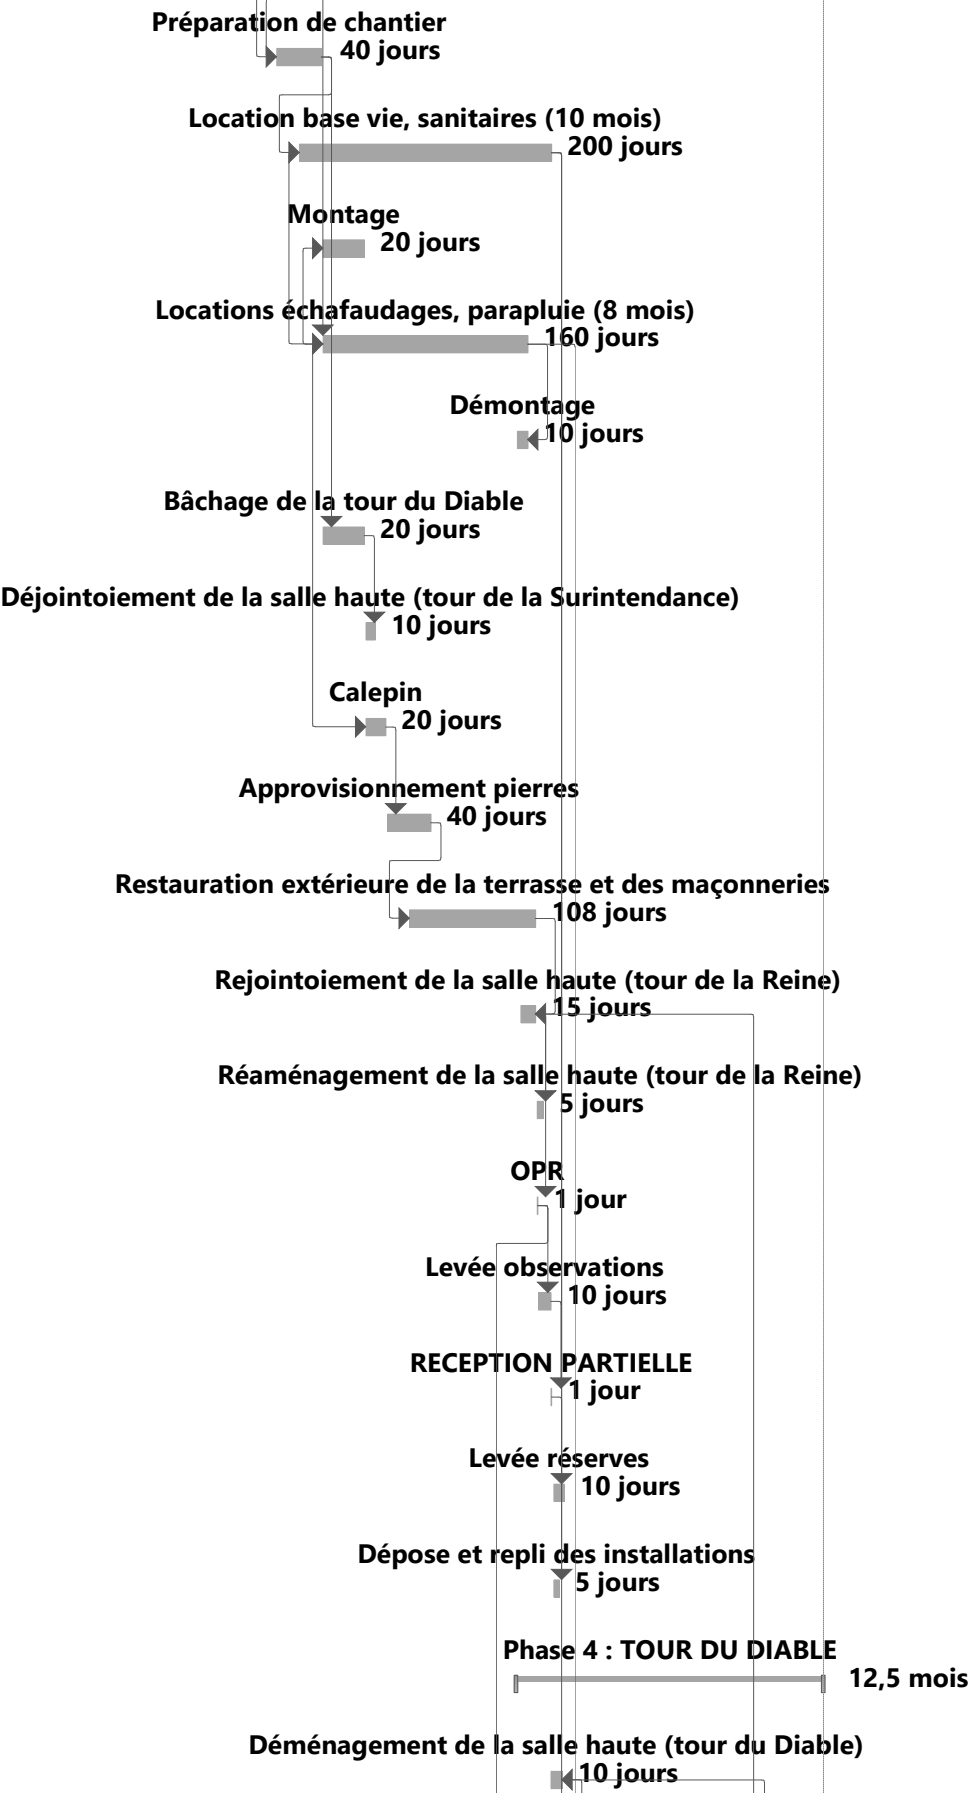

N°	Nom de la tâche	Durée	Semestre -1	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	Semestre 10	Semestre 11	Semestre 12	S
58	Préparation de chantier	40 jours														
59	Location base vie, sanitaires (10 mois)	200 jours														
60	Montage	20 jours														
61	Locations échafaudages, parapluie (8 mois)	160 jours														
62	Démontage	10 jours														
63	Calepin	20 jours														
64	Approvisionnement pierres	40 jours														
65	Restauration extérieure de la terrasse	117 jours														
66	Déjointoiement de la salle haute (tour du Diable)	10 jours														
67	Rejointoiement de la salle haute de la tour de la Surintendance	10 jours														
68	Réaménagement de la salle haute de la tour de la Surintendance	5 jours														
69	Rejointoiement de la salle haute de la tour du Diable	10 jours														
70	Réaménagement de la salle haute de la tour du Diable	5 jours														
71	OPR	1 jour														
72	Levée observations	10 jours														
73	RECEPTION PARTIELLE FINALE	1 jour														
74	Levée réserves	10 jours														
75	Dépose et repli des installations	5 jours														

