



APAVE
AGENCE DE LIMOGES
ZI Nord
15 rue Léon Serpollet BP 11584
87022 LIMOGES CEDEX
N° SIRET : 90386907100170

DONNEUR D'ORDRE
CH BRIVE
1, Bd du Dr VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
CONTACT : MR DELENTE



Rapport de mission de repérage
des matériaux et produits
contenant de l'amiante avant
réalisation de travaux dans un
immeuble bâti

PAVILLON BAT 71



Numéro d'offre : **3324920.2**
Numéro de contrat : **C26135861**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260188633**
Date : **10/04/2026**

Lieu d'intervention :
PAVILLON BAT 71

**1 boulevard DU DOCTEUR
VERLHAC
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE**

Destinataire rapport :
CH BRIVE Mr DELENTE

Date d'intervention :
Du **26/03/2026** au **27/03/2026**

Intervenant : **Monsieur Cyril PERE**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 86 pages*

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse :	1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	Numéro de Lot :	000BR - 0328
Étage :		Référence Cadastre :	Antérieur au 1er juillet 1997
Bâtiment :		Date du Permis de Construire :	Non communiquée
Nature du bâtiment :	Maison individuelle	Date de construction :	

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	CH BRIVE Mr DELENTE
Adresse :	1, Bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom :	CH BRIVE Mr DELENTE
Adresse :	1, Bd du Dr VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par :	PERE Cyril	Laboratoire d'Analyses :	Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest
N° certification :	1747	Adresse laboratoire :	4 Chemin des Maures 33170 Gradignan
Date d'obtention :	10/05/2023	Numéro d'accréditation :	1-5840
Organisme :	LCP CERTIFICATION DE PERSONNES	Organisme d'assurance professionnelle :	Allianz Global Corporate & Specialty SE
Adresse :	30 Avenue de Canteranne 33600 PESSAC	Adresse assurance :	1 cours Michelet - CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex
Date de la commande :	27/03/2026	N° de contrat d'assurance :	FRL003861
Accompagnateur :	MARIE-NEIGE LECHAT	Date de validité :	31/12/2026

1.4 REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Référence :

Nature des travaux envisagés : Le programme de travaux ne nous ayant pas été fourni, des investigations complémentaires seront à réaliser dès que ce dernier nous aura été communiqué.

1.5 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Il sera nécessaire de faire des investigations complémentaires car certains éléments non pas pu être contrôler a la demande du client :

Dormant des fenêtres bois

Plot de colle de fixation des plaques de plâtre

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DU REPERAGE.....	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AFFECTES PAR LES TRAVAUX	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON REALISEES	6
MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	6
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	6
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	7
OBJECTIF	7
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	7
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	7
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	8
PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE	8
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE	8
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	25
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE BATI	25
PRECONISATIONS	25
ANNEXE CROQUIS	26
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	33
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	70
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES.....	80
ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	81
ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	83
ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE	84
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	85

2. RESULTATS DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

2.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante affectés par les travaux

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Séjour	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P003)		
RDC	Toilettes	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P018)		Z002
RDC	Salle d'eau 1	Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P021)		
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P018 - idem)		Z002
Extérieur	Toiture	Ardoises	Ardoises fibres-ciment	Résultat d'analyse (P034)		

2.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Entrée	Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P001)		
		Revêtement de murs	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z001
RDC	Séjour	Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P002)		
		Revêtement de murs	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P004)		Z001
RDC	Cuisine	Revêtement de murs	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S006	Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P006)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P007)		
		Revêtements de plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P008)		
RDC	Dégagement 1	Revêtement de murs	Enduit Plâtre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S007	Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P011 - idem)		Z003
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S008	Z001
		Revêtements de	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
		plafond		(P010)		
		Revêtement de murs	Calicots	Résultat d'analyse (P009)		
RDC	Cellier	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P013)		
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P014)		
		Revêtements de plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P015)		
RDC	Buanderie	Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol - Sol souple	Résultat d'analyse (P016)		
RDC	Toilettes	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S002	Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P017)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P019)		
		Revêtements de plafond	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P020)		
RDC	Salle d'eau 1	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z001
RDC	Chambre 1	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P005)		Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P022)		
RDC	Chambre 2	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)	S001	Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P023)		
RDC	Salle de Bains	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P024)		
		Revêtement de murs	Colle de faïence	Résultat d'analyse (P025)		
RDC	Circulation	Revêtement de murs	Enduit Platre	Résultat d'analyse (P004 - idem)		Z001
		Revêtement de sol	Colle + Reagrage de sol	Résultat d'analyse (P011)		Z003
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	Résultat d'analyse (P012)		
RDC	Chambre 3	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S003	Z004

Etage	Local	Composant	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	Réf ZPSO
RDC	Chambre 4	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P026 - idem)	S004	Z004
R+1	Dégagement 3	Revêtement de sol	Ragréage+ colle	Résultat d'analyse (P029)		Z005
		Revêtements de plafond	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P030)		
		Revêtement de murs	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P031)		
R+1	Chambre 5	Revêtement de sol	Ragréage+ colle	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z005
R+1	Salle d'eau 2	Revêtement de sol	Ragréage+ colle	Résultat d'analyse (P029 - idem)	S005	Z005
R+1	Chambre 6	Revêtement de sol	Ragréage+ colle	Résultat d'analyse (P029 - idem)		Z005
Extérieur	Façade Maison	Revêtement de murs	Enduit	Résultat d'analyse (P032)		
Extérieur	Façade Garage	Revêtement de murs	Enduit	Résultat d'analyse (P033)		
		Ardoises	Ardoises fibres-ciment	Résultat d'analyse (P035)		
RDC	Dégagement 2	Revêtement de sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P026)		Z004
		Revêtement de murs	Calicots	Résultat d'analyse (P027)		
		Revêtements de plafond	Calicots - Peinture	Résultat d'analyse (P028)		
Extérieur	Fenetre salle de bain	Fenêtre - Mastic	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P036)		

3. INVESTIGATIONS NON REALISEES

3.1 Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

3.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Il sera nécessaire de faire des investigations complémentaires car certains éléments non pas pu être contrôlés à la demande du client :

Dormant des fenêtres bois

Plot de colle de fixation des plaques de plâtre

4. COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

4.1 Objectif

Le repérage de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti est défini à l'article R. 4412-97 du Code du Travail. Il consiste à rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur d'ordre.

4.2 Références réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
 Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars 2019,
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
 Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
 Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

4.3 Conditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des visites	Objet
26/03/2026	Reperage des MPCA avant la réalisation de travaux

Documents remis :

Titre
plan RDC / R+1

Ecart(s) par rapport à la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des sondages et prélèvements au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plenums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement des travaux projetés.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

5. PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

5.1 Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Référence du programme de travaux :

Nature des travaux envisagés : Le programme de travaux ne nous ayant pas été fourni, des investigations complémentaires seront à réaliser dès que ce dernier nous aura été communiqué.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

5.2 Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Entrée 	OUI	
RDC	Séjour 	OUI	
RDC	Cuisine	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Dégagement 1 	OUI	
RDC	Cellier 	OUI	
RDC	Buanderie	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Garage	OUI	
RDC	Toilettes 	OUI	
RDC	Salle d'eau 1 	OUI	
RDC	Chambre 1	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Chambre 2 	OUI	
RDC	Salle de Bains 	OUI	
RDC	Circulation	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Chambre 3 	OUI	
RDC	Chambre 4 	OUI	
R+1	Dégagement 3	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
R+1	Chambre 5 	OUI	
R+1	Salle d'eau 2 	OUI	
R+1	Chambre 6	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
Extérieur	Façade Maison 	OUI	
Extérieur	Façade Garage 	OUI	
Extérieur	Toiture	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
			

Etage	Local / partie d'immeuble concerné par les travaux	Visitée	Justification
RDC	Dégagement 2 	OUI	
Extérieur	Fenetre salle de bain 	OUI	

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder	Matériau ou Produit	Commentaire
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités			
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment	P	
	Ardoises en fibro ciment	P	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	P	
2 - Parois verticales extérieures et Façades			
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs	M	
	Revêtements plastiques épais (RPE)	M	
	Peintures sur béton	M	
	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	M	
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants	M	
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire	P	
	Garnissage des joints de dilatation	M	
	Joints de dilatation	M	
	Couvre-joints	P	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	P	
3 - Parois verticales intérieures			
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles	P	
	Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment	P	
	Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures intumescentes	M	
4 - Plafonds et faux plafonds			
Plafonds	Flocages	P	
	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	M	
	Panneaux collés vissés ou cloués	P	
	Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)	M	
	Bandes calicot	M	
	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre	M	
	Sous couches des tissus muraux	M	
	Peintures intumescentes	M	
	Revêtements bitumineux	M	
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)	M	
	Résines	M	
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage	M	
5 - Planchers et planchers techniques			
Revêtements de sols	Dalles de sol	P	
	Nez de marche	P	
	Dalles moquettes avec entre-couche noire	P	
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples	M	
	Colles bitumineuses	M	
	Colles non bitumineuses	M	
	Moquette	M	
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)	P	
	Peintures de sol	M	
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage	M	
	Revêtements de sols sportifs	P	

Joint de dilatation et d'assemblage	P
Joint de cantonnement sur faux planchers	P
Enduit de cuvelage	M
Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment	M

6. RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :

Absence de rapports antérieurs ou non communiqués

7. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE BATI

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

8. PRECONISATIONS


L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.


Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

ANNEXE CROQUIS

		Planche de repérage		Legende : Prélèvement négatif	
Client :	Mr DELENTE		Titre :	PLAN DE REPERAGE R+1 BAT 71	
N° rapport :	T260188633		Lieu d'intervention :	1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
N° planche :	2/6	Version : 0			
Type :	Croquis		Bâtiment :		
Date :	10/04/2026		Etage :		
Intervenant :	PERE Cyril		Commentaire :		
Origine du plan :					

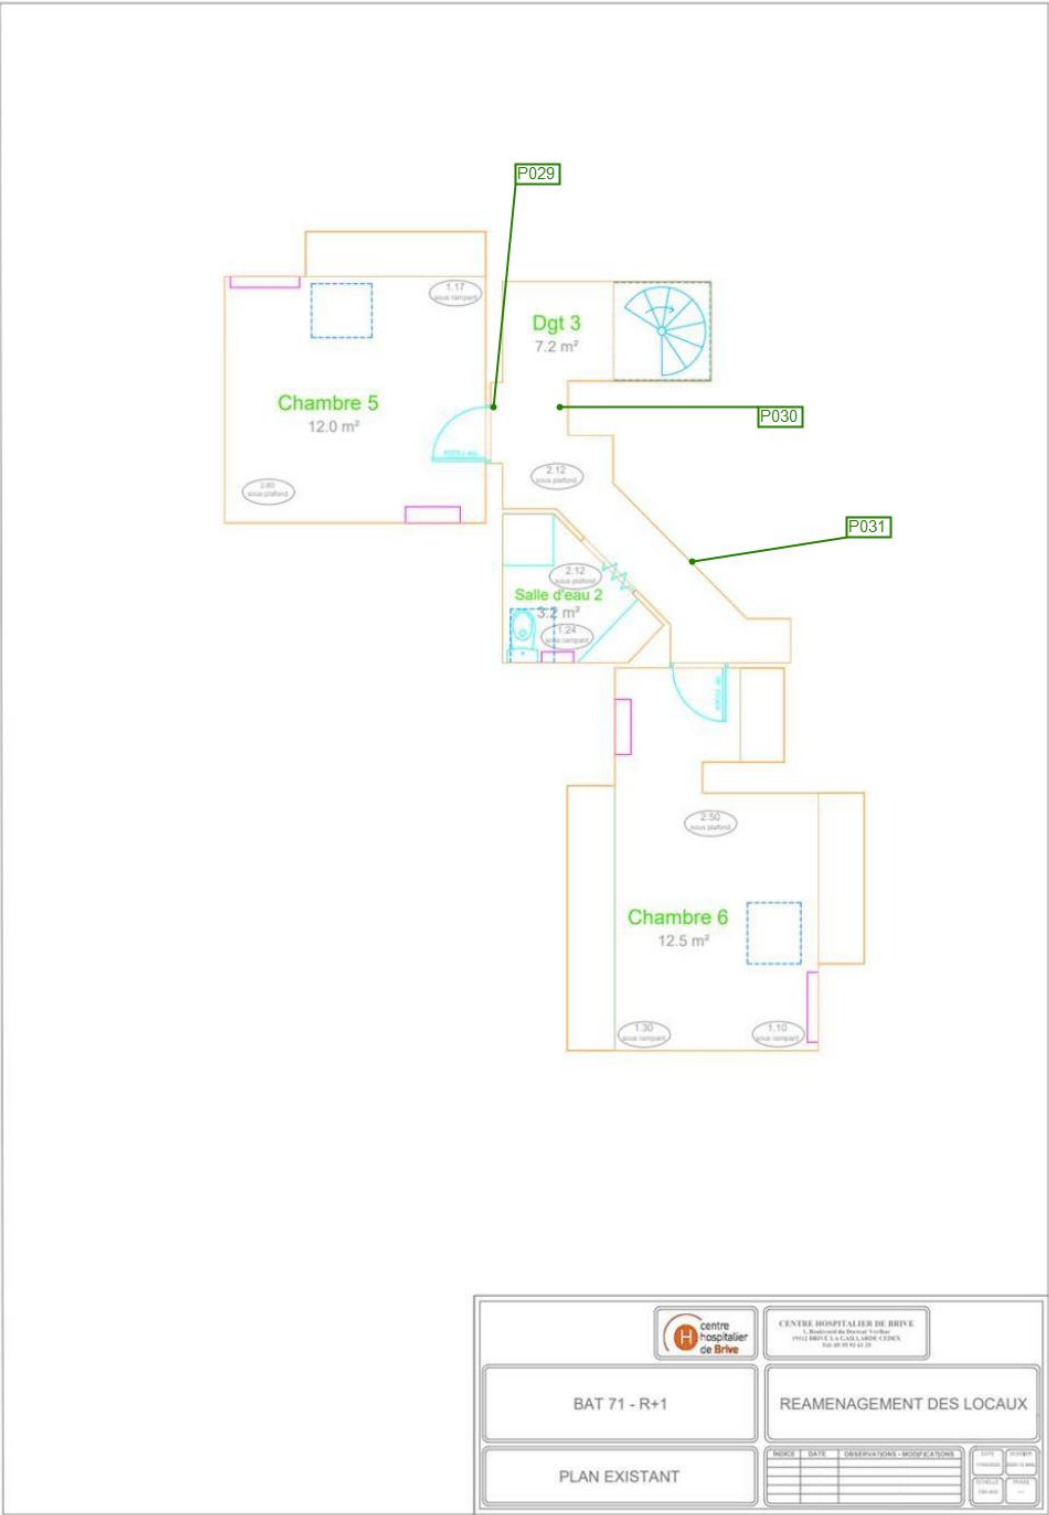

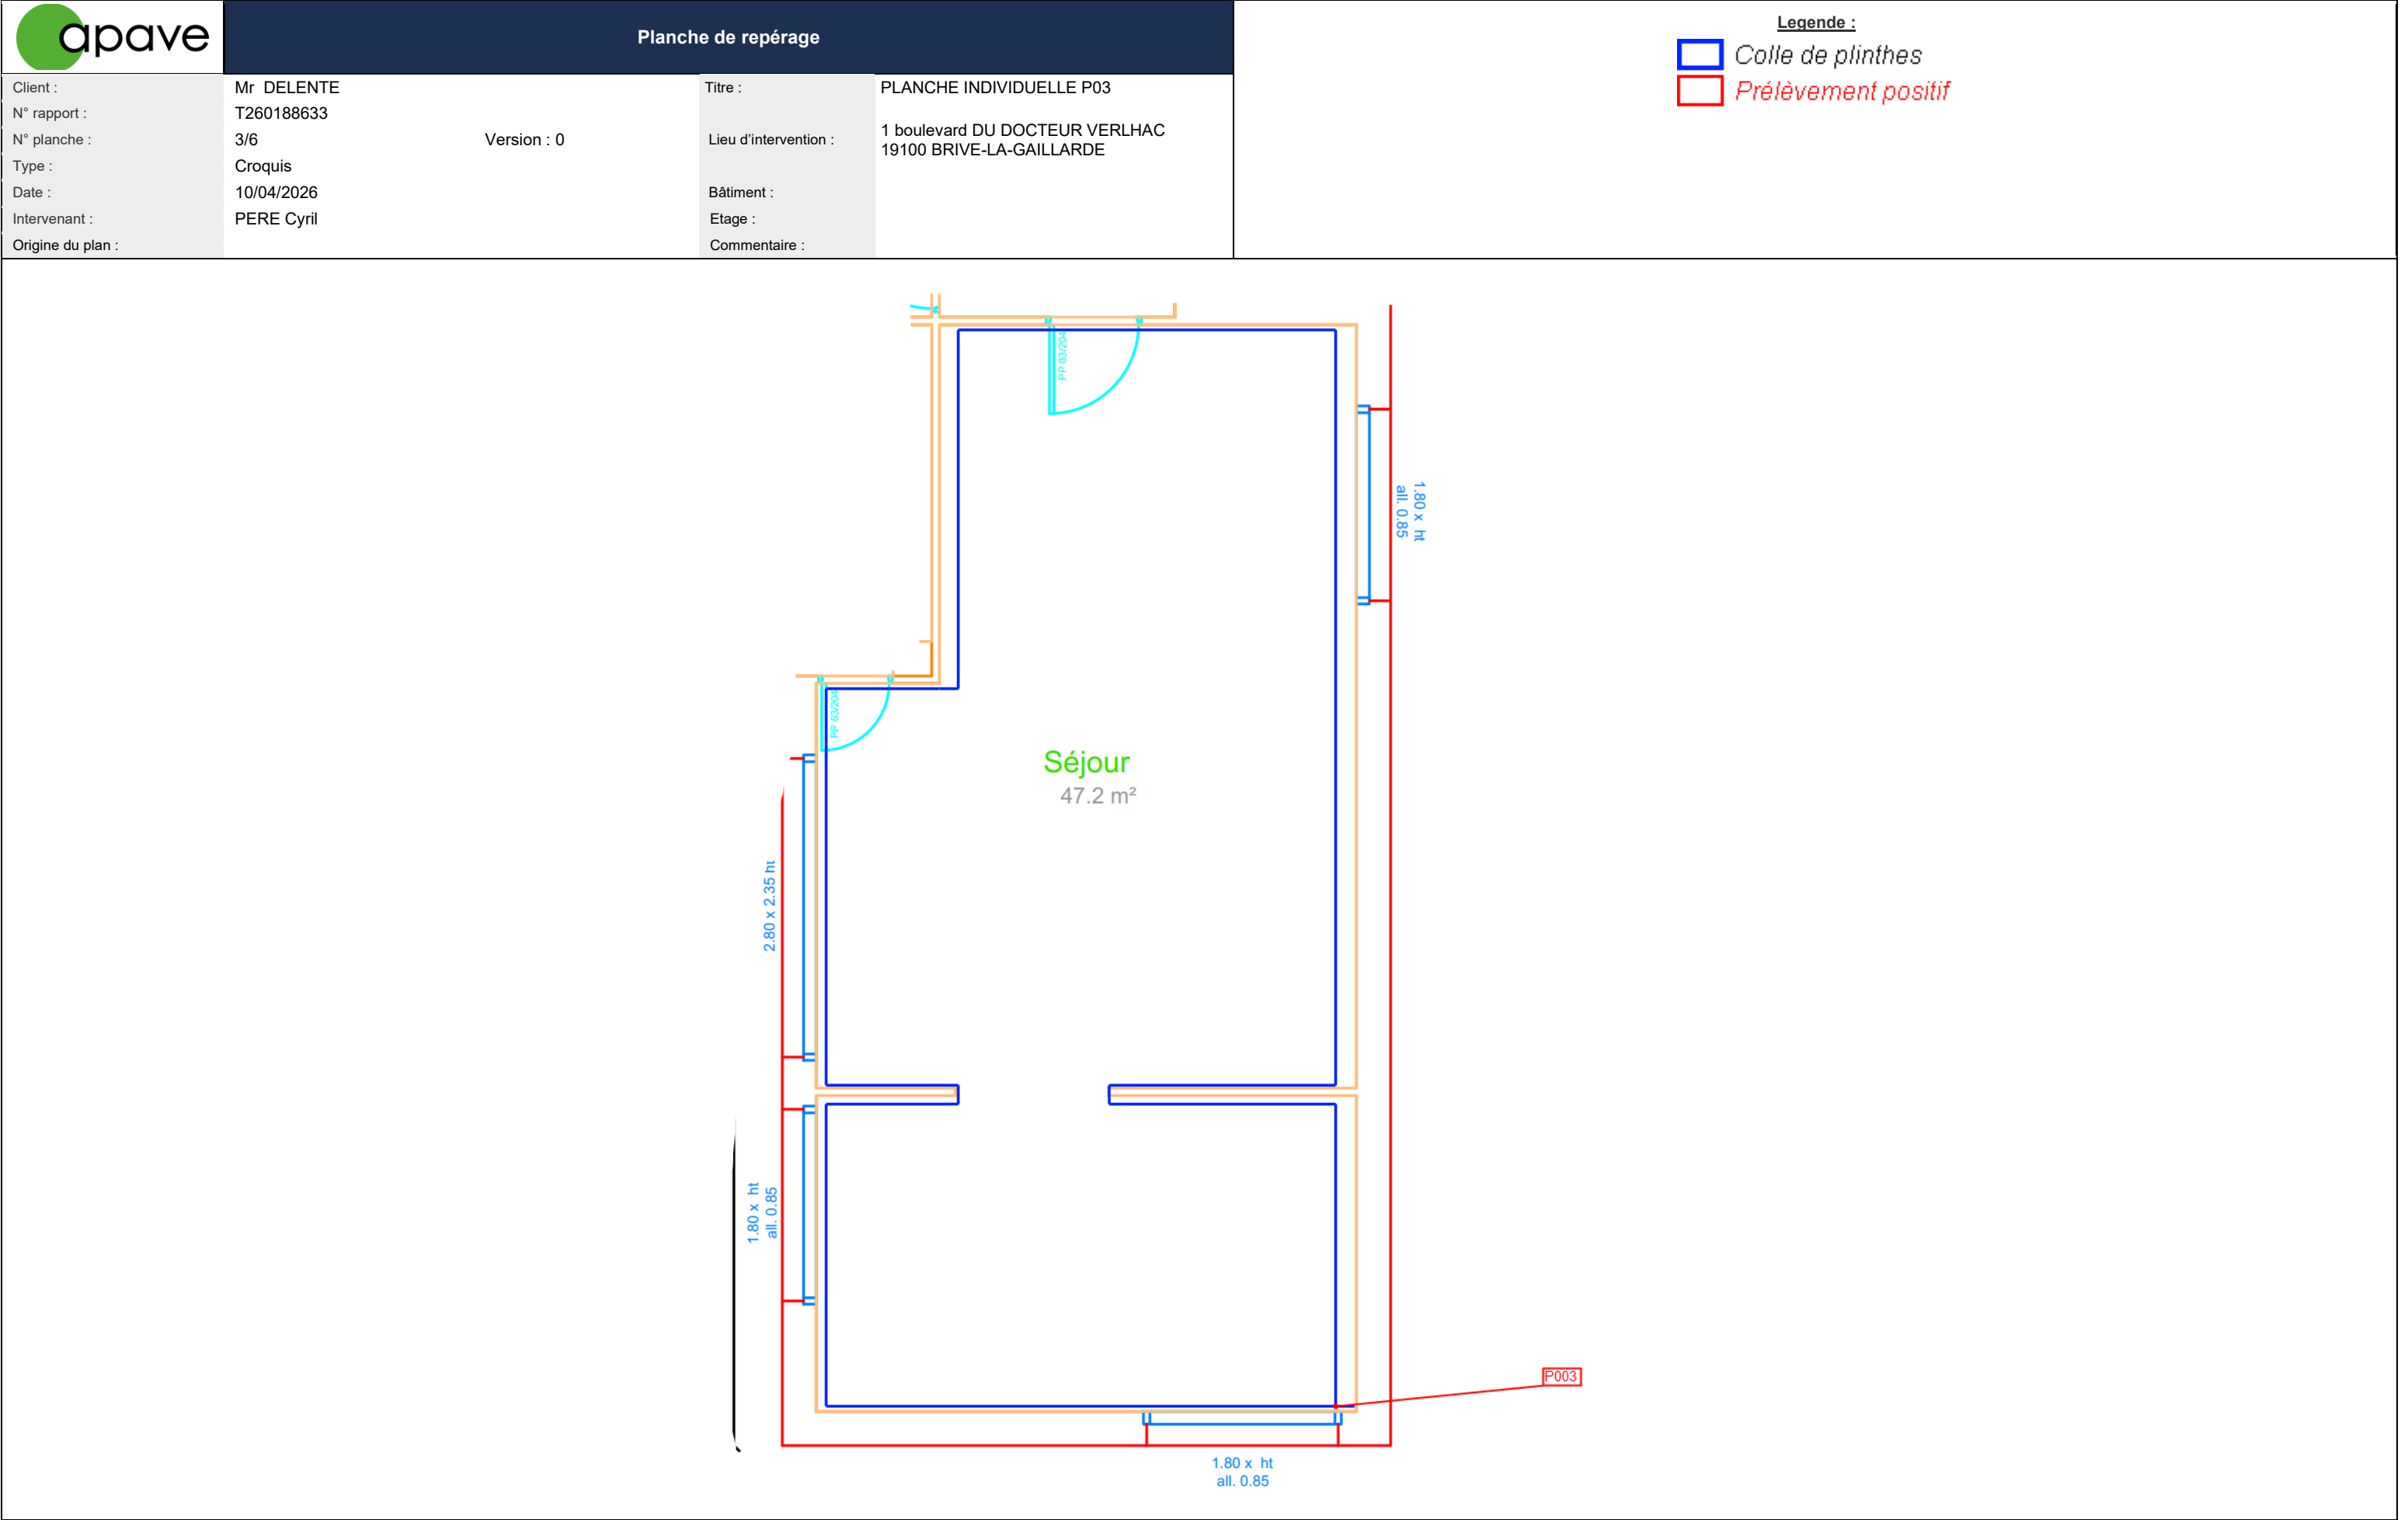

Cliant :	Mr DELENTE	Titre :	PLANCHE INDIVIDUELLE P018
N° rapport :	T260188633		
N° planche :	4/6	Lieu d'intervention :	1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Type :	Croquis	Bâtiment :	
Date :	10/04/2026	Etage :	
Intervenant :	PERE Cyril	Commentaire :	
Origine du plan :			


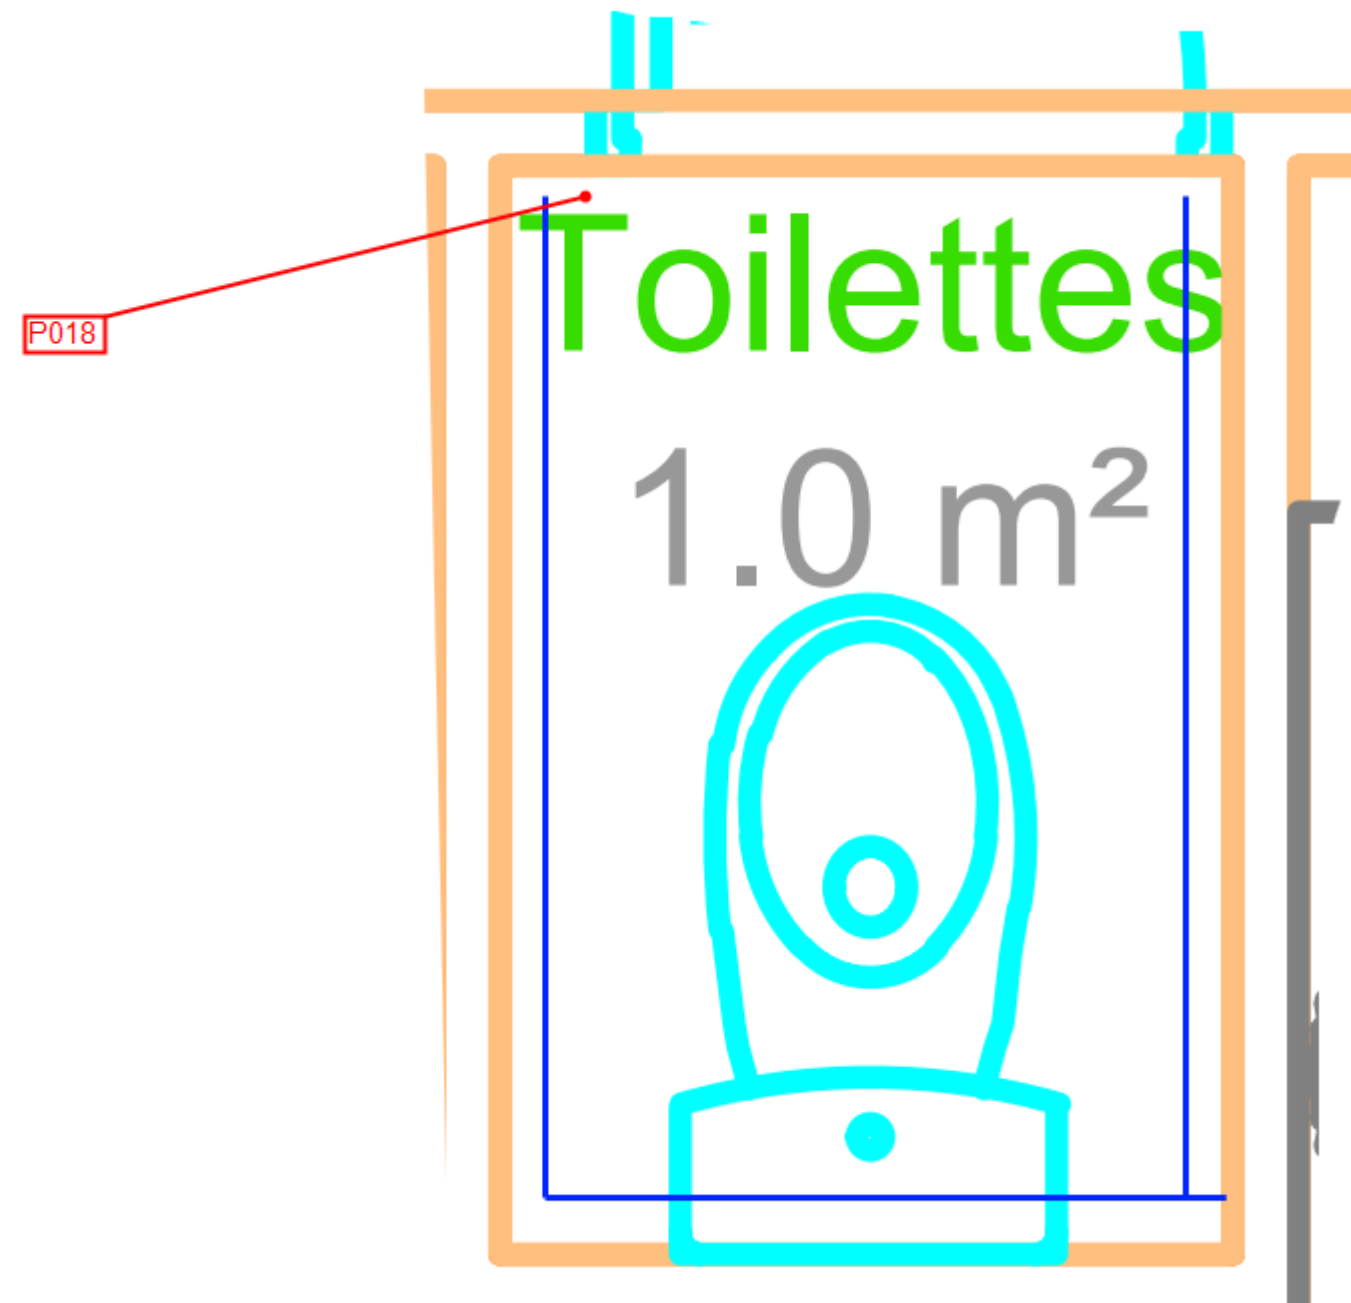


		Planche de repérage		Legende :  Ardoises en amiante-ciment  Prélèvement positif	
Client :	Mr DELENTE		Titre :	PLANCHE INDIVIDUELLE P034	
N° rapport :	T260188633				
N° planche :	6/6	Version : 0	Lieu d'intervention :	1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE	
Type :	Croquis		Bâtiment :		
Date :	10/04/2026		Etage :		
Intervenant :	PERE Cyril		Commentaire :		
Origine du plan :					

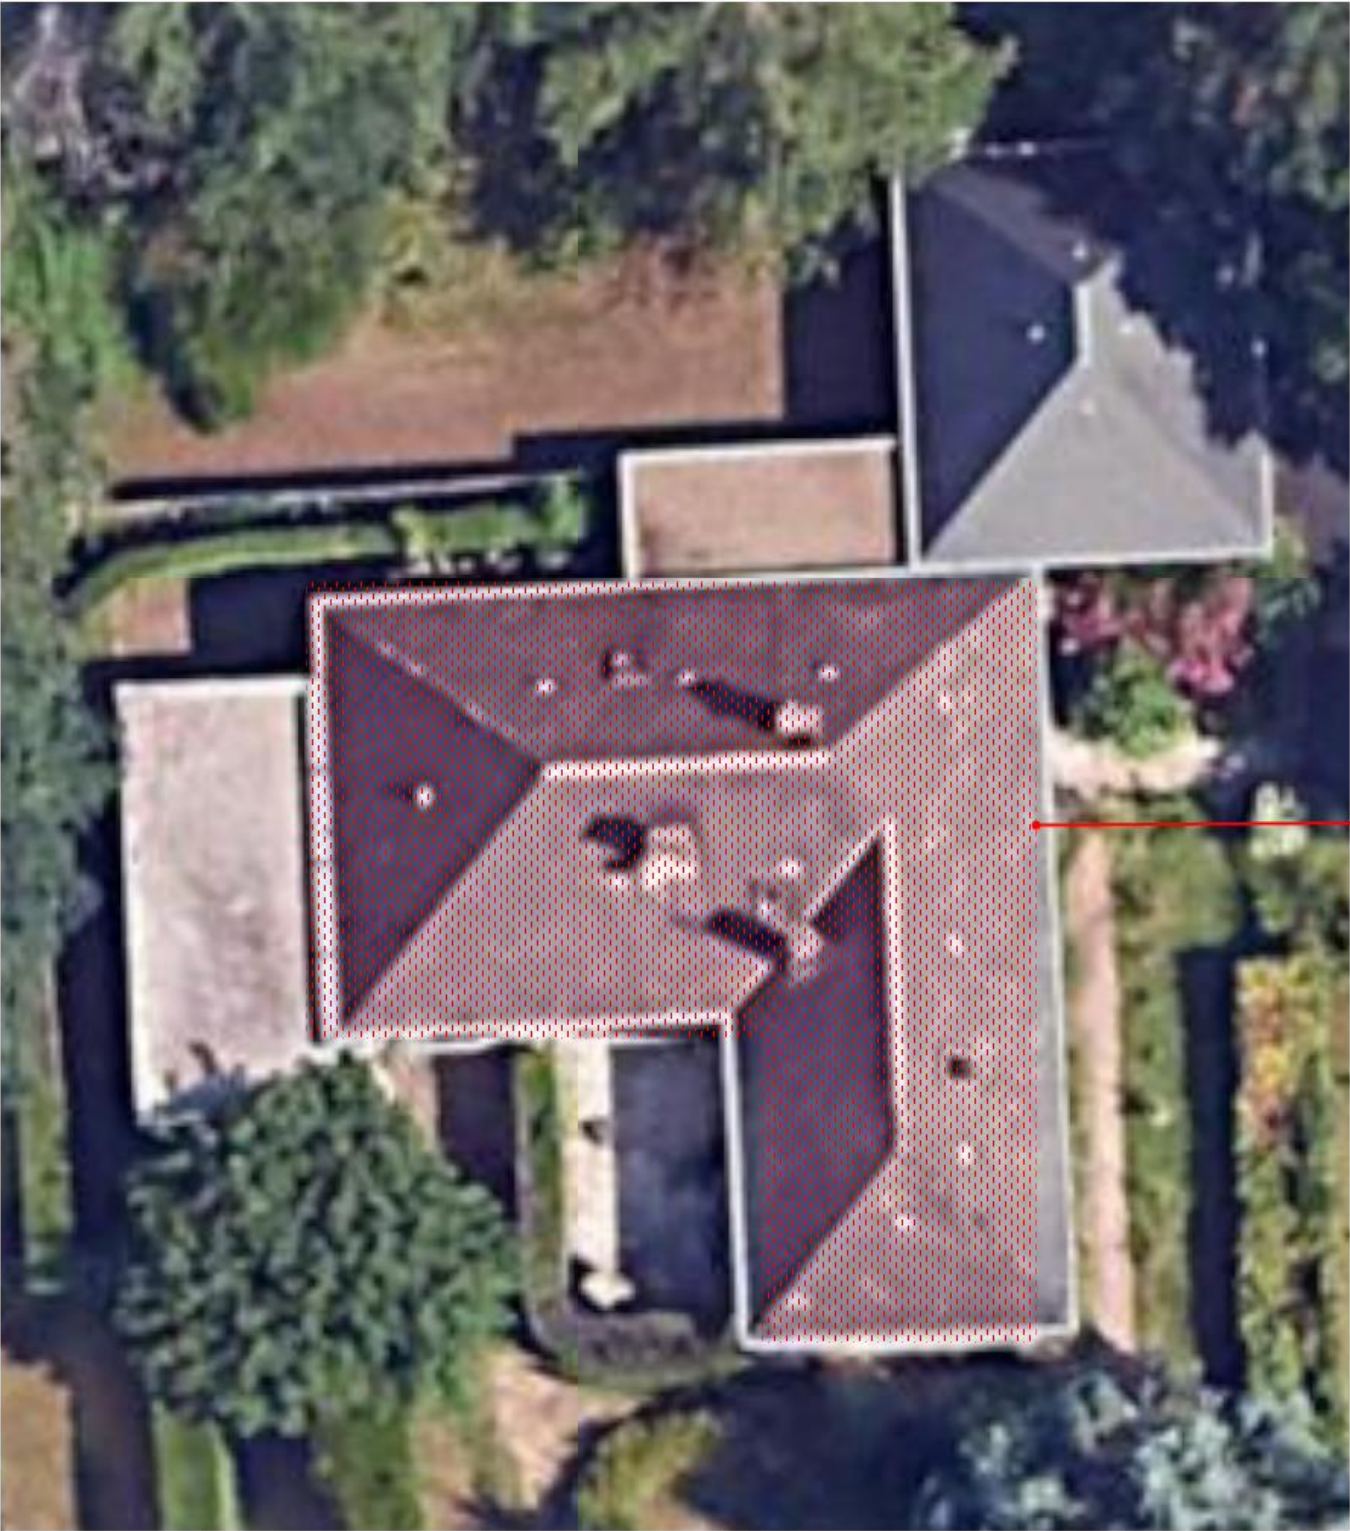

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : Revêtement de murs

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage	
CH BRIVE	T260188633	RDC - Salle d'eau 1	
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur	
Colle de plinthes	26/03/2026	PERE Cyril	
Localisation			
Revêtement de murs - Murs			
Résultat amiante			
Présence d'amiante ()			

PRELEVEMENT : P001

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Entrée
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle / Carrelage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633		RDC - Séjour
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026		PERE Cyril
Localisation			
Revêtement de sol - Sol			
Résultat amiante			
Absence d'amiante			

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : Colle + Reagreage de sol		
--	--	--

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633		RDC - Séjour
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	26/03/2026		PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Sol

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de faïence


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Séjour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit Plâtre


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Chambre 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit Plâtre


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de faïence


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cuisine
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :


Enduit / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

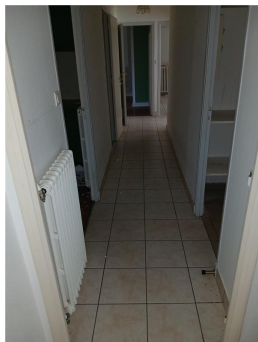PRELEVEMENT : P009
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Dégagement 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
 Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Emplacement

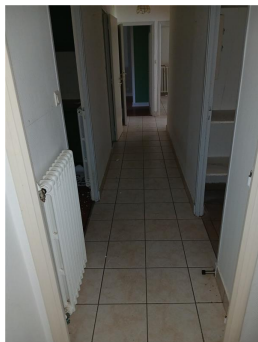

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Dégagement 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagreage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + Reagreage de sol



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Circulation
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de plinthes



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cellier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cellier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de plinthes


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Cellier
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016
Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Buanderie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol - Sol souple	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol / Sol souple

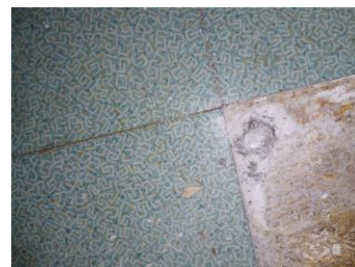
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Toiletttes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragrage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Toiletttes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de plinthes	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de plinthes


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P019
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Toilettes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de faïence


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Toiletttes
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Salle d'eau 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de faïence



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P022
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Chambre 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Chambre 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + Reagrage de sol


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + Reagrage de sol	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle + Reagrage de sol



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Salle de Bains
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de faïence	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle de faïence


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur de type ciment-colle (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs


Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
 Calicots

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

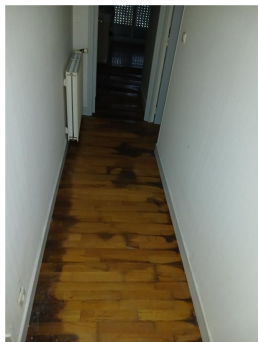PRELEVEMENT : P028
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	RDC - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Calicots / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (bleu)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	R+1 - Dégagement 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage+ colle	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ragréage+ colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	R+1 - Dégagement 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtements de plafond - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Calicots / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	R+1 - Dégagement 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Calicots - Peinture	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Calicots / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Emplacement

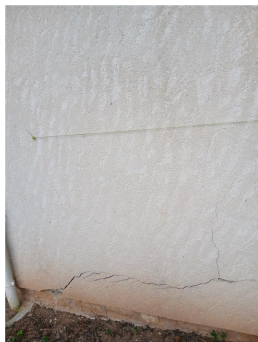

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	Extérieur - Façade Maison
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit




DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (beige)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

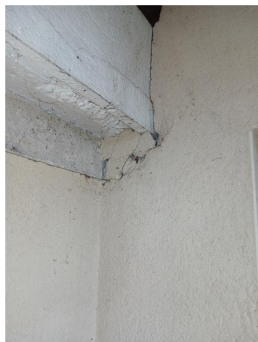PRELEVEMENT : P033
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	Extérieur - Façade Garage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
 Enduit

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	Extérieur - Toiture
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises fibres-ciment	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Ardoises - Toiture

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ardoises fibres-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P035

Emplacement

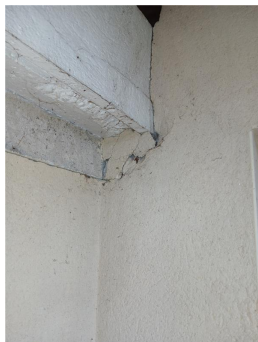

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633	Extérieur - Façade Garage
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ardoises fibres-ciment	26/03/2026	PERE Cyril

Localisation

Ardoises - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ardoises fibres-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
J01-COUCHE	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type poussières en traces

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Vue d'ensemble		Emplacement	
			
Nom du client	Numéro de dossier		Partie d'ouvrage
CH BRIVE	T260188633		Extérieur - Fenetre salle de bain
Matériau	Date de prélèvement		Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	26/03/2026		PERE Cyril

Localisation

Fenêtre - Murs

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Mastic vitrier


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
J01-COUCHE	AR-26-KC-020800-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

PV_00720260401797999



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Cyril PERE
15 Rue Léon Serpollet - ZI Nord
87280 LIMOGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 1/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Entrée - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Séjour - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagrage de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Séjour - Sol - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
004	P004-RDC - Séjour - Murs - Revêtement de murs - Enduit Platre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 : +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 2/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P005-RDC - Chambre 1 - Murs - Revêtement de murs - Enduit Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Cuisine - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagrage de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Cuisine - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Cuisine - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Dégagement 1 - Murs - Revêtement de murs - Calicots	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) (plâtreux)(i)	MET * / A4VB	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 3/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	P010-RDC - Dégagement 1 - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Circulation - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagrage de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P012-RDC - Circulation - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Cellier - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagrage de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Cellier - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 4/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	P015-RDC - Cellier - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P016-RDC - Buanderie - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagreage de sol - Sol souple	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-RDC - Toilettes - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagreage de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-RDC - Toilettes - Murs - Revêtement de murs - Colle de plinthes	Matériau dur (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET * / JND9	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P019-RDC - Toilettes - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 5/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P020-RDC - Toilettes - Plafond - Revêtements de plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-RDC - Salle d'eau 1 - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ZD6P *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
022	P022-RDC - Chambre 1 - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagreage de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-RDC - Chambre 2 - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagreage de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-RDC - Salle de Bains - Sol - Revêtement de sol - Colle + Reagreage de sol	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	MET / CF6U *	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél : +33388916531 - +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1 - 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page6/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	P025-RDC - Salle de Bains - Murs - Revêtement de murs - Colle de faïence	Matériau dur de type ciment-colle (beige)(i)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-RDC - Dégagement 2 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P027-RDC - Dégagement 2 - Murs - Revêtement de murs - Calicots	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * /WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-RDC - Dégagement 2 - Plafond - Revêtements de plafond - Calicots - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type maillage de fibres (bleu)	MET * /CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * /WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 7/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	P029-R+1 - Dégagement 3 - Sol - Revêtement de sol - Ragréage+ colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-R+1 - Dégagement 3 - Plafond - Revêtements de plafond - Calicots - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
031	P031-R+1 - Dégagement 3 - Murs - Revêtement de murs - Calicots - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP * / WPM6	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
032	P032-Extérieur - Façade Maison - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5840

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 8/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client:332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P033-Extérieur - Façade Garage - Murs - Revêtement de murs - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P034-Extérieur - Toiture - Toiture - Ardoises - Ardoises fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / WPM6	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
035	P035-Extérieur - Façade Garage - Toiture - Ardoises - Ardoises fibres-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau de type poussières en traces	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P036-Extérieur - Fenetre salle de bain - Murs - Fenêtre - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / CF6U	1 / 1 *	Calcination attaque acide broyage mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures ,CS 60134
33172 Gradignan, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-26-KC-020800-01 Date d'émission de rapport : 09/04/2026 12:20 Page 9/9
Dossier N° : 26K011324 Date de réception : 02/04/2026 Date d'analyse : 07/04/2026
Référence dossier Client: 332490.2
C26135861 A - 1 boulevard DU DOCTEUR VERLHAC 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE - Mr DELENTE (CH BRIVE)
T260188633

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse, ceci afin d'éviter le risque d'inter-contamination. Les raisons de cette non séparation peuvent être : la trop grande adhérence des couches entre elles, des couches trop fines, le manque de matière d'une des couches, l'état de conservation dégradé d'une des couches.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10), Arrêté du 3 juin 2025 (JORFN°0152 du 2 juillet 2025 texte N° 8).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés. Dans ce cadre l'indication 1/1 en META signifie que deux prises d'essais ont été réalisées et mélangées dans une préparation unique qui conduit à l'obtention d'une seule grille.



Emilien BRIOU
Chef(fe) de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole ".

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Ouest

4 Chemin des Maures, CS 60134

33172 Gradignan, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Composant	Matériau ou produit contenant de l'amiante	Estimation des quantités	Observations
RDC	Séjour	Revêtement de murs	Colle de plinthes	40 ml	
RDC	Toilettes	Revêtement de murs	Colle de plinthes	4 ml	
RDC	Salle d'eau 1	Revêtement de murs	Colle de faïence	6 m ²	
		Revêtement de murs	Colle de plinthes	3 ml	
Extérieur	Toiture	Ardoises	Ardoises fibres-ciment	200 m ²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE

Z001 - Revêtement de murs Enduit Platre							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Entrée	Revêtement de murs		Enduit Platre		P004 - idem	Non
RDC	Séjour	Revêtement de murs	X	Enduit Platre		P004	Non
RDC	Cuisine	Revêtement de murs		Enduit Platre	S006	P004 - idem	Non
RDC	Dégagement 1	Revêtement de murs		Enduit Platre	S007	P004 - idem	Non
		Revêtement de murs		Colle de plinthes	S008	P004 - idem	Non
RDC	Cellier	Revêtement de murs		Enduit Platre		P004 - idem	Non
RDC	Toilettes	Revêtement de murs		Enduit Platre	S002	P004 - idem	Non
RDC	Salle d'eau 1	Revêtement de murs		Enduit Platre		P004 - idem	Non
RDC	Chambre 1	Revêtement de murs		Enduit Platre		P005	Non
RDC	Chambre 2	Revêtement de murs		Enduit Platre	S001	P004 - idem	Non
RDC	Salle de Bains	Revêtement de murs		Enduit Platre		P004 - idem	Non
RDC	Circulation	Revêtement de murs		Enduit Platre		P004 - idem	Non

Z002 - Revêtement de murs Colle de plinthes							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Toilettes	Revêtement de murs	X	Colle de plinthes		P018	Oui
RDC	Salle d'eau 1	Revêtement de murs		Colle de plinthes		P018 - idem	Oui

Z003 - Revêtement de sol Colle + Reagrage de sol							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Dégagement 1	Revêtement de sol		Colle + Reagrage de sol		P011 - idem	Non
RDC	Circulation	Revêtement de sol	X	Colle + Reagrage de sol		P011	Non

Z004 - Revêtement de sol Ragréege							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
RDC	Chambre 3	Revêtement de sol		Ragréege	S003	P026 - idem	Non
RDC	Chambre 4	Revêtement de sol		Ragréege	S004	P026 - idem	Non
RDC	Dégagement 2	Revêtement de sol	X	Ragréege		P026	Non

Z005 - Revêtement de sol Ragréege+ colle							Continue : NON
Etage	Local / partie d'immeuble	Elément	Témoin	Matériau / Produit	Réf. sondage	Réf. prélèvt	Présence d'amiante (oui/non)
R+1	Dégagement 3	Revêtement de sol	X	Ragréege+ colle		P029	Non
R+1	Chambre 5	Revêtement de sol		Ragréege+ colle		P029 - idem	Non
R+1	Salle d'eau 2	Revêtement de sol		Ragréege+ colle	S005	P029 - idem	Non
R+1	Chambre 6	Revêtement de sol		Ragréege+ colle		P029 - idem	Non

ANNEXE CERTIFICATION DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier N°1747

Monsieur PERE Cyril

Amiante sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante avec mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

DPE individuel
Selon arrêté du 20 juillet 2023
modifié par l'arrêté du 16 juin 2025

Electricité
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Gaz
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Plomb sans mention
Selon arrêté du 1er juillet 2024

Amiante
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Missions spécifiques, bâtiments complexes
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Diagnostic de performances énergétiques
Date d'effet : 01/07/2024 : - Date d'expiration : 23/07/2030

Etat de l'installation intérieure électricité
Date d'effet : 24/07/2023 : - Date d'expiration : 23/07/2030

Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 07/03/2024 : - Date d'expiration : 06/03/2031

Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 10/05/2023 : - Date d'expiration : 09/05/2030

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit,
Edité le 20/01/2026, à Pessac par MOLEZUN Jean-Jacques Président.



Siège : 30, Avenue de Canteranne – 33600 PESSAC
Tél : 05.33.89.39.30 – Mail : contact@lcp-certification.fr - site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000€ - SIRET : 80914919800040 – RCS BORDEAUX – 809 149 198 - - Code APE : 7120 B
Enr487@ LE CERTIFICAT V015 du 19-01-2026



ANNEXE ATTESTATION D'ASSURANCE



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

SAS APAVE
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran
92400 COURBEVOIE
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle

Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada	5 000 000	EUR	Par année d'assurance
Dont :			
Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »	2 500 000	EUR	Par année d'assurance
Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)	5 000 000	EUR	Par année d'assurance


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :



CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

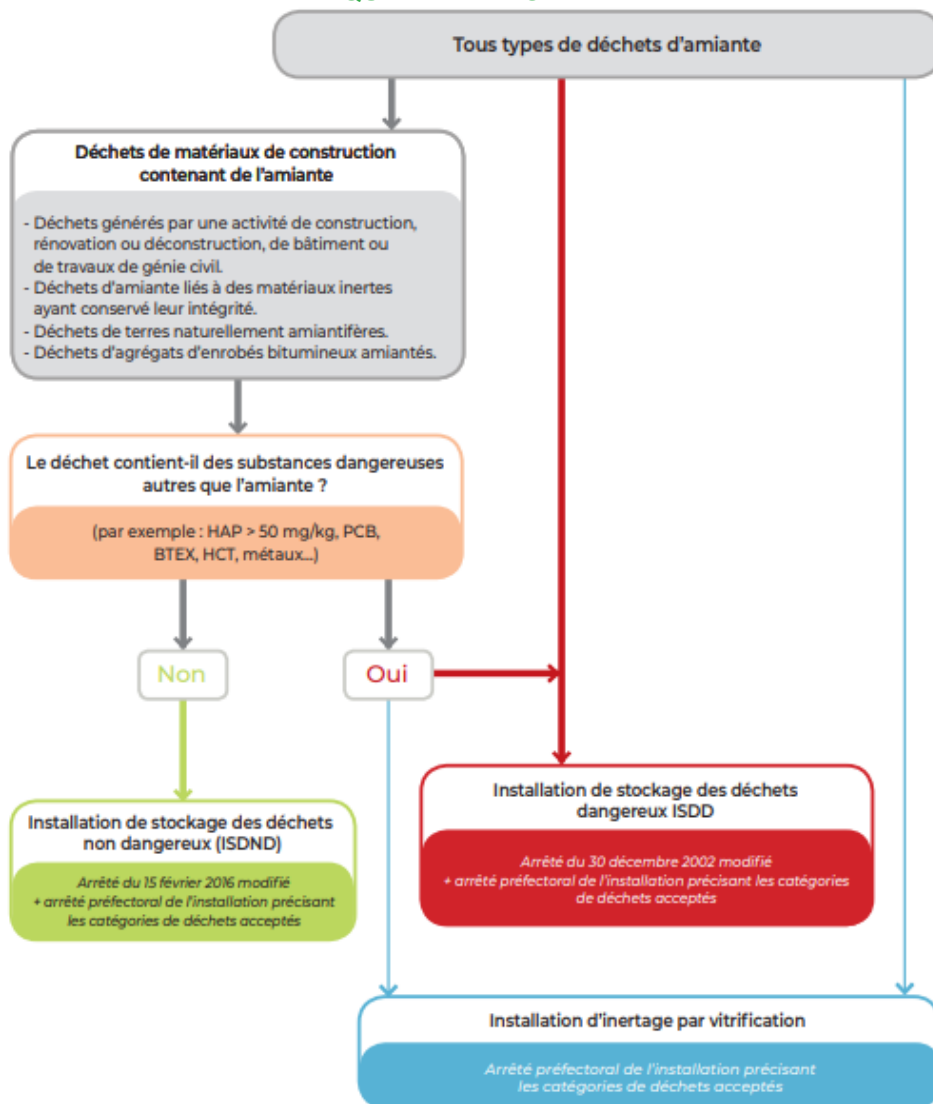

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>
