


PLANNING PRÉVISIONNEL – PROJET CONTRÔLE D'ACCÈS BIBLIOTHÈQUE ENS LYON

Planning recalé selon vos contraintes

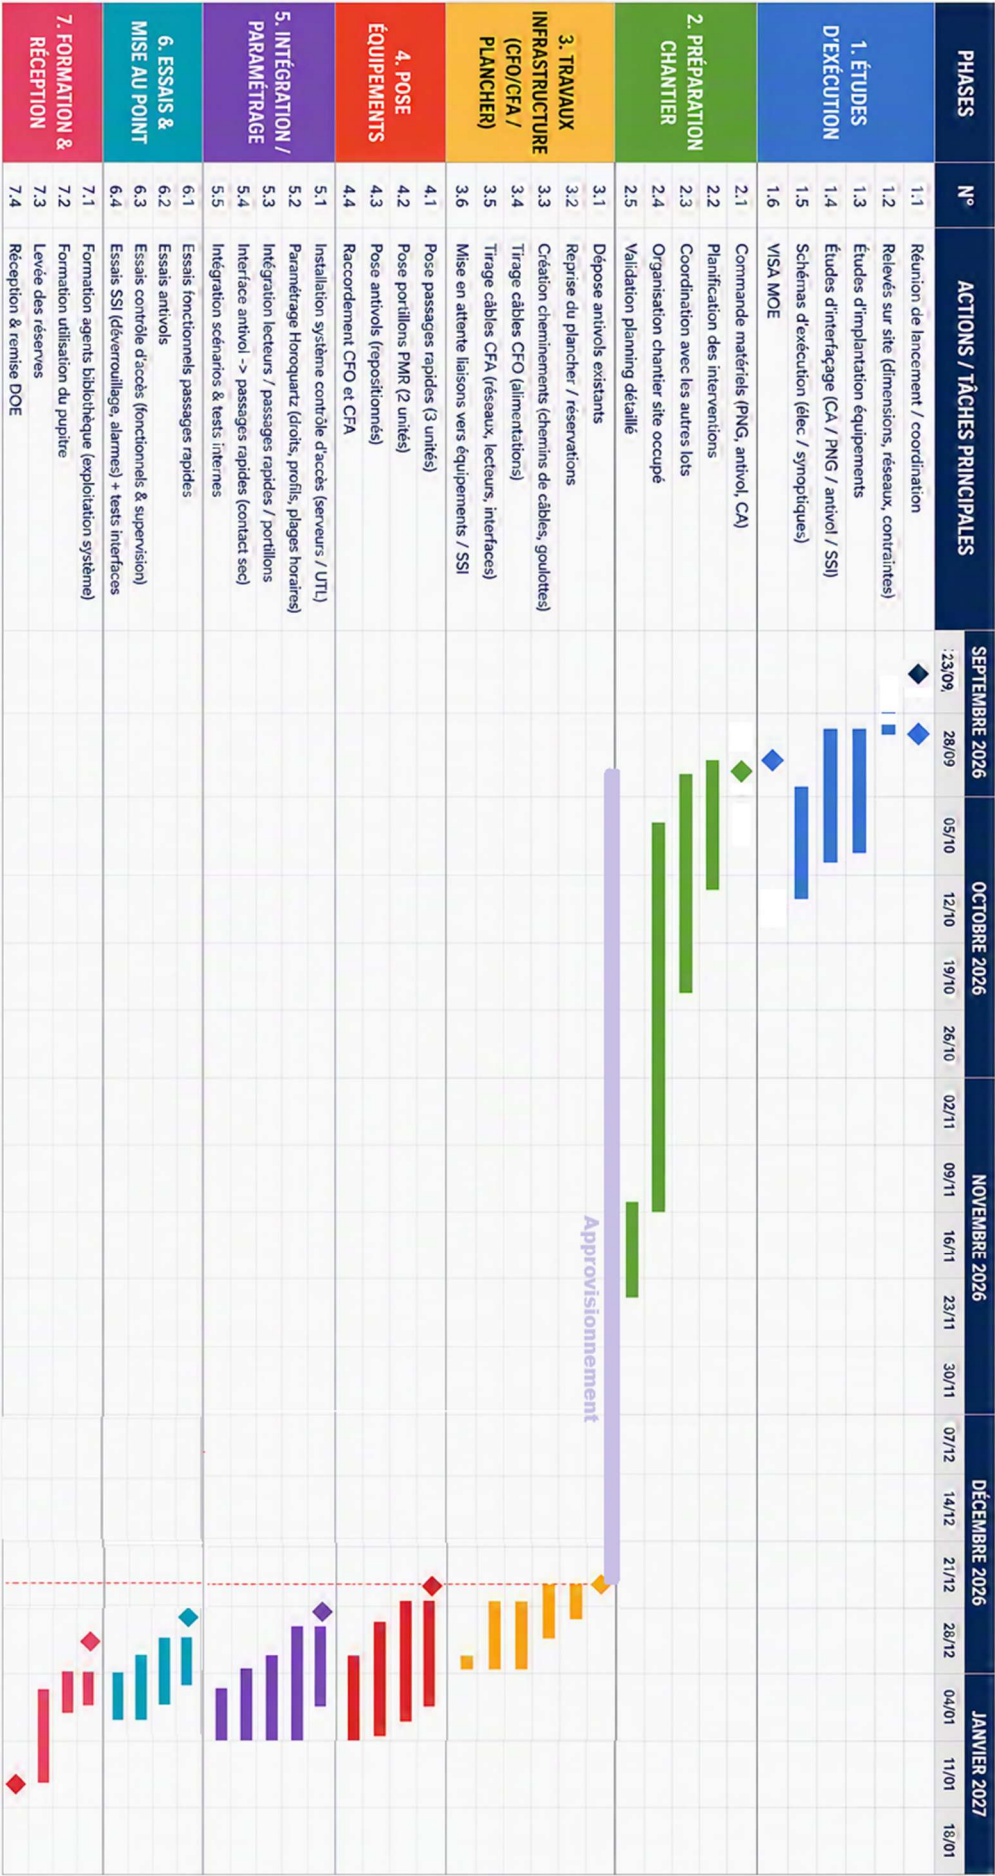

23/09/2026

Notification du marché (J0)

28/09/2026

Réunion de lancement / coordination (1.1)

02/10/2026

Commande matériaux (2.1)

09/10/2026

VISA MOE (1.6)

21/12/2026

Début travaux infrastructure (3.1 à 3.6)

22/12/2026

Début pose équipements (4.1 à 4.4)

26/12/2026

Début intégration / paramétrage (5.1 à 5.5)

05/01/2027

Début essais & mise au point (6.1 à 6.4)

11/01/2027

Formation utilisateurs (7.1 à 7.2)

15/01/2027

Réception & remise DOE (7.4)

Durée prévisionnelle totale : environ 4 mois (Confirmation à affiner en EXE)
