



PRO – Mai 2026

Carnet phasage synthetique par niveau - 1/1000e

PHASAGE :

- Phase EDL

- Etat des lieux
- Phase 0

- Travaux ENEDIS : Transfo et dalle GE
- Phase 1A

- Travaux préparatoires et Déménagement vers Bât A/B
- Phase 1B

- Travaux extensions Z1/Z2, Réhabilitation RDJ et Bât D1/D3/E
- Phase 2A

- Déménagement vers Bât neuf Z1/Z2, D1, D3 et E
- Phase 2B-1

- Travaux bât neuf Z3 et bât A/B
- Phase 2B-2

- Déménagement Internat, Toiture bât C et Finalisation bât A/B
- Phase 3

- Projet livré

MAITRE D’OUVRAGE

CHICAS - Centre Hospitalier Intercommunal des ALPES DU SUD
1 Place Rue Auguste Muret - B.P. 101- 05007 GAP cedex - T : 06 81 68 81 39 - rodolphe.bruxer@chicas-gap.fr

A2MO (Assistant maître d'ouvrage)
10 Place de la Joliette - Les Docks - Atrium 10.6 - CS 13543 - 13567 MARSEILLE Cedex 02
T : 07 67 49 98 30 - s.gay-peiller@a2mo.fr

MAITRISE D'OEUVRE

TOURRE SANCHIS ARCHITECTES (Architecte mandataire)
70 Allée Alma Mahler - 34000 Montpellier - T : 04 67 66 53 20 - agence@tourresanchis.com

UNIC architecture - Adrien Champsaur, Architecte (Architecte associé)
2 rue St-Bazile - 13001 Marseille - T : 04 91 62 29 52 / 87 - unic@unicarchitecture.com

OTCE (BET général)
65 Impasse Nicéphore Niepce - 34070 Montpellier - T : 04 67 20 06 15 - gamalvy@otce.fr

BET LAMOUR (BET VRD)
5 Rue d'Arcole - 13006 Marseille - T : 06 31 03 28 67 - c.maillard@bet-lamour.com


ARCHEMED (Economiste)
70 Allée Alma Mahler - 34000 Montpellier - T : 04 67 66 53 00 - contact@archemed.fr

PIALOT ESCANDE (BET acoustique)
9 Rue Lakanal - 34070 Montpellier - T : 04 99 62 20 08 - contact@pialot-escande.fr


MAC BTP (OPC)
Résidence les 2 Moulins - bât G - 13190 Allauch - T : 07 84 43 57 89 - contact@mac-btp.com

Indice	Date	Observations
Ind I	21/04/2026	Rendu PRO minute
Ind II	05/05/2026	Carnet D avec le descriptif des travaux provisoires
Ind III	20/05/2026	Mise à jour suite actualisation des besoins MOA durant la phase chantier
Ind IV	29/05/2026	Mise à jour carnet travaux provisoires suite actualisation besoins MOA durant la phase chantier


R+3

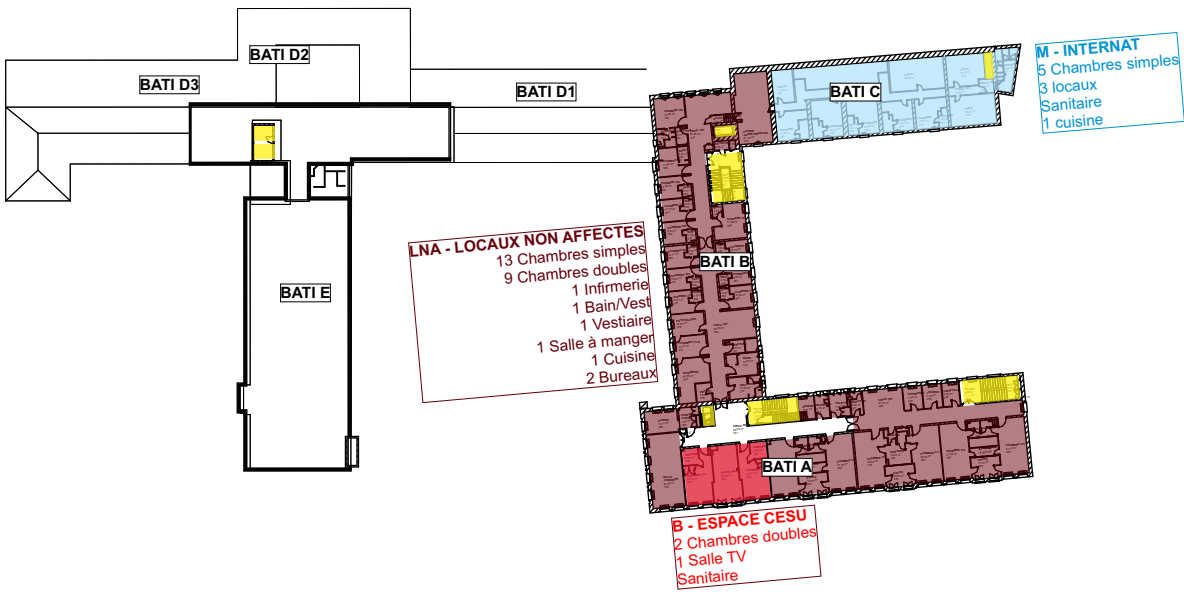


R+2

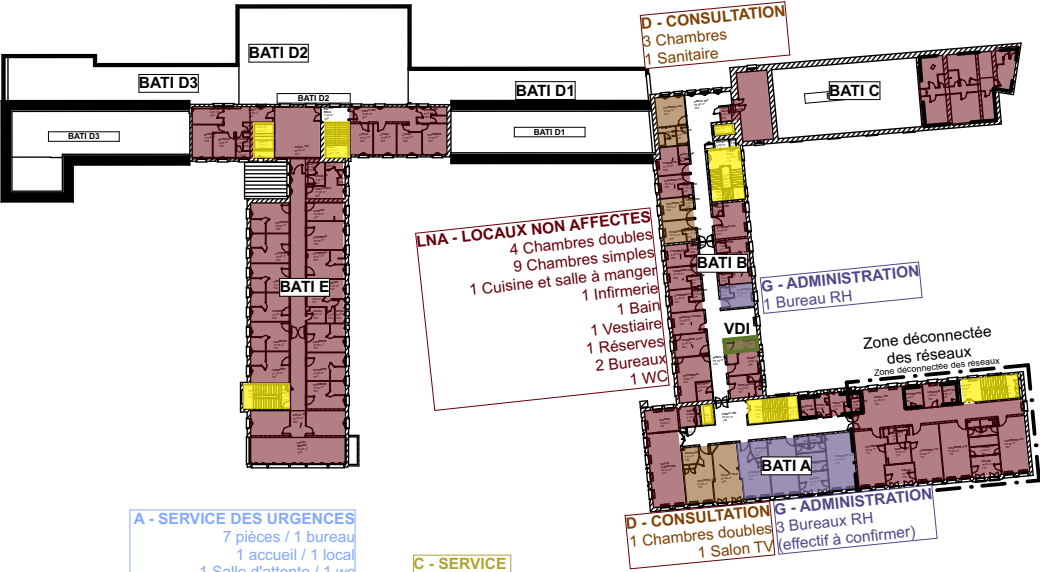


R+1

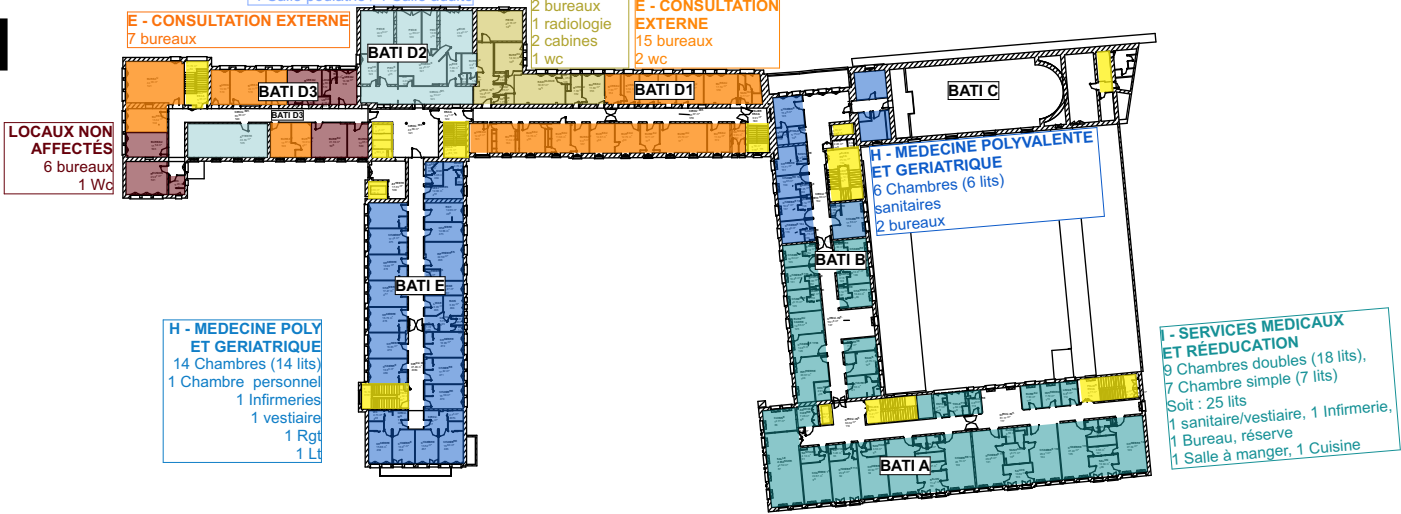

RDC

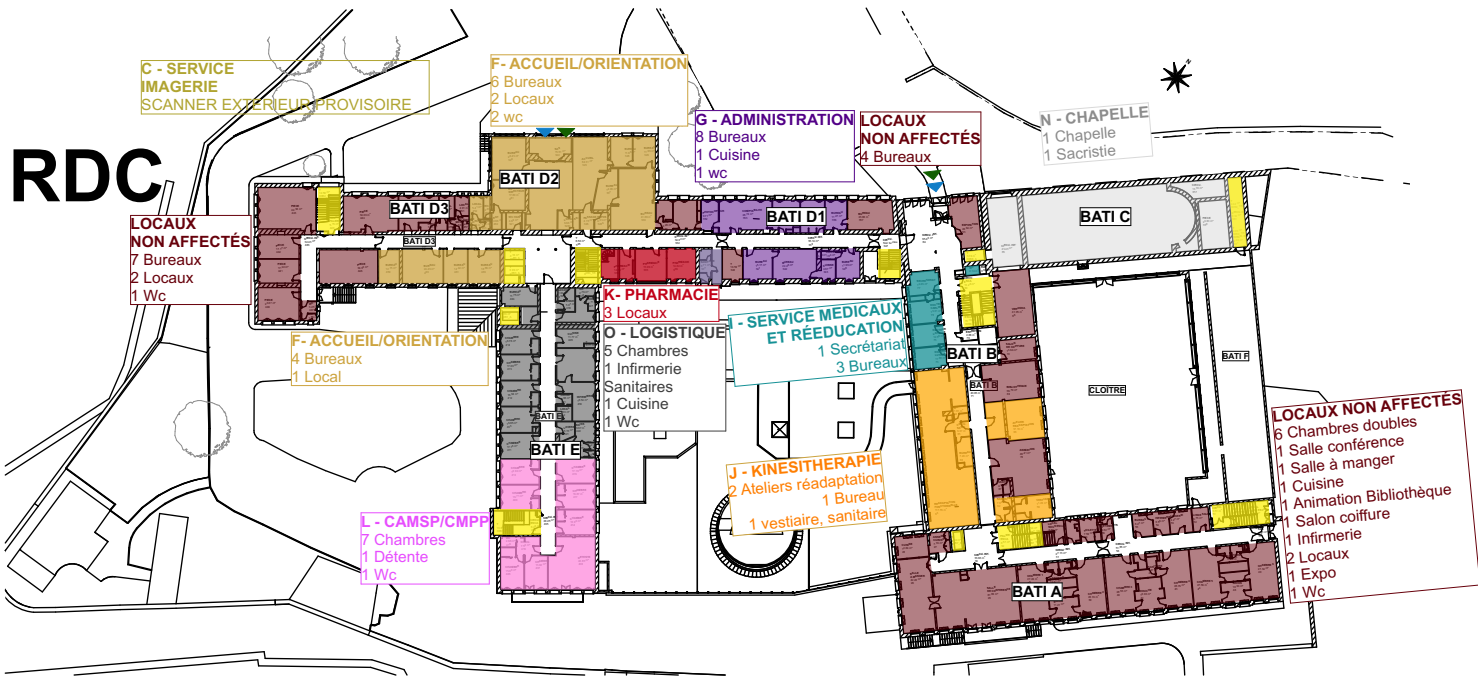

R-1

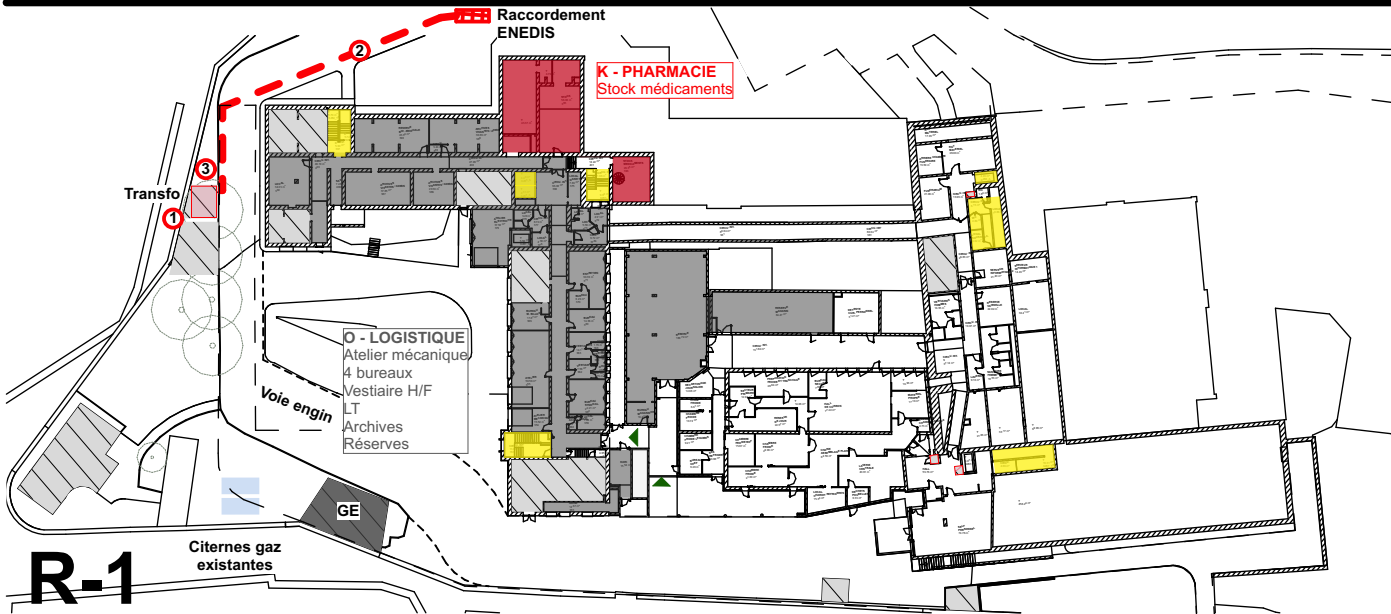

Phasage synthétique - Phase EDL

Affectation existante

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISoire avec TRVX
- ZONE PROVISoire dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISoire
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTES
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISoire
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER

Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET


EDL - Phase 0

Transfo ENEDIS


Chronologie des travaux pour le courant fort - Phase 0

- Réalisation du local transfo ext + dalle GE et passage de gaines en VRD local TGBT
- Raccordement ENEDIS
- Mise en place du transformateur HT/BT ENEDIS


R+3

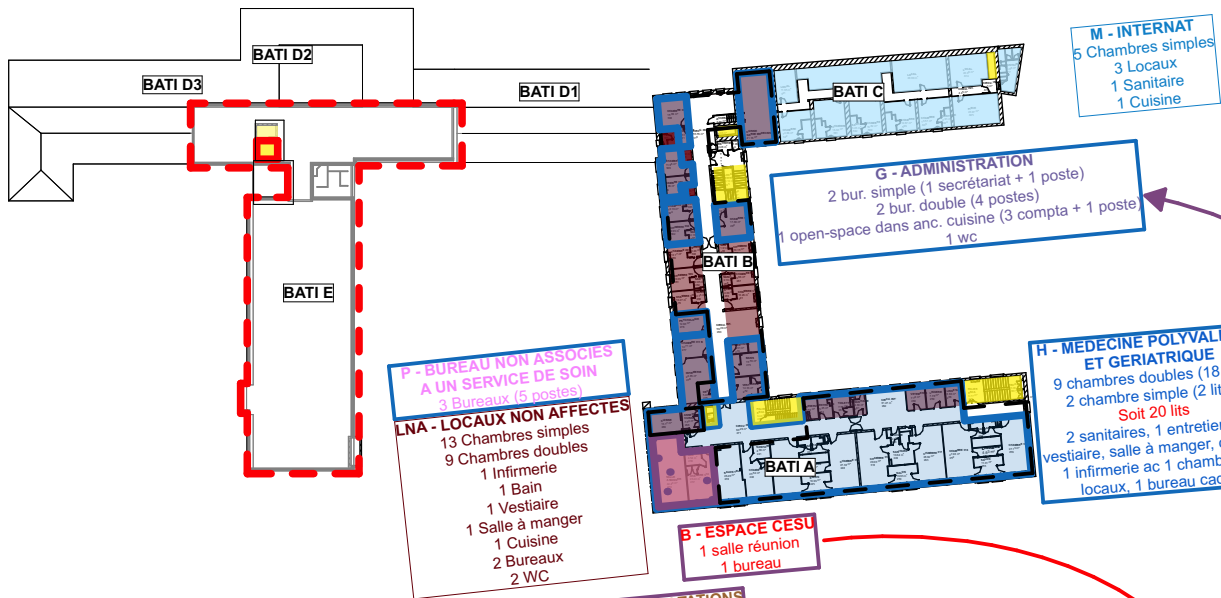


R+2

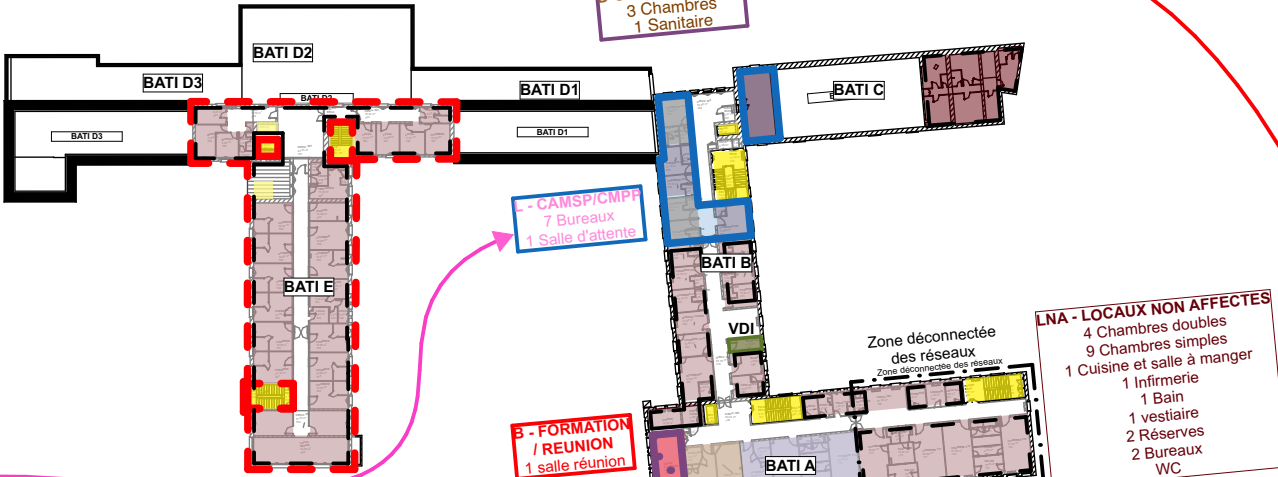


R+1

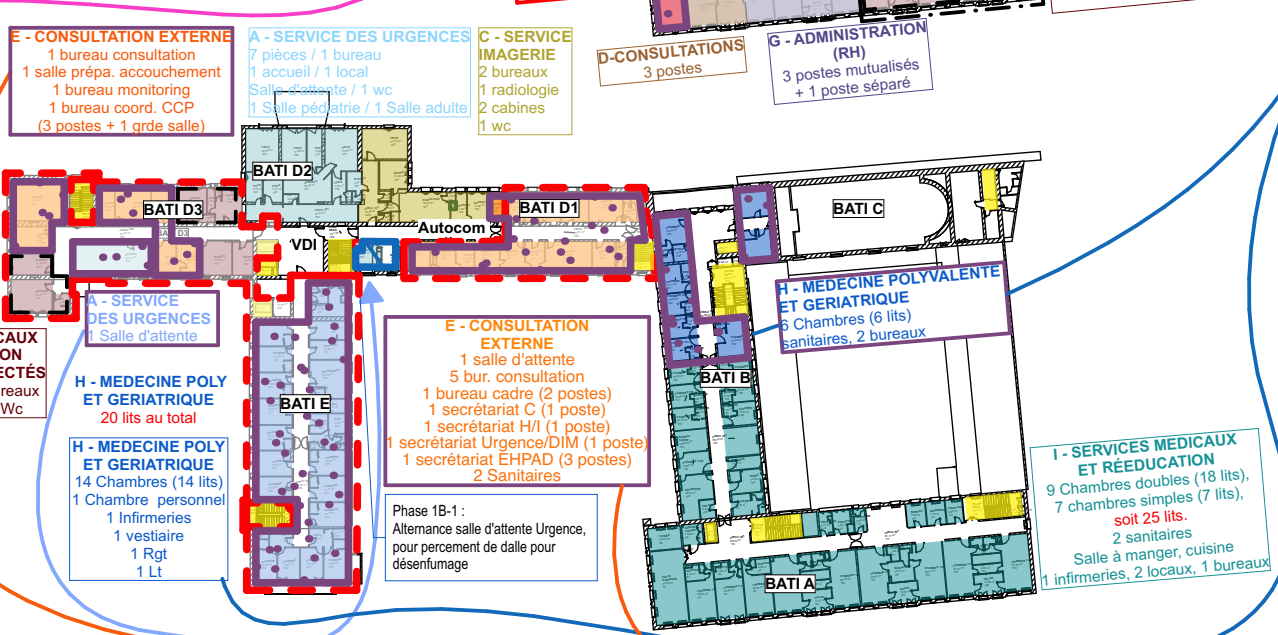

RDC

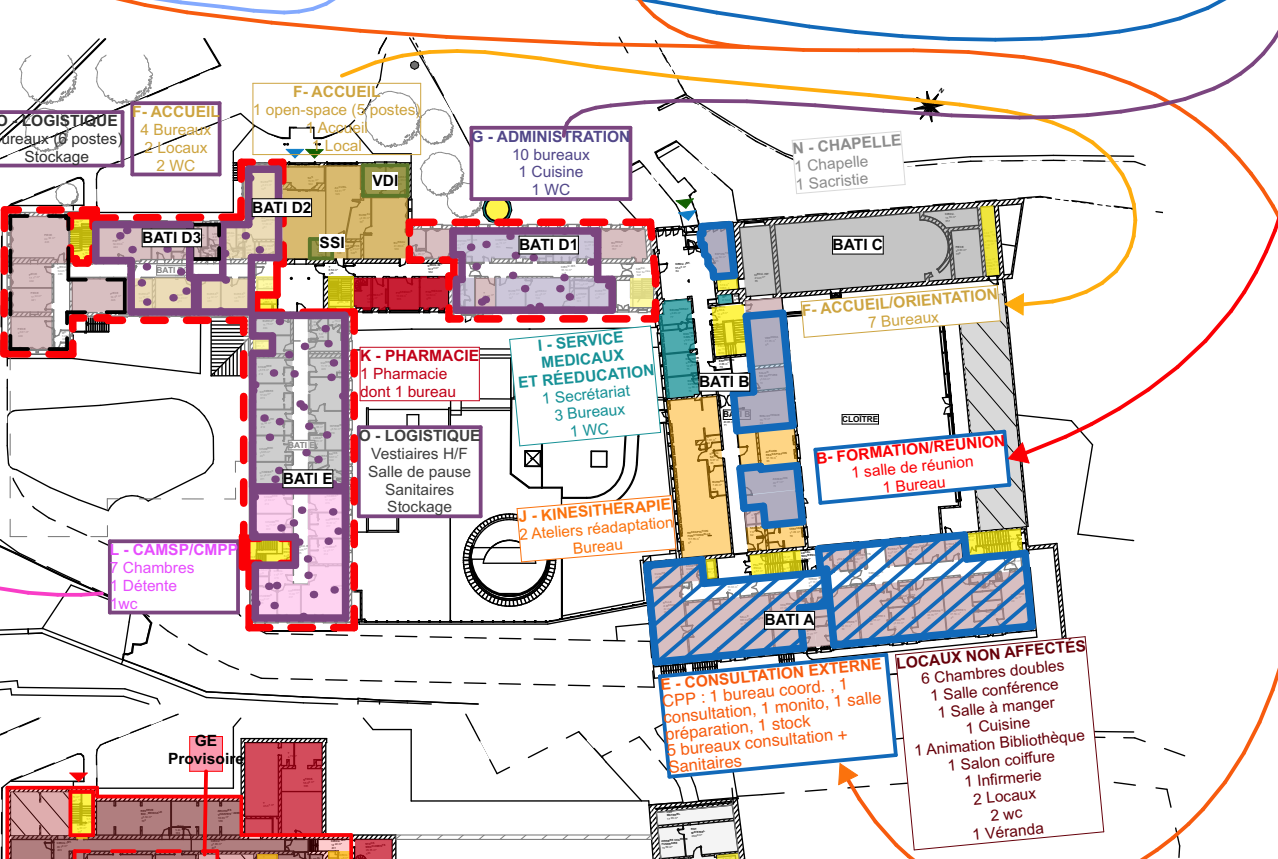

R-1

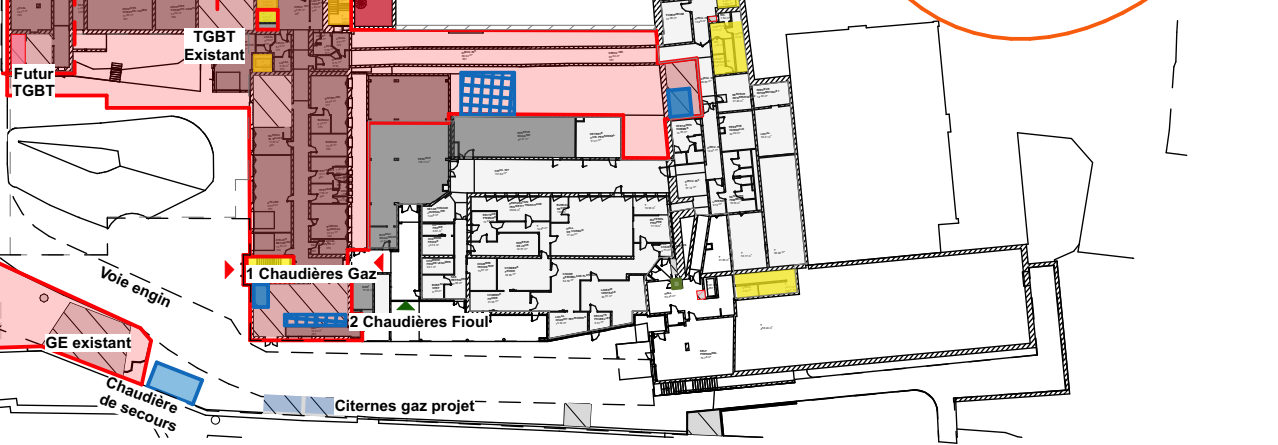

Phasage synthétique - Phase 1Aa

Travaux préparatoires et Déménagement vers Bât A/B

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISOIRE avec TRVX
- ZONE PROVISOIRE dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISOIRE
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTES
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISOIRE
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER


Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET


Descriptif Déménagement :

- 1 - L'espace **Archives ADMIN RDJ BAT D3** est libérés par la MOA
- 2 - L'espace **K - PHARMACIE RDJ BATI D2** est libérés par la MOA
- 3 - Délocalisation chaudière RDJ BAT E vers sous station 3 vers VS RDJ BAT A
- 4 - Externalisation des ateliers Méca **O - LOGISTIQUE RDJ BATI E** par la MOA durant la durée des travaux
- 5 - Déménagement locaux provisoire **O - LOGISTIQUE RDJ BATI E** (vestiaires) vers RDJ BAT B (Vestiaire existant)
- 6 - Déménagement locaux provisoire **O - LOGISTIQUE RDC BATI E** et RDJ BATI E (3 bureaux, 6 chambres + 1 infirmerie + 1 bureau + 1 vestiaire + 1 cuisine + salle à manger. 315 m2 de locaux non affectés)
- 7 - Déménagement provisoire **F - ACCUEIL OUEST RDC BAT D** vers **RDC BATI B RDC** (6 bureaux.110 m2 de locaux non affectés)
- 8 - Déménagement provisoire **L - CAMSP/CMPP** vers **R+2 BAT B** (7 chambres + 1 salle d'attente .104 m2 de locaux non affectés)
- 9 - Déménagement provisoire **G - ADMIN RDC BATI D1** vers **R+3 BATI B** (4 bureaux + 1 open-space locaux non affectés)
- 10- Déménagement provisoire **E - CONSULTATION EXTERNE RDJ BAT D3 ET D1** dans **RDC BAT A** (6 bureaux. 260 m2 locaux non affectés)
- 11- Déménagement provisoire de la Salle d'attente **A - SERVICE DES URGENCES** vers **R+1 BAT D1**
- 12- Déménagement provisoire **H-MEDECINE POLY et GERIATRIQUE R+1 BAT E et R+1 bat B** vers **R+3 BAT A** (20 lits -entretien, sanitaire, infirmerie, salon. 477 m2 locaux non affectés)
TOTAL de 20 lits
- 13- Aucun déménagement **I - SERVICE MEDICAUX ET REEDUCATION R+1 BAT B**
TOTAL de 25 lits
- 14- Déménagement provisoire **B - ESPACE CESUS / FORMATION BATI A R+3** vers **RDC BATI B** (1 bureau+ 1 salle de reunion de locaux non affectés)
Suppression de la salle de reunion du **R+2 BATI B**
- 15- Aménagement provisoire **P - BUREAUX NON ASSOCIES** au **R+3 BATI B** (3 bureaux 50m2 de locaux non affectés)


R+3

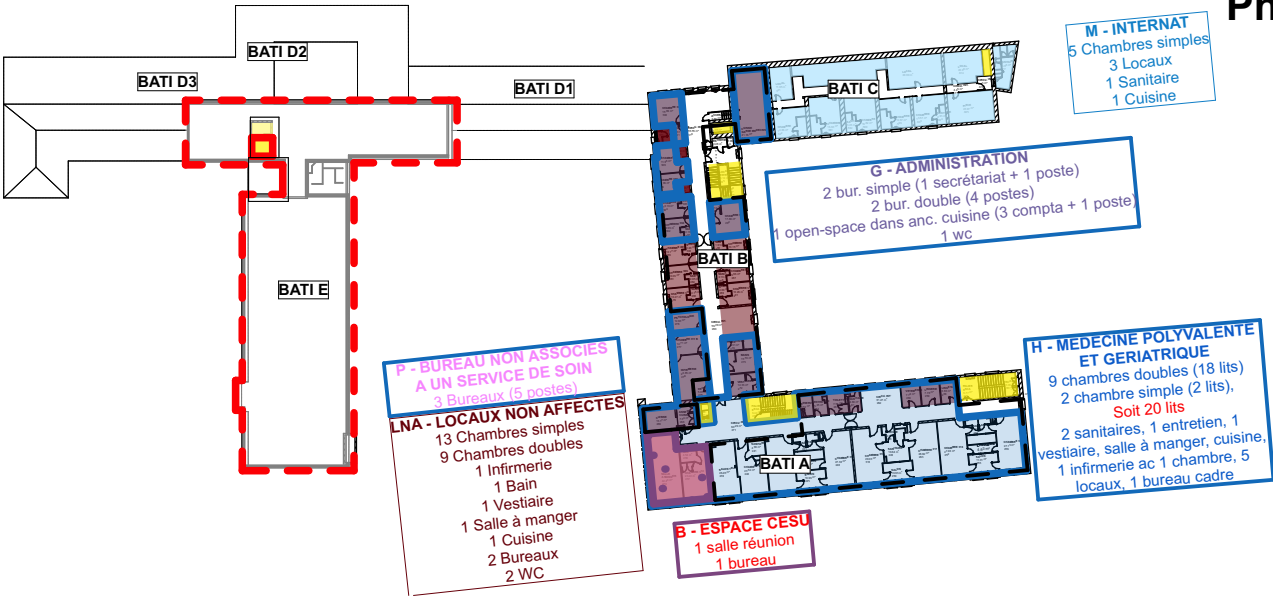


R+2

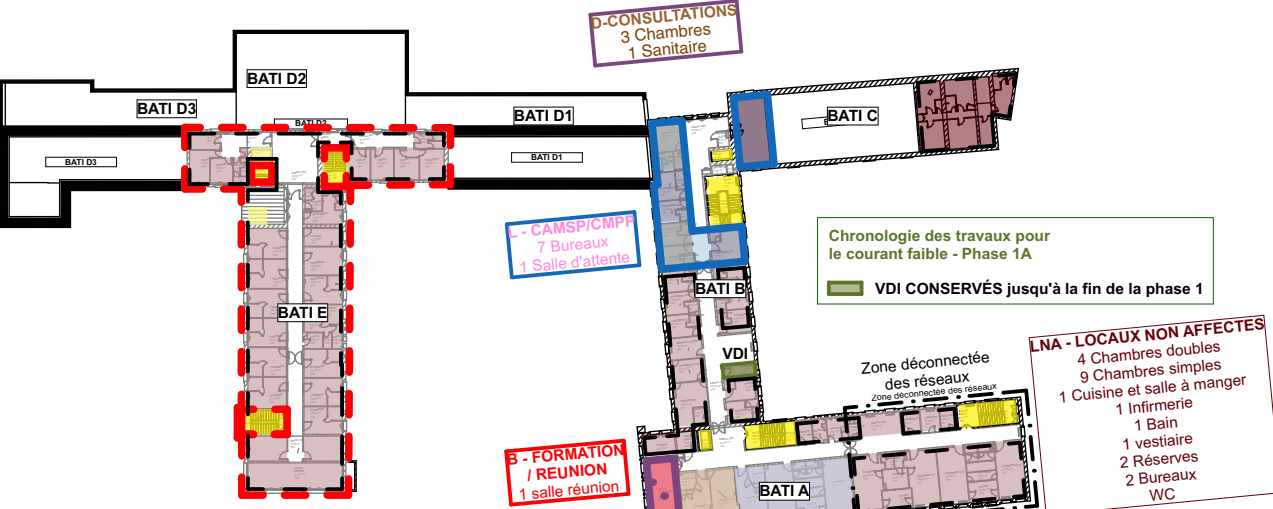


R+1

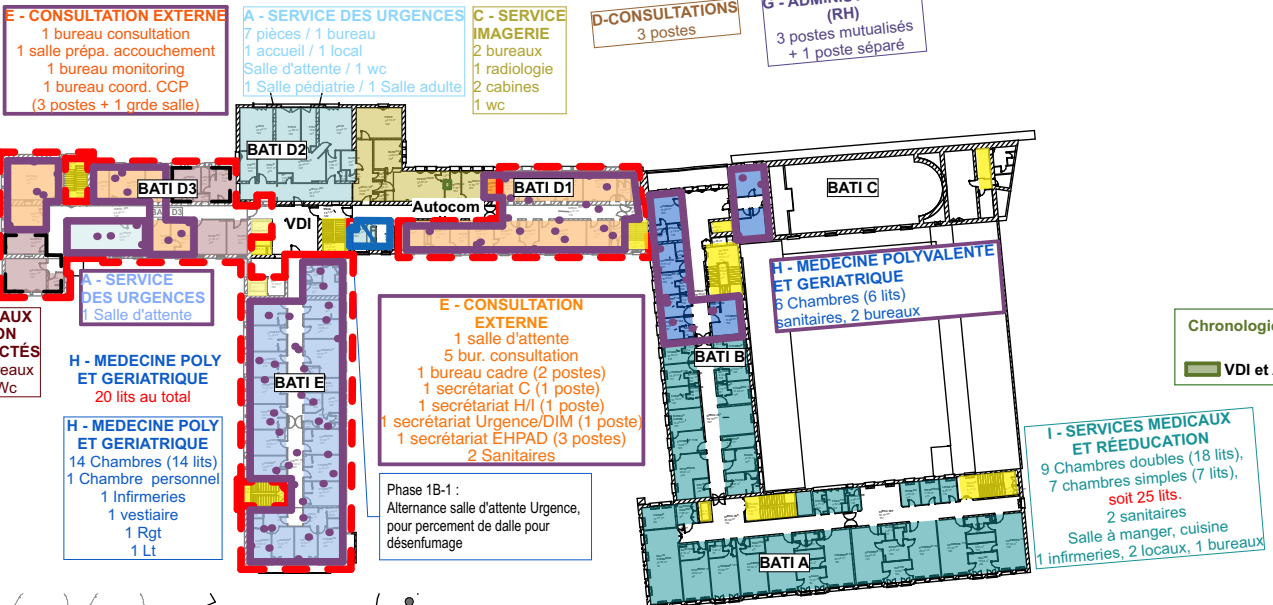

RDC

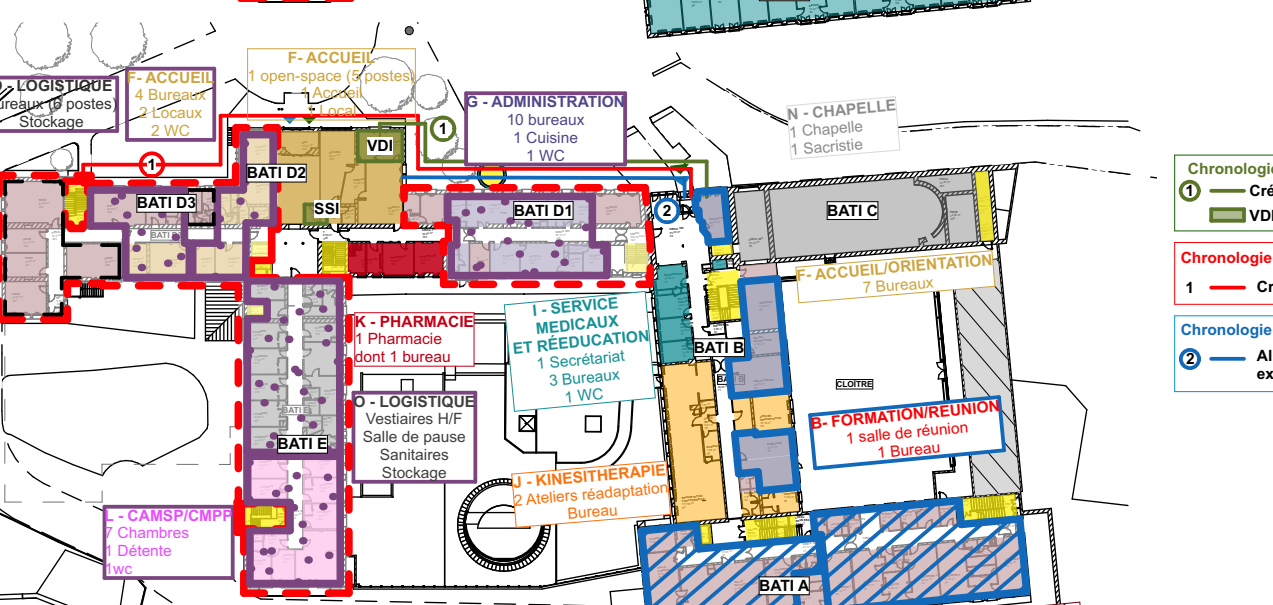

R-1

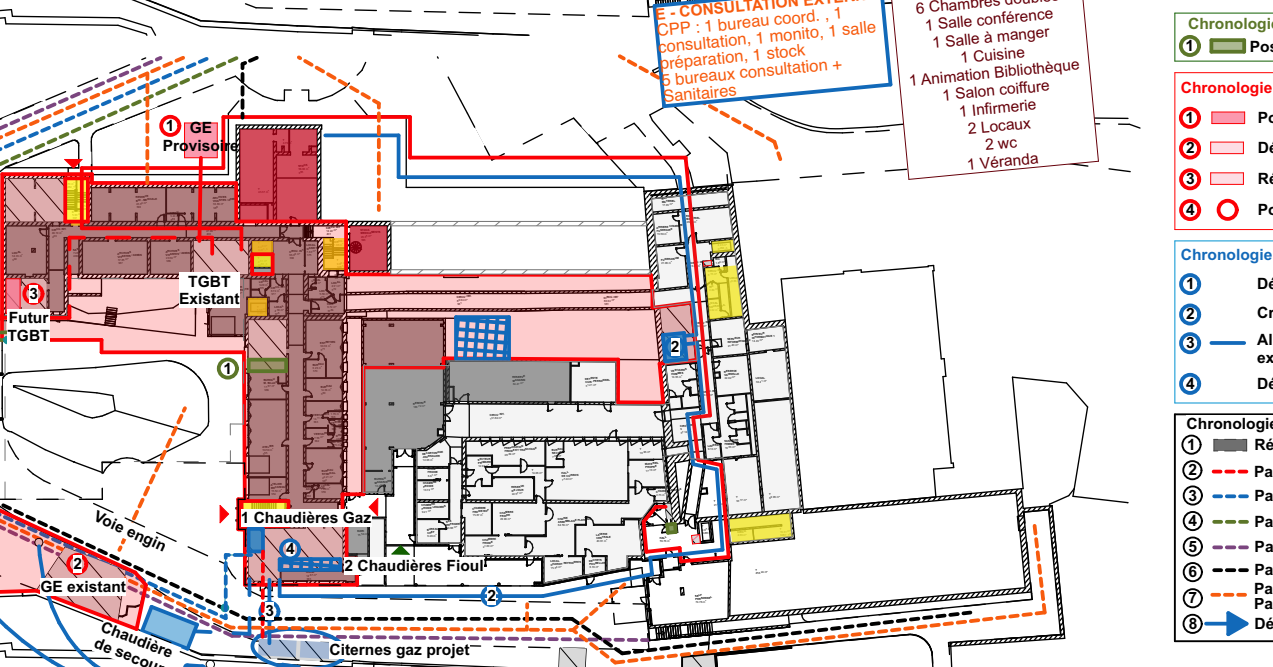

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
 - ZONE A DEMENAGER
 - ZONE PROVISoire avec TRVX
 - ZONE PROVISoire dans définitif
 - ZONE TRAVAUX PROVISoire
 - ZONE TRAVAUX
 - ZONE REALISEE / RENOVEE
 - LOCAUX NON AFFECTES
 - CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
 - CIRC. VERTICALES CHANTIER
 - ESCALIER PROVISoire
 - ACCES PUBLIC
 - ACCES PERSONNEL
 - ACCES CHANTIER
- Programme**
- A - SERVICE DES URGENCES
 - B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
 - C - SERVICE IMAGERIE
 - D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
 - E - CONSULTATIONS EXTERNES
 - F - ACCUEIL - ORIENTATION
 - G - ADMINISTRATION
 - H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
 - I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
 - J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
 - K - PHARMACIE
 - L - CAMPS ET CMPP
 - M - INTERNAT
 - N - CHAPELLE
 - O - LOGISTIQUE
 - P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
 - Q - LOCAUX TECHNIQUES
 - LNA - LOCAUX NON AFFECTES
 - ZONE HORS PROJET

Chronologie des travaux pour le courant faible - Phase 1A

VDI et Autocom CONSERVÉS jusqu'à la fin de la phase 1

Chronologie des travaux pour le courant faible - Phase 1A

① Création ligne VDI pour ali. Bât A/B/C/D2 et RDJ

VDI et SSI CONSERVÉS jusqu'à la fin de la phase 1

Chronologie des travaux pour le courant fort - Phase 1A

① Création ligne BT pour alim. Bât A/B/C/D2 et RDJ

Chronologie des travaux pour plomberie / CVC - Phase 1A

② Alim. EF/ECS/Chauff ss-station 3 depuis chaufferie existante, chaudière mobile en secours

Chronologie des travaux pour le courant faible - Phase 1A

① Pose réseau DECT provisoire yc extension autocom

Chronologie des travaux pour le courant fort - Phase 1A

① Pose GE de chantier de secours au TGBT existant

② Dépose GE existant et mise à disposition MO

③ Réalisation TGBT projet

④ Pose nouveau GE et raccord au TGBT projet

Chronologie des travaux pour plomberie / CVC - Phase 1A

① Déplacement citernes gaz et raccord à ss-station 1

② Création ss-station 3 + Dépose cuves fioul existantes

③ Alim. EF/ECS/Chauff ss-station 3 depuis chaufferie existante, chaudière mobile en secours

④ Dépose chaudières existantes

Chronologie des travaux VRD

① Réalisation de dalle pour citernes Gaz

② Passage réseau Gaz

③ Passage réseau AEP

④ Passage réseau CFA / CFO

⑤ Passage réseau ECL


⑥ Passage réseau EU

⑦ Passage réseau EP

⑧ Passage réseau bassin tube Acier

⑧ Déplacement borne incendie

R+3

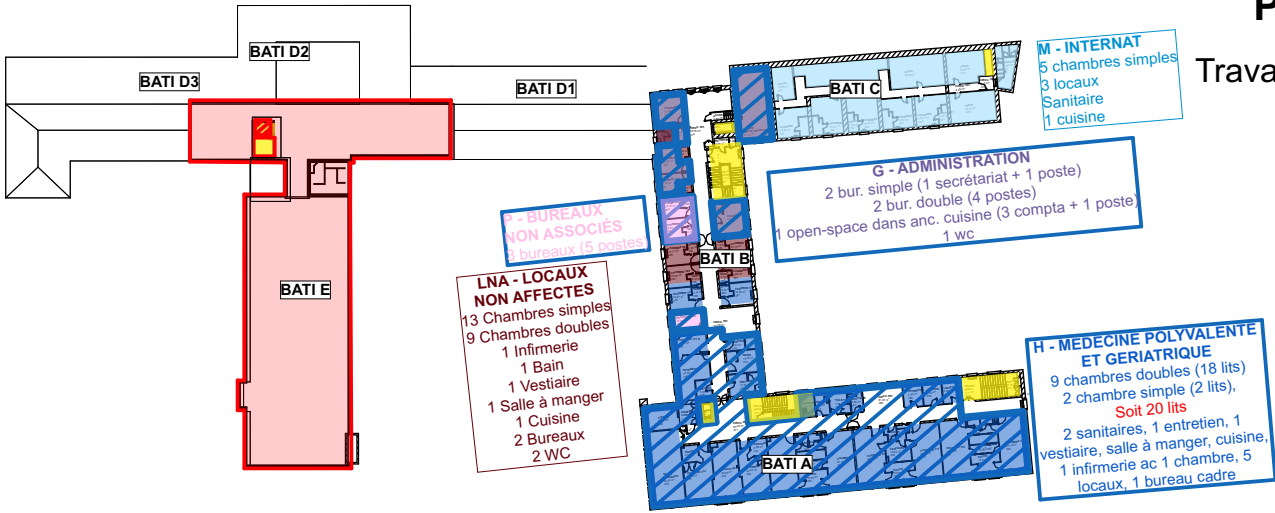


Phasage synthétique - Phase 1B


Travaux extensions Z1/Z2, RDJ et Bât D1/D3/E

- Légende :**
- SERVICE A DEMENAGER
 - ZONE A DEMENAGER
 - ZONE PROVISOIRE avec TRVX
 - ZONE PROVISOIRE dans définitif
 - ZONE TRAVAUX PROVISOIRE
 - ZONE TRAVAUX
 - ZONE REALISEE / RENOVEE
 - LOCAUX NON AFFECTÉS
 - CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
 - CIRC. VERTICALES CHANTIER
 - ESCALIER PROVISOIRE
 - ACCES PUBLIC
 - ACCES PERSONNEL
 - ACCES CHANTIER
- Programme**
- A - SERVICE DES URGENCES
 - B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
 - C - SERVICE IMAGERIE
 - D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
 - E - CONSULTATIONS EXTERNES
 - F - ACCUEIL - ORIENTATION
 - G - ADMINISTRATION
 - H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
 - I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
 - J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
 - K - PHARMACIE
 - L - CAMPS ET CMPP
 - M - INTERNAT
 - N - CHAPELLE
 - O - LOGISTIQUE
 - P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
 - Q - LOCAUX TECHNIQUES
 - LNA - LOCAUX NON AFFECTES
 - ZONE HORS PROJET


R+2

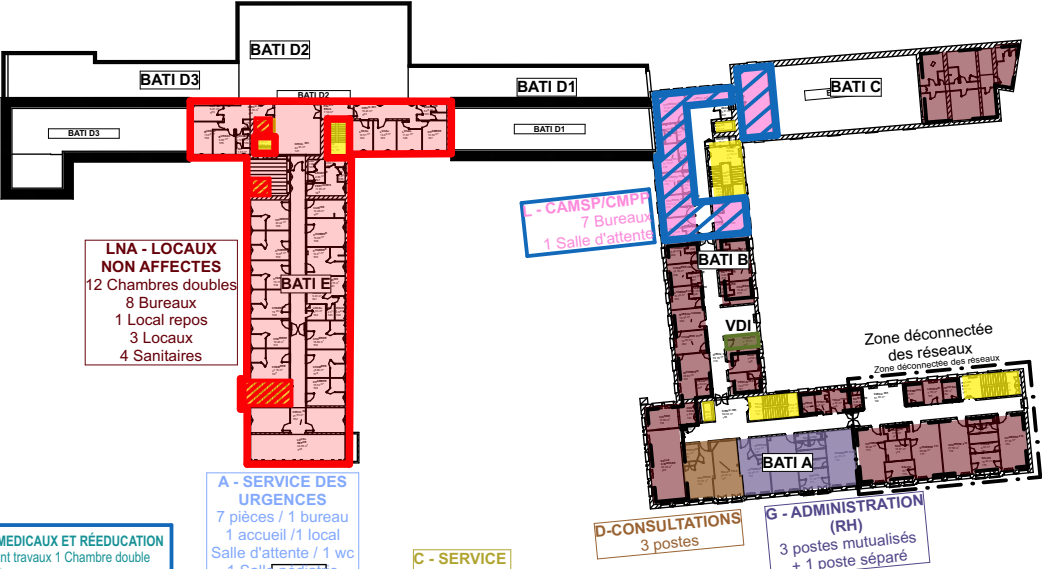


R+1

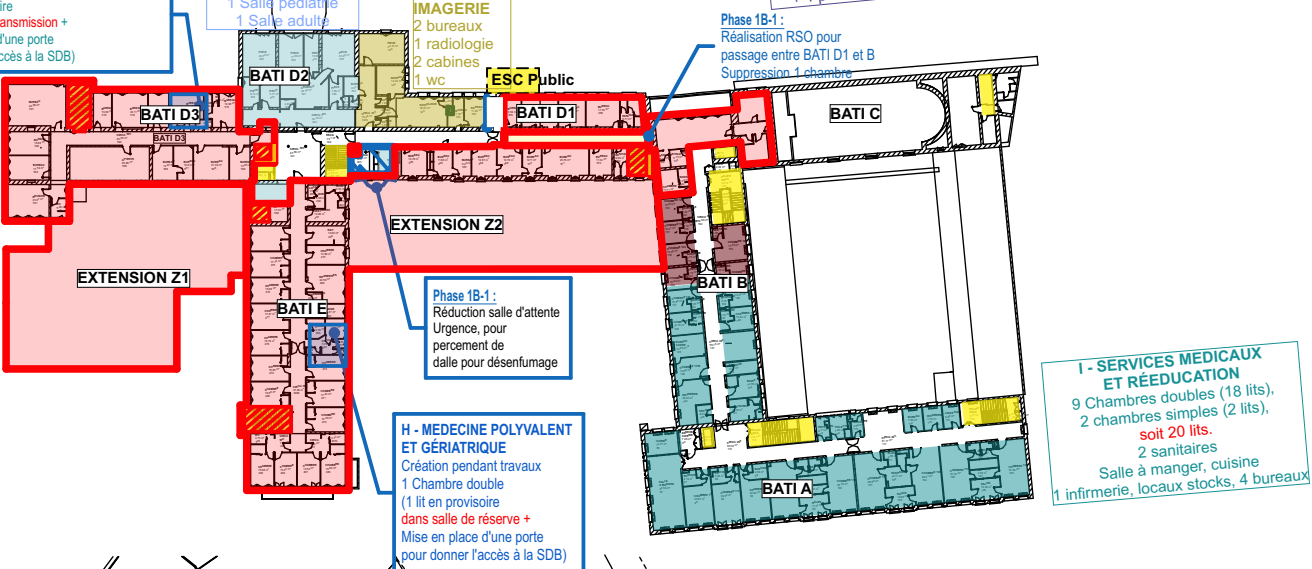

RDC

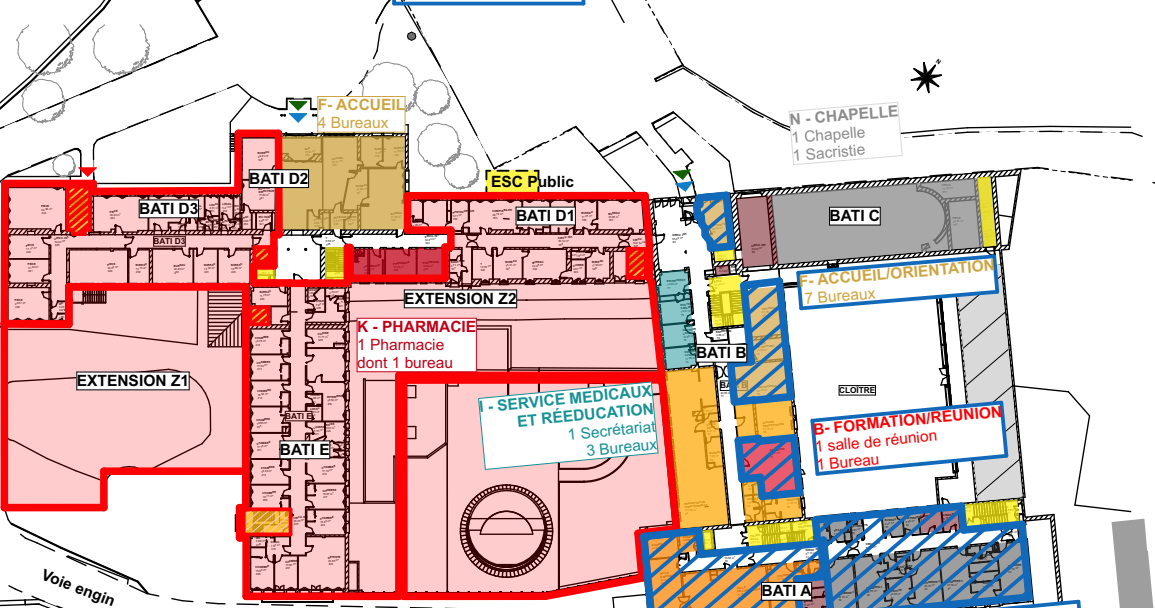


R-1

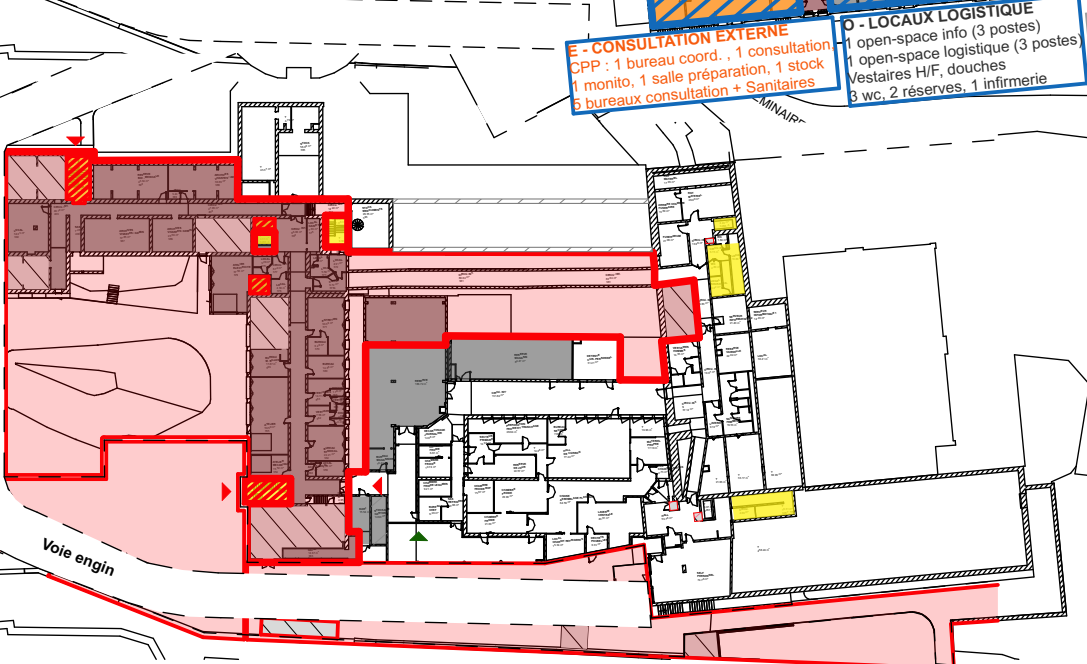


Descriptif travaux :

- Phase 1B-1 : R+1 - Percement dalle pour désenfumage et déplacement de la salle d'attente des A-SERVICE DES URGENCES
- R+1 - Percement dans le voile permettant de lier le bâtiment B au bâtiment D1
- Réhabilitation du rez-de-jardin
- Création des extensions Z1 et Z2
- Réhabilitation des bâtiments D3 / D1 / E et le R+1 d'un la partie nord du bati B
- Création de l'hélistation


R+3

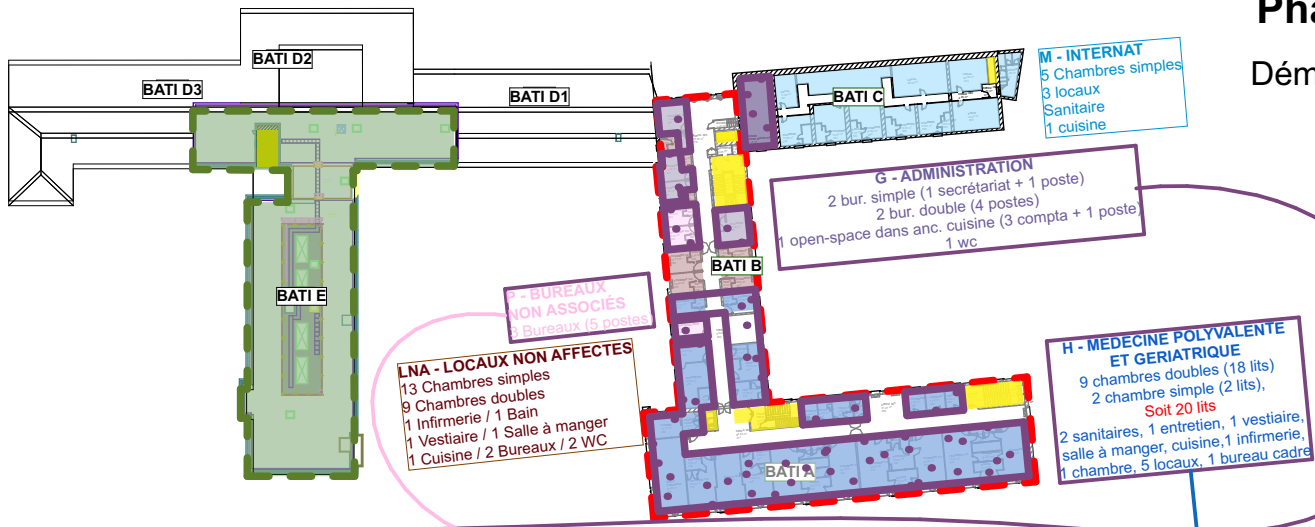


R+2

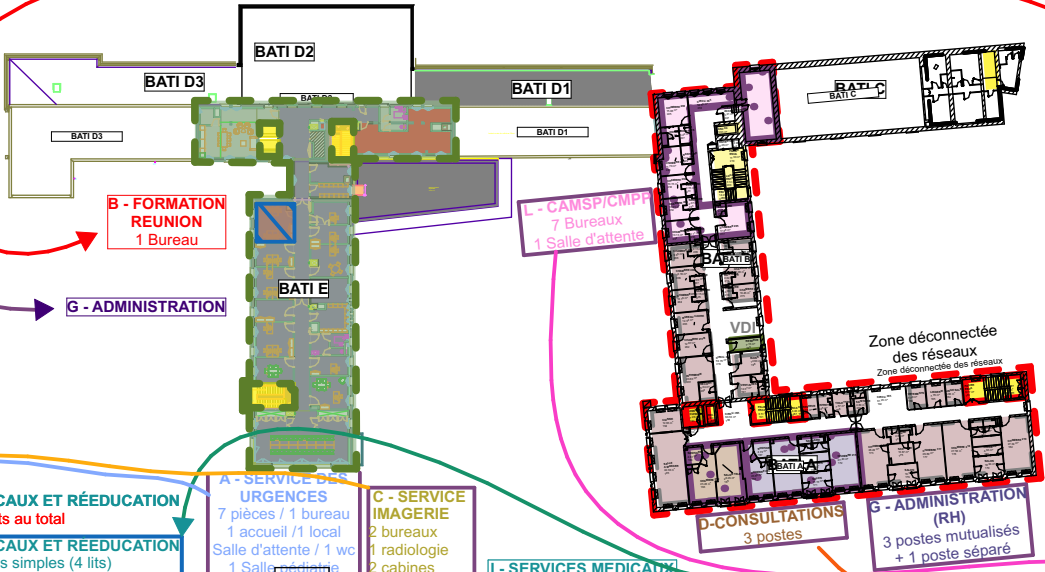

R+1

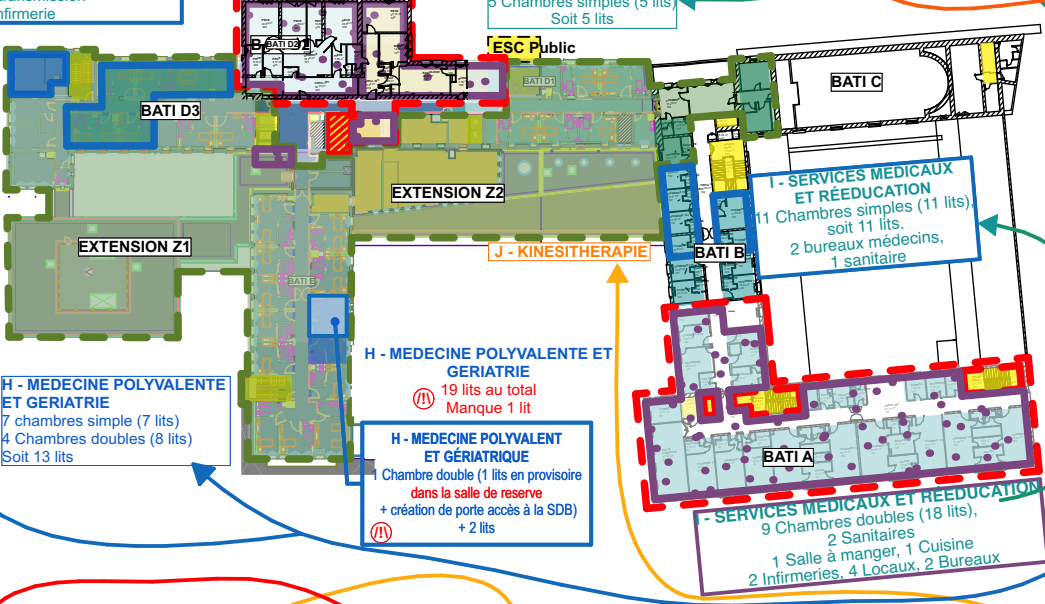

RDC

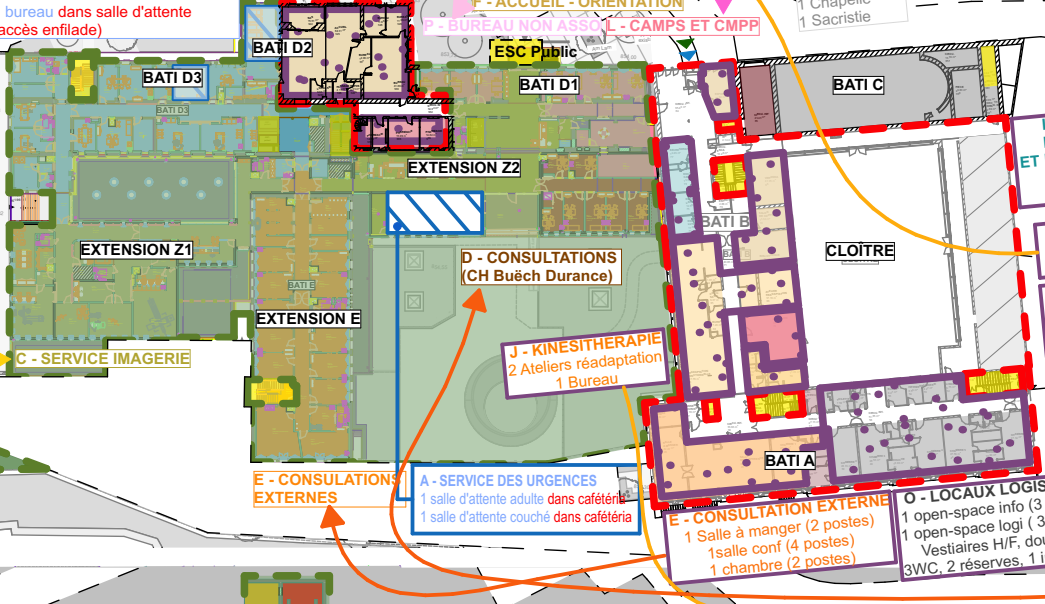

R-1



Phasage synthétique - Phase 2A

Déménagement vers Z1/Z2, et Bât D1/D3/E

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISOIRE avec TRVX
- ZONE PROVISOIRE dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISOIRE
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTES
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISOIRE
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER


Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET

Descriptif Déménagement :

- 1 - Déménagement définitif **PHARMACIE RDC BATI D1** vers **RDJ EXTENSION Z1**
- 2 - Déménagement définitif **O - LOGISTIQUE R+3 BATI A** vers **RDJ BAT E**
- 3 - Déménagement définitif **F-ACCUEIL RDC BATI D2** et **B** vers **RDC BAT D1**
- 4 - Déménagement définitif **E-CONSULTATION EXTERNE RDC BAT A** vers **RDC BAT E**
- 5 - Aménagement définitif **D-CONSULTATION** vers **RDC Extension Z2** (manque 2 bureaux + salle d'attente sur programme définitif)
- 6 - Déménagement Définitif **J-Kinésithérapeutes RDC BATI B** vers **R+1 Extension Z2** (manque 1 stockage et 1 bureau sur programme définitif)
- 7 - Déménagement Définitif **A-URGENCE R+1 BATI D2** vers **RDC BAT D3** (création temporaire 1 salles d'attente enfant)
- 8 - Déménagement Définitif **SERVICE IMAGERIE R+1 BATI D2** vers **RDC EXTENSION Z1**
- 9 - Déménagement définitif **I-SERVICE MEDICAUX RDC BATI B / R+1 BATI A / R+2 BATI A** vers :
 - R+1 BAT B (11 lits provisoire dans EDL)
 - R+1 BAT D1 (5 lits)
 - R+1 BAT D3 (4lits)**TOTAL de 20 lits**
- 10 - Déménagement définitif d'une partie du **H- MEDECINE POLY ET GERIATRIE R+1 BAT B** vers **R+1 BATI E**
 - R+1 BAT D3 (2 lits)
 - R+1 BAT E (16 lits +1 lits provisoire)**TOTAL de 19 lits** (création 1 Chambre provisoire double (2 lits)
- 12 - Déménagement définitif **L-CAMSP R+2 BATI B** vers **RDC BATI D1** (manque 1 salle d'attente + sanitaire sur programme définitif)
- 13 - Déménagement Définitif **G-Admin RDC BATI A** vers **R+2 BAT E** (manque 1 bureau comptabilité sur programme définitif)
- 14 - Déménagement provisoire **B - ESPACE FORMATION BATI B RDC** vers **R+2 BATI E**

R+3

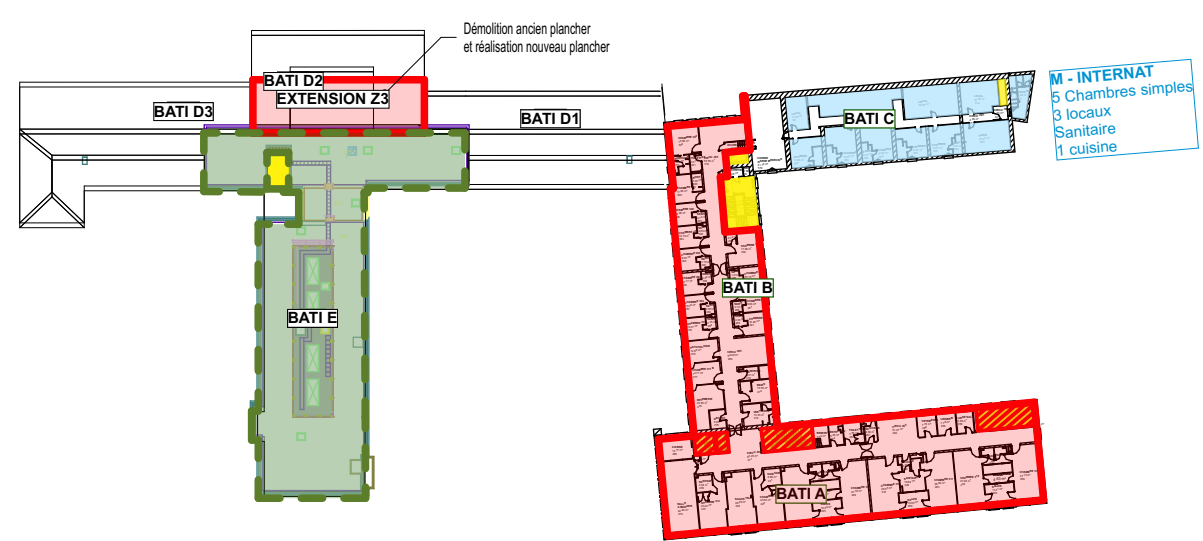

Phasage synthétique - Phase 2B-1

Travaux bât neuf Z3 et bât A/B


Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISOIRE avec TRVX
- ZONE PROVISOIRE dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISOIRE
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTÉS
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISOIRE
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER


Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET


R+2

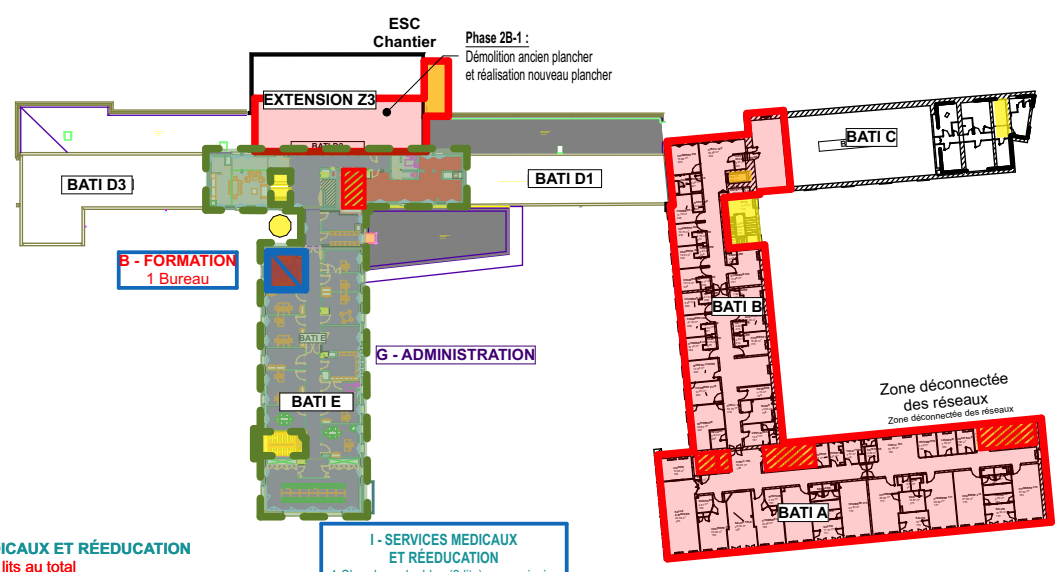


R+1

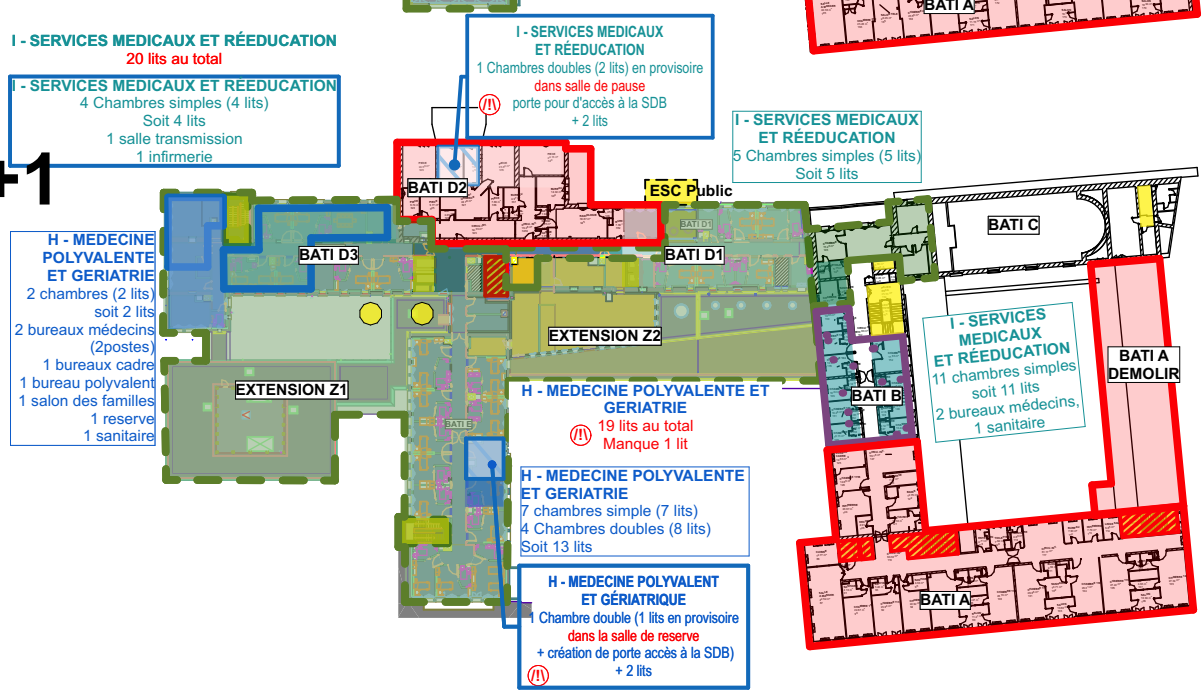

RDC

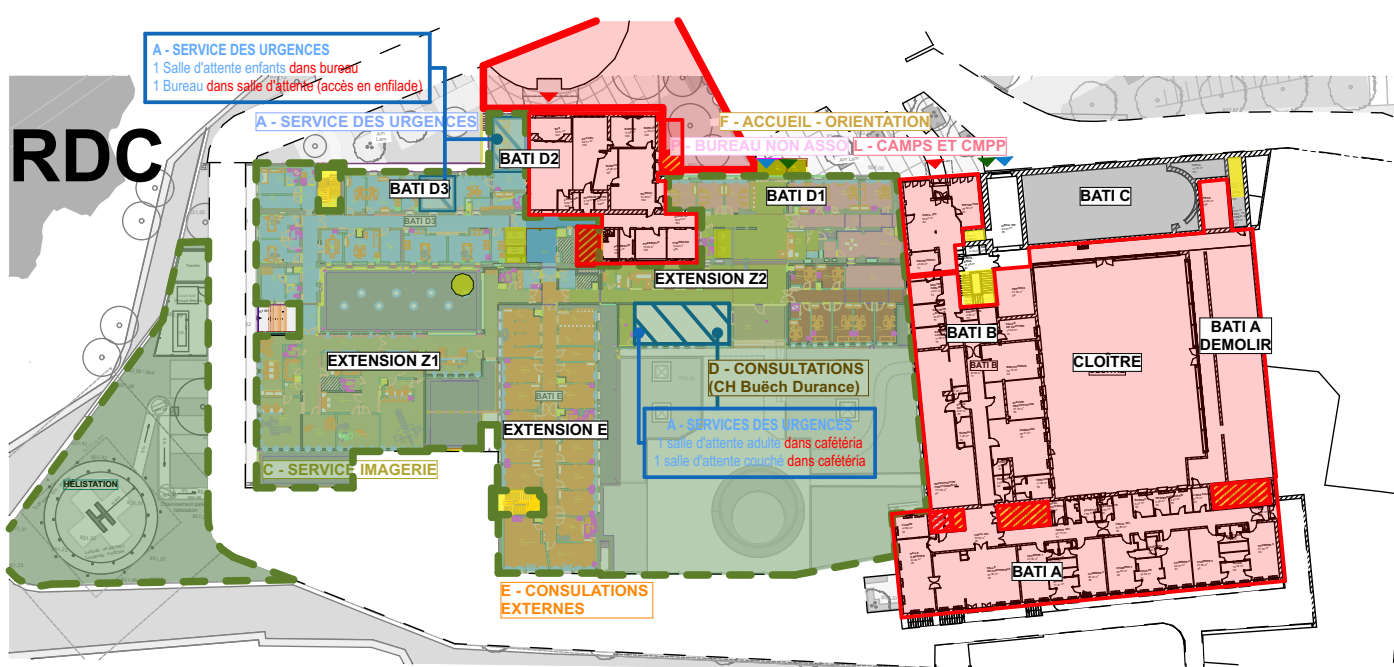


R-1

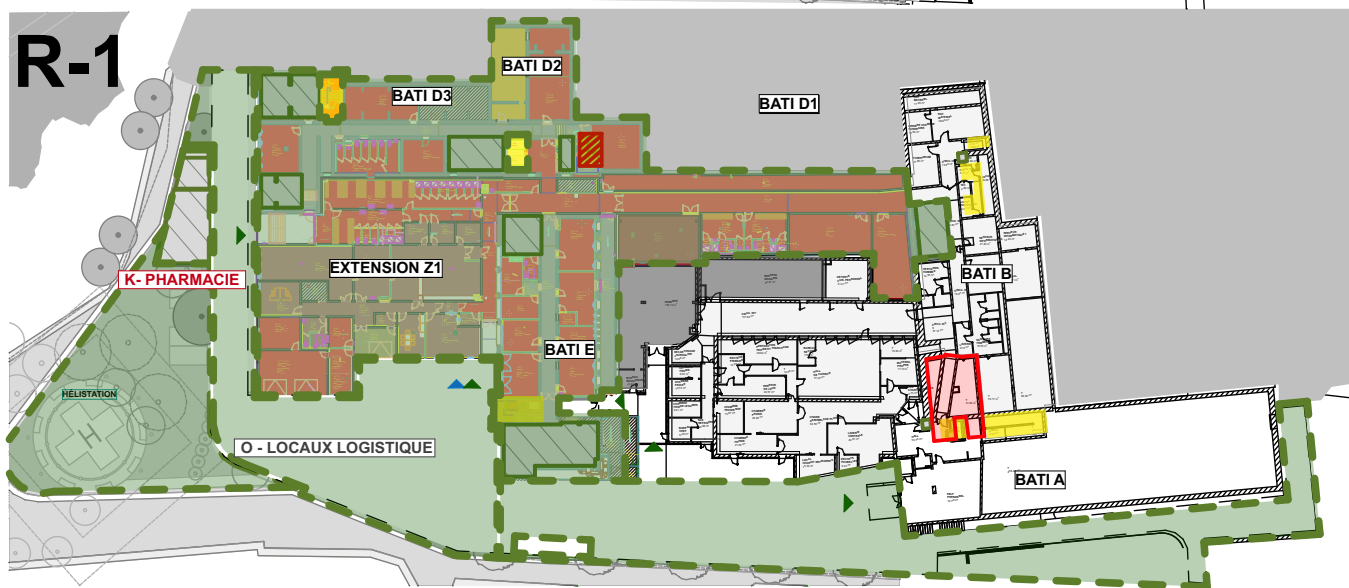


Descriptif travaux :

- RDC livraison partielle du **A-SERVICE DES URGENCE**, accès par RDJ
- Démolition de l'ancienne blanchisserie et de plancher haut du R+2 bati D2 en amont de la création de l'extension Z3
- Réhabilitation des bâtiments A / B / D2

R+3

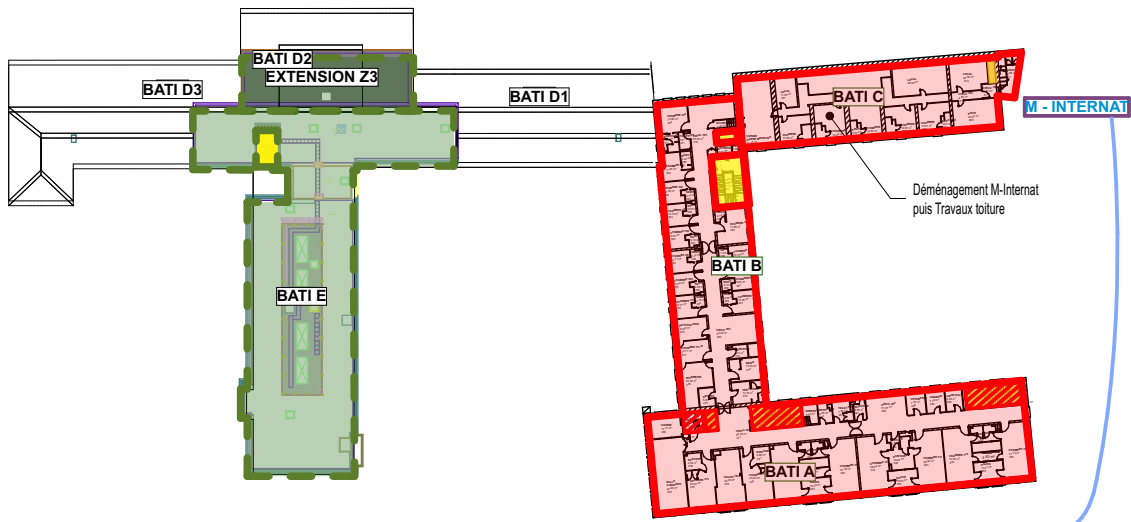

R+2

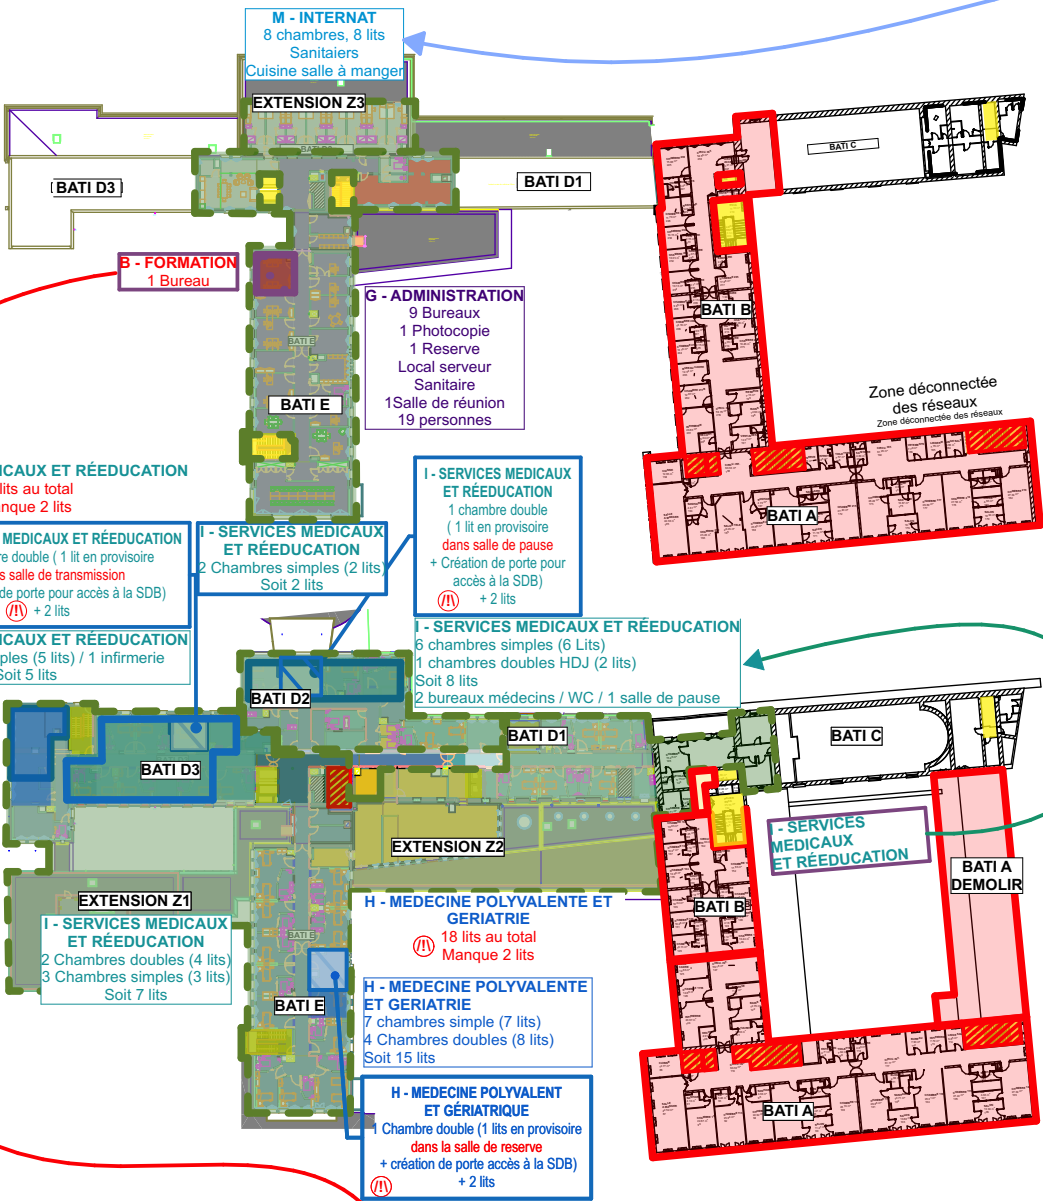

R+1

RDC

R-1

RDJ

Phasage synthétique - Phase 2B-2

Dmngt Internat, Toiture bât C, Travaux bât A/B

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISOIRE avec TRVX
- ZONE PROVISOIRE dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISOIRE
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTÉS
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISOIRE
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER


Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET


Descriptif travaux :

- Conservation du couloir liant le R+1 du bâtiment D1 à la cage d'escalier du batiment B
- Emménagement définitif **B- FORMATION R+3 BATI E** vers **RDC BATI D2**
- Emménagement définitif **M- INTERNAT** vers **R+3 EXTENSION Z3**
- Emménagement définitif **L-CAMSP R+2 BATI B** vers **RDC BATI B**
1 salle d'attente + sanitaire sur programme définitif
- Déménagement provisoire **I-SERVICE MEDICAUX R+1 BATI B**
TOTAL de 18 lits
(manque 2 lits)
- Transformation provisoire de 2 lits **H-MEDECINE POLYVALENT**
TOTAL 18 lits
(manque 2 lits)
- Création d'un passage protégé amenant à la distribution vertical dans le batiment B
- Démolition de l'ancienne blanchisserie
- Réhabilitation des bâtiments A / B / C / D2


R+3

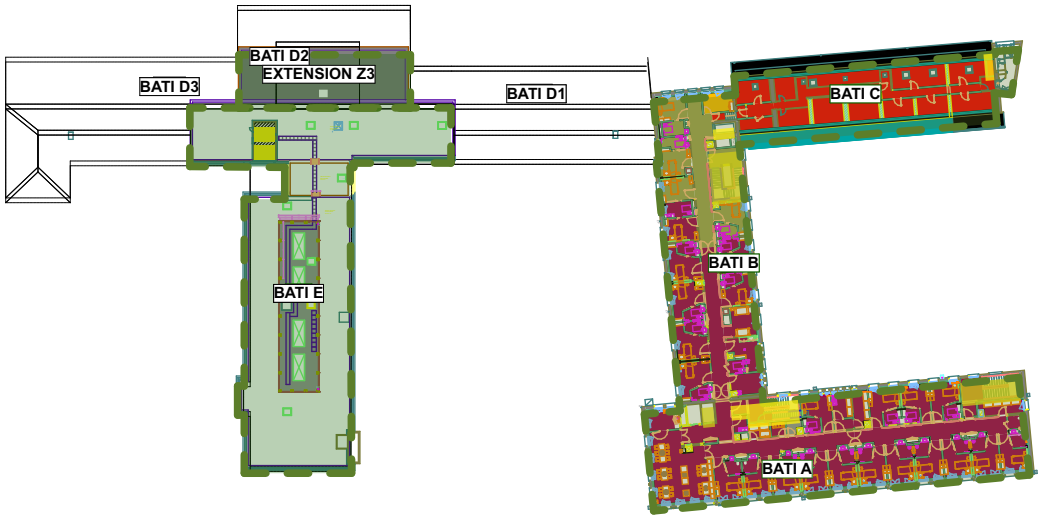


R+2

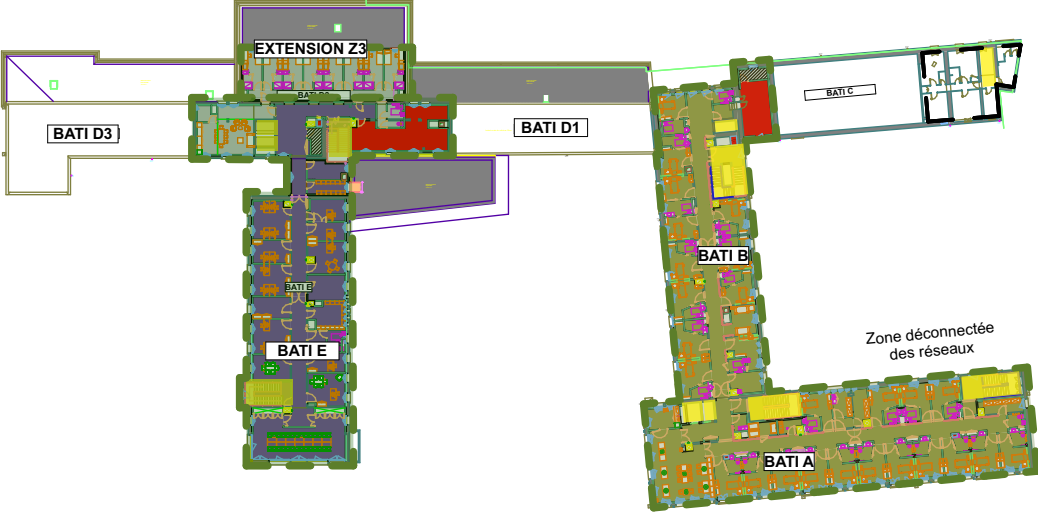


R+1

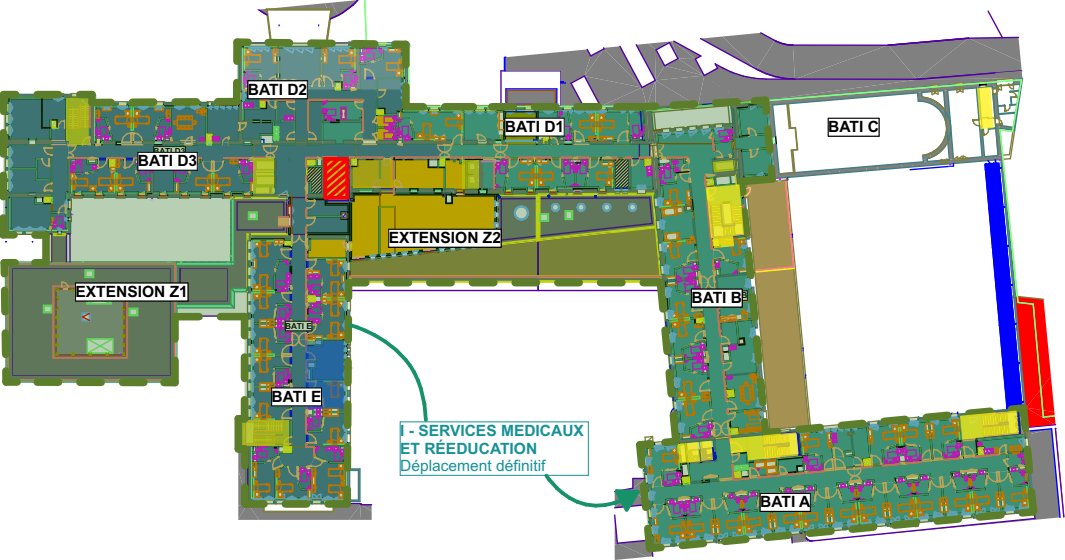

RDC

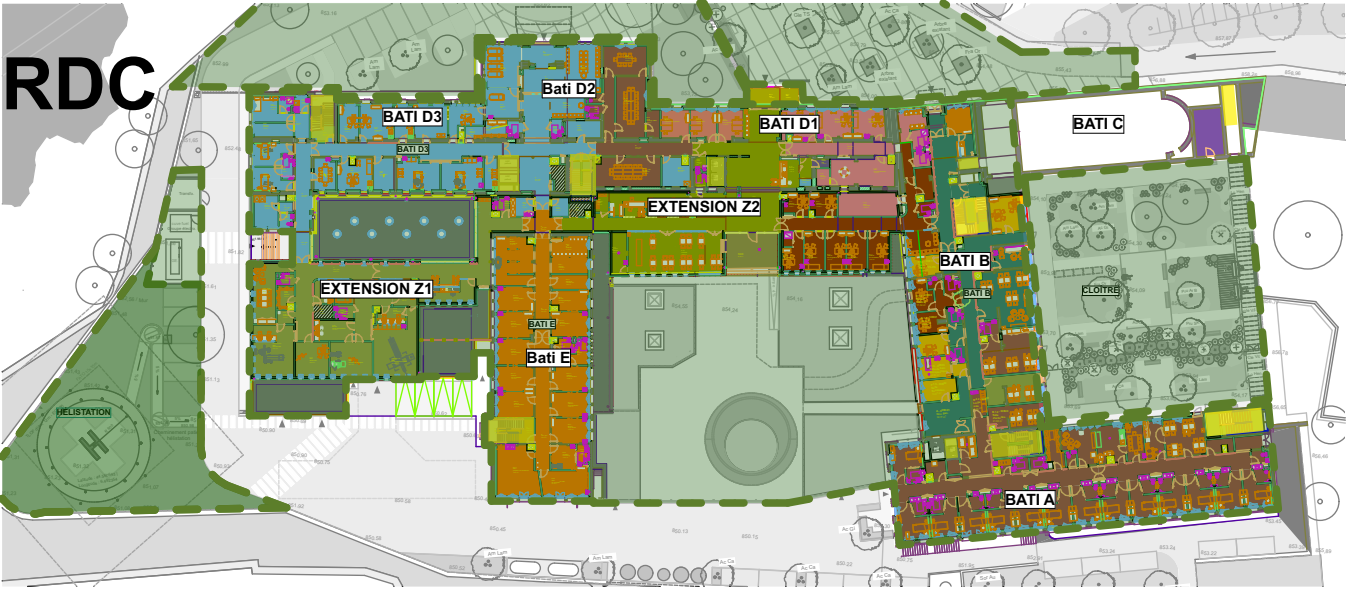

R-1

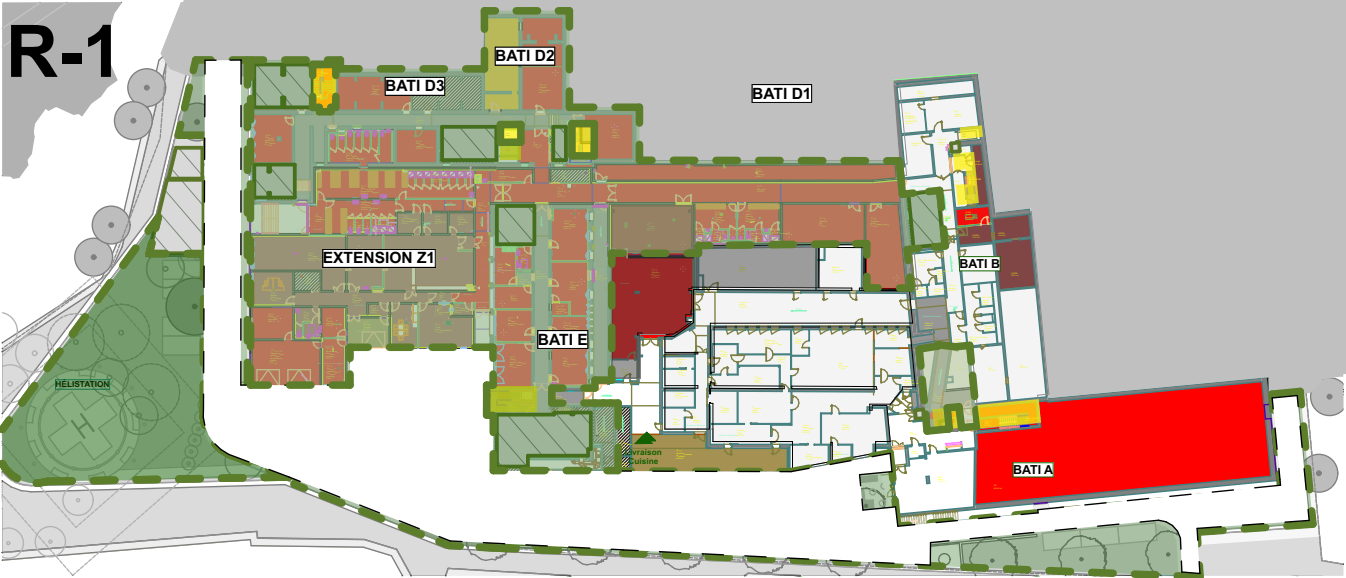

Phasage synthétique - Phase 3

Livraison projet

Légende :

- SERVICE A DEMENAGER
- ZONE A DEMENAGER
- ZONE PROVISoire avec TRVX
- ZONE PROVISoire dans définitif
- ZONE TRAVAUX PROVISoire
- ZONE TRAVAUX
- ZONE REALISEE / RENOVEE
- LOCAUX NON AFFECTÉS
- CIRC. VERTICALES PUBLIQUES
- CIRC. VERTICALES CHANTIER
- ESCALIER PROVISoire
- ACCES PUBLIC
- ACCES PERSONNEL
- ACCES CHANTIER

Programme

- A - SERVICE DES URGENCES
- B - ESPACES DE REUNION ET DE FORMATION
- C - SERVICE IMAGERIE
- D - CONSULTATIONS (CH Buëch Durance)
- E - CONSULTATIONS EXTERNES
- F - ACCUEIL - ORIENTATION
- G - ADMINISTRATION
- H - MEDECINE POLYVALENTE ET GERIATRIQUE
- I - SERVICES MEDICAUX ET DE REEDUCATION
- J - KINESITHERAPIE ET ERGOTHERAPIE
- K - PHARMACIE
- L - CAMPS ET CMPP
- M - INTERNAT
- N - CHAPELLE
- O - LOGISTIQUE
- P - BUREAU NON ASSOCIES A UN SERVICE
- Q - LOCAUX TECHNIQUES
- LNA - LOCAUX NON AFFECTES
- ZONE HORS PROJET
