

SUIVI DES MODIFICATIONS

Indice	Objet de la modification	Date	Visa Émetteur	Visa Contrôleur
0	Création du document	01/2023	FJT/CMY	EBR/DPT
A				
B				
C				



ROUTE NATIONALE 102  
LIAISON A75 -BRIOUDE

SIGNALISATION

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Pièce destinée à la compréhension  
PHASAGE ECHANGEUR DE COHADE



CLIENT	AFFAIRE	PHASE	N° DOC	TYPE DOC	IND.	DATE
DREAL	5601770	DCE	8401	PLA	0	01/2023


COHADE - PHASE 1 - Bretelle RN102 vers Clermont


Durée : 3 Semaines dont 2 nuits sous alternat

Construction de la bretelle de raccordement à l'ancienne RN102  
Mise en place d'un alternat de circulation  
pour raccorder les chaussées (travaux de nuits)

Raccord sur anneau en travaux  
de nuits sous alternat

Zone de travaux à réaliser  
sous alternat de nuits

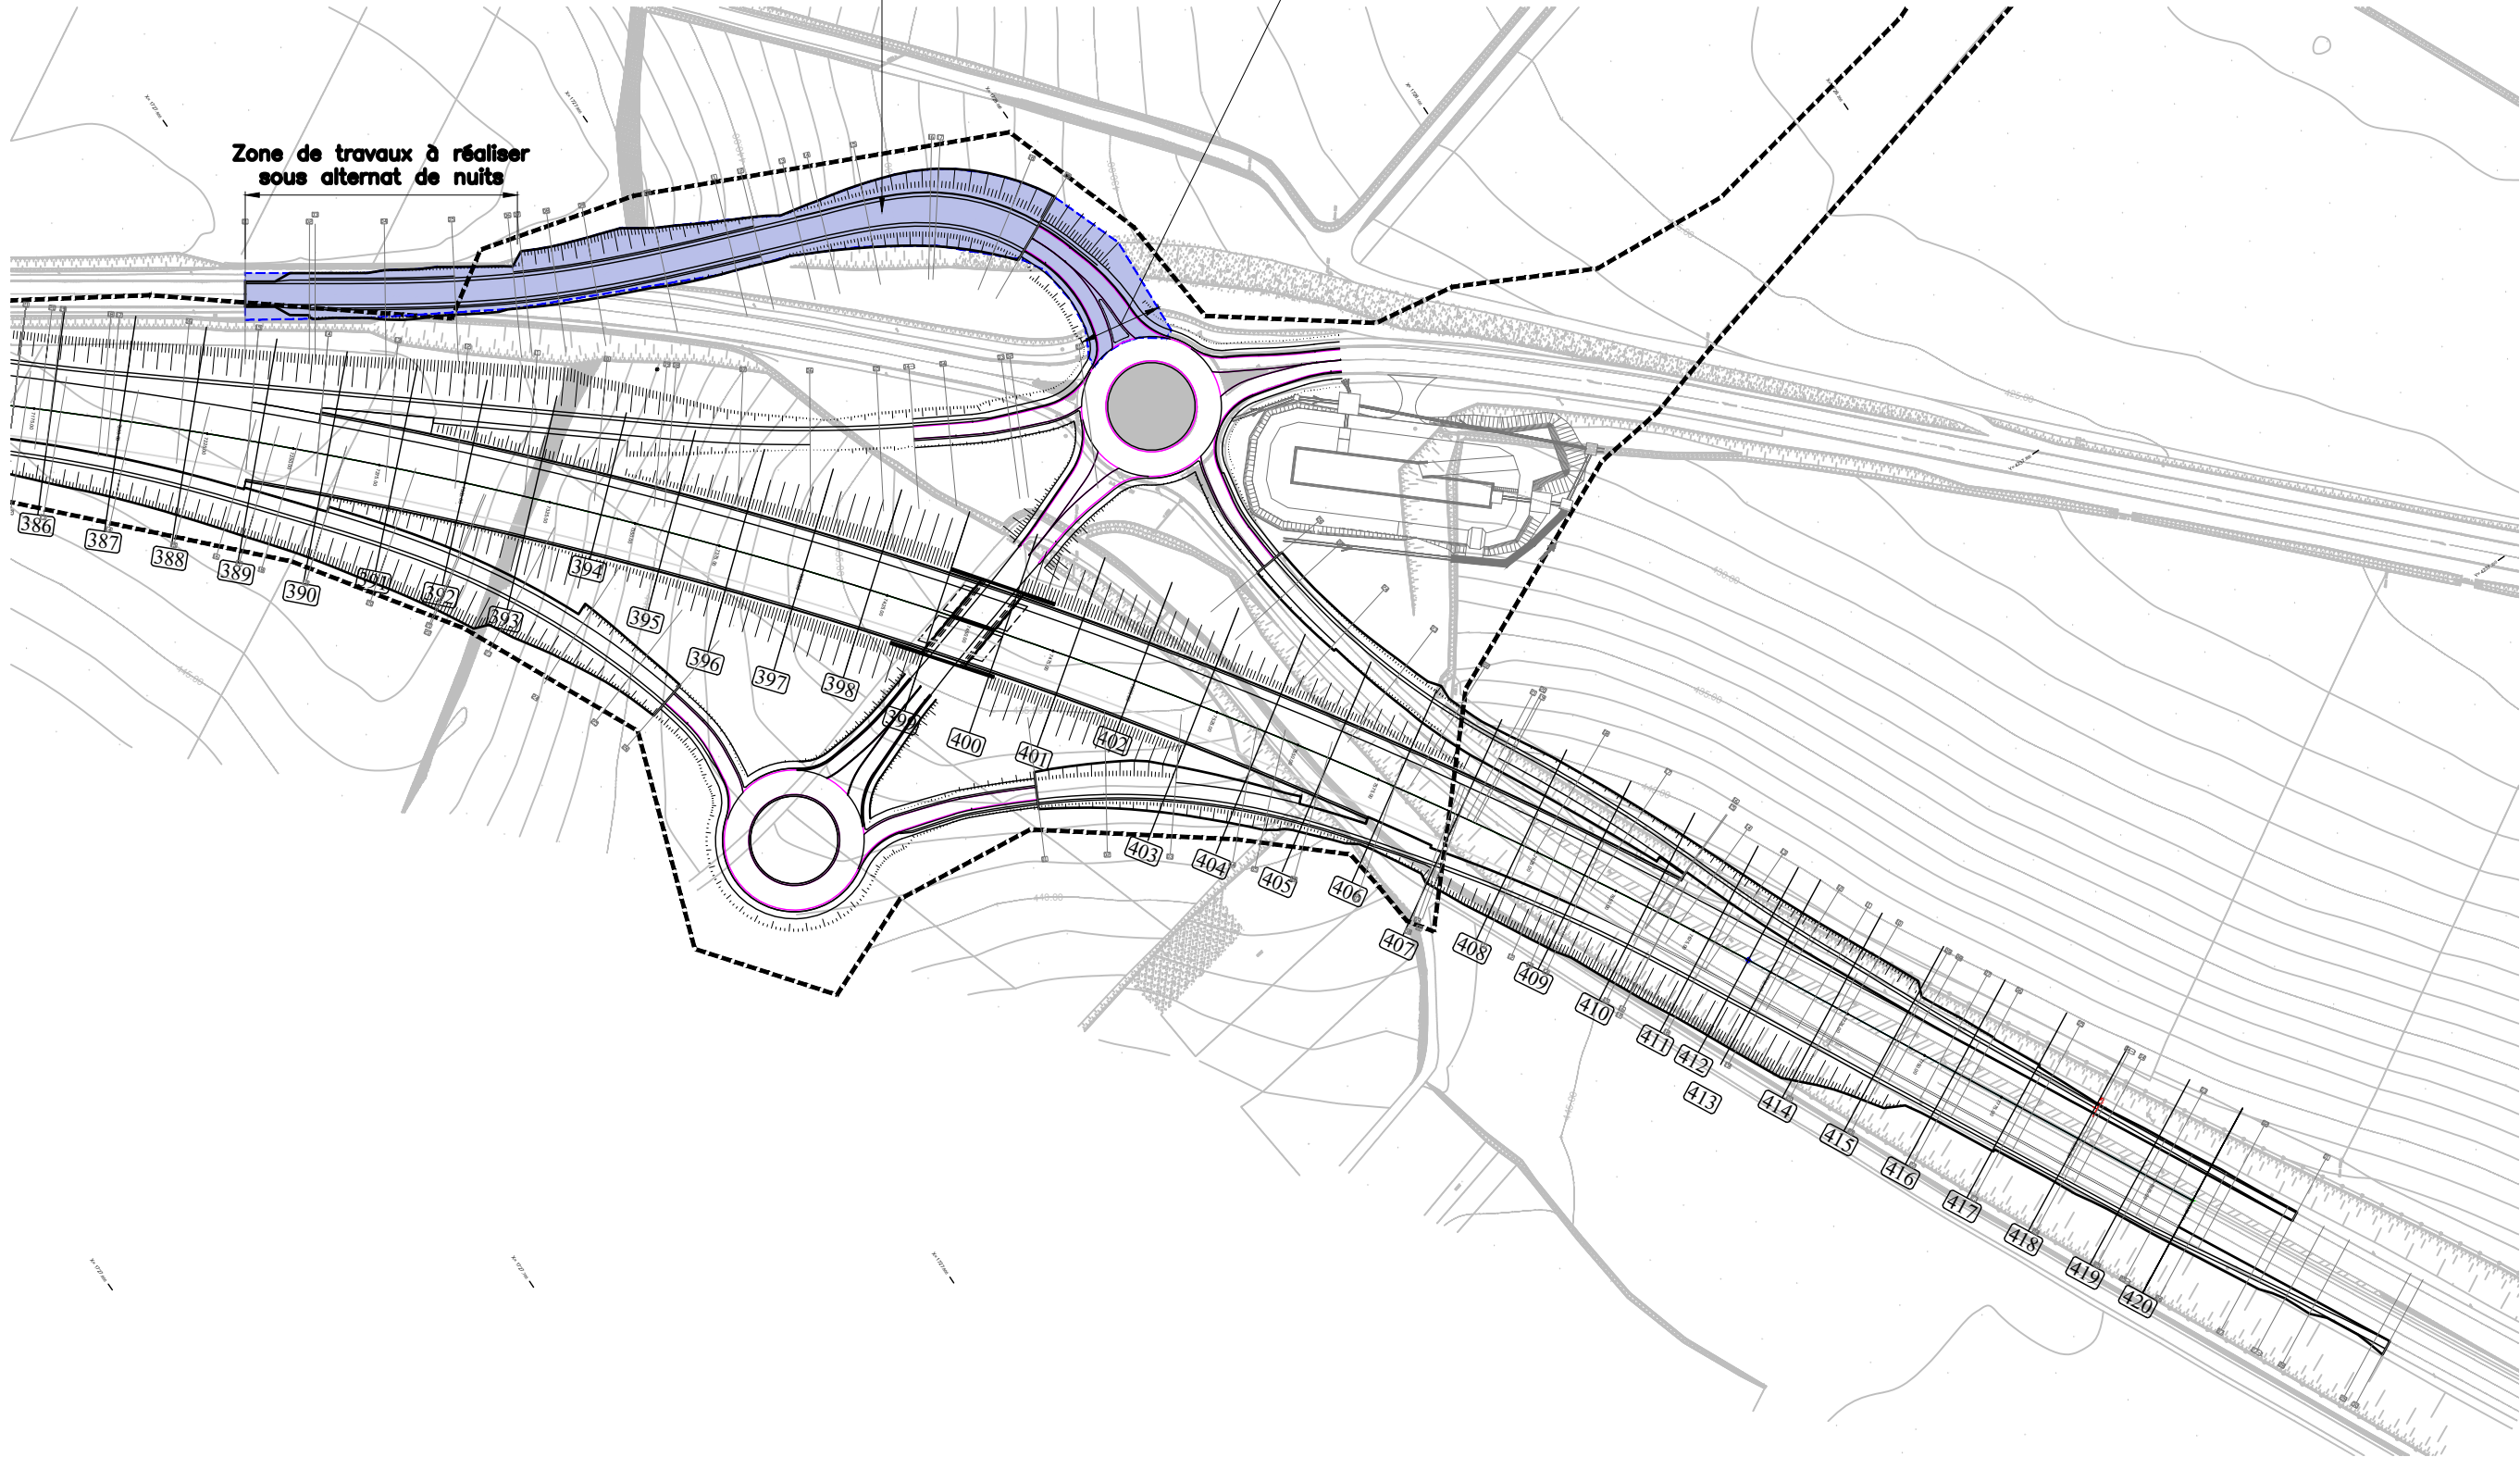


 N° affaire : 5601770	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes RN102 - Liaison A75 - Brioude	Phasage de construction Echangeur de COHADE	DCE	
			Ind. 0	Janvier 2023
	SIGNALISATION	Phase 1	A3	Ech : 1/2000
			Plan 8401	Folio 1



COHADE - PHASE 2 - Raccordement sur la plateforme de la déviation de LARGELIER

Durée : 6 Semaines dont 4 nuits pour pose SMV et signalisation provisoire

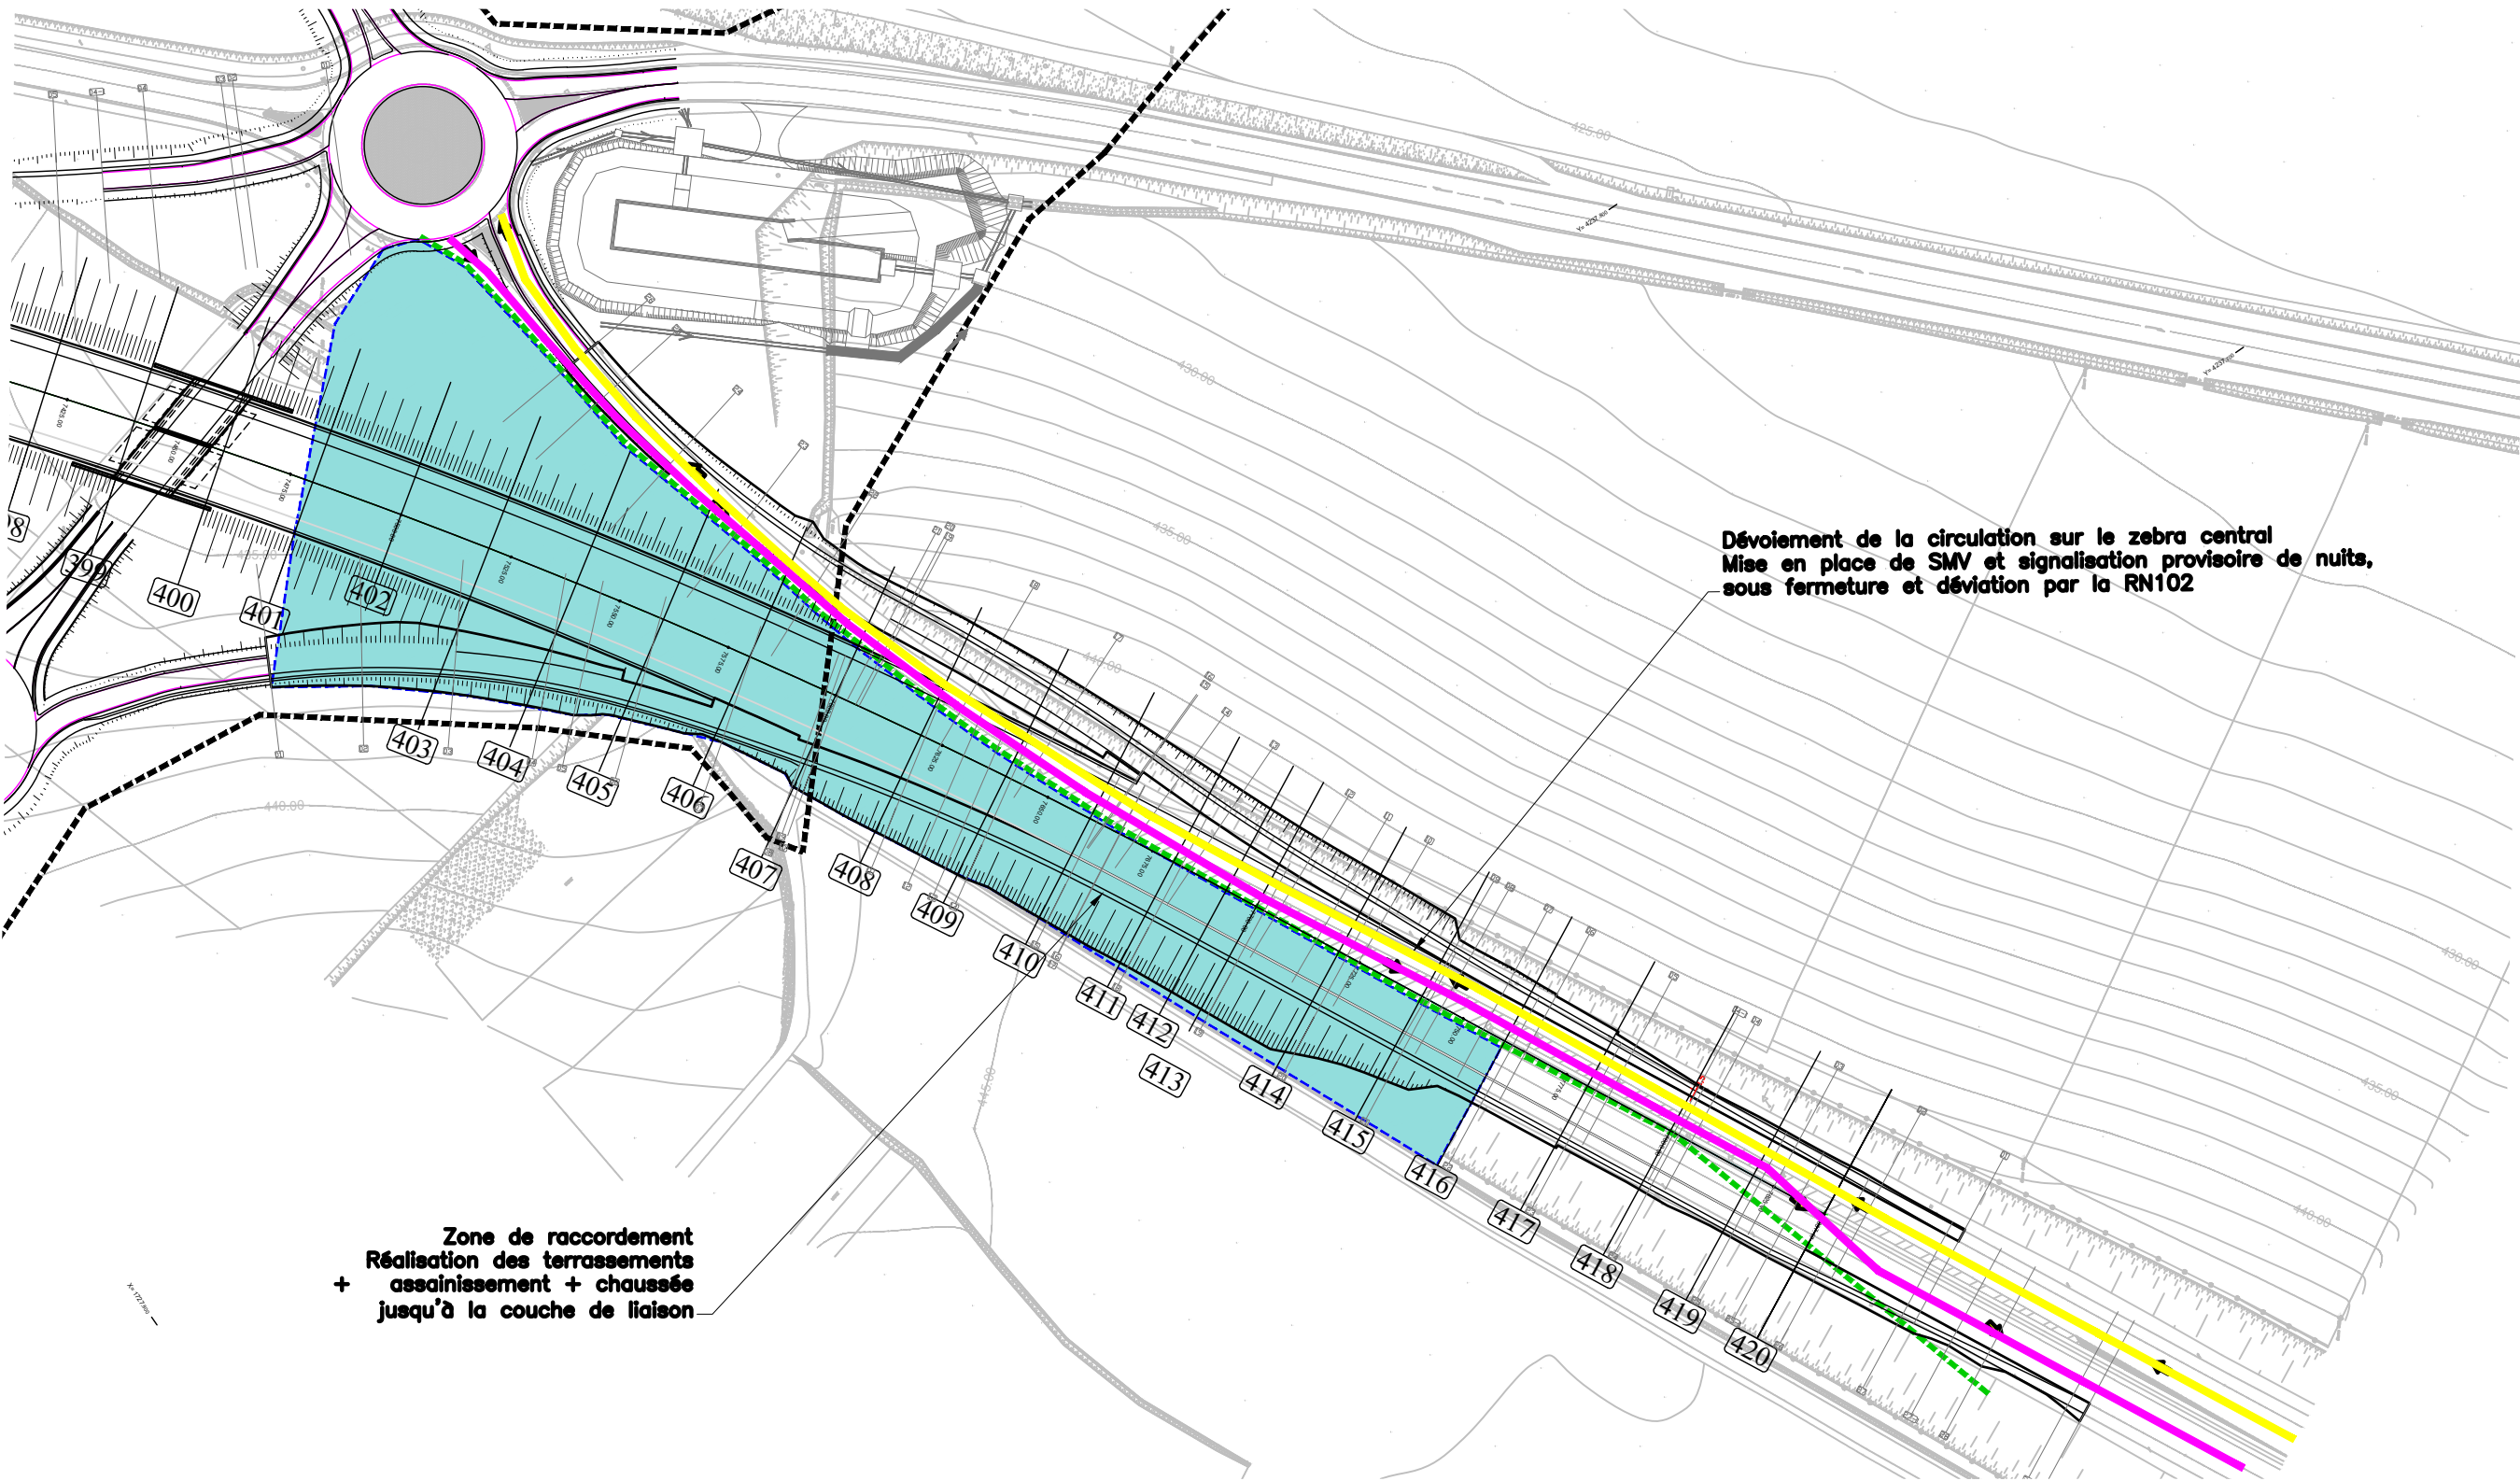

LEGENDE :


- SMV
- Sens Clermont / Brioude
- Sens Brioude / Clermont

<div></div> <div>N° affaire : 5601770</div>	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes	Phasage de construction	DCE	
	RN102 - Liaison A75 - Brioude		Ind. 0	Janvier 2023
	SIGNALISATION	Phase 2	A3	Ech : 1/1500
			Plan 8401	Folio 2




COHADE - PHASE 3 - Basculement de la circulation sur la nouvelle plateforme  
Mise en service sur voie lente en bidirectionnel sur zone travaux

Durée : 4 Semaines

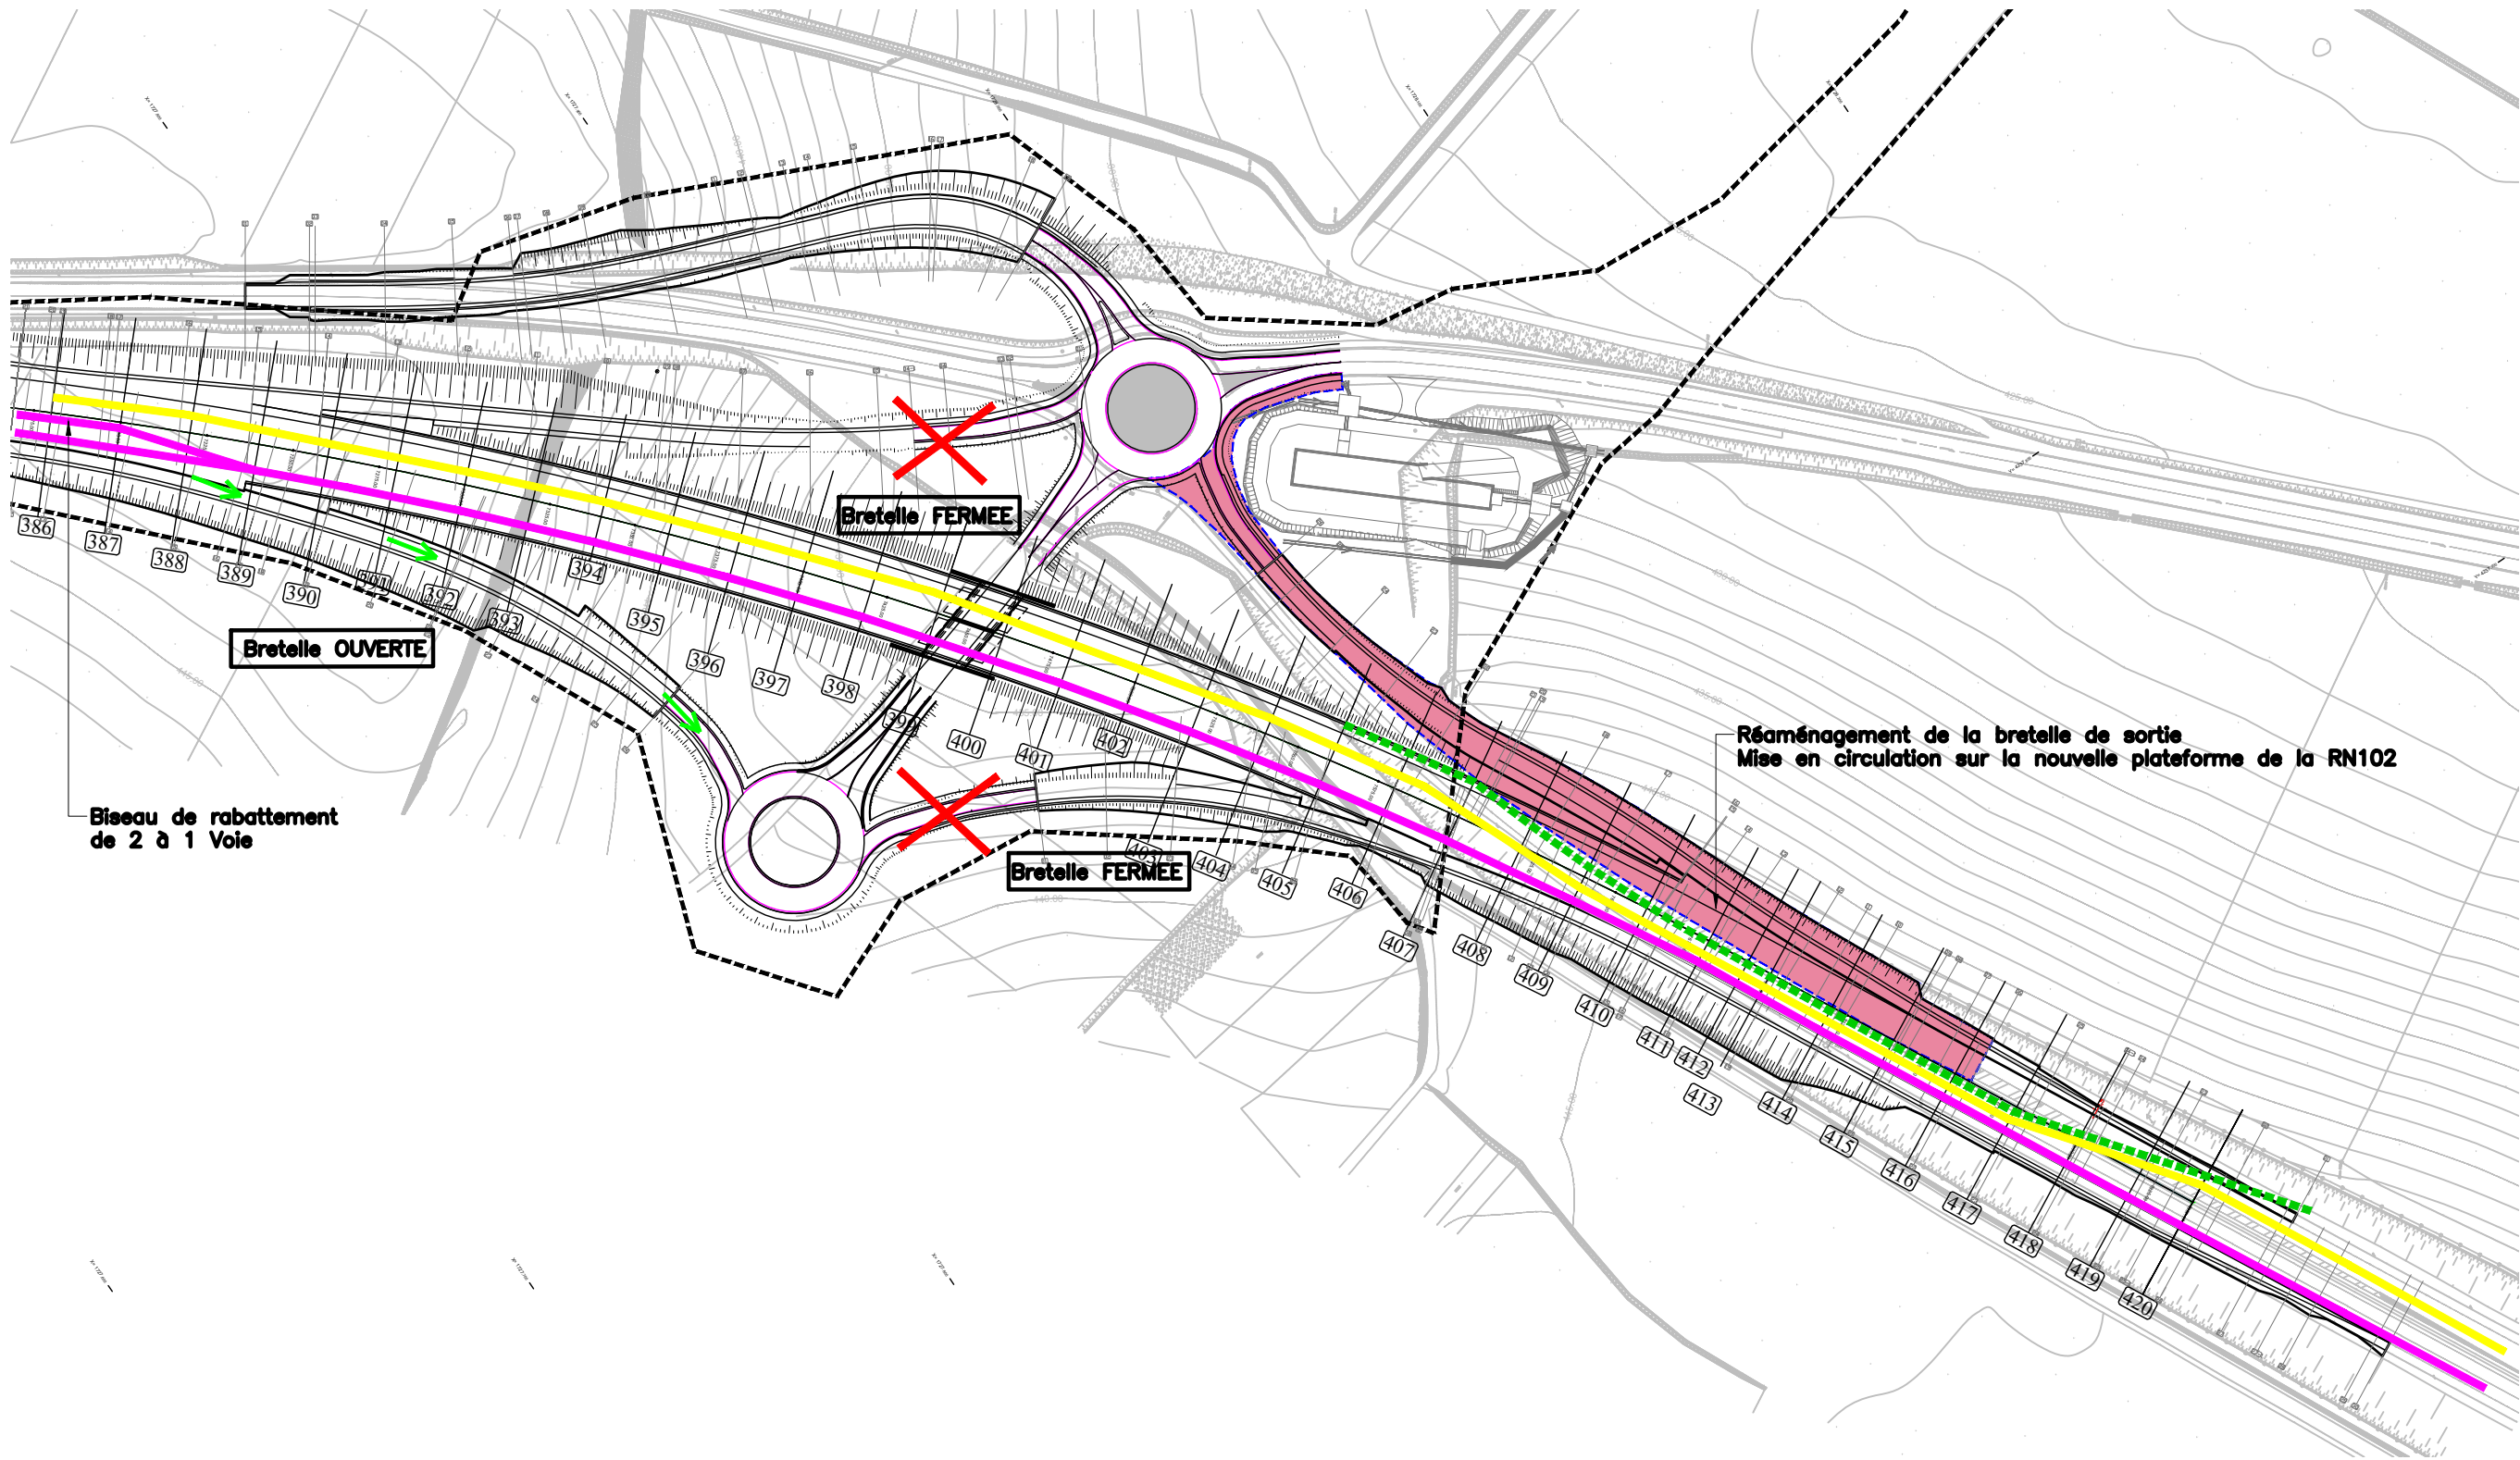

LEGENDE :


- SMV
- Sens Clermont / Brioude
- Sens Brioude / Clermont

<div> N° affaire : 5601770</div>	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes RN102 - Liaison A75 - Brioude	Phasage de construction Echangeur de COHADE	DCE	
	SIGNALISATION	Phase 3	Ind. 0	Janvier 2023
			A3	Ech : 1/2000
			Plan 8401	Folio 3




COHADE - PHASE 4A - Raccordement définitif RN102  
Déviation Largelier Sens Brioude - Clermont

Durée : 1 Semaine

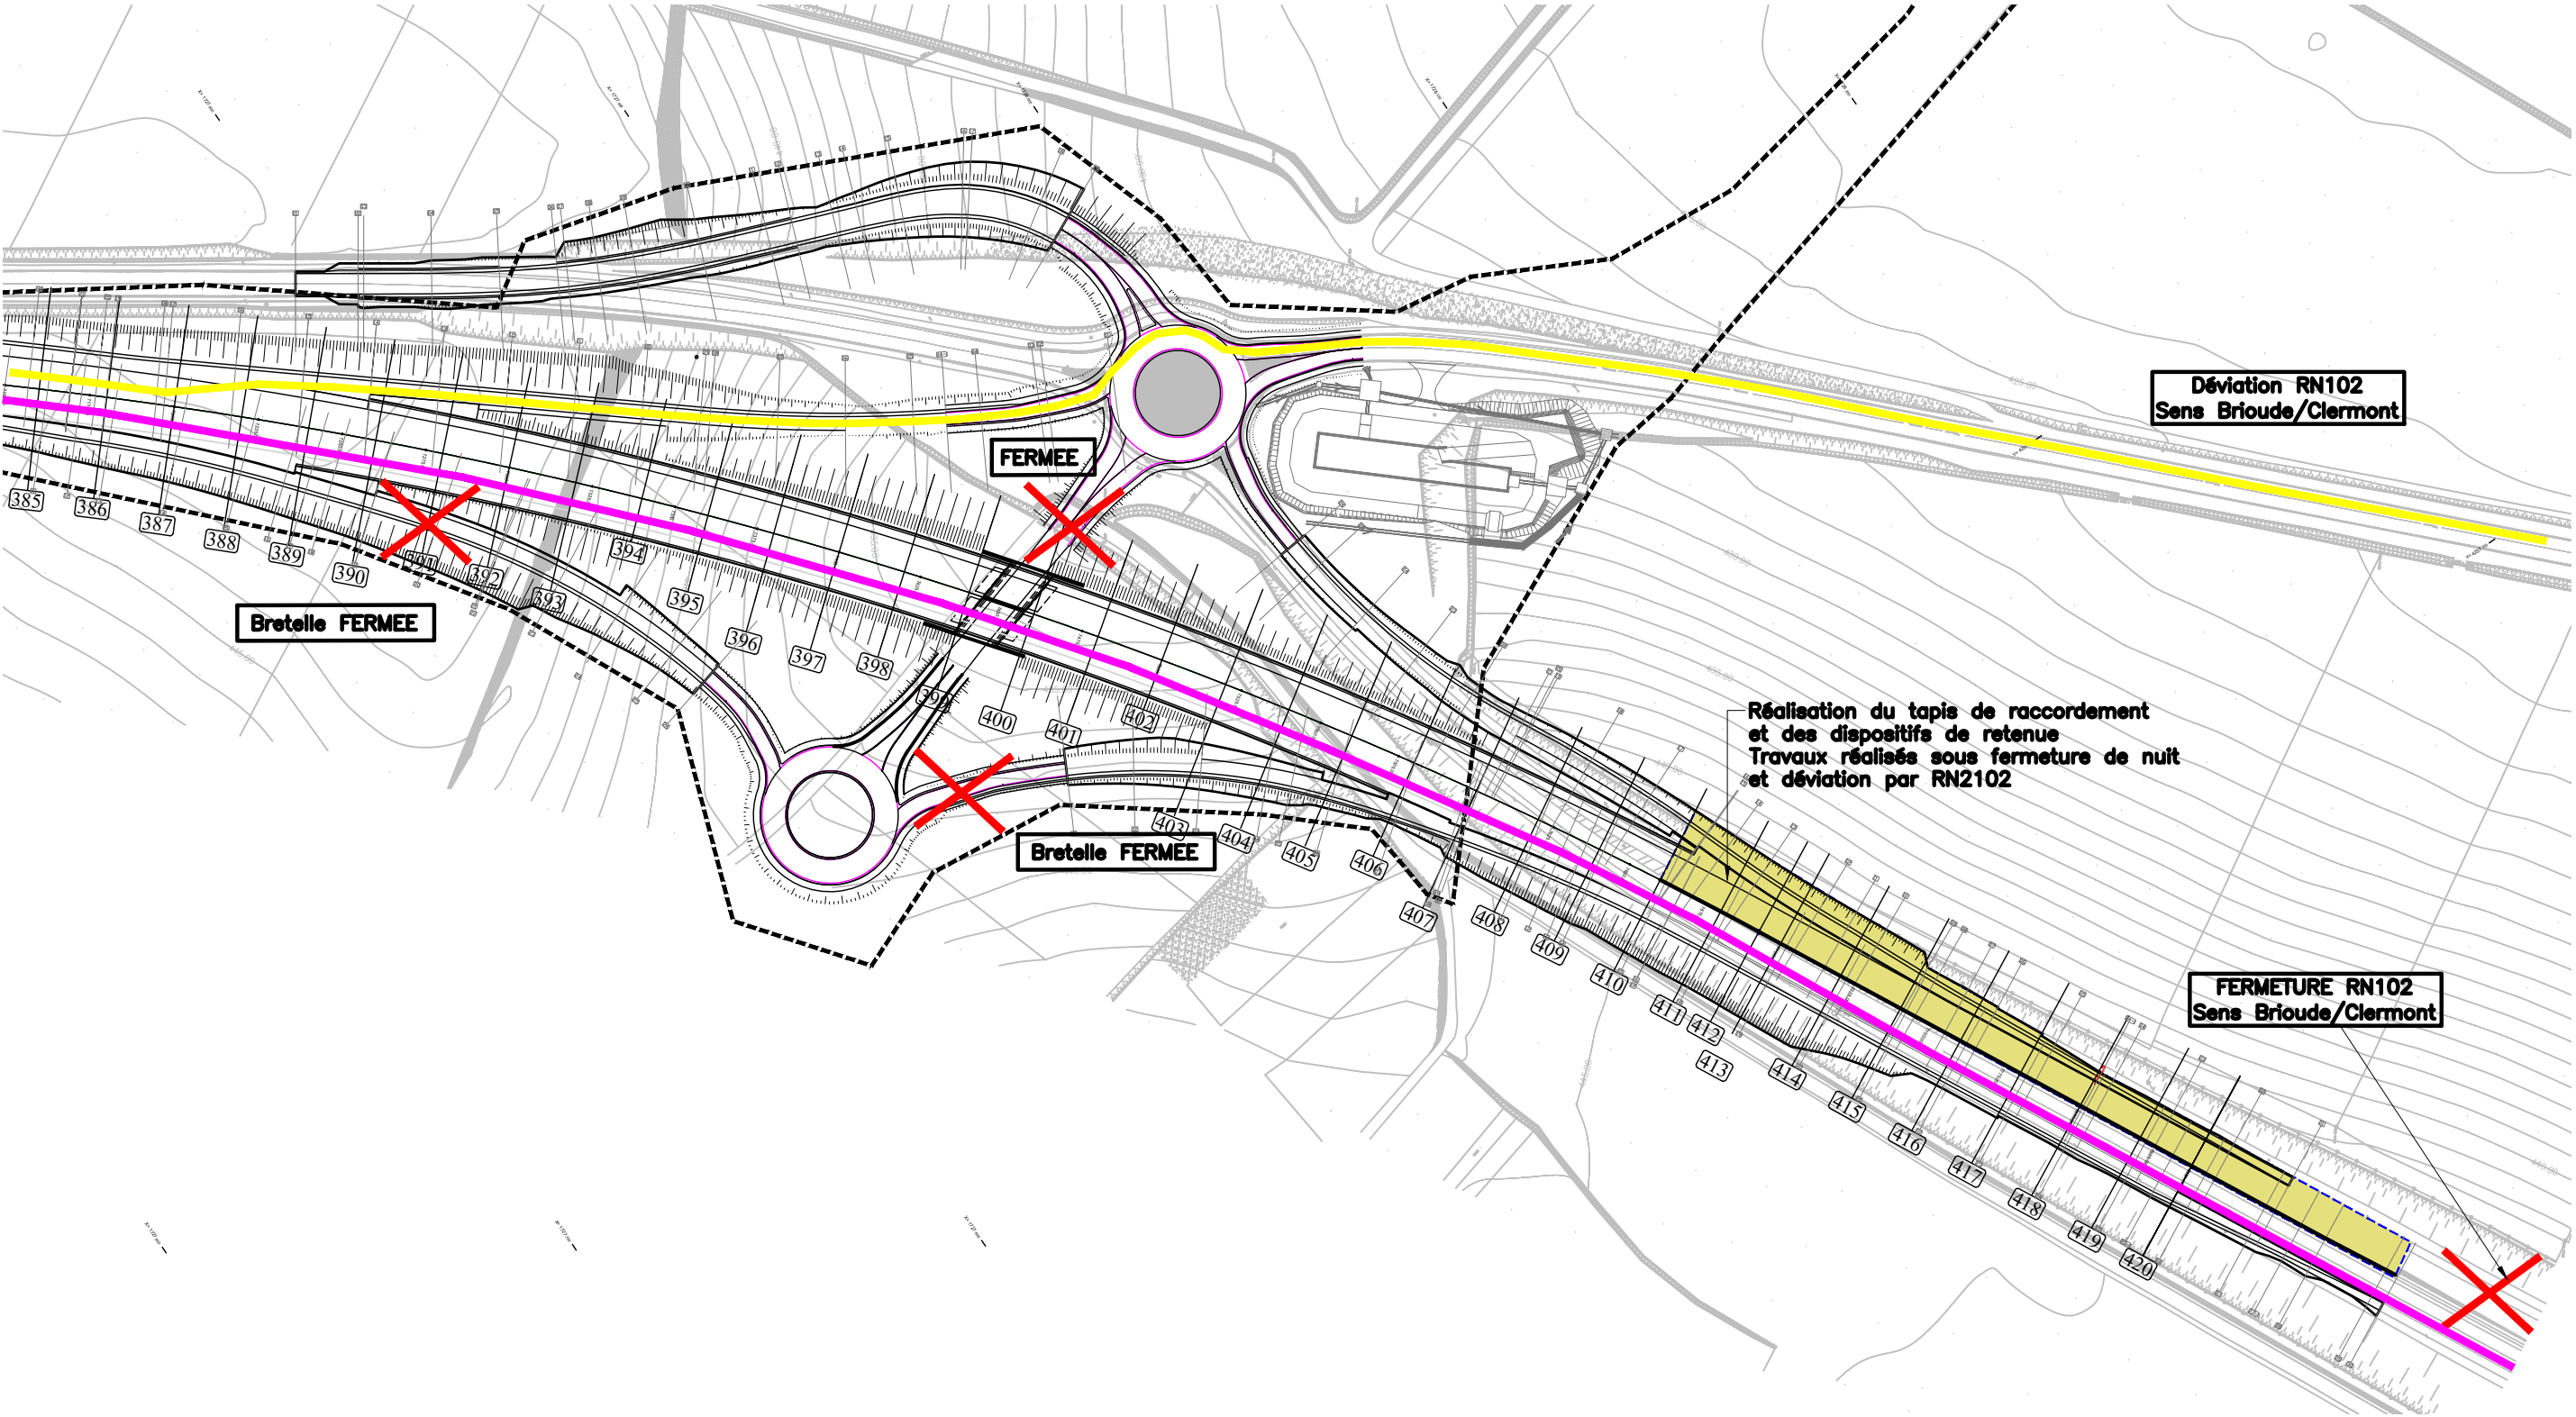

LEGENDE :


- Travaux de fibre optique
- Sens Clermont / Brioude
- Sens Brioude / Clermont

<div></div> <div>N° affaire : 5601770</div>	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes RN102 - Liaison A75 - Brioude	Phasage de construction Echangeur de COHADE	DCE	
			Ind. 0	Janvier 2023
			A3	Ech : 1/2000
			Plan 8401	Folio 4
SIGNALISATION		Phase 4A		



COHADE - PHASE 4B - Raccordement définitif RN102  
Déviation Largelier Sens Clermont - Brioude

Durée : 1 Semaine

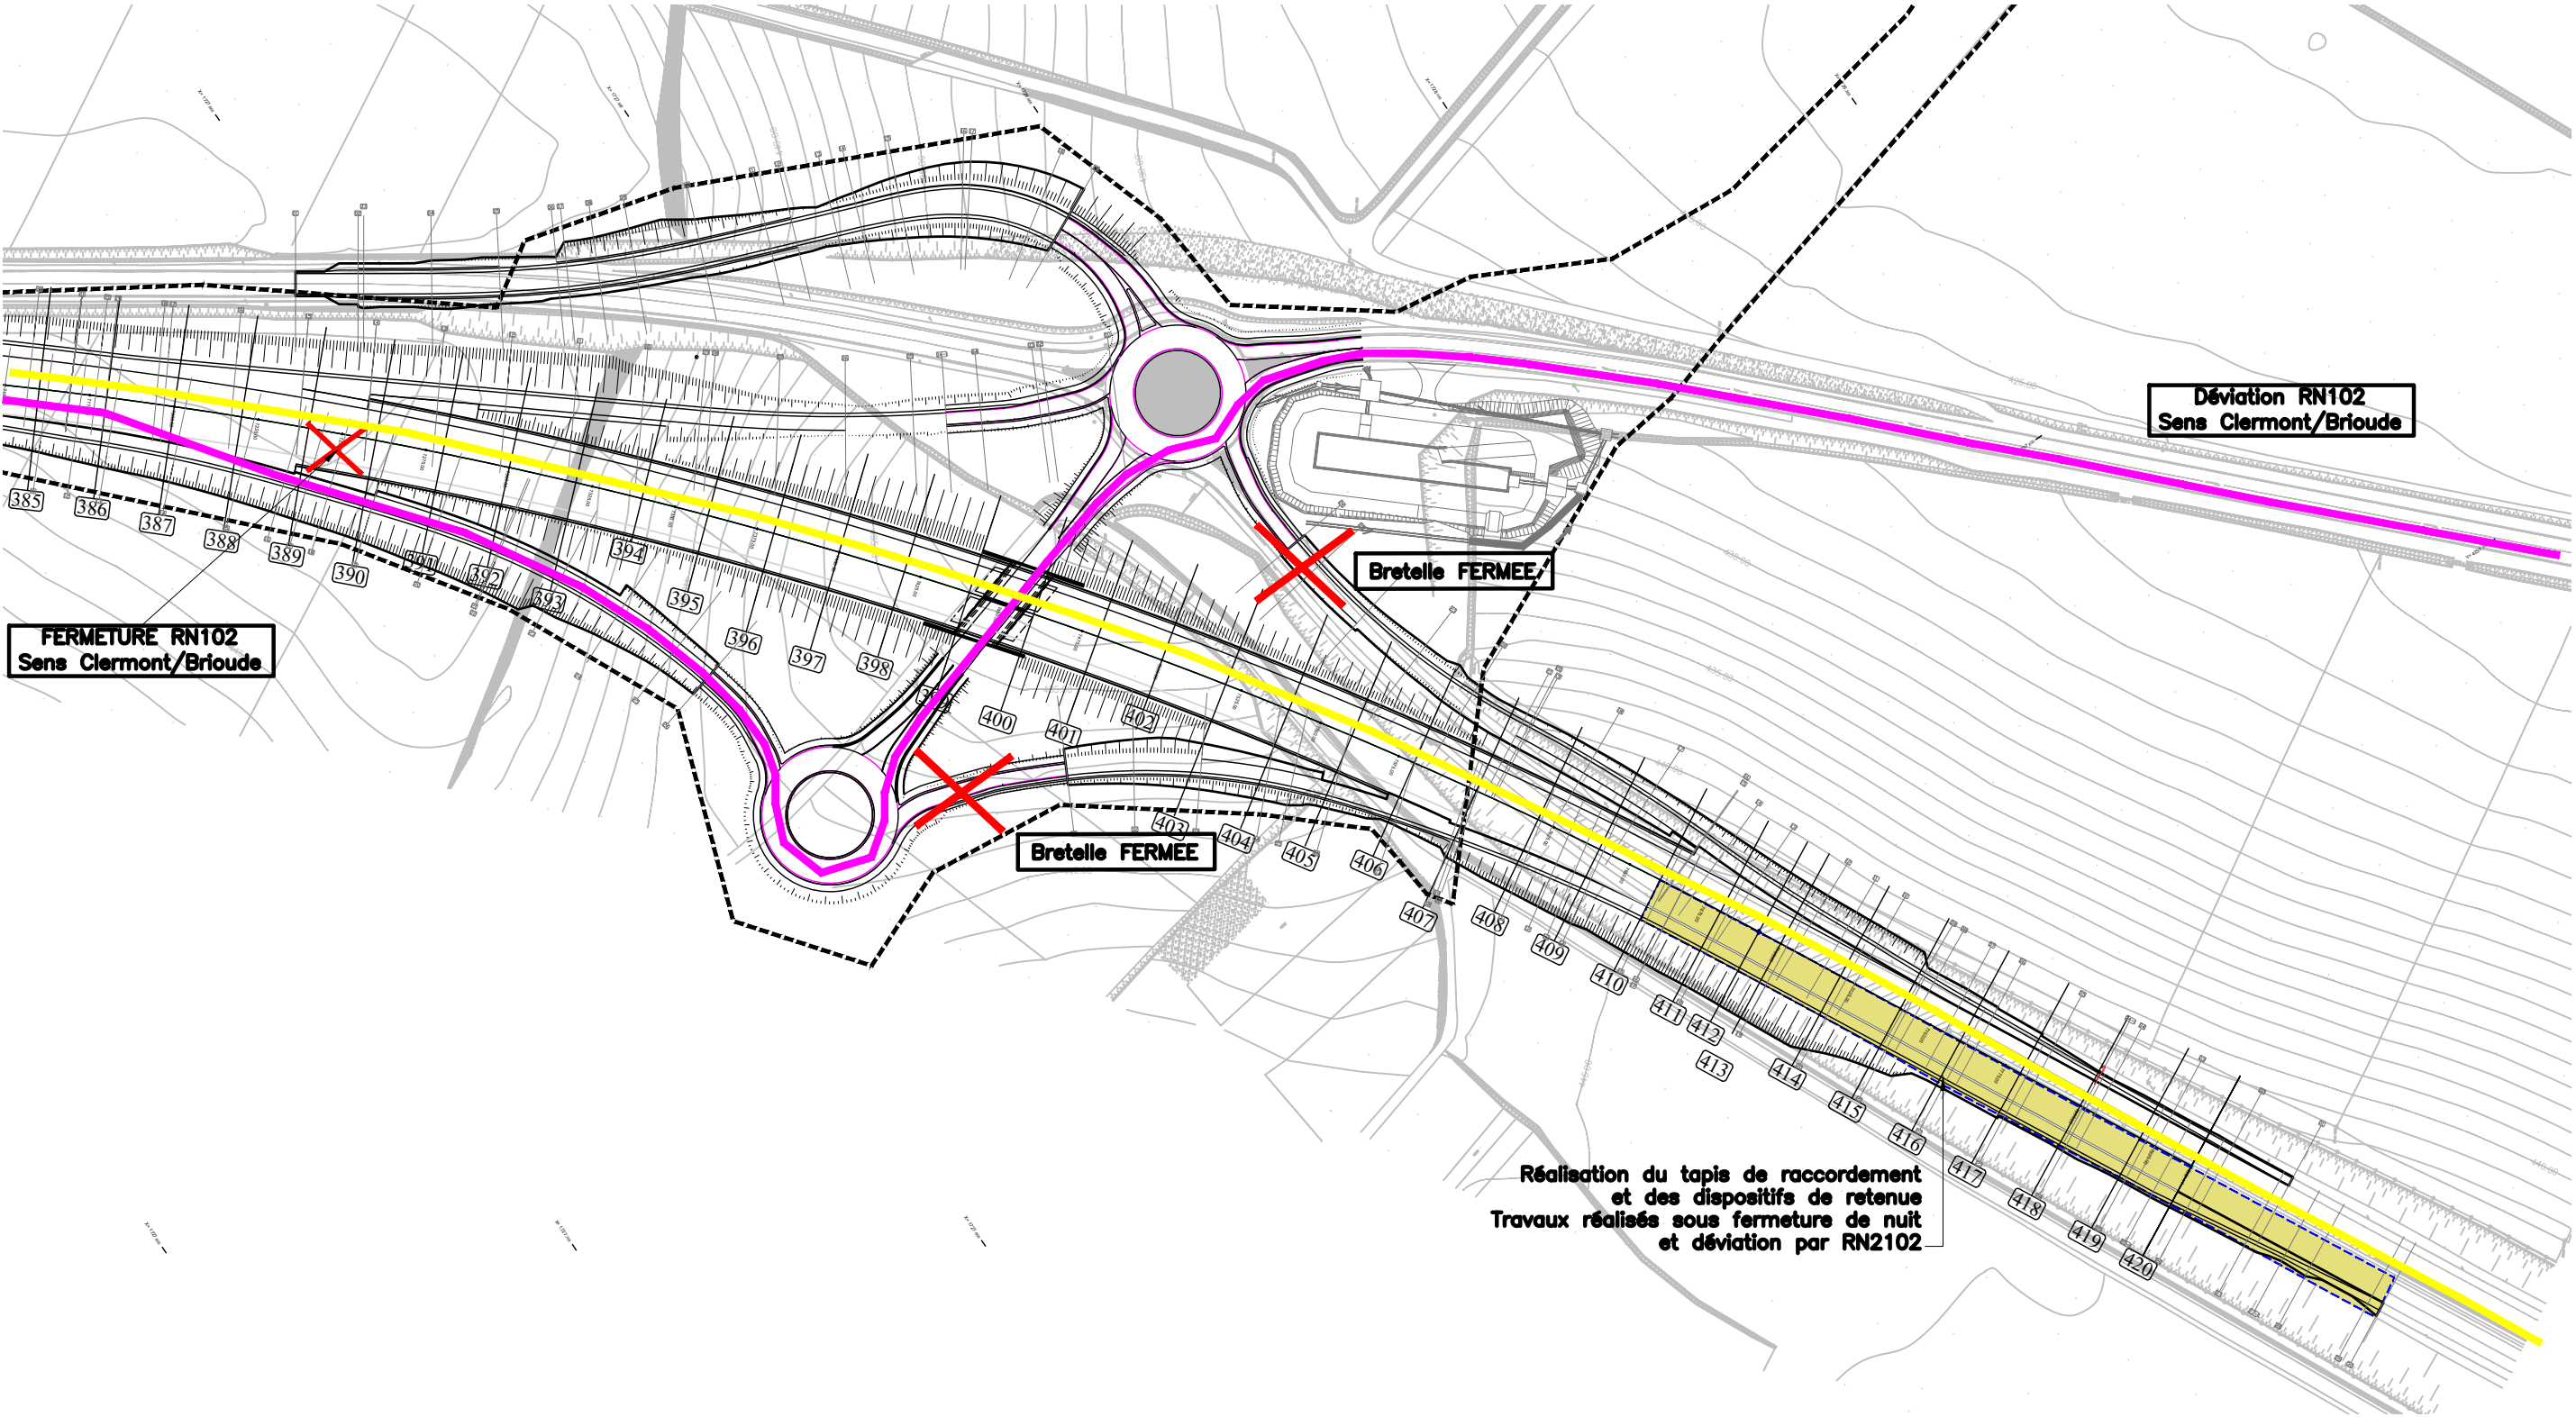

- LEGENDE :
- Travaux de fibre optique
  - Sens Clermont / Brioude
  - Sens Brioude / Clermont


	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes RN102 - Liaison A75 - Brioude	Phasage de construction Echangeur de COHADE	DCE	
			Ind. 0	Janvier 2023
	SIGNALISATION	Phase 4B	A3	Ech : 1/2000
			Plan 8401	Folio 5

N° affaire : 5601770




COHADE - PHASE 4C - MISE EN ŒUVRE DES FOURREAUX NTIC  
Déviation Largelier restriction de voie de droite sens Brioude - Clermont

Durée : 1 Semaine

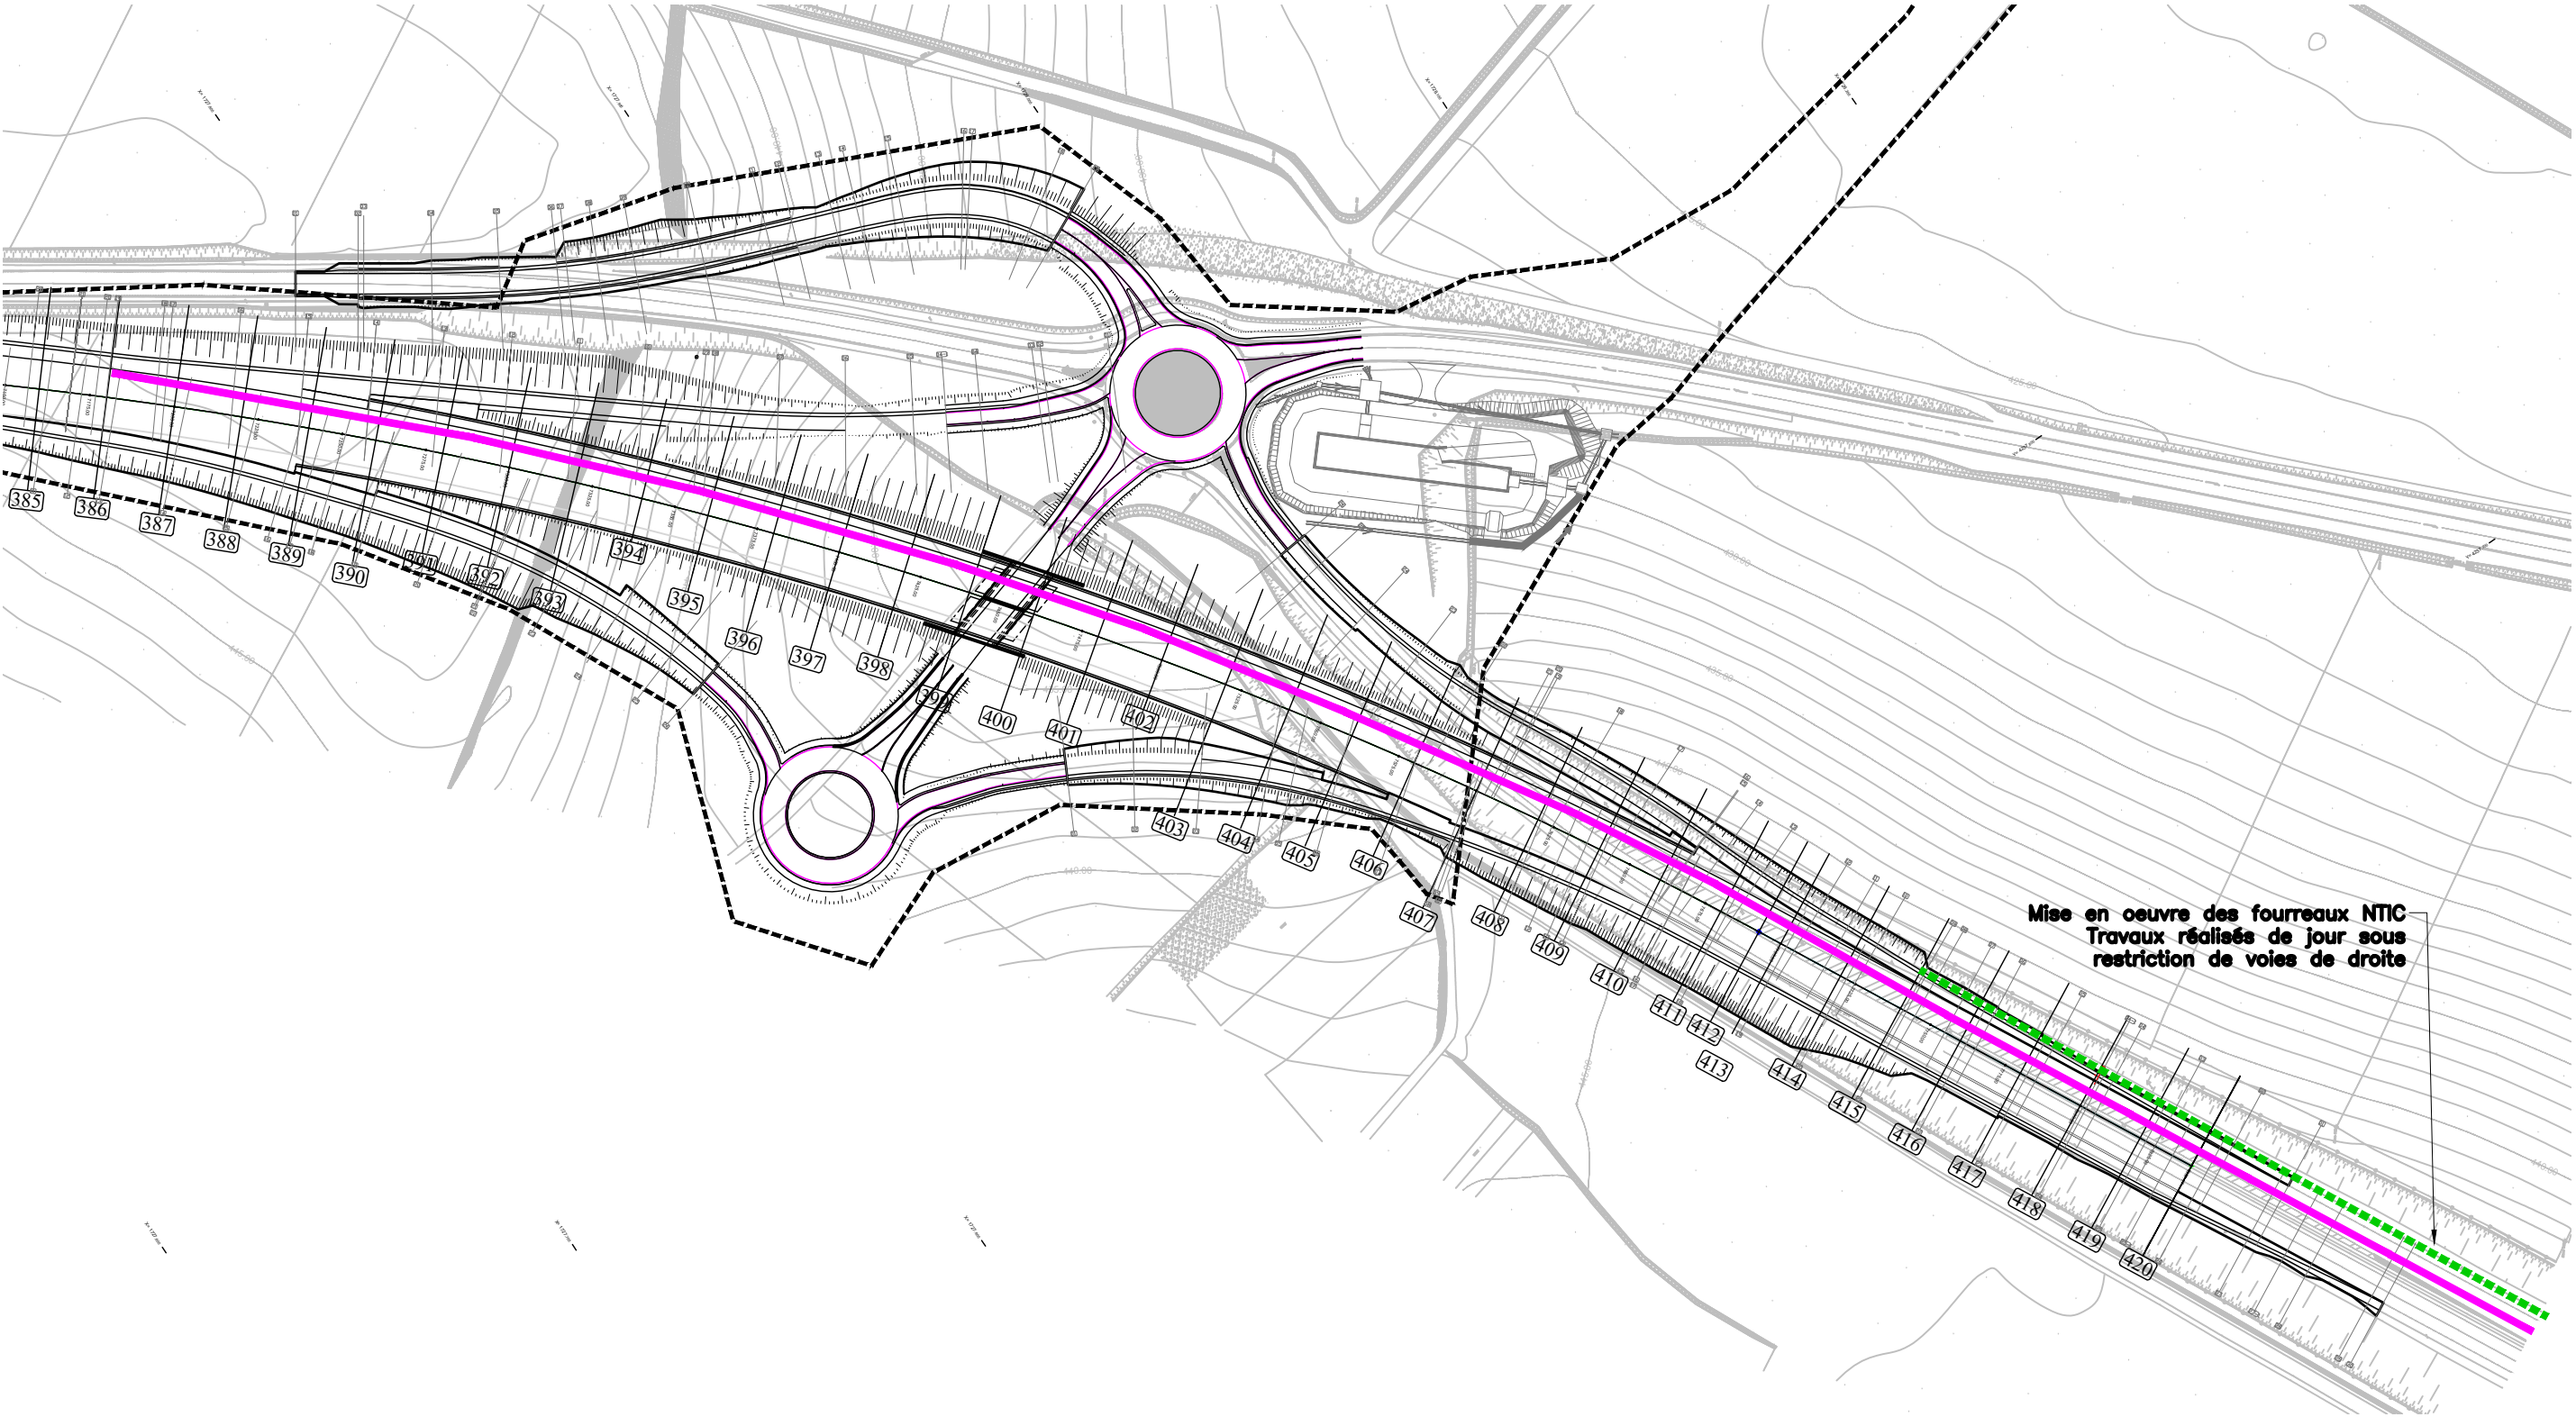

LEGENDE :

- Travaux de fibre optique
- Sens Clermont / Brioude
- Sens Brioude / Clermont

 N° affaire : 5601770	DREAL Auvergne - Rhône-Alpes RN102 - Liaison A75 - Brioude	Phasage de construction Echangeur de COHADE	DCE	
			Ind. 0	Janvier 2023
	SIGNALISATION	Phase 4C	A3	Ech : 1/2000
			Plan 8401	Folio 6
