


CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025																		2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	Etudes phase DCE	184 jours	Lun 02/09/24	Mer 21/05/25	02/09	Etudes phase DCE												21/05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
114	PHASE D'EXECUTION	185 jours	Mar 04/03/25	Lun 01/12/25								04/03	PHASE D'EXECUTION											01/12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
115	Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03	0 jour	Jeu 17/07/25	Jeu 17/07/25											17/07	Démarrage travaux up-grade fit-up_accès Bât 41.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
116	Fin de synthèse	0 jour	Mer 30/04/25	Mer 30/04/25										30/04	Fin de synthèse																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
117	Lot 197 extraction	185 jours	Mar 04/03/25	Lun 01/12/25								04/03	Lot 197 extraction											01/12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
118	Etudes d'exe et synthèse	50 jours	Mar 04/03/25	Lun 12/05/25								04/03	Etudes d'exe et synthèse						12/05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
119	Appro gaines inox	60 jours	Mar 29/04/25	Lun 21/07/25										29/04	Appro gaines inox						21/07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
120	Appro gaines inox revêtues	80 jours	Ven 11/04/25	Jeu 31/07/25										11/04	Appro gaines inox revêtues						31/07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
121	Appro 2 laveurs acides	80 jours	Mar 29/04/25	Lun 01/09/25										29/04	Appro 2 laveurs acides						01/09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
122	Travaux gaines	80 jours	Jeu 17/07/25	Mer 19/11/25											17/07	Travaux gaines						19/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
123	Travaux laveurs et local réactif	70 jours	Jeu 17/07/25	Mer 05/11/25											17/07	Travaux laveurs et local réactif						05/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
124	Mise en service extraction	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

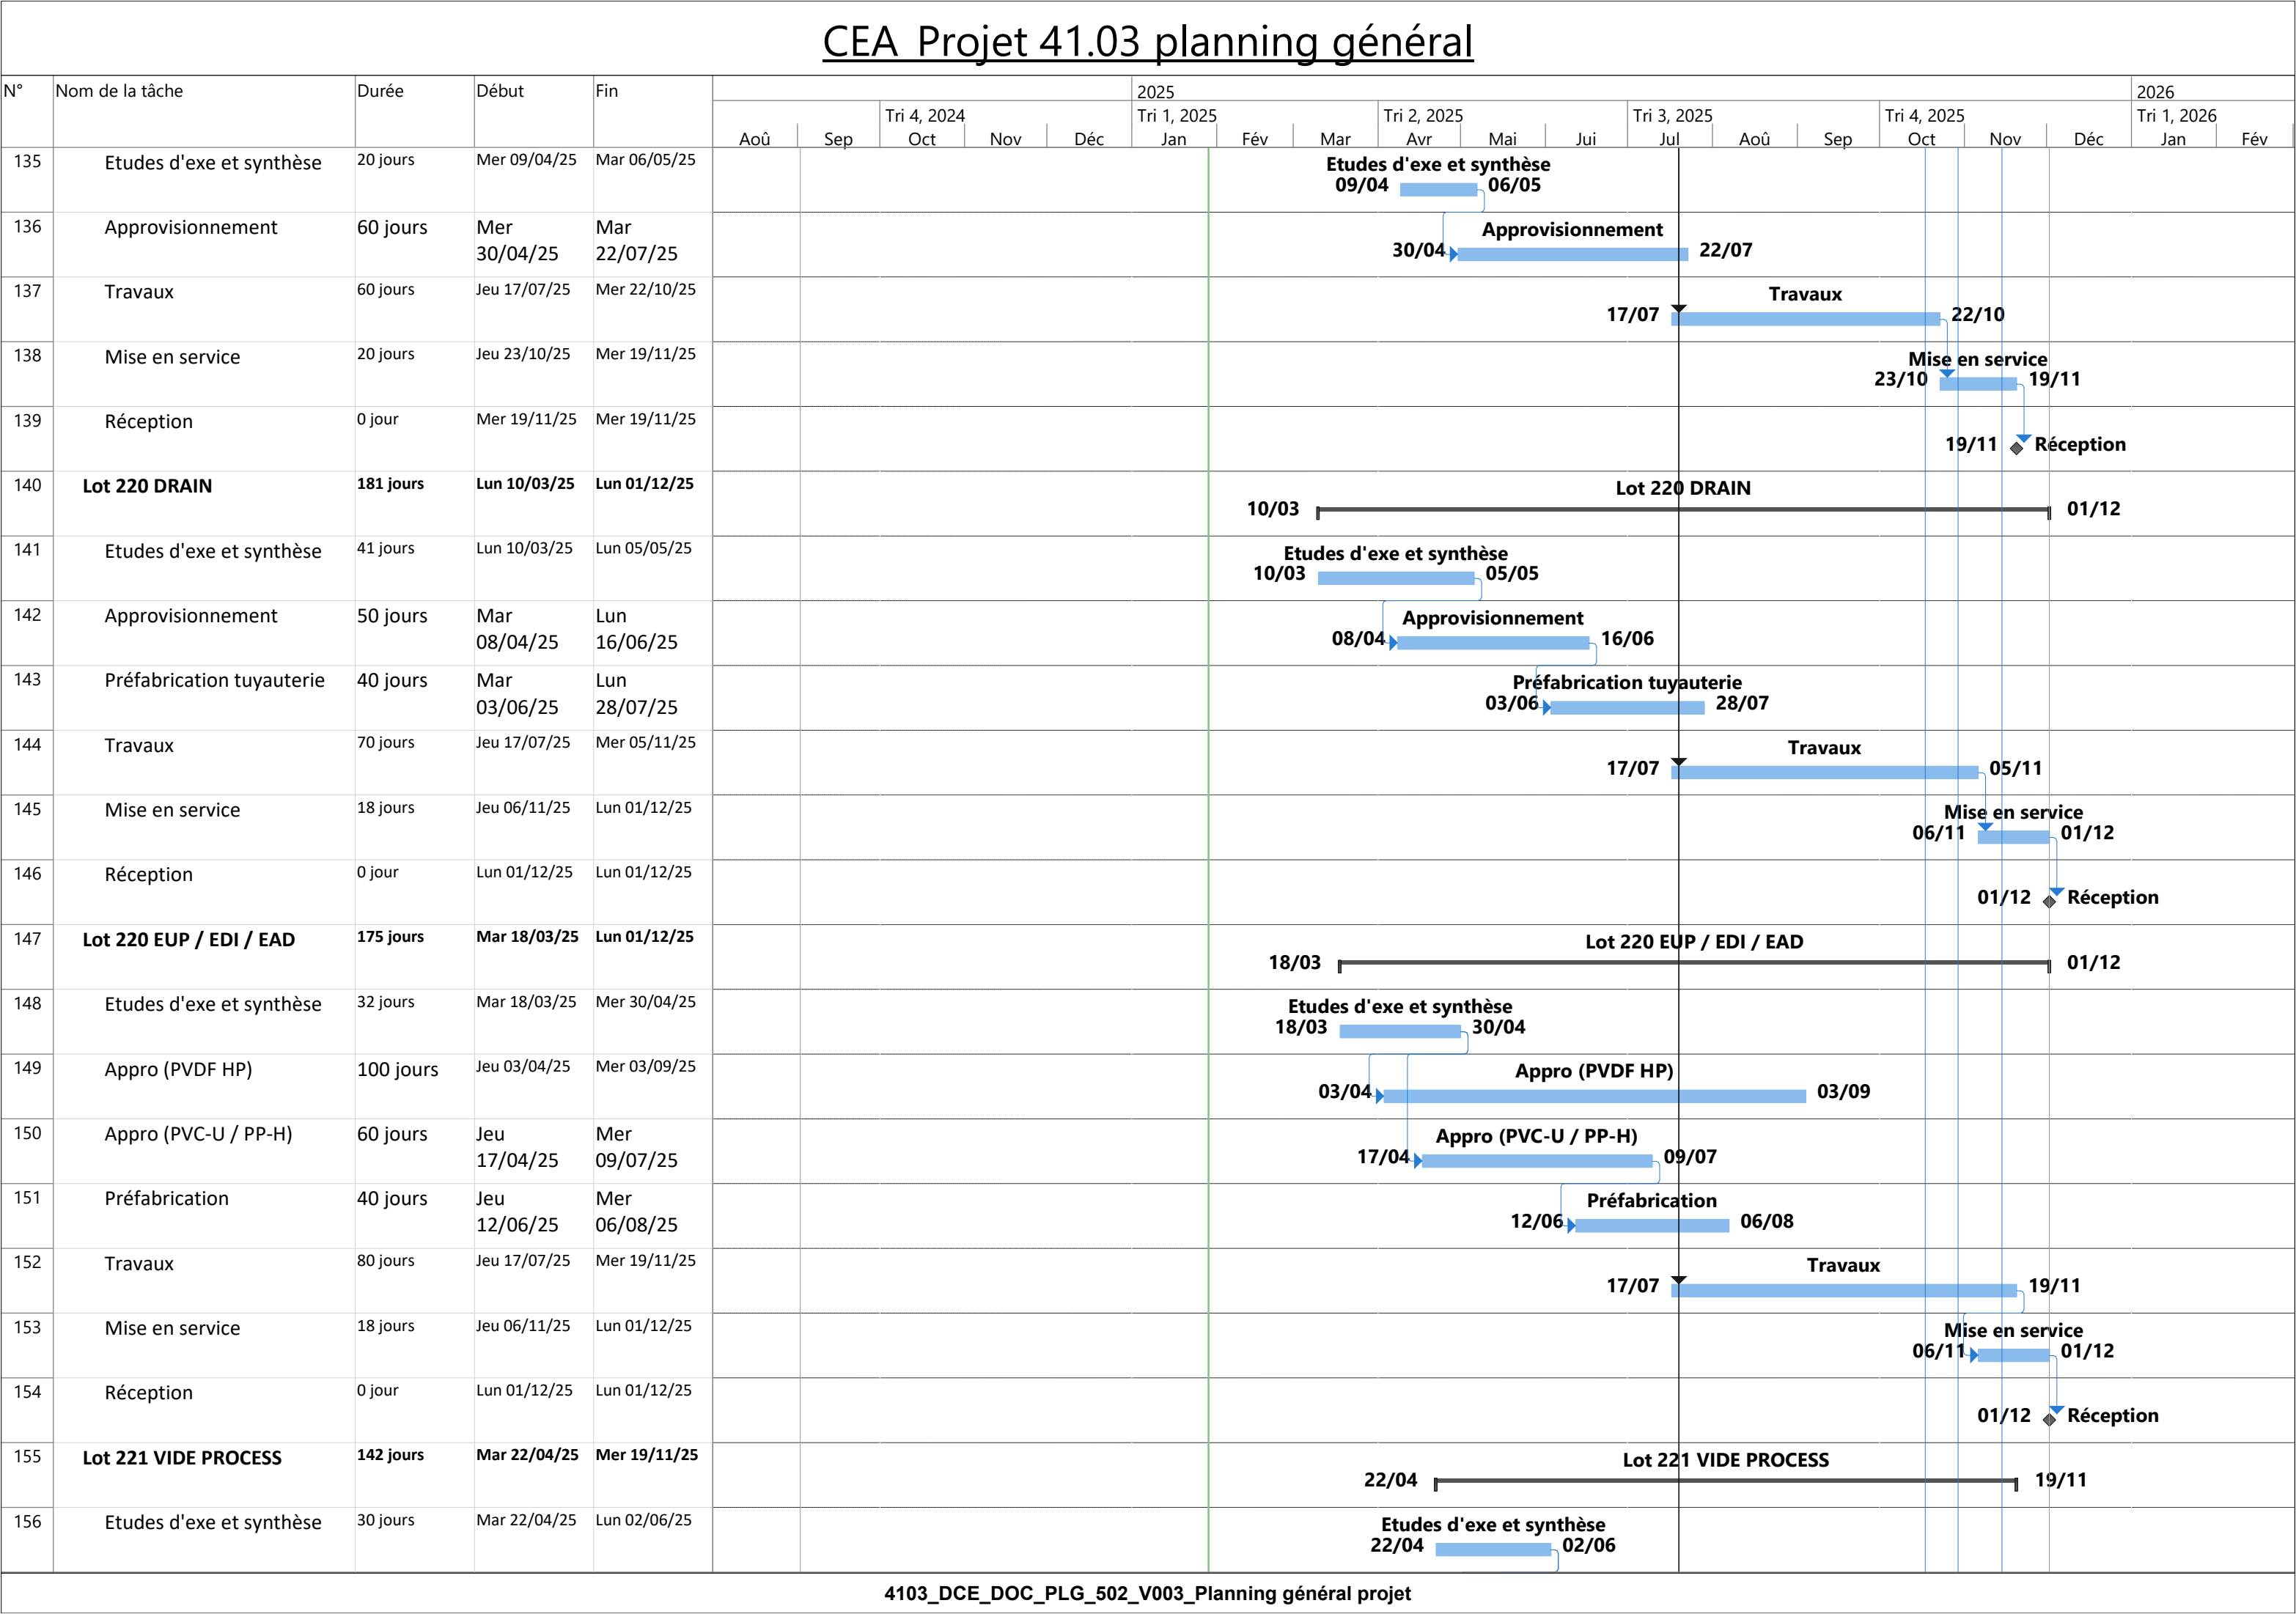

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																			
					Tri 4, 2024					2025			Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			2026	
					Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
157	Appro pompe à vide	60 jours	Mar 06/05/25	Lun 28/07/25								Appro pompe à vide											
158	Appro tuyauterie équipement	60 jours	Mar 20/05/25	Lun 25/08/25								Appro tuyauterie équipement											
159	Préfabrication	40 jours	Mar 17/06/25	Lun 25/08/25								Préfabrication											
160	Travaux	60 jours	Jeu 17/07/25	Mer 22/10/25								Travaux											
161	Mise en service	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25								Mise en service											
162	Réception	0 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25								Réception											
163	Lot 248 ERP 301/302	175 jours	Mar 18/03/25	Lun 01/12/25								Lot 248 ERP 301/302											
164	Etudes d'exe et synthèse	40 jours	Mar 18/03/25	Lun 12/05/25								Etudes d'exe et synthèse											
165	Approvisionnement	60 jours	Mar 29/04/25	Lun 21/07/25								Approvisionnement											
166	Pré-fabrication	60 jours	Mar 27/05/25	Lun 01/09/25								Pré-fabrication											
167	Travaux	75 jours	Jeu 17/07/25	Mer 12/11/25								Travaux											
168	Mise en service	23 jours	Jeu 30/10/25	Lun 01/12/25								Mise en service											
169	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25								Réception											
170	Lot 030 Serrurerie	92 jours	Jeu 03/04/25	Ven 08/08/25								Lot 030 Serrurerie											
171	Etudes d'exe et synthèse	40 jours	Jeu 03/04/25	Mer 28/05/25								Etudes d'exe et synthèse											
172	Pré-fabrication + peinture	40 jours	Jeu 15/05/25	Mer 09/07/25								Pré-fabrication + peinture											
173	Travaux	40 jours	Lun 16/06/25	Ven 08/08/25								Travaux											
174	Réception	0 jour	Ven 08/08/25	Ven 08/08/25								Réception											
175	Lot 020 charpente	95 jours	Jeu 17/04/25	Mer 10/09/25								Lot 020 charpente											
176	Etudes d'exe	40 jours	Jeu 17/04/25	Mer 11/06/25								Etudes d'exe											
177	Pré-fabrication + peinture	40 jours	Jeu 05/06/25	Mer 30/07/25								Pré-fabrication + peinture											
178	Travaux de beton et séchage	20 jours	Jeu 12/06/25	Mer 09/07/25								Travaux de beton et séchage											

CEA Projet 41.03 planning général

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																			2025		2026	
					Aoû	Sep	Tri 4, 2024 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2025 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2025 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév			
179	Travaux de montage charpente	20 jours	Jeu 31/07/25	Mer 10/09/25											Travaux de montage charpente 31/07 10/09											
180	Réception	0 jour	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25											10/09 Réception											
181	Lot 200 CFO/CFA	153 jours	Mer 16/04/25	Ven 28/11/25											Lot 200 CFO/CFA 16/04 28/11											
182	Etudes d'exe	30 jours	Mer 16/04/25	Mar 27/05/25											Etudes d'exe 16/04 27/05											
183	Appro gaine à barre	60 jours	Mer 07/05/25	Mar 29/07/25											Appro gaine à barre 07/05 29/07											
184	Appro autre matériels	77 jours	Mer 28/05/25	Jeu 25/09/25											Appro autre matériels 28/05 25/09											
185	Pré-fabrication armoires	72 jours	Mer 04/06/25	Jeu 25/09/25											Pré-fabrication armoires 04/06 25/09											
186	Travaux	67 jours	Jeu 17/07/25	Ven 31/10/25											Travaux 17/07 31/10											
187	Mise en service	40 jours	Lun 06/10/25	Ven 28/11/25											Mise en service 06/10 28/11											
188	Réception	0 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25											28/11 Réception											
189	Lot 205 GTC	108 jours	Jeu 19/06/25	Lun 01/12/25											Lot 205 GTC 19/06 01/12											
190	Etudes d'exe	60 jours	Jeu 19/06/25	Mer 24/09/25											Etudes d'exe 19/06 24/09											
191	Intégration des vues GTC	30 jours	Lun 01/09/25	Ven 10/10/25											Intégration des vues GTC 01/09 10/10											
192	Mise en service	20 jours	Lun 13/10/25	Ven 07/11/25											Mise en service 13/10 07/11											
193	MES ERP	13 jours	Jeu 30/10/25	Lun 17/11/25											MES ERP 30/10 17/11											
194	MES Exhaust	8 jours	Jeu 20/11/25	Lun 01/12/25											MES Exhaust 20/11 01/12											
195	MES laveurs	20 jours	Mar 04/11/25	Lun 01/12/25											MES laveurs 04/11 01/12											
196	MES Compteurs	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25											MES Compteurs 23/10 19/11											
197	MES VPE	20 jours	Jeu 23/10/25	Mer 19/11/25											MES VPE 23/10 19/11											
198	Réception	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25											01/12 Réception											
