


N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Remarques	Prédécesseur	Texte1		Mai	Jui
60		Création système d'expansion, de remplissage et de dégazage	40 Lot 3	50				
61		Création d'un circuit de distribution avec échangeur Bât 40	40 Lot 3	60				
62		Création d'un collecteur A-R avec expansion et remplissage Bât 40 et 37 (90 ?)	40 Lot 3	61				
63		Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Nord Bât 40	40 Lot 3	62				
64		Création d'un circuit de distribution, pompes et compteur circuit Sud Bât 40	40 Lot 3	63				
65		Pose du coffret distribution pompes et puissance	40 E-Cf	54				
66		Raccordement électrique pompes secondaires et éléments récupérés	40 E-Cf	65				
67		Raccordement du coffret régulation et GTC RCU et départs chauffage 40-37 (90 ?)	40 E-Cf	66				
68		Pose de vannes sur réseau secondaire pour départ Bât 90	Ext Lot 2	39				
69		Création d'un réseau en pleine terre Bât 90	Ext Lot 2	68				
70		Adaptation et raccordement du compteur et du réseau Bât 90	Ext Lot 2	69				
71		Création d'une tranchée et raccordement des autres réseaux Bât 90	Ext Lot 2	70				
72		Fermeture des tranchées et remise en état terrain Bât 90	Ext Lot 2	71				
73		Raccordement du coffret régulation et GTC Bât 90	90 E-Cf	72				
74		Travaux RCU Bât 72		22				
75		Vidange de l'installation, consignation	STL-Exploit.					
76		Dépote des installations de GTC existantes	72 E-Cf	75				
77		Remplacement des syphons, bouchage et reprise des finitions	72 Lot 1	76				
78		Pose du skid inclus l'assemblage	72	77				
79		Raccordement hydraulique primaire et secondaire	72	78				
80		Repose compteurs calories, ouvrages récupérés et vanne 3V	72	79				
81		Adaptation du système d'expansion, de remplissage et de dégazage	72	80				
82		Pose du coffret régulation et GTC	72 E-Cf	81				
83		Raccordement du coffret régulation et GTC	72 E-Cf	82				
84		Mise en eau du feeder 72, épreuve, test et auto-contrôle de la sous-station 72	72	83				
85		Travaux de finitions - Mise en service						
Projet : Réseau chaleur urbain Date : Jeu 27/02/25		Tâche Récapitulatif du projet Tâche inactive Jalon inactif Récapitulatif inactif	Tâche manuelle Durée uniquement Report récapitulatif manuel Récapitulatif manuel	Début uniquement Fin uniquement Tâches externes Jalons externes	Échéance Avancement Progression manuelle 			
Page 2								

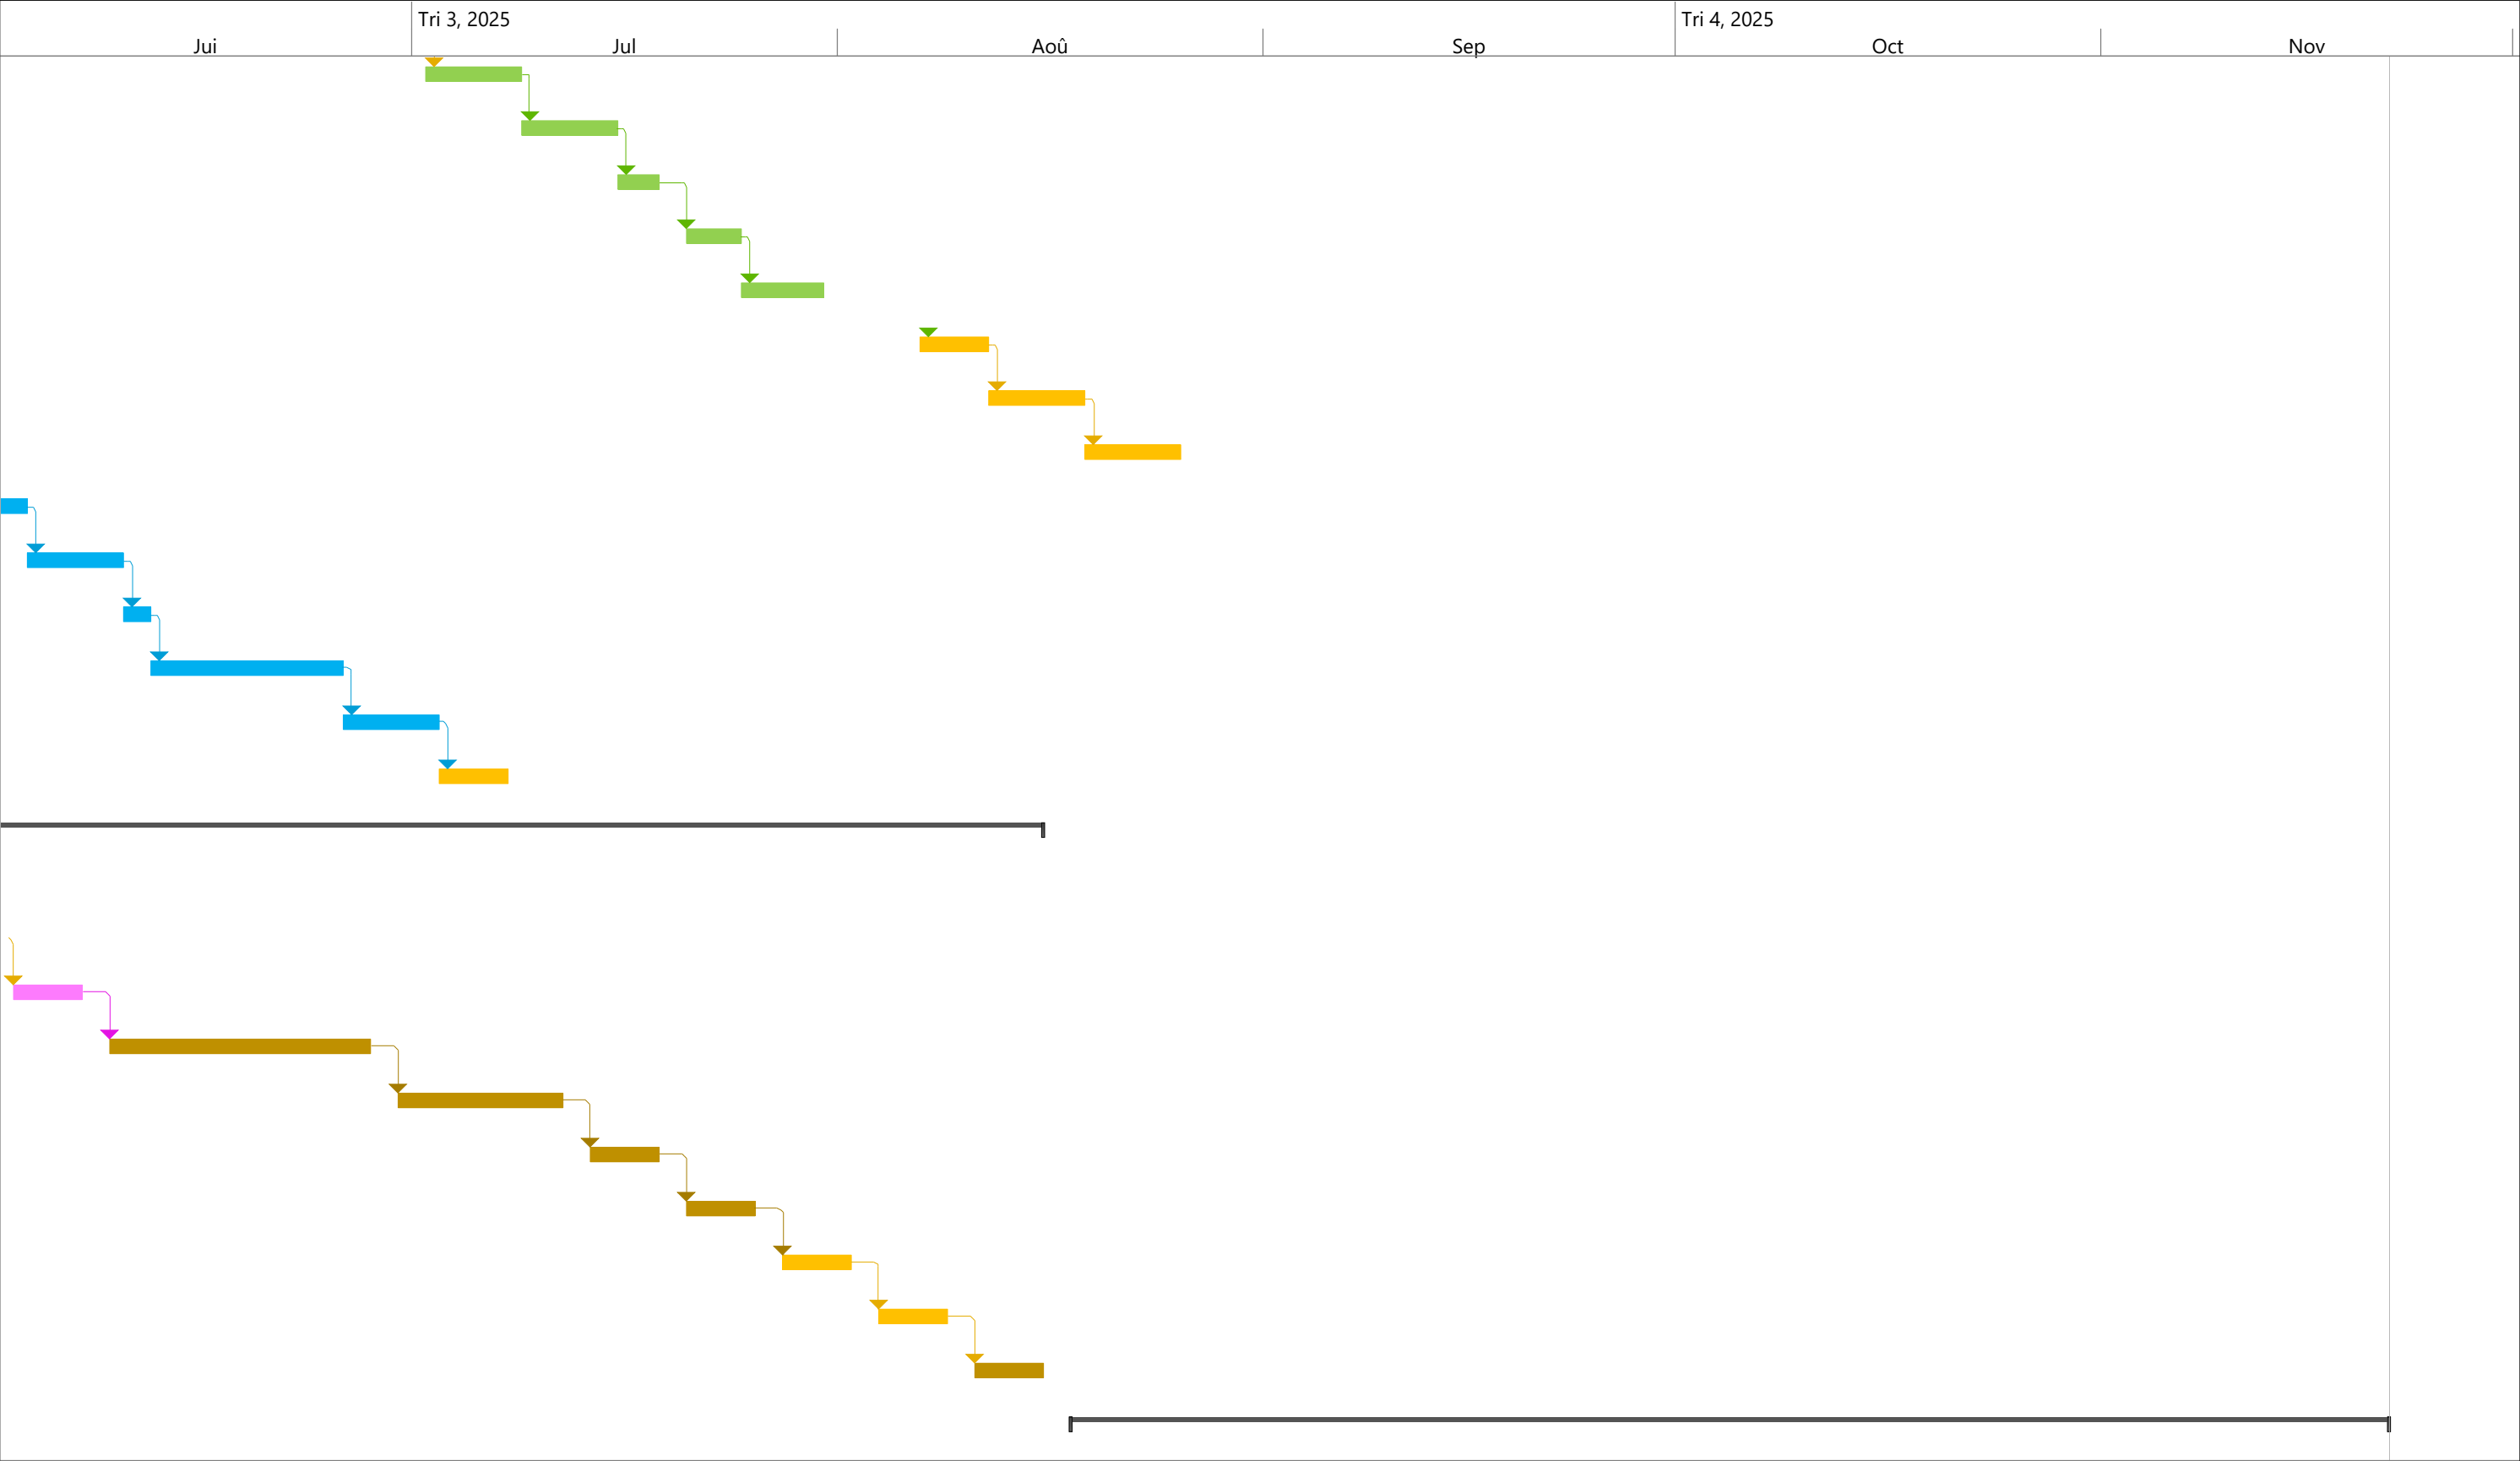

Projet : Réseau chaleur urbain Date : Jeu 27/02/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			
