

**Bureau Veritas Exploitation SAS**

NANTERRE  
Immeuble Le GAIA  
333 avenue Georges Clémenceau  
92000 NANTERRE France  
Téléphone : 01 47 52 02 00  
Mail : [said.mancer@bureauveritas.com](mailto:said.mancer@bureauveritas.com)

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D  
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS  
2 Rue Abraham Lincoln  
92220 BAGNEUX

Rapport mis à disposition sur le site BVLink  
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

## Rapport de vérification électricité visite périodique



**Intervention du 04/03/2025 ( 0.5 jour )**

**Coordonnées du site :**  
**Nom du site :** RESIDENCE BAS LONGCHAMPS  
**Latitude :** 48.7908  
**Longitude :** 2.3173



**Lieu d'intervention :** RESIDENCE BAS LONGCHAMPS  
2 Rue Abraham Lincoln  
92220 BAGNEUX

**Numéro d'affaire :** 8642115  
**Référence du rapport :** 8642115/40.2.1.P  
**Rédigé le :** 07/03/2025  
**Par :** Said MANCER  
Ce document a été validé par son auteur

**Activité de l'établissement :** RESIDENCE ETUDIANTE

**Date de la précédente vérification :** 06/10/2023

**Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection**  
Liste des sites accrédités et portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

<b>Préambule.....</b>	<b>3</b>
Rappel des obligations de l'employeur.....	3
Actions à mener.....	3
<b>Liste récapitulative des observations issues de la vérification.....</b>	<b>5</b>
RESIDENCE BAGNEUX (2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX).....	5
RESIDENCE BAGNEUX (2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX).....	5
<b>Informations générales.....</b>	<b>7</b>
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client.....	7
Personne chargée de la surveillance de l'installation.....	7
Installations vérifiées.....	7
Eléments de l'installation non vérifiables.....	7
Modifications apportées aux installations.....	7
<b>Vérification relative à la protection des travailleurs.....</b>	<b>8</b>
Information documentaire.....	8
Textes de référence.....	8
Modalité de vérification.....	8
Registre de sécurité.....	9
Condition de mise hors tension.....	9
<b>Résultats des mesures et essais.....</b>	<b>10</b>
Conditions de mesure.....	10
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure.....	10
Appareils de mesure utilisés.....	10
Prises de terre.....	11
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT.....	11
<b>Synoptique de l'installation électrique Basse Tension.....</b>	<b>16</b>
<b>Liste des documents mis à disposition de l'inspecteur (autres que ceux déjà mentionnés).....</b>	<b>19</b>

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

## Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations réglementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
  - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
  - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.

Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

## Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

## Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes Critères			
	✓ Sans observation	✓	✗
✓ 100% des coupures réalisées ✓ 100 % des points vérifiés ✓ 100 % des locaux vérifiés	✓	✗	x ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

# Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | RESIDENCE BAS LONGCHAMPS

## RESIDENCE BAGNEUX (2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX)

### Installations Basse et Très Basse Tension



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

## RESIDENCE BAGNEUX (2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX)

### Installations Basse et Très Basse Tension

RESIDENCE BAGNEUX

↳ SOUS-SOL

↳ **LOCAL TGBT**

Point vérifié	N°	Observation(s)
<b>TGBT : INTER GENERAL</b>		
Dispositifs bt	1	<b>Protéger contre les contacts directs les pièces nues sous tension accessibles, en amont du général au niveau des bornes de serrage .</b>
Code Obs. : YT/220318/113535/0		Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 20/03/2018 Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.411.2
<b>TGBT : MACHINE A LAVER</b>		
Dispositifs bt	2	<b>Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure.</b>
Code Obs. : SM/040325/094103/1		Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 04/03/2025 <b>NOUVEAU</b> Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533
<b>TGBT : SECHOIR</b>		
Dispositifs bt	3	<b>Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure.</b>
Code Obs. : SM/040325/094103/2		Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 04/03/2025 <b>NOUVEAU</b> Art. Réf. : CDT R.4215-6 NF C 15-100 Art.430-533
<b>TGBT</b>		
Coffrets et armoires électriques	4	<b>Isoler sur bornes fixes, les extrémités des conducteurs inutilisés, situés dans le compartiment à bornier de droite, afin d'éviter tous risques de contacts directs ou indirects en cas de mise sous tension accidentelle de ces conducteurs</b>
Code Obs. : YT/220318/120956/0		Date de 1 <sup>er</sup> signalement : 20/03/2018 Art. Réf. : CDT R.4215-3 NF C 15-100 Art.410

## Liste récapitulative des observations issues de la vérification

**Nota :** Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

### Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 8642115/40.1.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Sans Objet

### Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. BLOND, Électricien

### Installations vérifiées

**Installations vérifiées** : Ensemble des installations accessibles et présentées

**Nota** : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

**Origine de l'installation vérifiée** : Local comptage Basse Tension

**Nota** : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

### Éléments de l'installation non vérifiables

**RESIDENCE BAGNEUX>2 RUE ABRAHAM LINCOLN > 9220 BAGNEUX**

**RESIDENCE BAGNEUX > SOUS-SOL**

**PRISES DE TERRE : *Terre des masses BT***

Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références

### Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

# Vérification relative à la protection des travailleurs

## Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.

En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
<b>Dossier Technique</b>		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Présent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Présent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Présent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Présent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Absent
<b>DRPE</b>		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
<b>ERP</b> : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Sans Objet

\*\*Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

## Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

## RESIDENCE BAGNEUX

### Arrêtés :

- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

### Normes :

- NF C 15-100 : installation électrique à basse tension

## Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par

M. BLOND, Électricien

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :

M. BLOND, Électricien



## Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

## Condition de mise hors tension

### En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

## Conditions de mesure

### MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

### VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

### VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION

Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

### ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

### MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

### MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée  $R \leq \frac{U_L}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n : sensibilité du différentiel principal). Cette méthode donne un résultat par excès.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

## Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

### PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	FF	EI	PT	IND

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	RB	T

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	A	B	C

### RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

## Appareils de mesure utilisés

# Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **Ponta-ohms (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielle : **Megger MIT 405**

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **Ponta-mesure (PONTARLIER ELECTRONIQUE)**

Mesure des impédances de boucle : **Autre**

Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

## Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
RESIDENCE BAGNEUX(2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX)						
<u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; SOUS-SOL</u>						
Terre des masses BT	FF	T			Non vérifié : impossibilité de planter les piquets de références	

(1) Consulter la liste des abréviations

## Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
RESIDENCE BAGNEUX(2 RUE ABRAHAM LINCOLN / 9220 BAGNEUX)					
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 1</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+1					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B					
Général	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+1					
Q1	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 10</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+10					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+10					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 11</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+11					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 11/19

rapport n° : 8642115/40.2.1.P

en date du 07/03/2025

# Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
ARMOIRE COLONNE B R+11					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 12</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+12					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+12					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 13</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+13					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+13					
Q1	300		1		
Q2	300				
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 14</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+14					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+14					
Q1	300		1		
Q2	300				
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 15</u></b>					
ARMOIRE COLONNE A R+15					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
ARMOIRE COLONNE B R+15					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 12/19

rapport n° : 8642115/40.2.1.P

en date du 07/03/2025

# Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 2</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+2</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+2</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 3</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+3</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+3</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 4</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+4</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+4</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 5</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+5</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+5</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 6</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+6</b>					
Q1	300		1		

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

# Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+6</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 7</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+7</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+7</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 8</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+8</b>					
Disjoncteur de branchement	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+8</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; ETAGE 9</u></b>					
<b>ARMOIRE COLONNE A R+9</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
<b>ARMOIRE COLONNE B R+9</b>					
Q1	300		1		
Q2	300		1		
Q3	300		1		
Q3	300		1		
<b><u>RESIDENCE BAGNEUX &gt; SOUS-SOL &gt; LOCAL TGBT</u></b>					
<b>TGBT</b>					
PROTECTION MX	30		1		
DESENFUMAGE 1	300		1		
DESENFUMAGE 2	300		1		
GENERAL LAVERIE	300		1		
SL3	30		1		

(\*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

OPALE 01 – V 4

Copyright BUREAU VERITAS

page 14/19

rapport n° : 8642115/40.2.1.P

en date du 07/03/2025


## Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
ASCENSEUR 1	300		1		
ASCENSEUR 2	300		1		
CHAUFFERIE	300		1		
SURPRESSEUR	300		1		
GENERAL VMC	300		1		
GENERAL VMC 2	300		1		
GENERAL ECL+DIVERS	300		1		
GENERAL PC	30		1		
GENERAL PC 2	30		1		
GENERAL ECL+DIVERS	300		1		
GENERAL DIVERS	300		1		

(1) La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.  
 La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement  
 L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

# Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

## RESIDENCE BAGNEUX

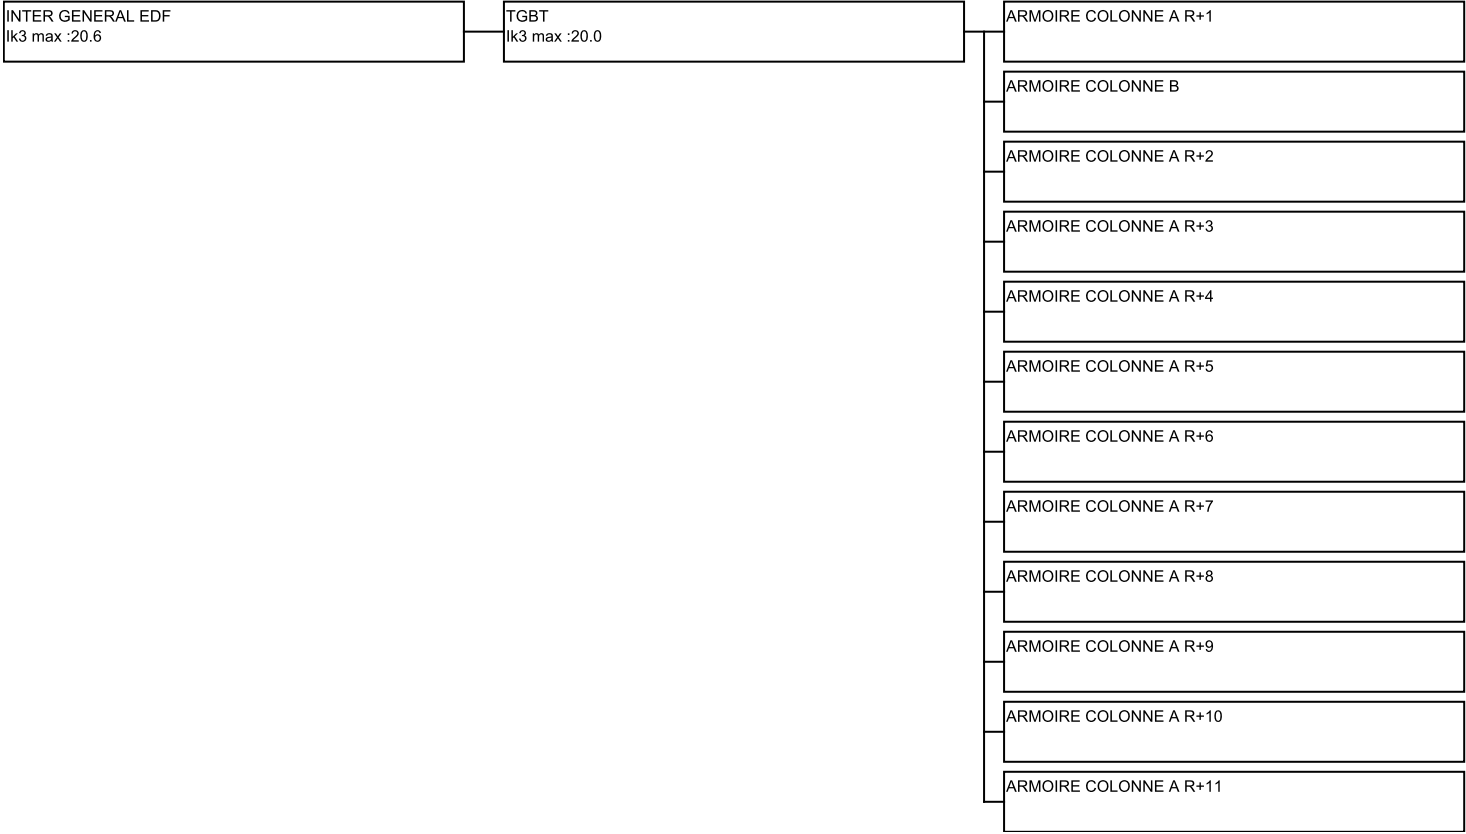



	ARMOIRE COLONNE A R+12
	ARMOIRE COLONNE A R+13
	ARMOIRE COLONNE A R+14
	ARMOIRE COLONNE A R+15
	ARMOIRE COLONNE B R+1
	ARMOIRE COLONNE B R+2
	ARMOIRE COLONNE B R+3
	ARMOIRE COLONNE B R+4
	ARMOIRE COLONNE B R+5
	ARMOIRE COLONNE B R+6
	ARMOIRE COLONNE B R+7
	ARMOIRE COLONNE B R+8
	ARMOIRE COLONNE B R+9

	ARMOIRE COLONNE B R+10
	ARMOIRE COLONNE B R+11
	ARMOIRE COLONNE B R+12
	ARMOIRE COLONNE B R+13
	ARMOIRE COLONNE B R+14
	ARMOIRE COLONNE B R+15

**LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DE L'INSPECTEUR (AUTRES QUE  
CEUX DEJA MENTIONNES)**

-NOTE DE CALCUL REF:15-601 CIDE-ELEC
