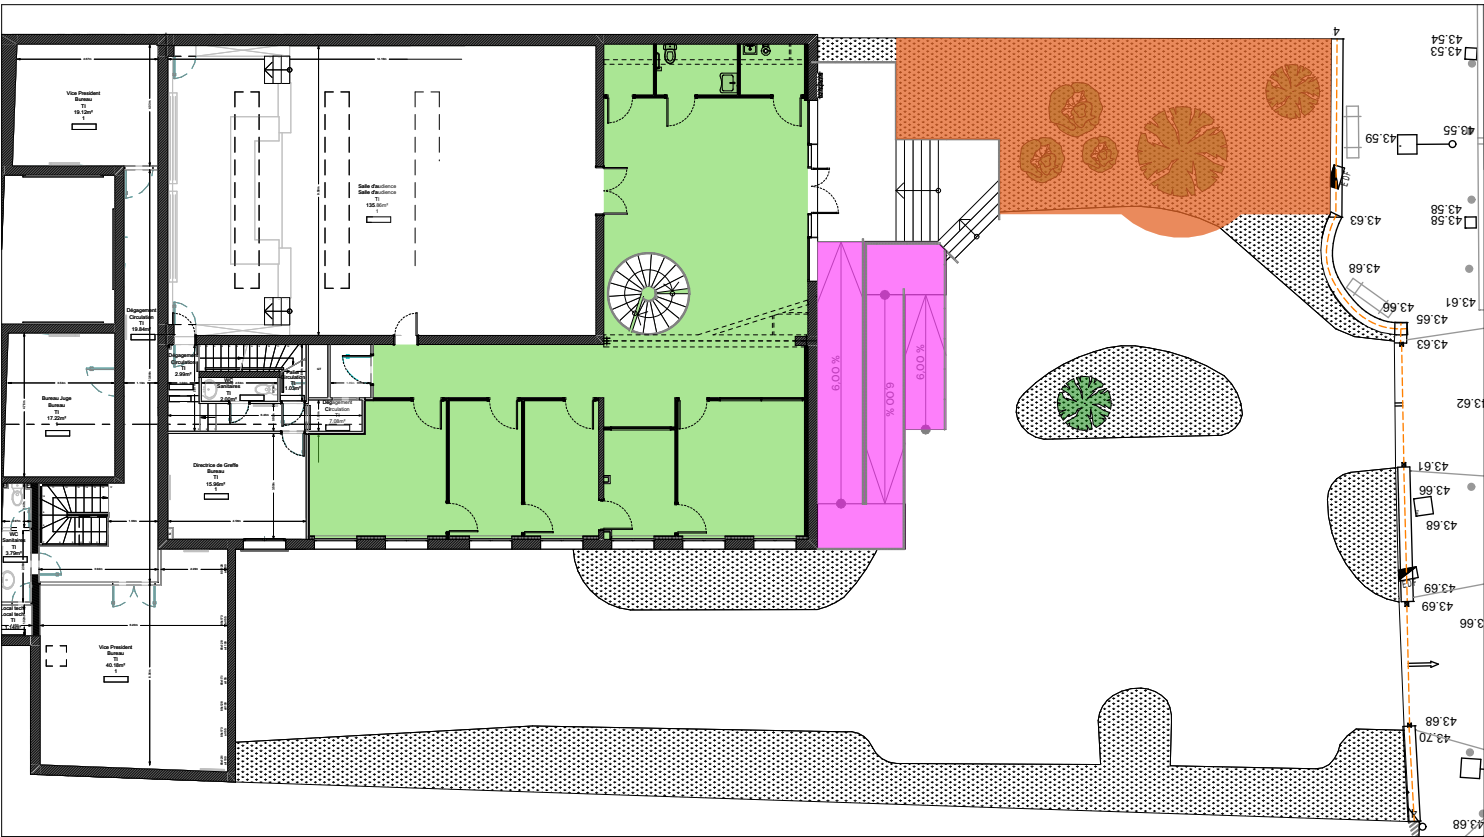




- PHASE 1** (attention : se référer au planning joint à la consultation pour les sous-phases 1a et 1b)
- RDC : désamiantage en deux phases, démolitions, renforts, réservations, cloisonnement, équipements et appareillages techniques (zone a)
 - R+1 : désamiantage, démolitions, renforts, réservations, cloisonnement, revêtements de sol et mur, plomberie
 - Extérieur : mise en place du bâtiment modulaire et de la rampe provisoire
 - Toiture : réservations, reprises d'étanchéité
- PHASE 2 :**
- RDC : plaquage, réseaux, équipements et appareillages techniques revêtements de sol et mur
 - Toiture : équipements techniques
- PHASE 3 :**
- Extérieur : démolition de la rampe provisoire et évacuation du bâtiment modulaire, nettoyage de façade, remplacement de signalétique, création de la nouvelle rampe PMR
 - Parking : création du local
- PHASE 4 :**
- Extérieur : démolition de l'ancienne rampe, plantations et engazonnement, remise en état des abords



NOTE :
Le phasage prévisionnel et les zones associées sont sous réserve de présence d'amiante dans la colle du carrelage du hall. Ils pourront être revus en période de préparation de chantier selon les résultats du diagnostic amiante avant travaux.

Ouvrage : Mise en accessibilité et création d'un Service d'Accueil Unique du Justiciable au tribunal de proximité de Lagny		 MINISTÈRE DE LA JUSTICE <i>Liberté Égalité Fraternité</i>	Maître d'ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE -				Maître d'œuvre : HAUTS-DE-FRANCE / OUEST 5/7, avenue Eugène Gazeau - 60300 SENLIS Tel.: 03 44 28 90 59 GRAND LYON 74, rue Maurice Flandin - 69003 LYON Tel.: 04 37 69 99 26 GRAND PARIS Cité Descartes - 18, rue Albert Einstein - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE Tel.: 01 60 06 04 75 GRAND EST 6, rue Saint Just - 51100 REIMS Tel.: 03 26 05 83 90 www.idoneis.fr / contact@idoneis.fr						Ind	Nom de changement	Date
N° de plan: 1137_DCE_indO 2e_PL26	Titre: Phasage prévisionnel		Echelle : 1:250	Format : A3	N° de projet : 1137	Phase : 1137_DCE_indO2 e			O0	Première publication	22/05/2024				
								01	Modifications demandées par la MOA	08/10/2024					
								01b	Demande de pièces complémentaires	27/11/2024					
								02	Modifications demandées et résultats de diagnostic	19/03/2025					
								02e	Modifications demandées par la MOA	22/08/2025					
