




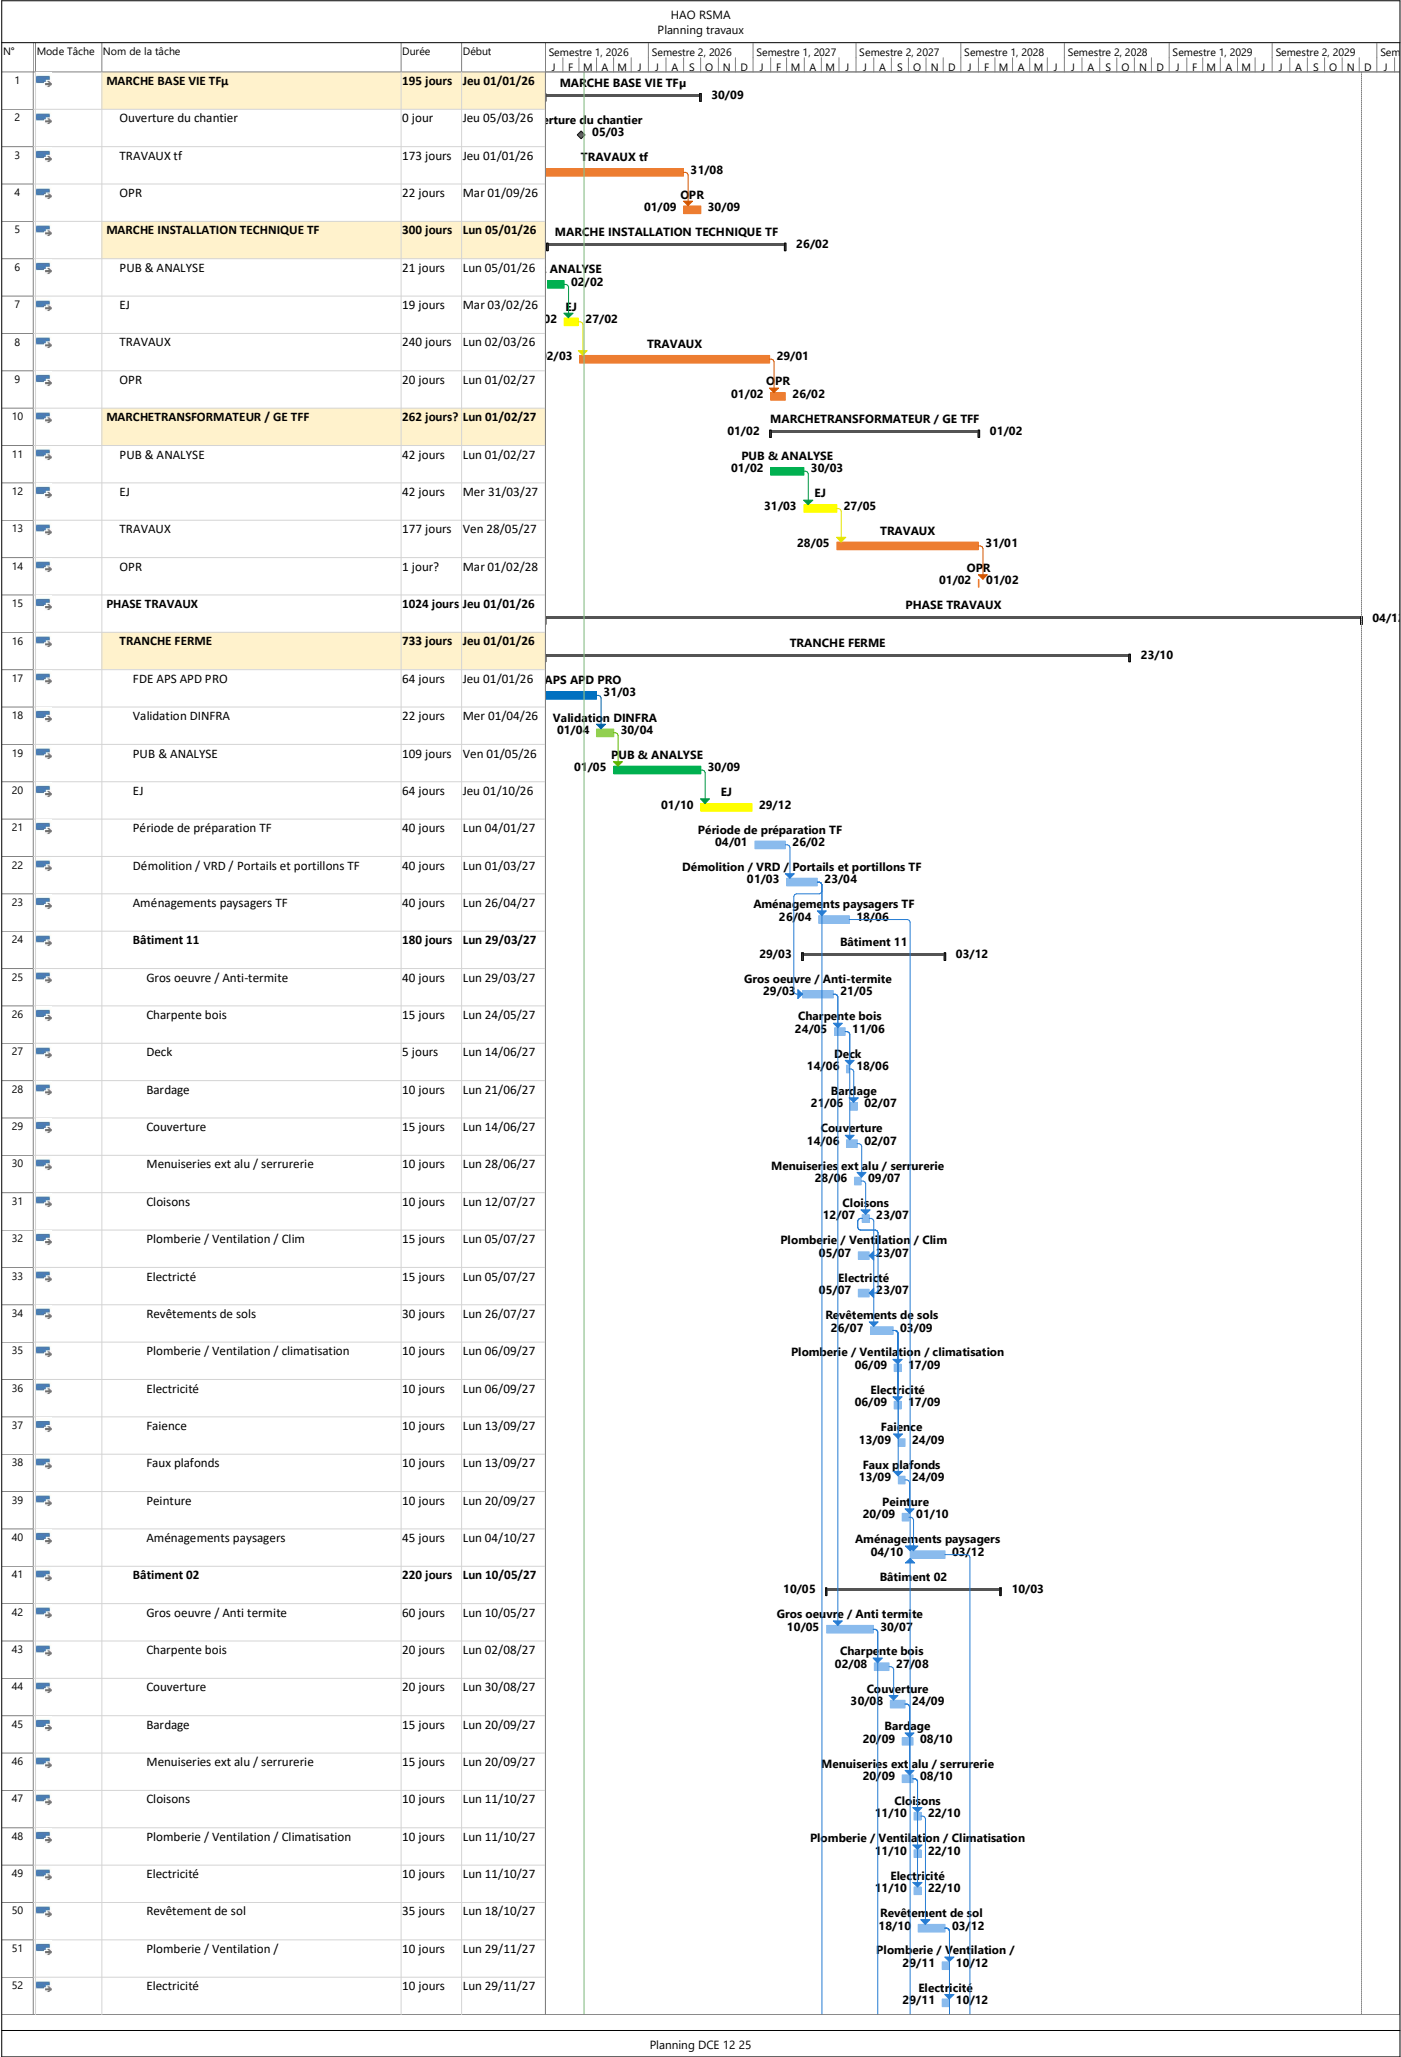

HAO RSMA													
Planning travaux													
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Semestre 2, 2029	Sem
53		Faux plafonds	20 jours	Lun 06/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
54		Faïence	10 jours	Lun 06/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
55		Cloisons	10 jours	Lun 20/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
56		Peinture	15 jours	Lun 20/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
57		Mobilier	5 jours	Lun 10/01/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
58		Aménagements paysagers	40 jours	Lun 17/01/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
59		Bâtiment 10	215 jours	Lun 19/07/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
60		Gros oeuvre / Anti termite	60 jours	Lun 19/07/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
61		Charpente bois	20 jours	Lun 11/10/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
62		Couverture	20 jours	Lun 08/11/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
63		Bardage	15 jours	Lun 29/11/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
64		Menuiseries ext alu / Serrurerie	15 jours	Lun 29/11/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
65		Cloison	10 jours	Lun 20/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
66		Plomberie / Ventilation / Climatisation	10 jours	Lun 20/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
67		Electricité	10 jours	Lun 20/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
68		Revêtementst de sol	35 jours	Lun 27/12/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
69		Plomberie / Ventilation / Climatisation	10 jours	Lun 07/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
70		Electricité	10 jours	Lun 07/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
71		Faux plafonds	20 jours	Lun 14/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
72		Faïence	10 jours	Lun 14/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
73		Cloisons	10 jours	Lun 28/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
74		Peinture	15 jours	Lun 28/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
75		Mobilier	5 jours	Lun 20/03/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
76		Aménagements paysagers	40 jours	Lun 20/03/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
77		Bâtiment 15	235 jours	Lun 11/10/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
78		Gros oeuvre / Anti termite	75 jours	Lun 11/10/27	J	F	M	A	M	J	J	A	S
79		Charpente métallique	25 jours	Lun 24/01/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
80		Couverture	20 jours	Lun 28/02/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
81		Menuiseries ext alu / Serrureries	20 jours	Lun 20/03/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
82		Bardage	15 jours	Lun 27/03/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
83		Cloisons	5 jours	Lun 17/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
84		Cloisons isotherme (hors marché)	15 jours	Lun 10/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
85		Plomberie / Ventilation / Climatisation	20 jours	Lun 03/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
86		Electricité	20 jours	Lun 03/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
87		Gros oeuvre	10 jours	Lun 01/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
88		Revêtement de sol	40 jours	Lun 15/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
89		Plomberie / Ventilation / Climatisation	10 jours	Lun 10/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
90		Electricité	10 jours	Lun 10/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
91		Réseaux équipements de cuisien (hors marché)	15 jours	Lun 10/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
92		Faux plafonds	30 jours	Lun 10/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
93		Peinture	15 jours	Lun 07/08/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
94		Faïence	10 jours	Lun 24/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
95		Equipements de cuisine (hors marché)	15 jours	Lun 31/07/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
96		Mobilier	5 jours	Lun 28/08/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
97		Bâtiment 01	135 jours	Lun 24/01/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
98		Gros oeuvre / Anti termite	50 jours	Lun 24/01/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
99		Charpente bois	15 jours	Lun 03/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
100		Couverture	15 jours	Lun 24/04/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
101		Menuiseries ext Alu / Serrurerie	10 jours	Lun 08/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
102		Bardage	15 jours	Lun 08/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
103		Cloisons	10 jours	Lun 22/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S
104		Plomberie / Ventilation / Climatisation	10 jours	Lun 15/05/28	J	F	M	A	M	J	J	A	S

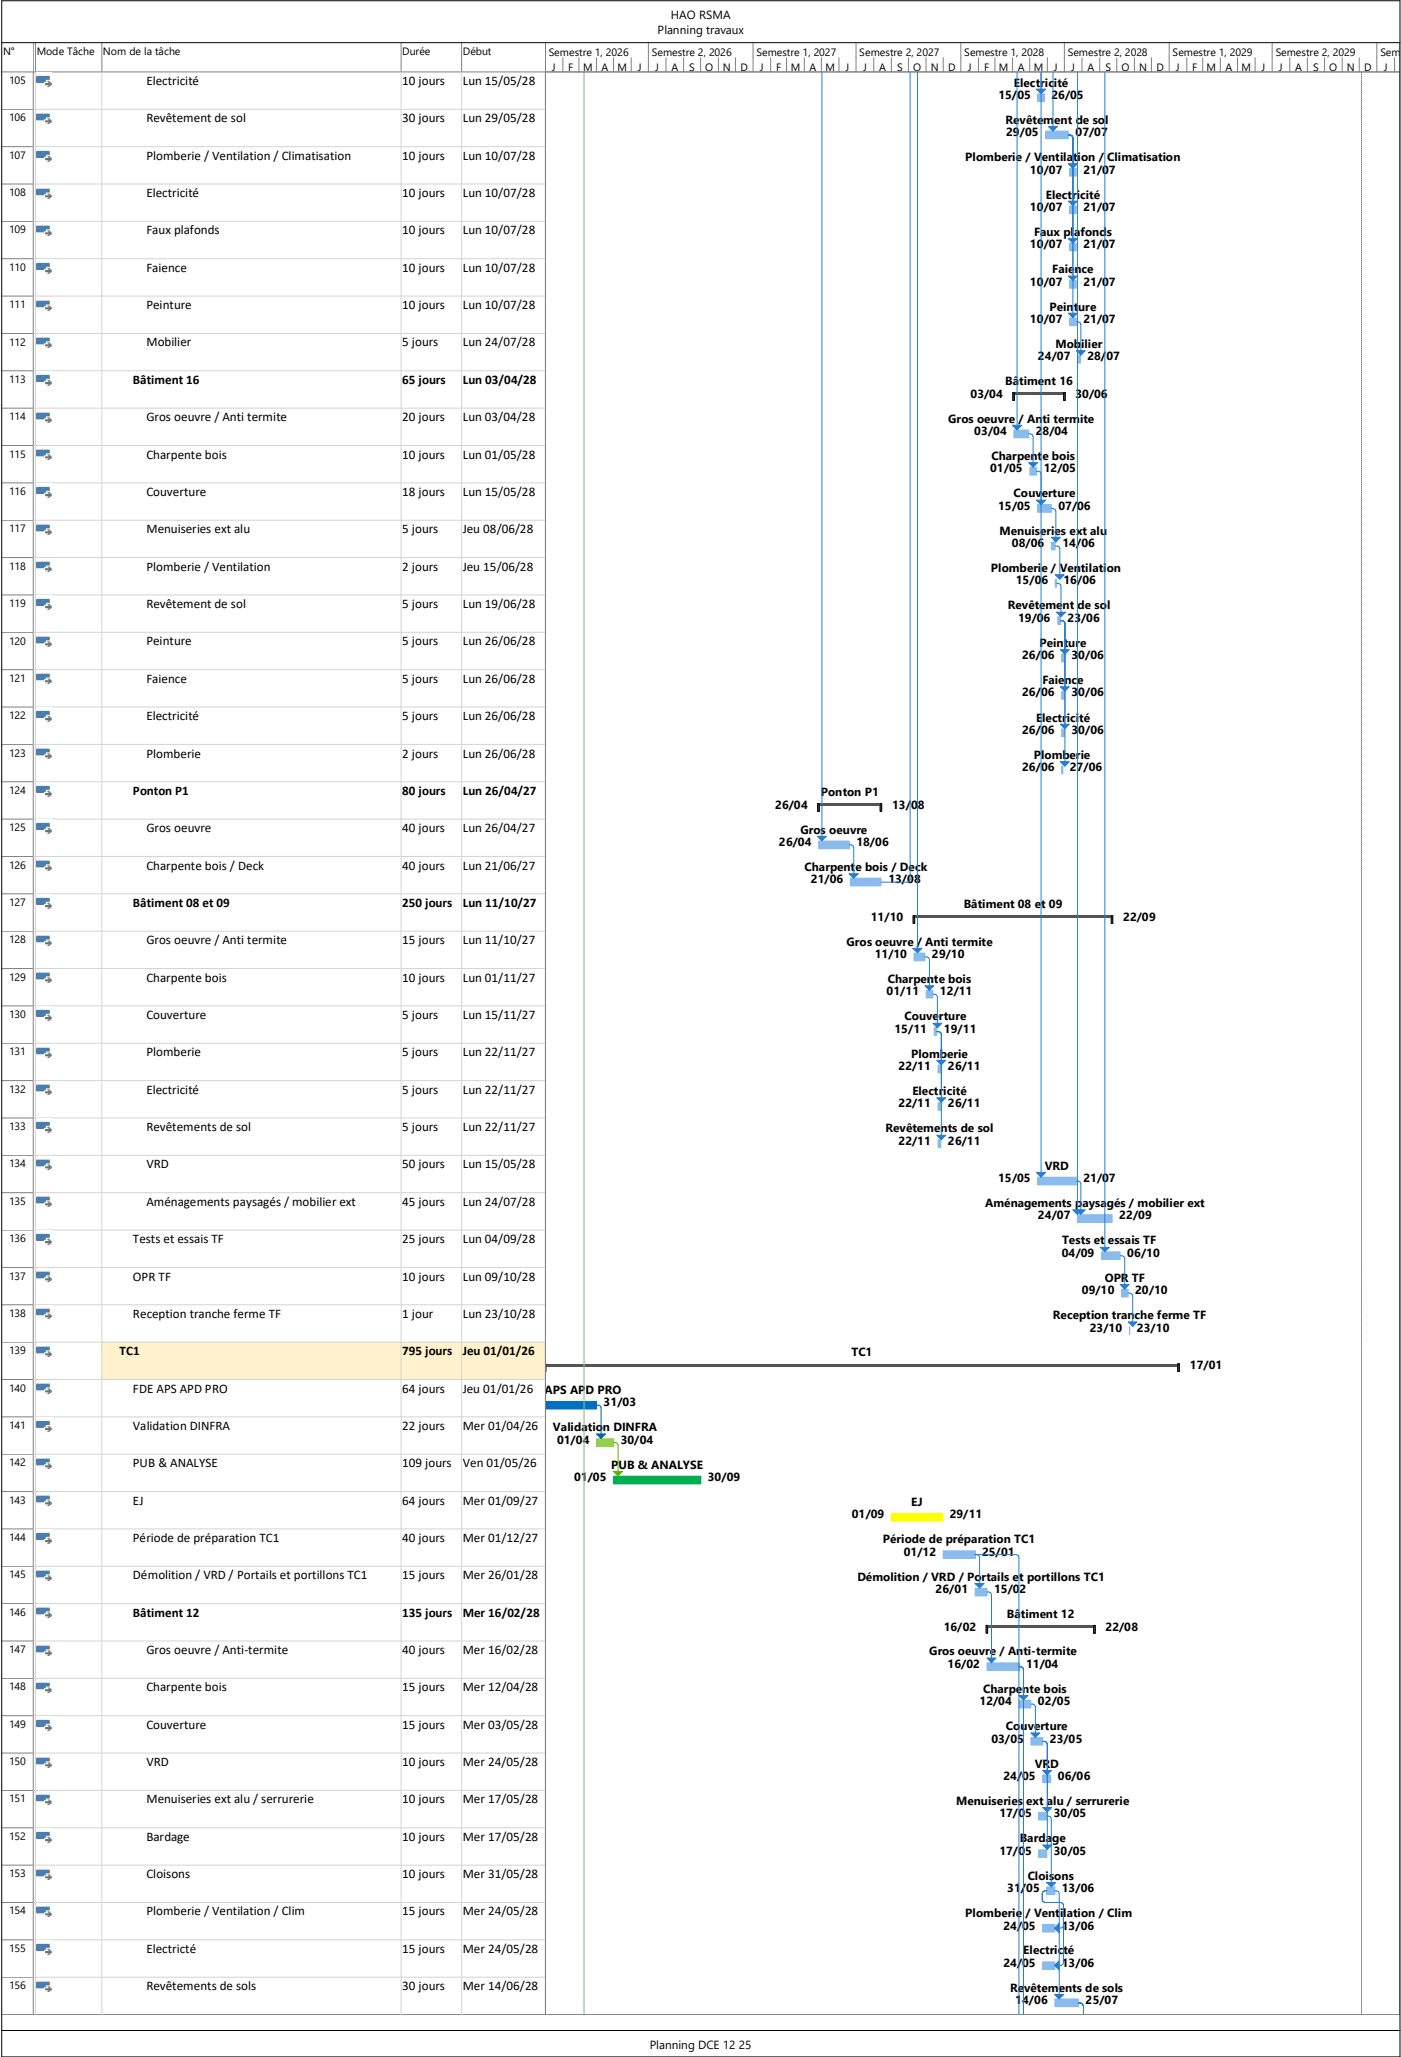

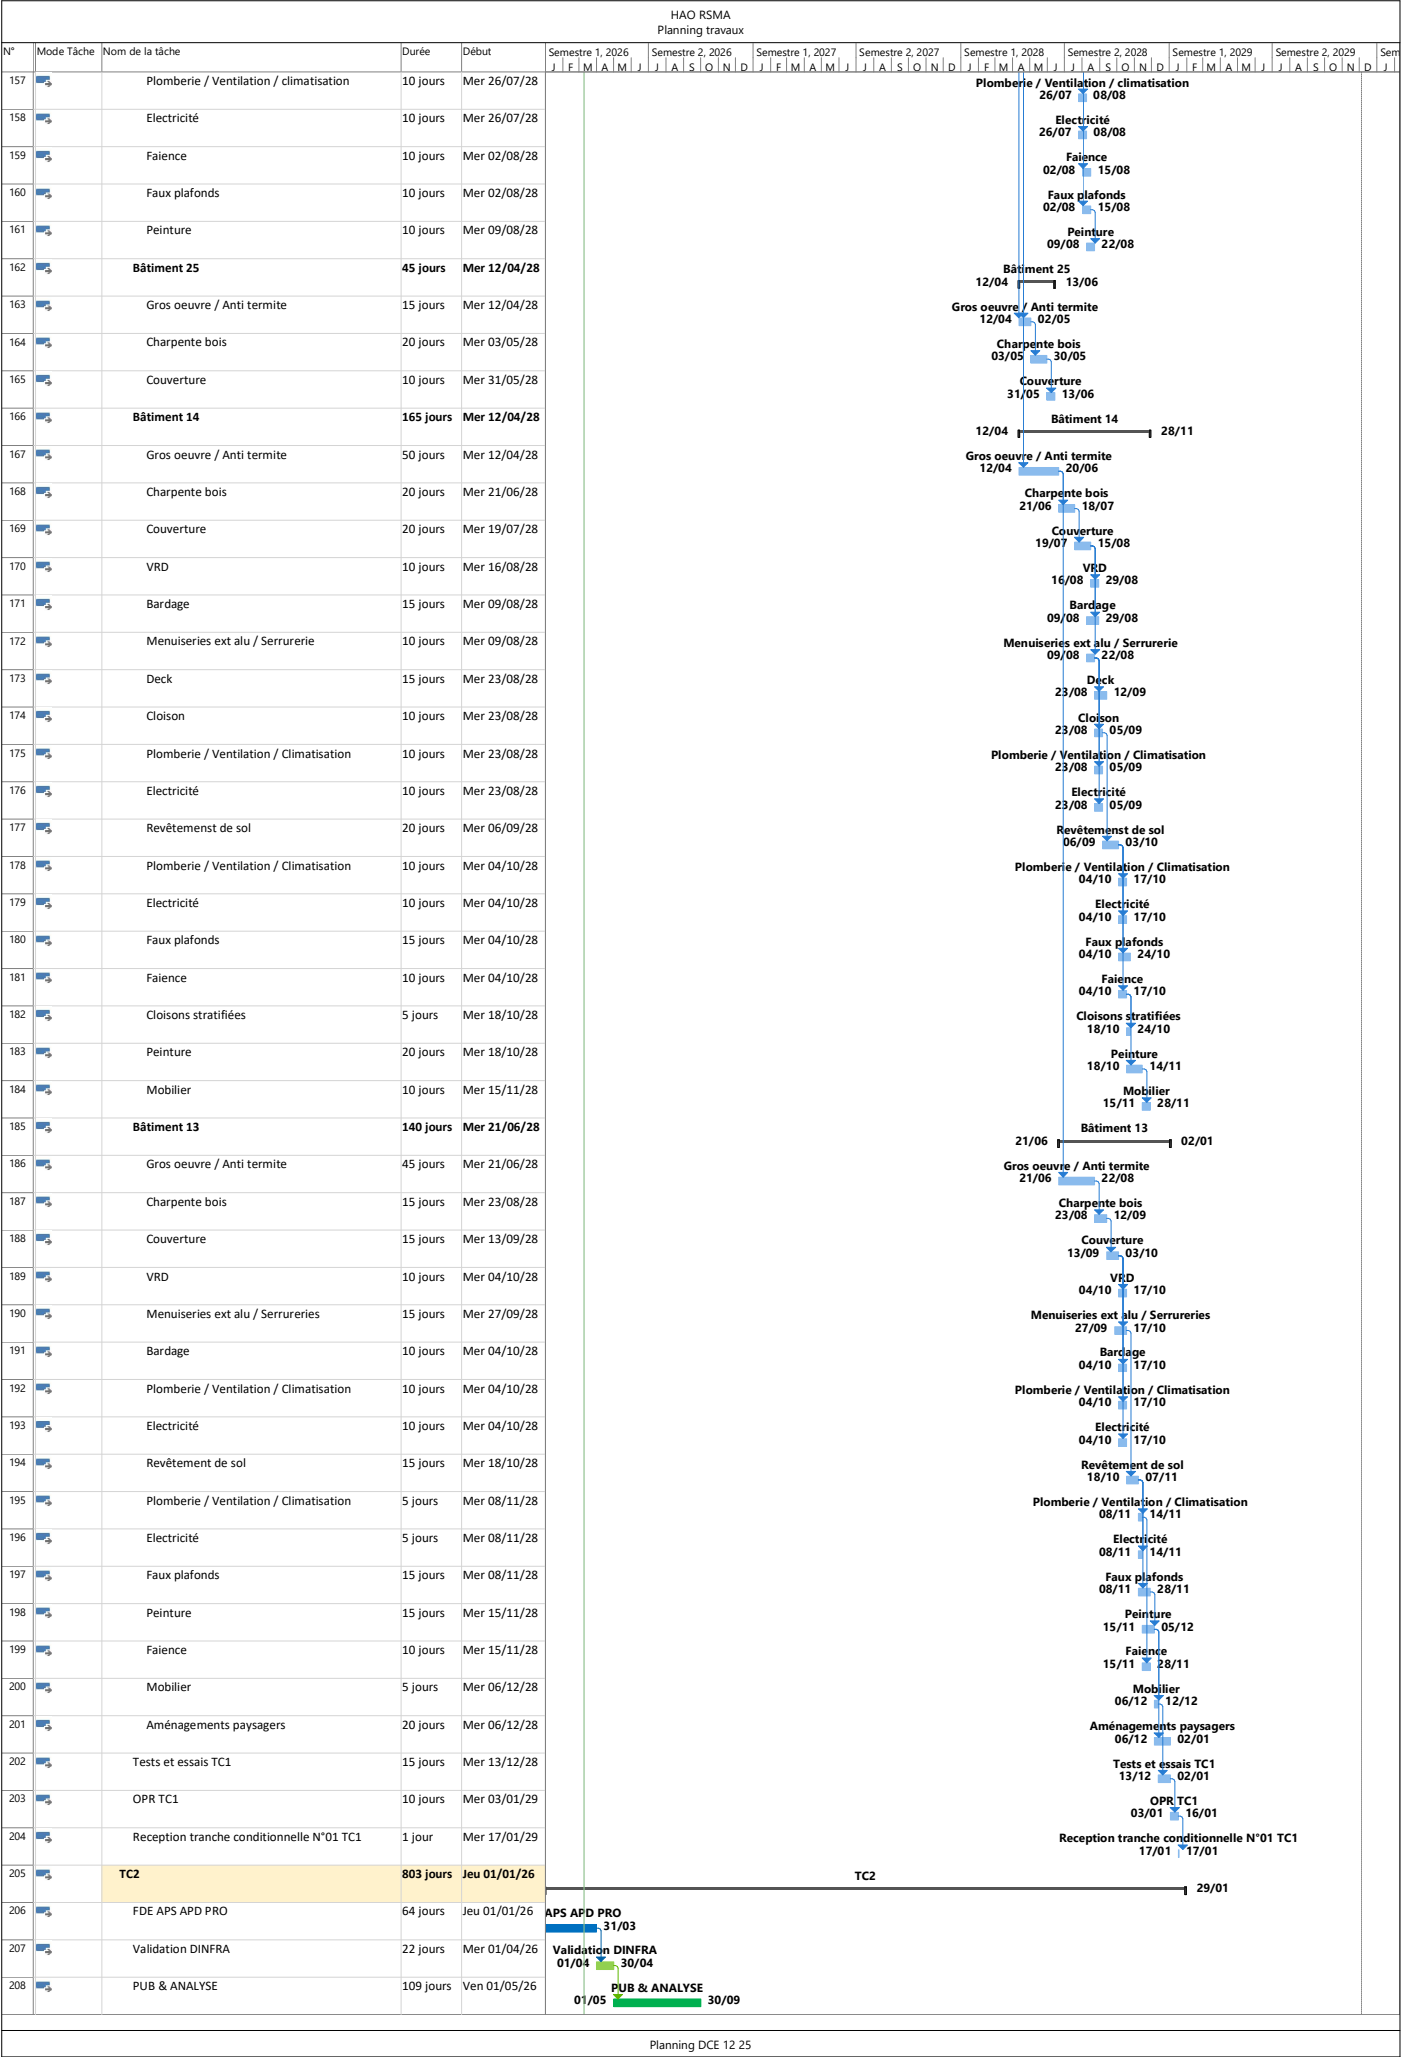

HAO RSMA Planning travaux													
N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Semestre 2, 2029	Sem
209		EJ	64 jours	Lun 04/10/27	J	F	M	A	M	J	J	J	
210		Période de préparation TC2	40 jours	Lun 03/01/28									
211		Démolition / VRD / Portails et portillons TC2	10 jours	Lun 28/02/28									
212		Bâtiment 7 et 3	119 jours	Lun 13/03/28									
213		Gros oeuvre / Anti-termite	50 jours	Lun 13/03/28									
214		Charpente bois	20 jours	Lun 08/05/28									
215		Couverture	15 jours	Lun 29/05/28									
216		Menuiseries ext alu / serrurerie	10 jours	Lun 12/06/28									
217		Bardage	15 jours	Lun 12/06/28									
218		Deck	20 jours	Lun 03/07/28									
219		Cloisons	10 jours	Mer 21/06/28									
220		Plomberie / Ventilation / Clim	10 jours	Lun 19/06/28									
221		Electricité	10 jours	Lun 19/06/28									
222		Revêtements de sols	20 jours	Mer 28/06/28									
223		Plomberie / Ventilation / climatisation	5 jours	Mer 26/07/28									
224		Electricité	5 jours	Mer 26/07/28									
225		Faïence	10 jours	Mer 26/07/28									
226		Faux plafonds	12 jours	Mer 02/08/28									
227		Peinture	12 jours	Mer 09/08/28									
228		Bâtiment 24	50 jours	Lun 22/05/28									
229		Gros oeuvre / Anti termite	30 jours	Lun 22/05/28									
230		Charpente bois	20 jours	Lun 19/06/28									
231		Couverture	10 jours	Lun 17/07/28									
232		Bâtiment 6, 4 et 5 et P2	165 jours	Lun 22/05/28									
233		Gros oeuvre	60 jours	Lun 22/05/28									
234		Charpente bois	20 jours	Lun 31/07/28									
235		Deck	20 jours	Lun 28/08/28									
236		Couverture	20 jours	Lun 21/08/28									
237		Bardage	20 jours	Lun 11/09/28									
238		Menuiseries ext alu / Serrurerie	15 jours	Lun 11/09/28									
239		Cloison	10 jours	Lun 25/09/28									
240		Plomberie / Ventilation / Climatisation	20 jours	Lun 18/09/28									
241		Electricité	20 jours	Lun 18/09/28									
242		Revêtementst de sol	20 jours	Lun 09/10/28									
243		Plomberie / Ventilation / Climatisation	10 jours	Lun 06/11/28									
244		Electricité	10 jours	Lun 06/11/28									
245		Faux plafonds	15 jours	Lun 06/11/28									
246		Faïence	10 jours	Lun 06/11/28									
247		Peinture	15 jours	Lun 20/11/28									
248		Mobilier	10 jours	Lun 11/12/28									
249		Aménagements paysagers	20 jours	Lun 11/12/28									
250		Tests et essais TC2	15 jours	Lun 25/12/28									
251		OPR TC2	10 jours	Lun 15/01/29									
252		Reception tranche conditionnelle N°02 TC2	1 jour	Lun 29/01/29									
253		TC3	984 jours	Jeu 01/01/26									
254		FDE APS APD PRO	64 jours	Jeu 01/01/26									
255		Validation DINFRA	22 jours	Mer 01/04/26									
256		PUB & ANALYSE	109 jours	Ven 01/05/26									
257		EJ	64 jours	Lun 03/04/28									
258		Période de préparation TC3	40 jours	Mar 01/08/28									
259		Démolition / VRD / Portails et portillons TC3	10 jours	Mar 26/09/28									
260		Bâtiment 20	125 jours	Mar 10/10/28									

04/10 EJ 30/12

Période de préparation TC2 03/01 25/02

Démolition / VRD / Portails et portillons TC2 28/02 10/03

Bâtiment 7 et 3 13/03 24/08

Gros oeuvre / Anti-termite 13/03 19/05

Charpente bois 08/05 02/06

Couverture 29/05 16/06

Menuiseries ext alu / serrurerie 12/06 23/06

Bardage 12/06 30/06

Deck 03/07 28/07

Cloisons 21/06 04/07

Plomberie / Ventilation / Clim 19/05 30/06

Electricité 19/05 30/06

Revêtements de sols 28/06 25/07

Plomberie / Ventilation / climatisation 26/07 01/08

Electricité 26/07 01/08

Faïence 26/07 08/08

Faux plafonds 02/08 17/08

Peinture 09/08 24/08

Bâtiment 24 22/05 28/07

Gros oeuvre / Anti termite 22/05 30/06

Charpente bois 19/05 14/07

Couverture 17/07 28/07

Bâtiment 6, 4 et 5 et P2 22/05 05/01

Gros oeuvre 22/05 11/08

Charpente bois 31/07 25/08

Deck 28/08 22/09

Couverture 21/08 15/09

Bardage 11/09 06/10

Menuiseries ext alu / Serrurerie 11/09 29/09

Cloison 25/09 06/10

Plomberie / Ventilation / Climatisation 18/09 13/10

Electricité 18/09 13/10

Revêtementst de sol 09/10 03/11

Plomberie / Ventilation / Climatisation 06/11 17/11

Electricité 06/11 17/11

Faux plafonds 06/11 24/11

Faïence 06/11 17/11

Peinture 20/11 08/12

Mobilier 11/12 22/12

Aménagements paysagers 11/12 05/01

Tests et essais TC2 25/12 12/01

OPR TC2 15/01 26/01

Reception tranche conditionnelle N°02 TC2 29/01 29/01

TC3 09/10

APS APD PRO 31/03

Validation DINFRA 01/04 30/04

PUB & ANALYSE 01/05 30/09

03/04 EJ 29/06

Période de préparation TC3 01/08 25/09

Démolition / VRD / Portails et portillons TC3 26/09 09/10

Bâtiment 20 10/10 02/04

Planning DCE 12 25

Planning DCE 12 25
