

Projet :  
PRÉFECTURE DES YVELINES  
18 Rue De Lorraine  
78200 MANTES-LA-JOLIE

Maîtrise d’Ouvrage délégué :  
PRÉFECTURE DES YVELINES  
1 Rue Jean HOUDON  
78100 VERSAILLES Cedex

Maîtrise d’Oeuvre :  
EC-BE  
33 Rue Navier  
75017 PARIS



Liste des pièces

ÉLEVATION - ROTATION AMIANTE

Émetteur : EC-BE	Phase : DCE	Impression : A3
Niveau : RDC	Échelle : .	Indice : 00

RAVALEMENT DES FAÇADES  
MENUISERIES EXTÉRIEURES  
DÉSAMIANTAGE

DCE




18 Rue De Lorraine  
78200 MANTES-LA-JOLIE


ÉLEVATIONS - ROTATION AMIANTE

Date :  
20/11/2024


ÉLÉVATIONS SUR COUR

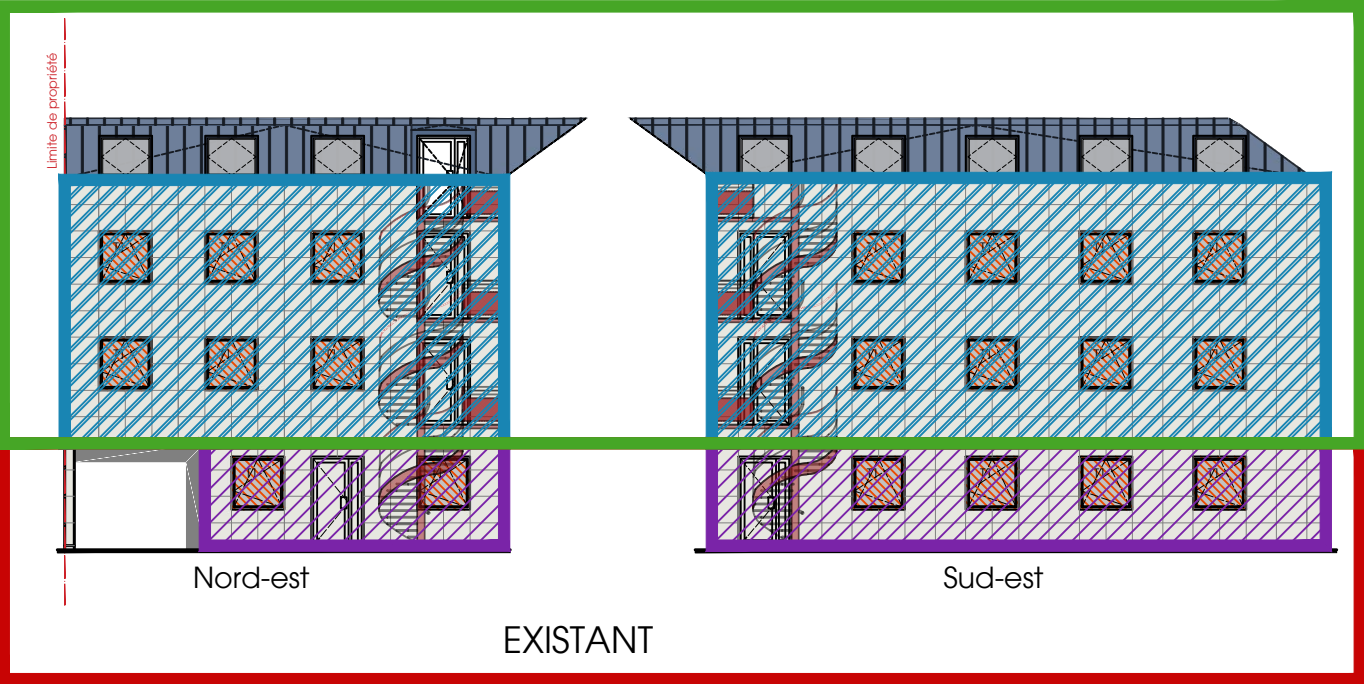


ÉLÉVATIONS SUR LE MUSÉE

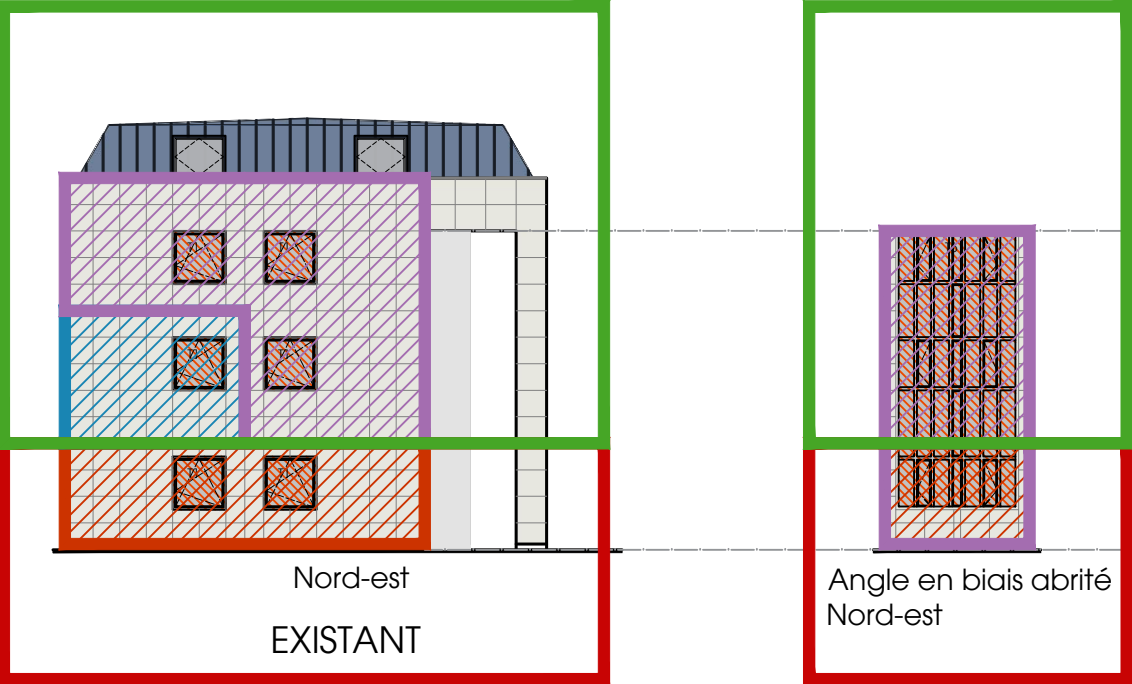

ÉLÉVATIONS SUR LE PARC

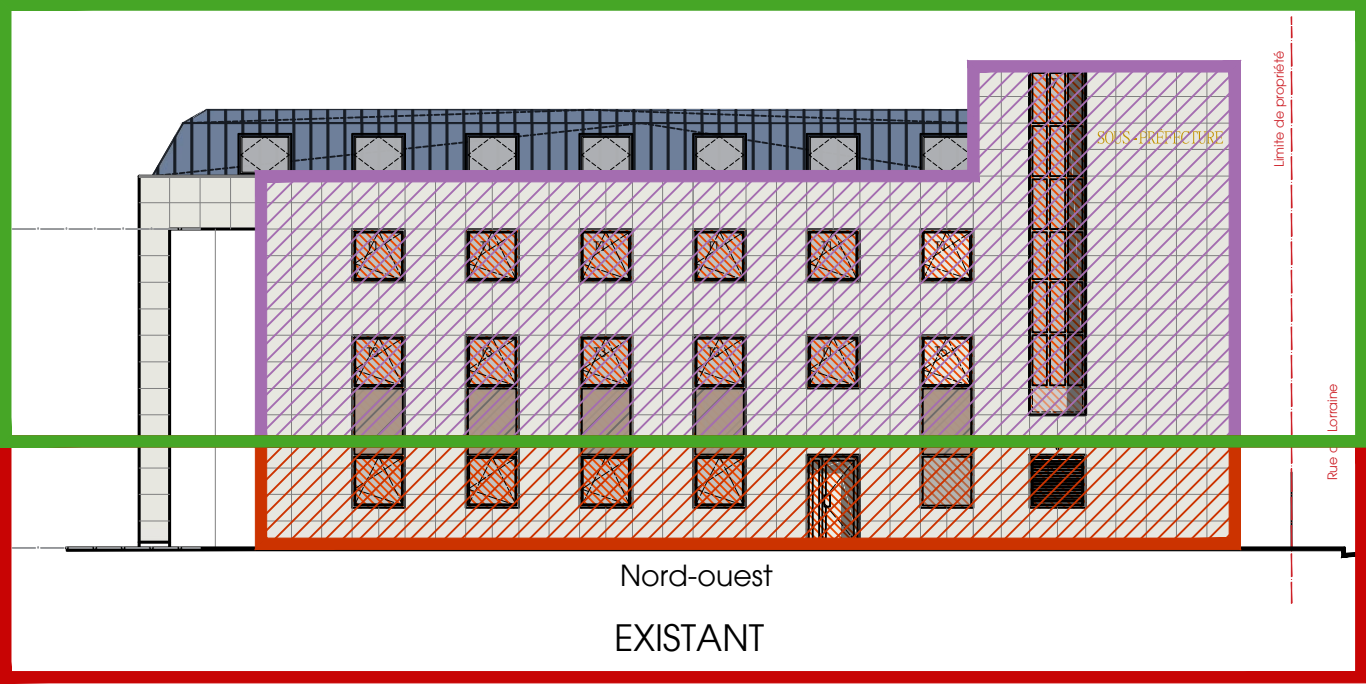

ÉLÉVATIONS SUR RUE DE LORRAINE

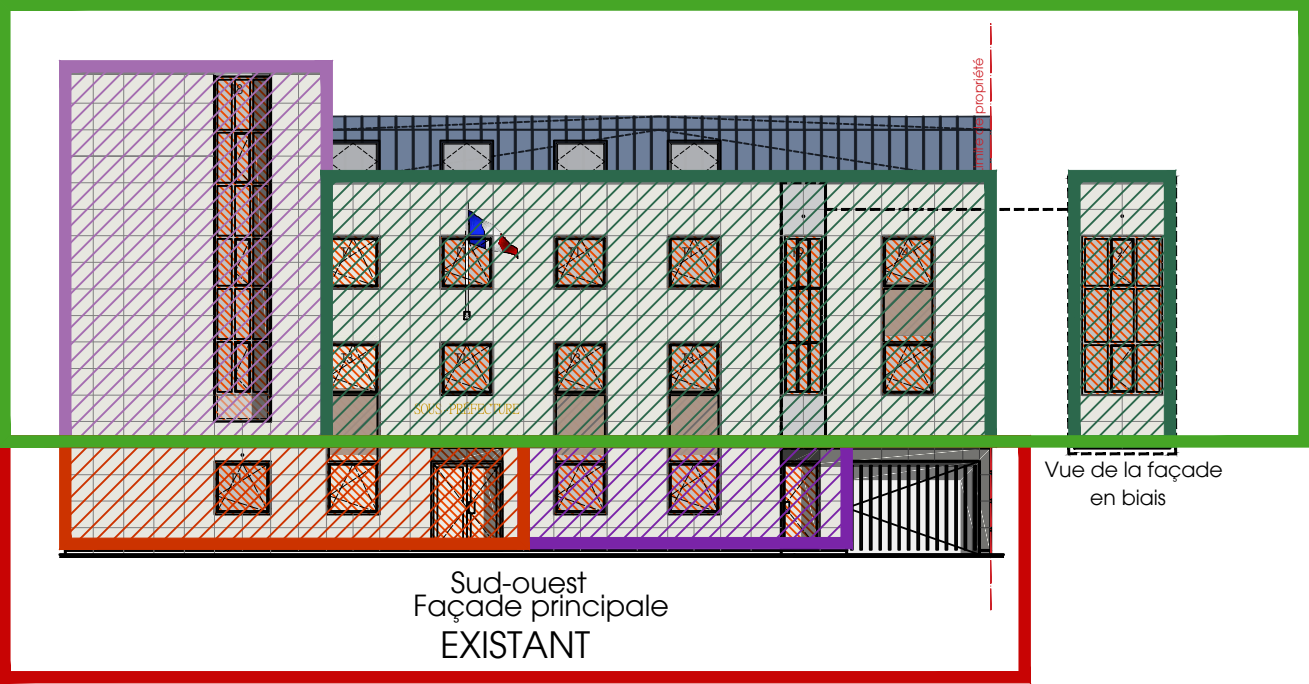

ÉTAPE A - 6 semaines  
Désamiantage RDC (accueil public)

Phase 1  
Les travaux comprennent la partie du RDC accueillant le public.


Phase 2  
Les travaux comprennent les bureaux du RDC.

Phase 1  
Les travaux concernent la partie en bleu, et impactent 8 bureaux au R+1 et 6 bureaux au R+2 :  
- Les travaux démarrent le 19 mars 2025 et se terminent le 3 juillet 2025.  
- Condamnation des bureaux au R+1 du 2 avril au 24 avril 2025  
- Condamnation des bureaux au R+2 du 2 mai au 26 mai 2025

Phase 2  
Les travaux concernent la partie en vert, soit 4 bureaux au R+1 et 4 bureaux au R+2 :  
- Les travaux démarrent le 3 juin 2025 et se terminent le 16 septembre 2025.  
- Condamnation des bureaux au R+1 du 16 juin au 3 juillet 2025  
- Condamnation des bureaux au R+2 du 11 juillet au 31 juillet 2025

ÉTAPE B  
Étages

Phase 3  
Les travaux concernent la partie en mauve, ils s'appliquent à 6 bureaux au R+1, à 6 bureaux au R+2, ainsi que le volume de la circulation verticale (escalier / ascenseur) :  
- Les travaux démarrent le 8 septembre 2025 et se terminent le 23 décembre 2025.  
- Condamnation des bureaux au R+1 du 19 septembre au 8 octobre 2025.  
- Condamnation des bureaux au R+2 du 16 octobre au 4 novembre 2025.

Maîtrise d'ouvrage : PRÉFECTURE DES YVELINES 1 Rue Jean HOUDON 78100 VERSAILLES Cedex	Maîtrise d'oeuvre : EC-BE 33 Rue Navier 75017 PARIS 	Projet : PRÉFECTURE DES YVELINES 18 Rue De Lorraine 78200 MANTES-LA-JOLIE	ÉLÉVATIONS ROTATION AMIANTE			Echelle : 1/200	Date : 18.01.2024	
			Emetteur : EC-BE	Phase : DCE	Niveau : TN	Impression : A3	Numéro :	Indice : 00
