


**PHASE 1 - Plateforme déchets et voirie de contournement**  
**du 02/06/2025 au 04/08/2025**

Sens de circulation des véhicules  
 Zone d'intervention  
 Démolition

Démolition du bâtiment de la médecine du sport et suppression de 20 places de stationnement en périphérie  
Préparation de la plateforme déchets  
Création d'une voirie lourde de contournement de la plateforme  
Réaménagement du parking Ouest (suppression de 5 places) pour création en continuité de la nouvelle voirie de contournement

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJ existant : en fonctionnement à l'identique  
RDC existant : en fonctionnement à l'identique

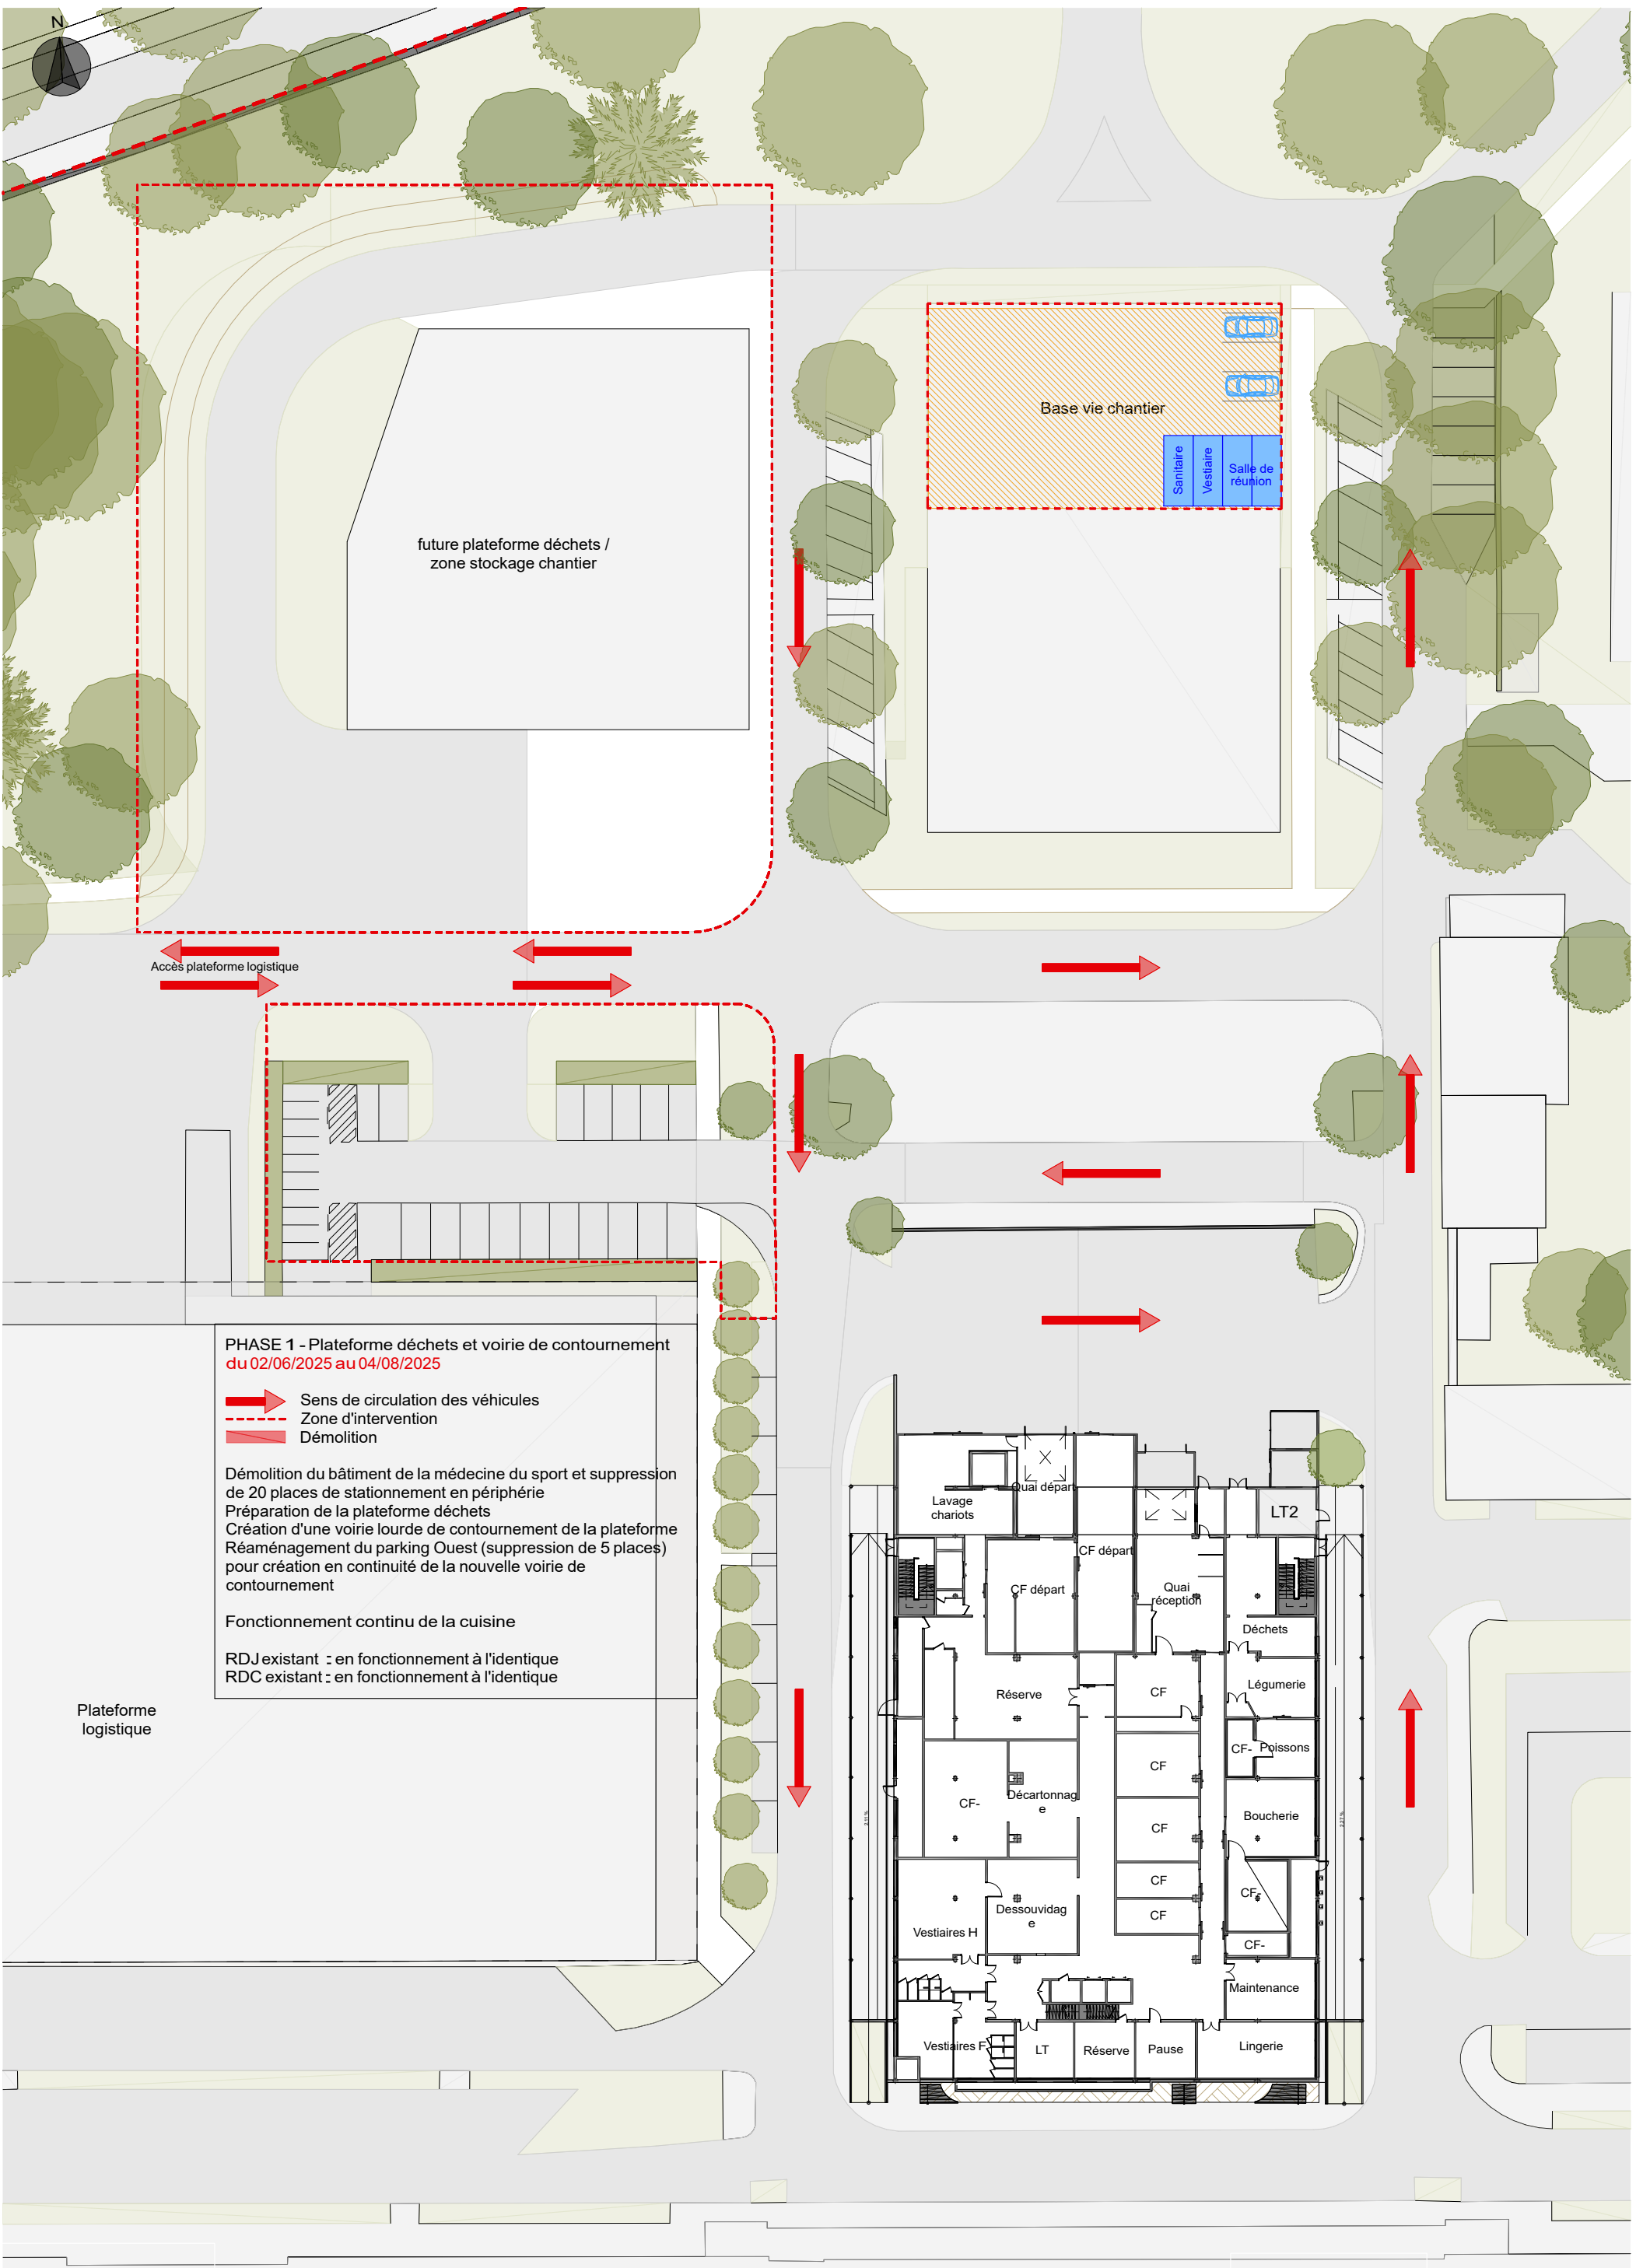











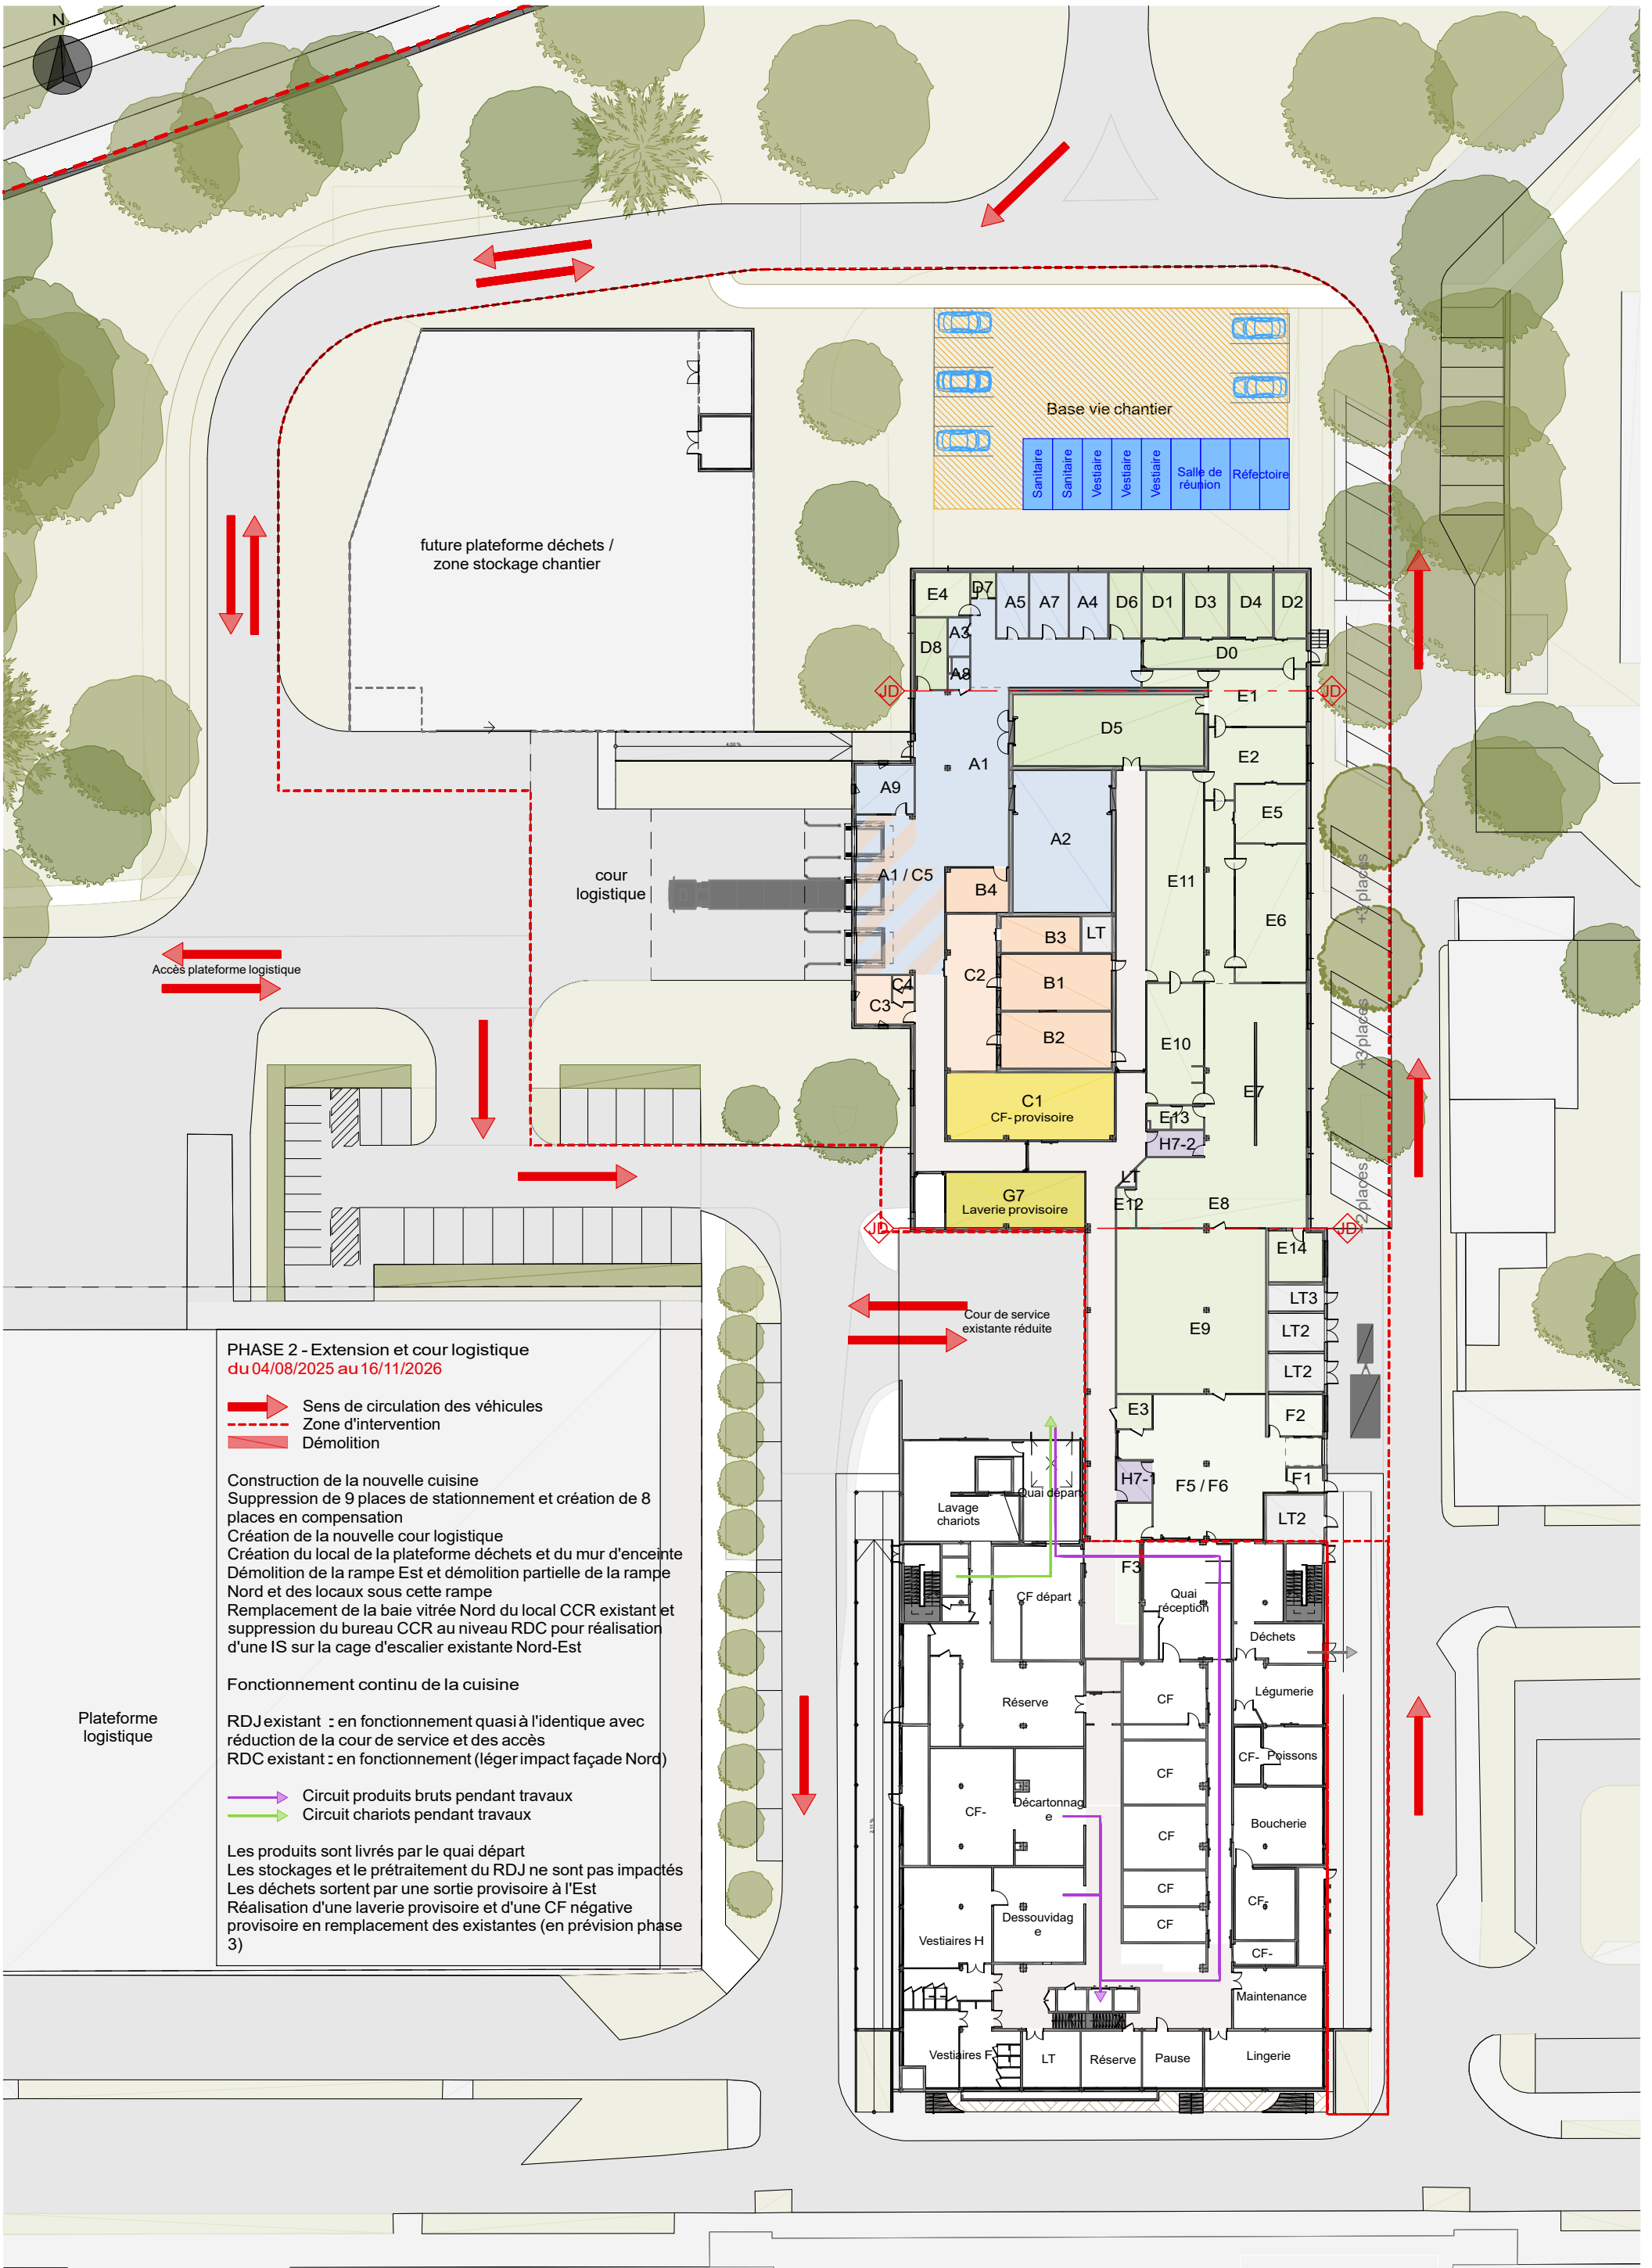



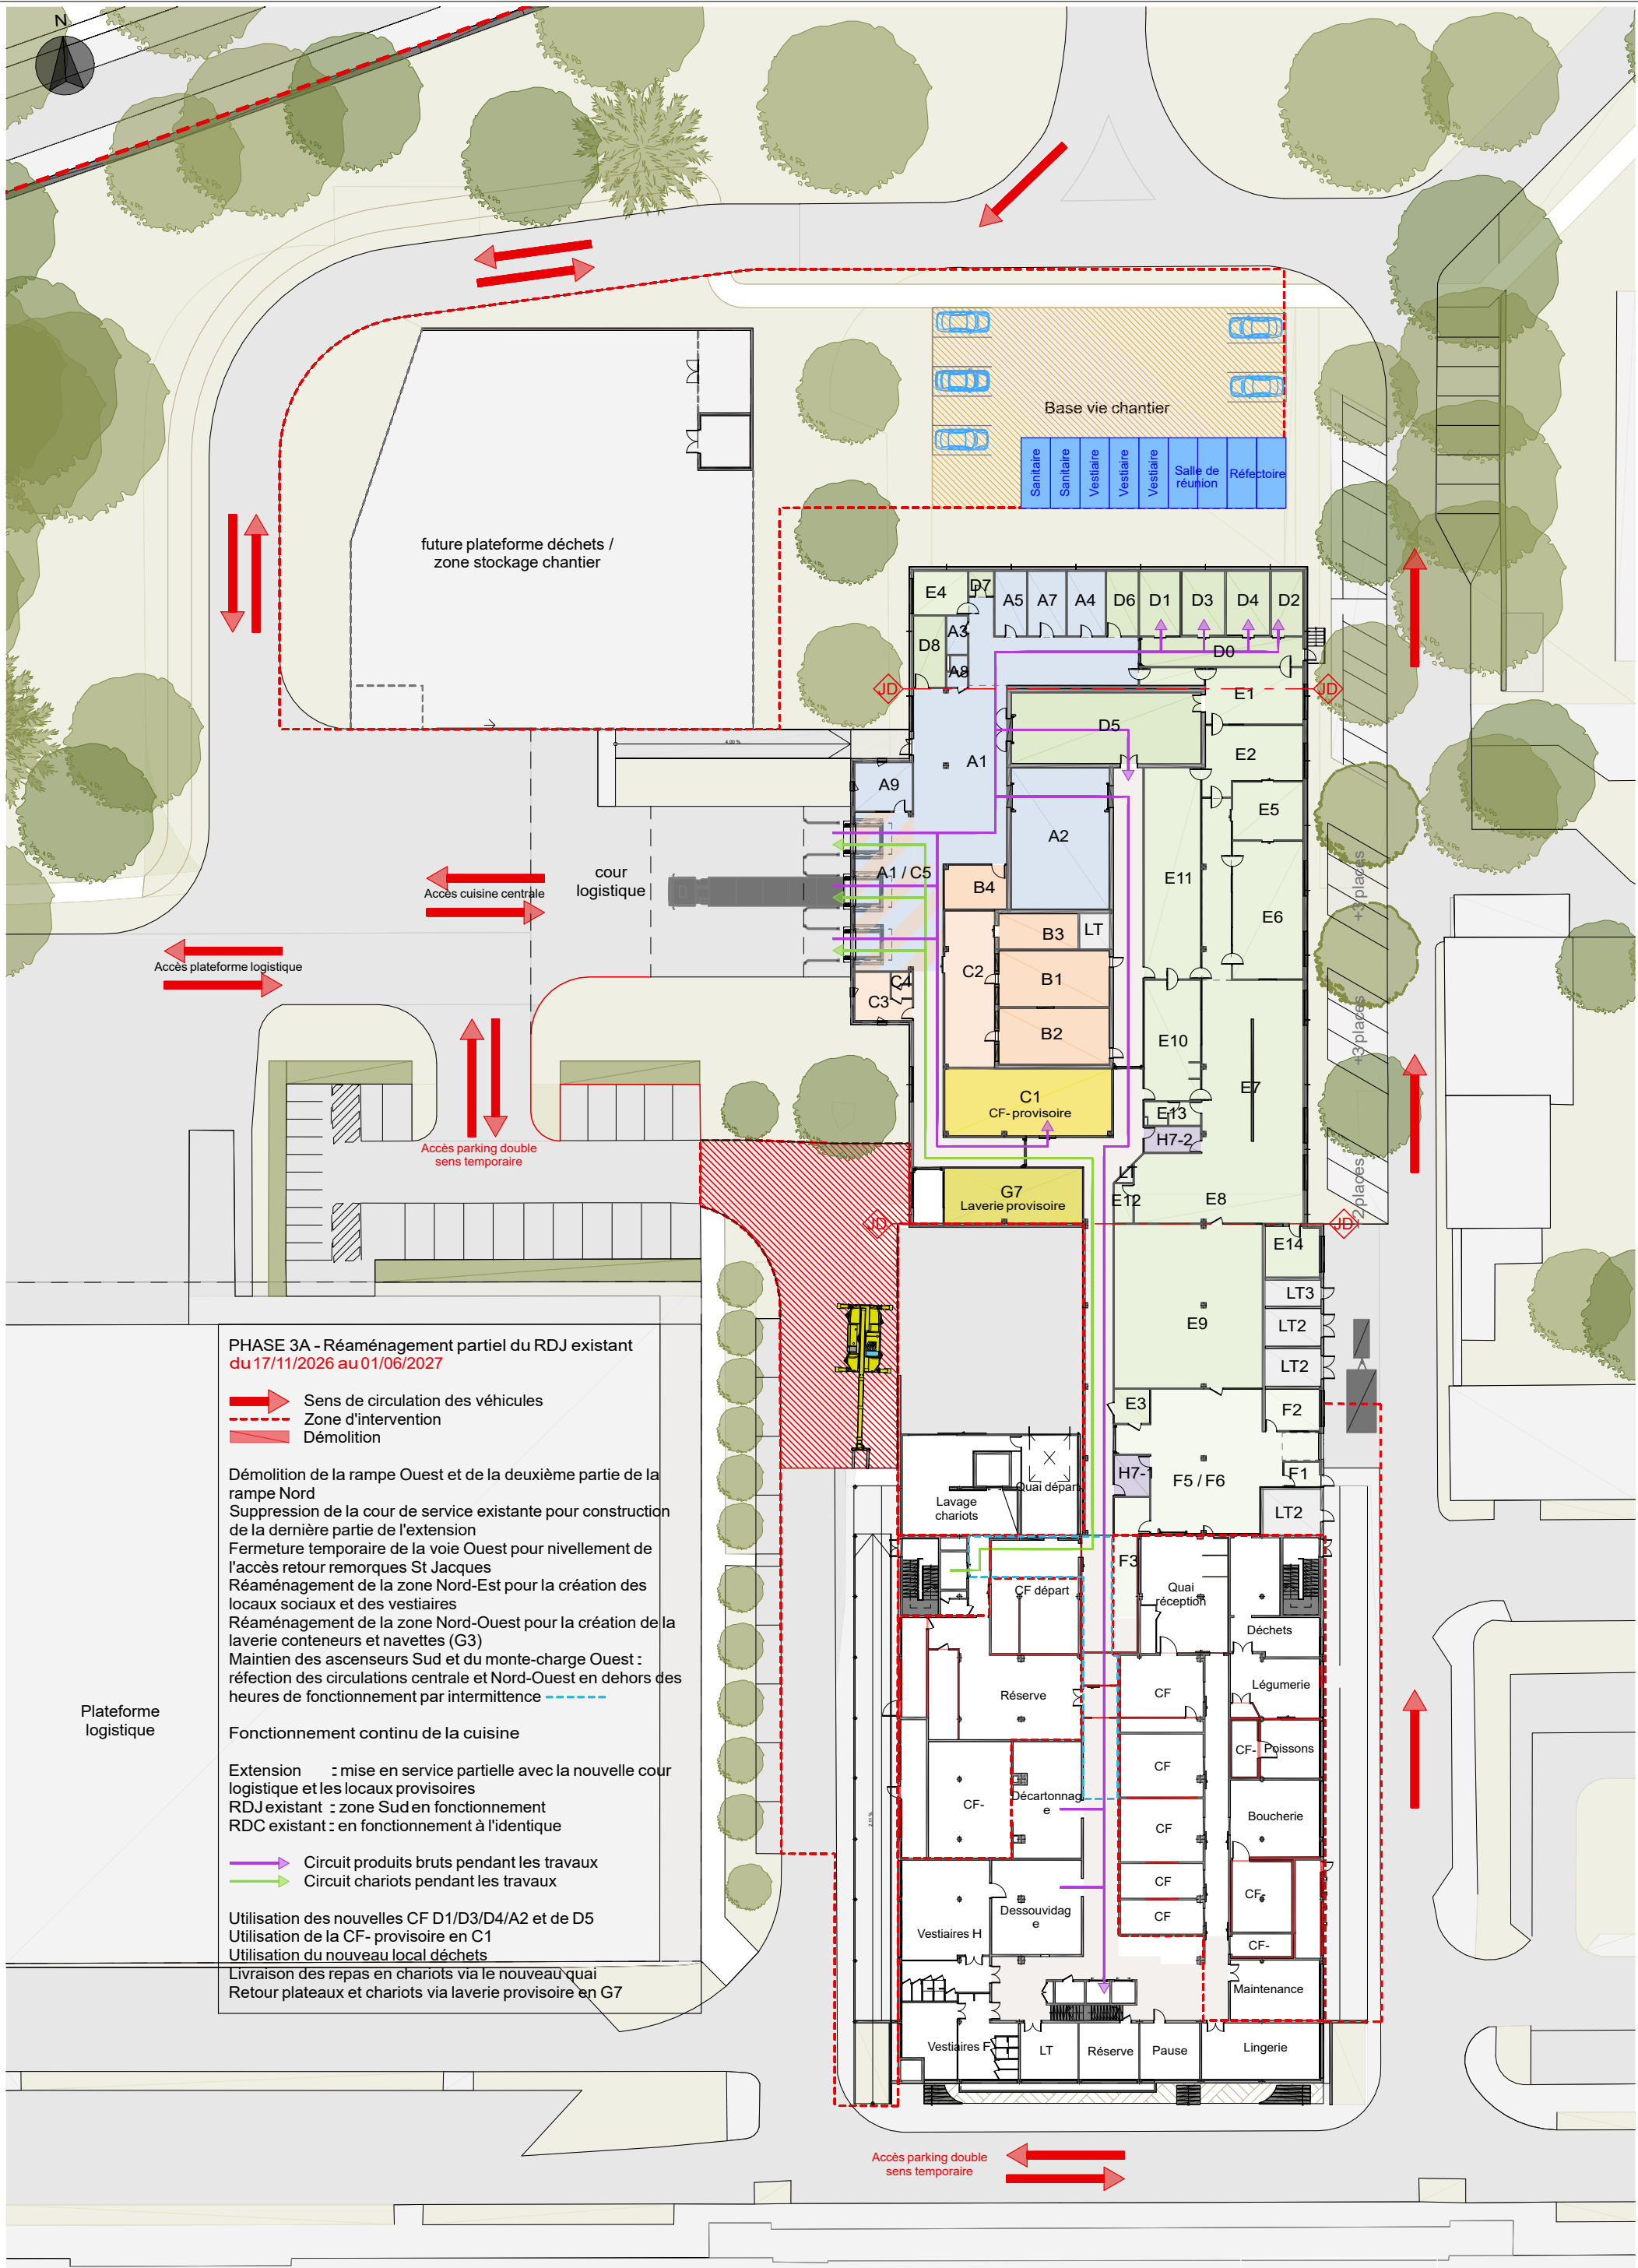

**PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant**  
**du 17/11/2026 au 01/06/2027**

**Sens de circulation des véhicules**  
**Zone d'intervention**  
**Démolition**

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxième partie de la rampe Nord  
Suppression de la cour de service existante pour construction de la dernière partie de l'extension  
Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de l'accès retour remorques St Jacques  
Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des locaux sociaux et des vestiaires  
Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de la laverie conteneurs et navettes (G3)  
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest : réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des heures de fonctionnement par intermittence


Fonctionnement continu de la cuisine


Extension : mise en service partielle avec la nouvelle cour logistique et les locaux provisoires  
RDJ existant : zone Sud en fonctionnement  
RDC existant : en fonctionnement à l'identique

Circuit produits bruts pendant les travaux  
Circuit chariots pendant les travaux

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5  
Utilisation de la CF- provisoire en C1  
Utilisation du nouveau local déchets  
Livraison des repas en chariots via le nouveau quai  
Retour plateaux et chariots via laverie provisoire en G7



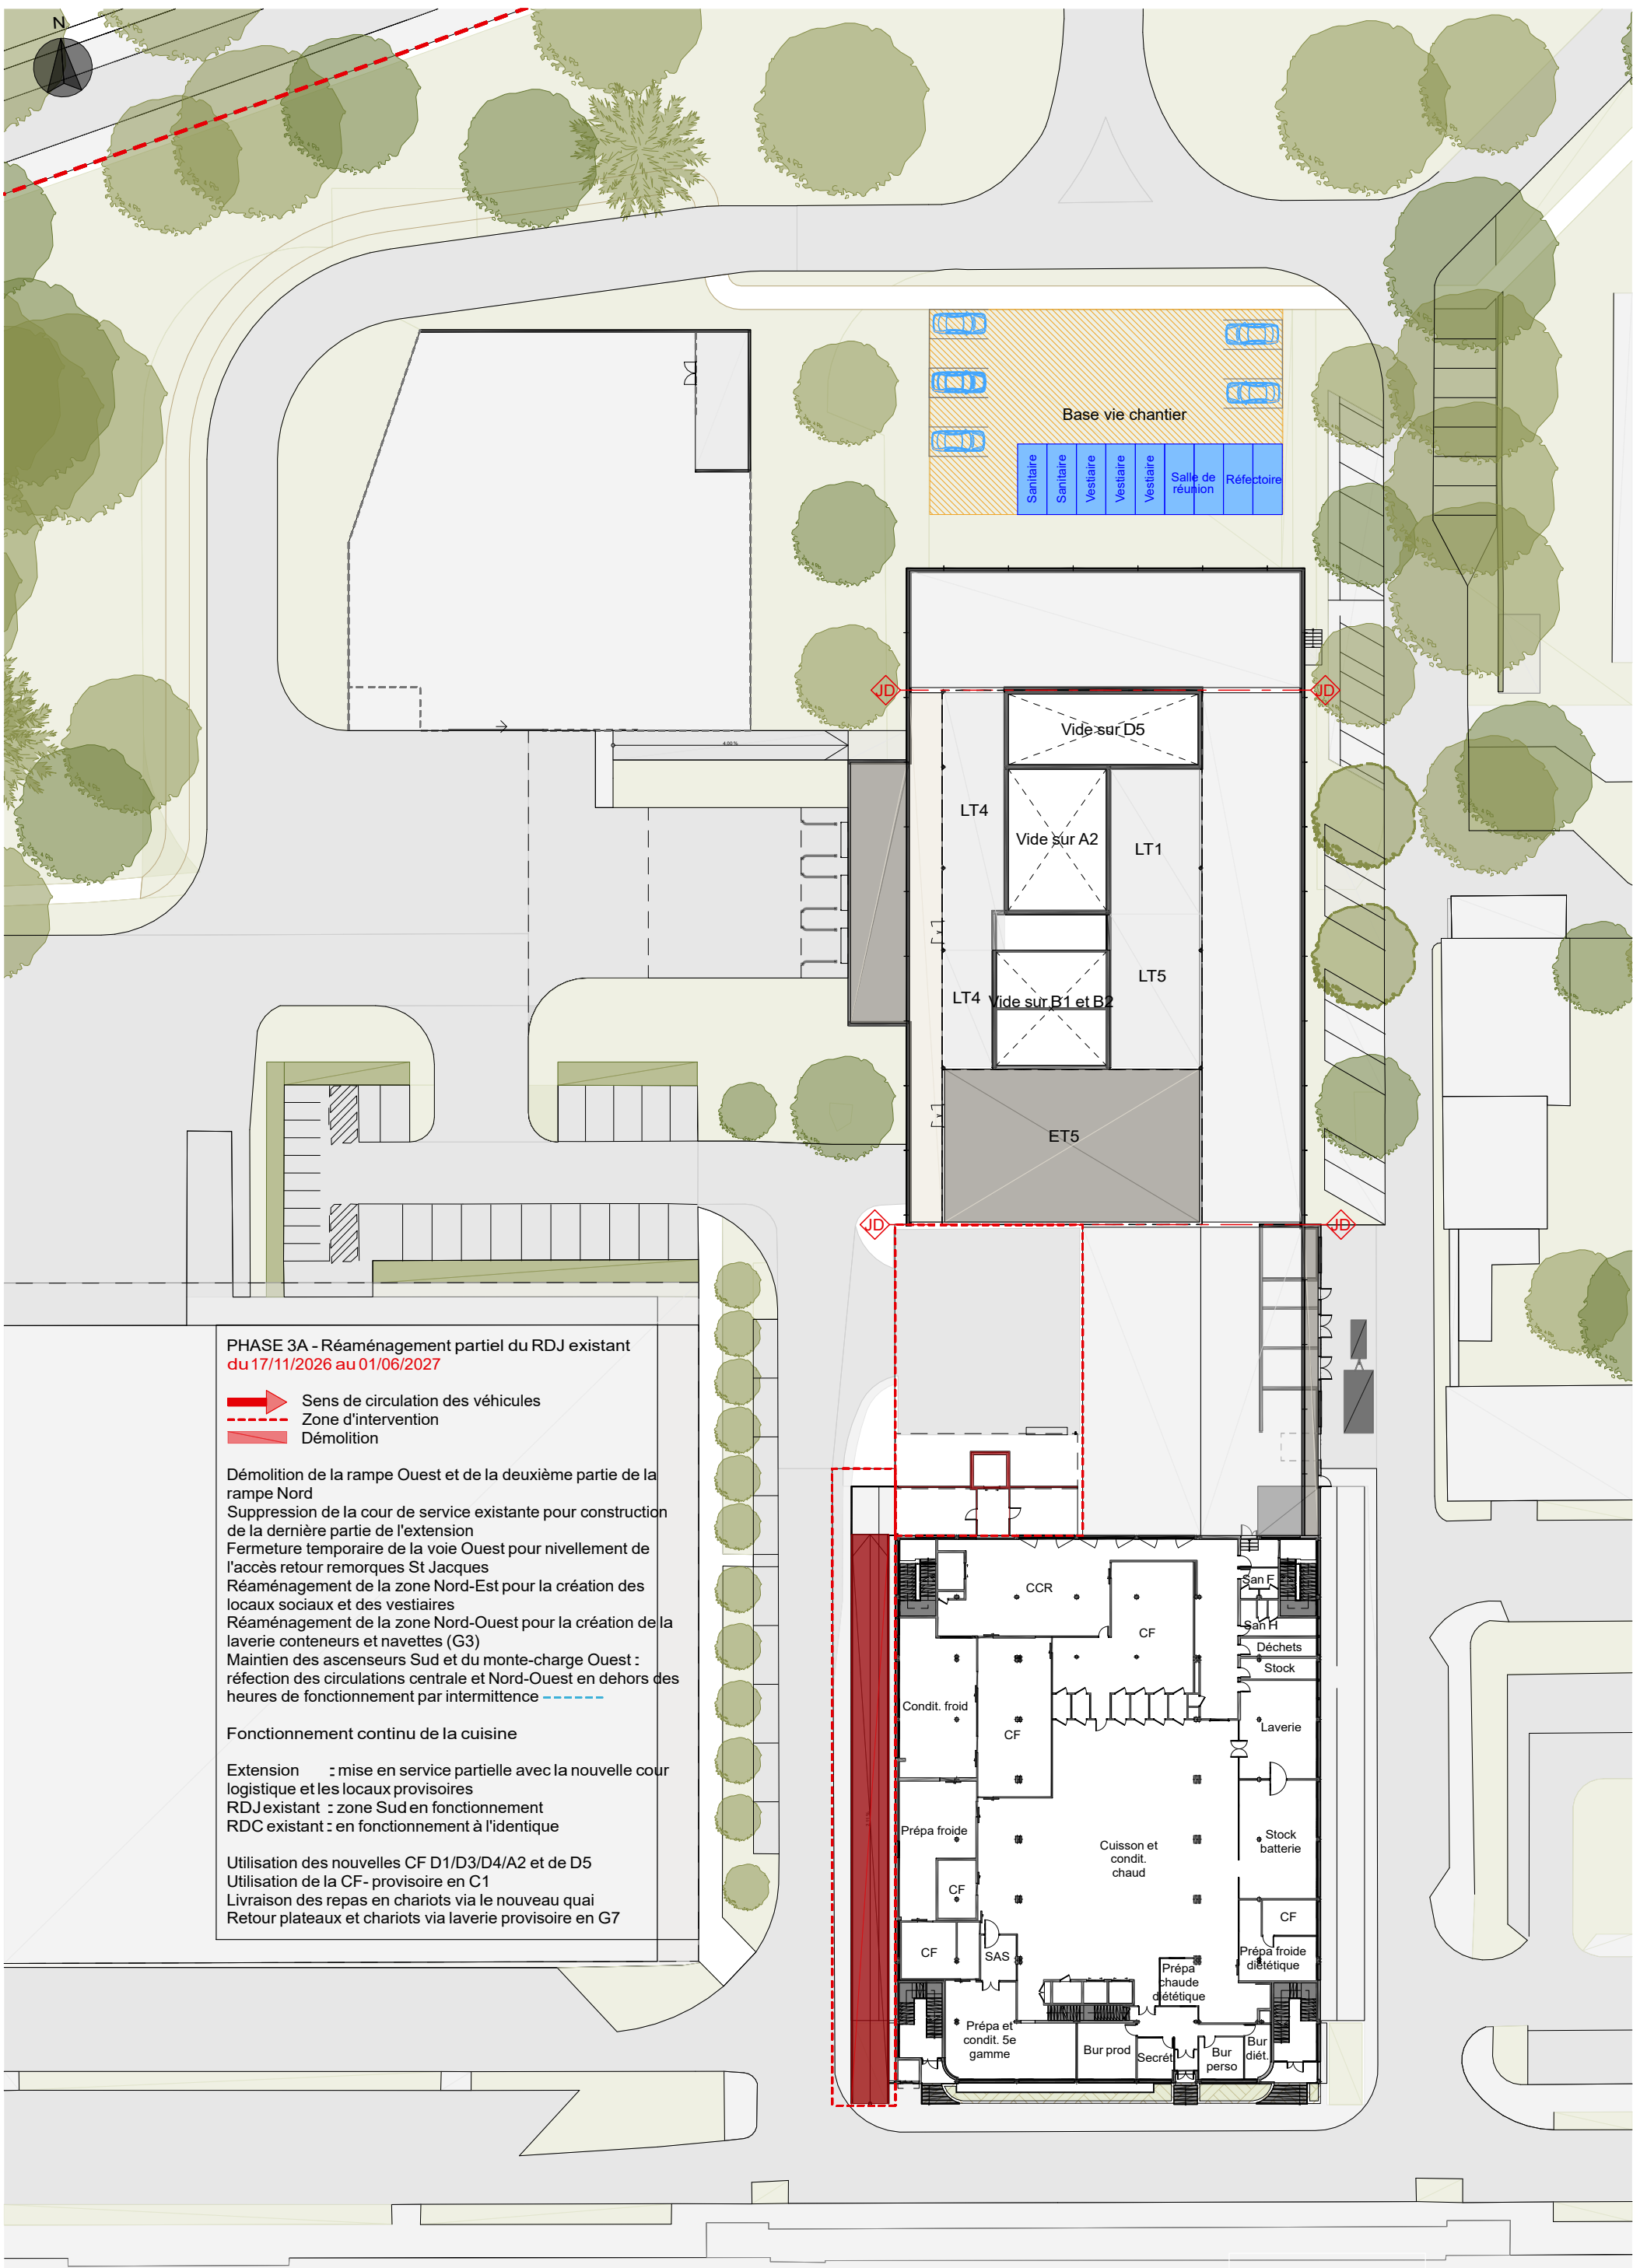


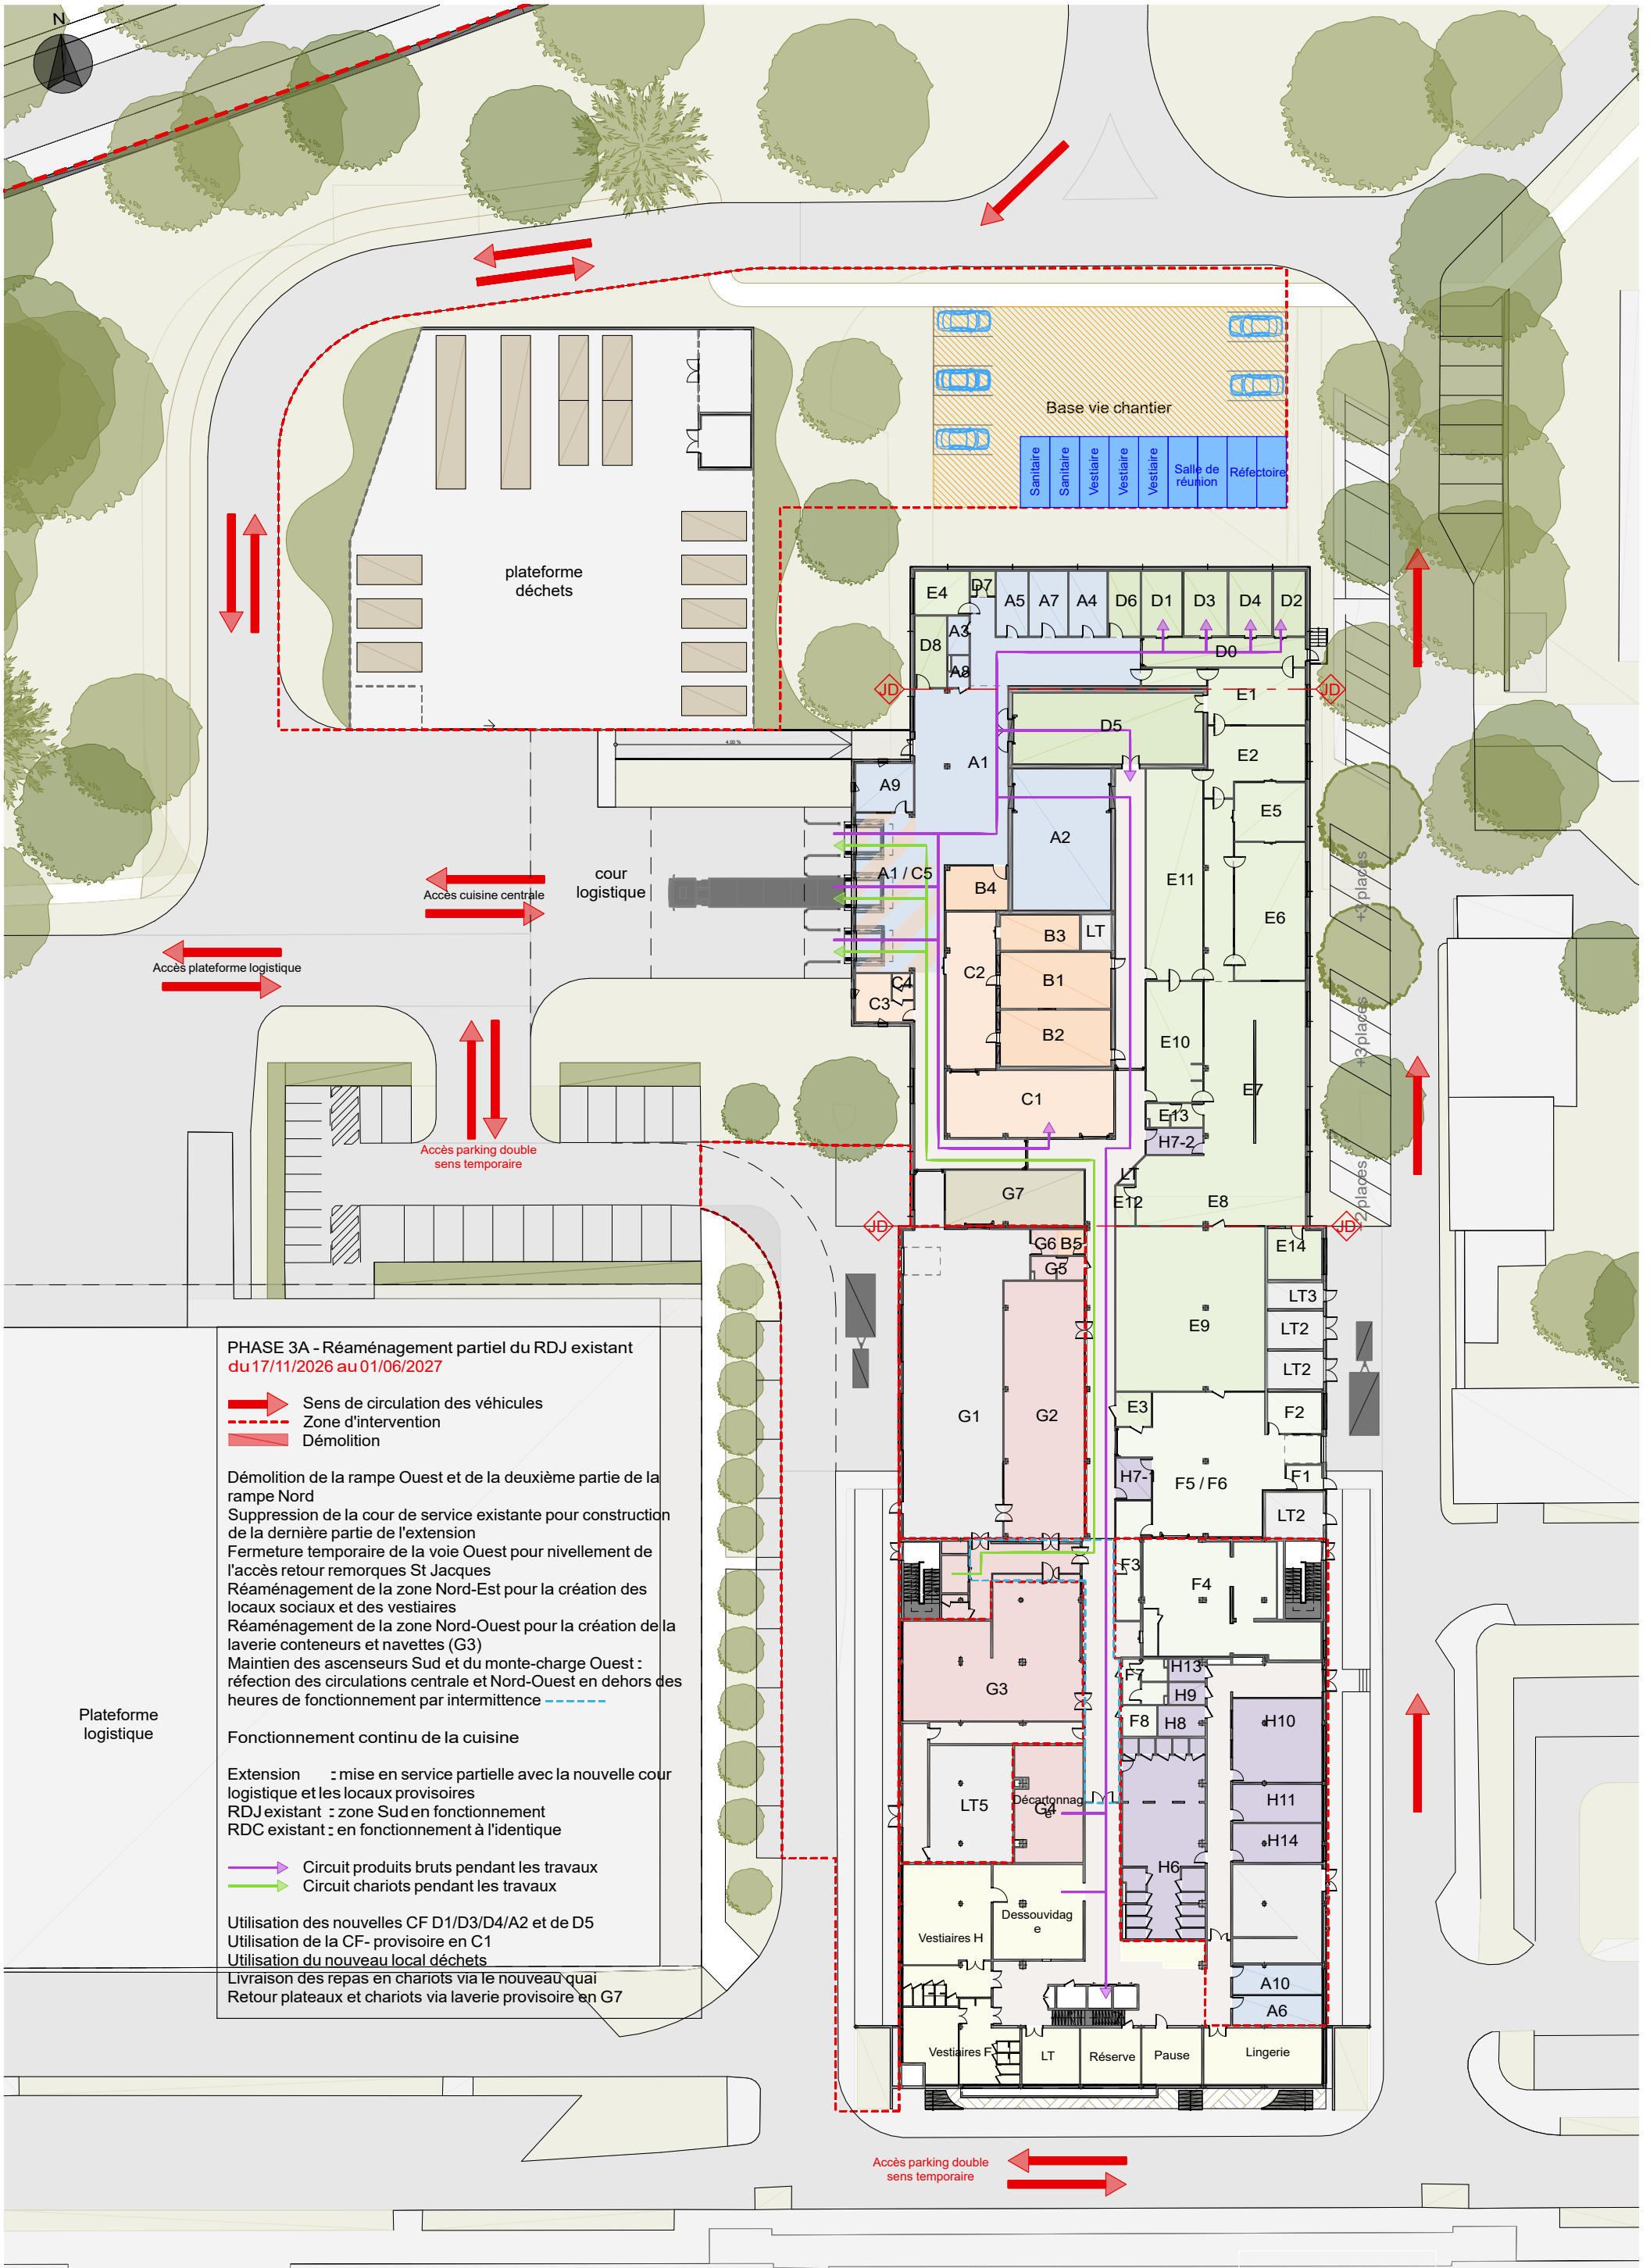








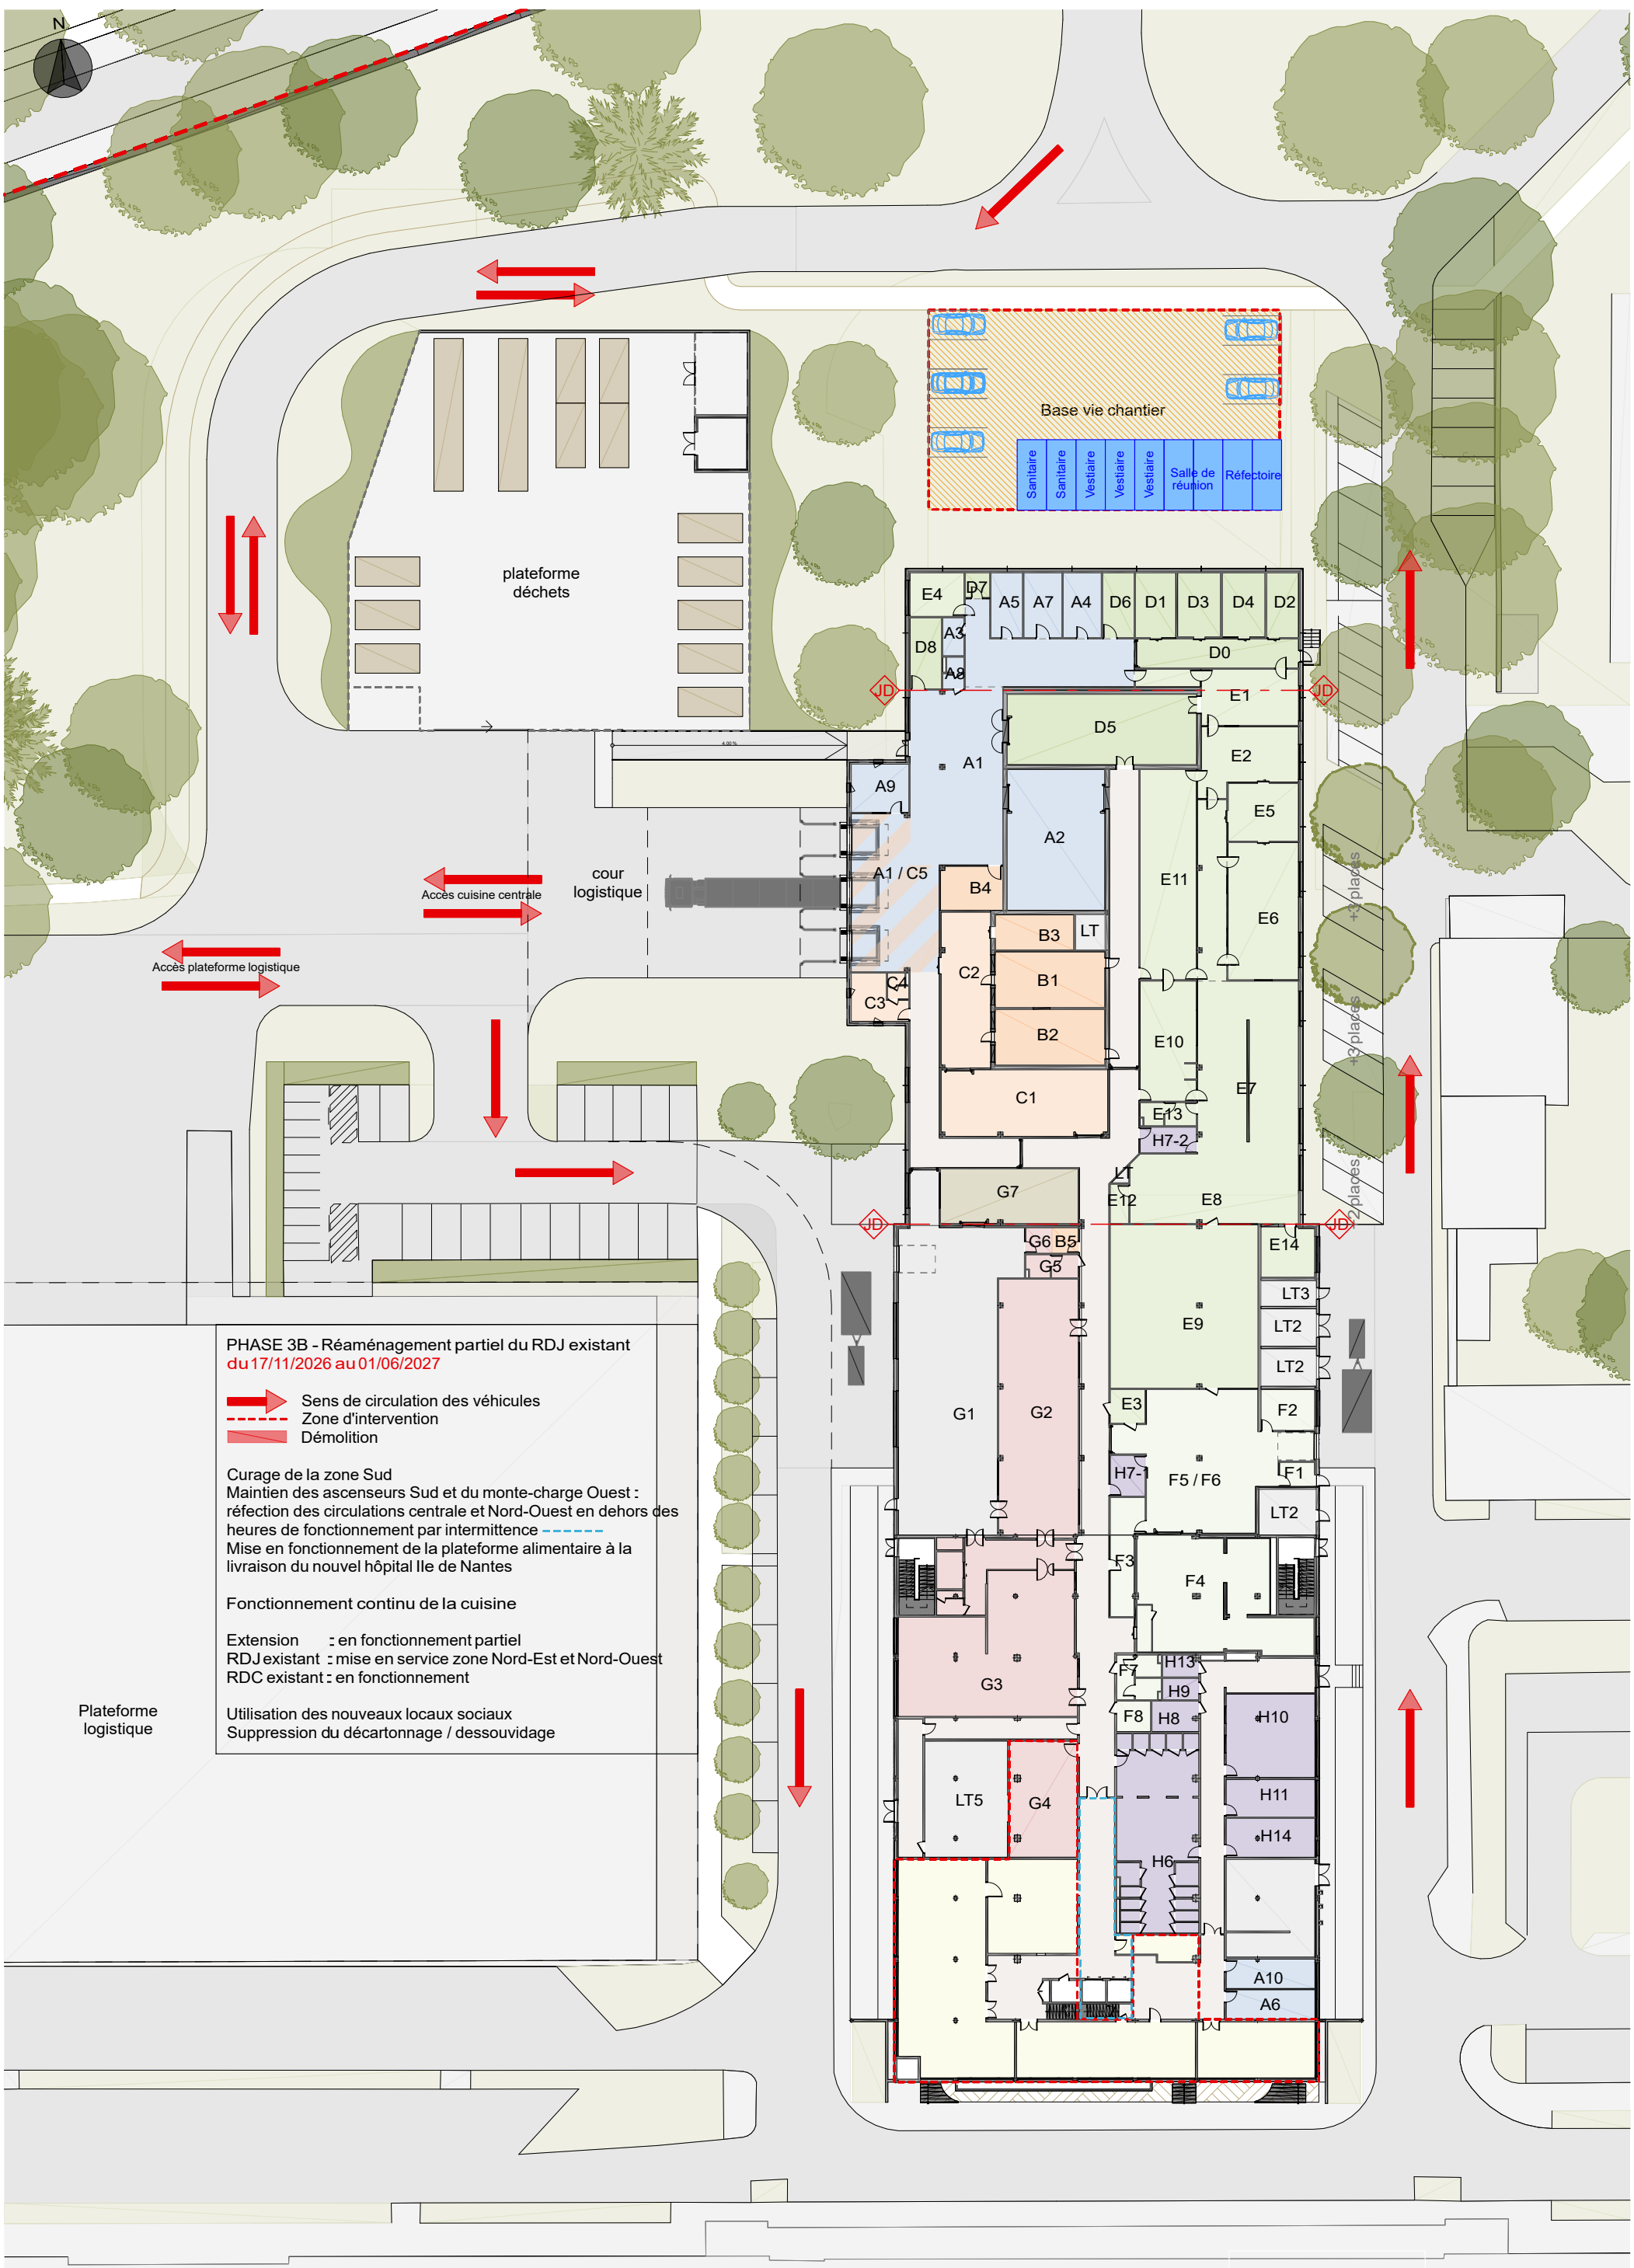



**PHASE 3B - Réaménagement partiel du RDJ existant**  
**du 17/11/2026 au 01/06/2027**

 Sens de circulation des véhicules  
 Zone d'intervention  
 Démolition

Curage de la zone Sud  
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest :  
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des  
heures de fonctionnement par intermittence  
Mise en fonctionnement de la plateforme alimentaire à la  
livraison du nouvel hôpital Ile de Nantes

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension : en fonctionnement partiel  
RDJ existant : mise en service zone Nord-Est et Nord-Ouest  
RDC existant : en fonctionnement

Utilisation des nouveaux locaux sociaux  
Suppression du décartonnage / dessouvidage

