


Création de la future entrée provisoire du PRC existant :

- dépose du mur non porteur
- dépose du relais H.
- réalisation de la dalle
- pose du mur provisoire (MOB) avec portes automatiques 2UP + un rideau d'air chaud (prévoir BAES et vitrophanie)

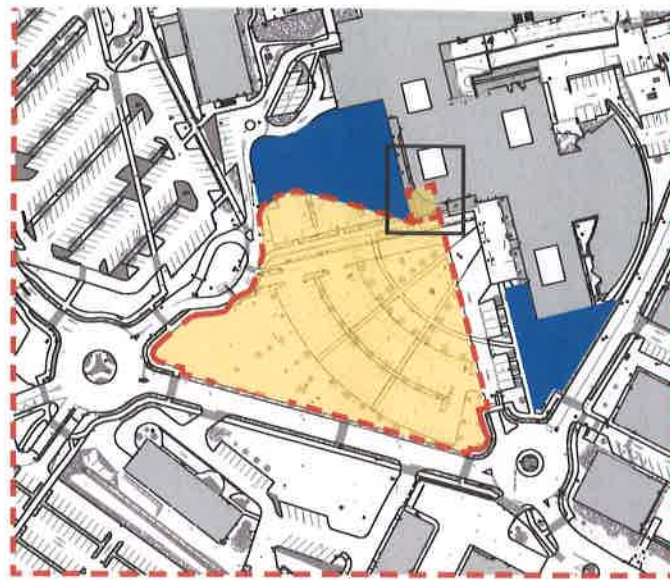

DURÉE : 2 semaines

Légende

- flux piétons
- implantation des barrières et cloison de chantier
- zone de travaux
- limite second-oeuvre

## PHASE 1.1

Création de la future entrée provisoire du PRC existant

