



ANNEXE 5 DU CCTP

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

Travaux de régénération de la vanne de la rigole de
l'écluse 63 CRRBN
Diagnostic lié au plomb

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
4 quai de Paris
CS-30 367
67010 STRASBOURG CEDEX

Le diagnostic plomb/amiante a révélé la présence de plomb selon les extraits du rapport ci-après :

4 PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :


- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Classement des unités de diagnostic:

Concentration en plomb	Classification	Classement
< 1mg/cm ² ou < 1,5 mg/g	NEGATIF	0
≥ 1mg/cm ² ou ≥ 1,5 mg/g	POSITIF	P

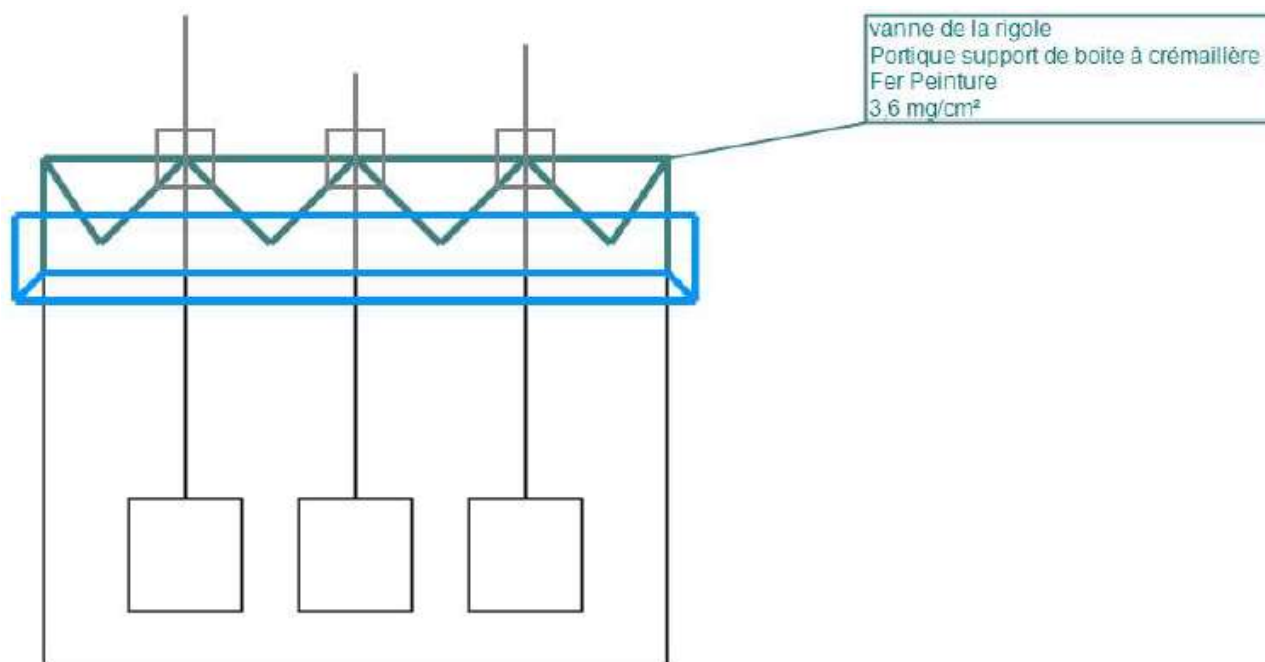

6 RESULTATS DES MESURES

Local : vanne de la rigole											
N°	Zone	Unité de diagnostic		Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Etat de conservation	Nature de la dégradation	Résultats (mg/cm²)	Classement	Observations
3	Porte	Porte n°1	boîte à manivelle	Fer	Peinture				0,67	0	
4									0,35		
5	Porte	Porte n°1	boîte à manivelle	Fer	Peinture				0,1	0	
6									0,56		
7	Porte	Porte n°1	boîte à manivelle	Fer	Peinture				0,18	0	
8									0,53		
9	Porte	Porte n°1	Garde-corps	Fer	Peinture				0,1	0	
10									0,37		
11	Porte	Porte n°1	Garde-corps de la berge	Fer	Peinture				0,54	0	
12									0,02		
13	Porte	Porte n°1	Mécanisme crémaillère	Fer	Peinture				0,11	0	
14									0,18		
15	Porte	Porte n°1	Mécanisme crémaillère	Fer	Peinture				0,19	0	
16									0,4		
17	Porte	Porte n°1	Mécanisme crémaillère	Fer	Peinture				0,1	0	
18									0,02		
19	Porte	Porte n°1	Passerelles	Fer	Peinture				0,1	0	
20									0,25		
21	Porte	Porte n°1	Porte bois	Bois	Non peint				0,62	0	
22									0,73		
23	Porte	Porte n°1	Portique	Fer	Peinture				0,11	0	
24									0,78		
2	Porte	Porte n°1	Portique support de boîte à manivelle	Fer	Peinture				3,6	P	
25	Porte	Porte n°1	vanteilles	Bois	Non peint				0,09	0	
26									0,24		
Nombre total d'unités de diagnostic				13							
