

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

### BATIMENT E - RDJ ET RDC


Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	80985-163553 A
Propriétaire	CH MONTLUCON
Donneur d'ordre	CH MONTLUCON
Adresse de l'immeuble	C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	20/08/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	29/10/2024
Date d'émission du rapport de repérage	13/11/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**apave**  
Apave Diagnostics  
30, boulevard Maurice Pourchon  
63100 CLERMONT-FERRAND  
Tél : 33 (0)4 81 91 31 22  
clermont-ferrand@adiag.apave.com  
SIRET 483 336 319 00213

Opérateur de repérage :

**ROZAN Ludovic**  
Apave Diagnostics  
Le 13/11/2024

## Conclusions

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante**

**Commentaires :**

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.



## SOMMAIRE

TOC



## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **80985-163553**

Référence du donneur d'ordre : **BATIMENT E - RDJ ET RDC**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CH MONTLUCON**

Adresse du propriétaire : **Avenue du 8 Mai 1945 03100 MONTLUCON**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **CH MONTLUCON**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur ROZAN Ludovic**

N° de certification de l'opérateur : **20-1574**

Organisme : **ABCIDIA Certification**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 CLERMONT-FERRAND**

N° de Siret : **48333631900213**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E**

Adresse complète : **18 avenue DU 8 MAI 1945 - 03100 MONTLUCON**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **E**

Etage : **----**

Escalier : **-----**

Porte : **-----**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : **---**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

### 1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

### Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Repérage amiante avant travaux selon plans fournis.

## 3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder		
<b>1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités</b>			
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)		Peintures décoratives
	Plaques en matériaux bitumineux	Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation
	Revêtements anti-condensation sous bac acier		Conduits d'eaux (pluviales et usées)
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment		Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
	Ardoises en fibro ciment	<b>3 - Parois verticales intérieures</b>	
	Bardeaux bitumineux (« shingles »)	Murs et cloisons maçonnés	Flocages
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Conduits d'eaux pluviales		Enduits de ragréage, débouillage, lissage
	Garnissage des joints de dilatation		Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
	Joints de dilatation		Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
	Couvre-joints	Poteaux	Flocages
	Tresses d'étanchéité à l'air		Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés
	Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.)		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Jonctions bitumineuses		Joints de dilatation, d'assemblage avec poutrason
	Solins en fibre ciment		Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
	Colle des solins en fibre ciment	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Isolants fibreux en sous toiture		Flocages
	Flocages, enduits projetés		Plots de colle fixant les cloisons au mur
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur		Bandes calicot
	Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre
	Parties planes ou relevés : complexes asphaltés		Sous couches des tissus muraux
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...)		Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature		Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		
<b>2 - Parois verticales extérieures et Façades</b>			
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage	Gaines et coffres verticaux	Flocages
	Ardoises composites hors fibro ciment		Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés)
	Ardoises en fibro ciment		Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débouillage, lissage)
	Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses		Bandes calicot
	Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures)		Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Peintures des bardages métalliques		Panneaux (fibres-ciment, ...)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés	Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
	Carton-amiante		Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie)
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs		Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite
	Revêtements plastiques épais (RPE)		Isolants intérieurs des portes
	Peintures sur béton	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles
	Enduits pelliculaires de lissage/débouillage		Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment
	Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants		Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage
	Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire		Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
	Garnissage des joints de dilatation		Revêtements bitumineux
	Joints de dilatation		Peintures intumescentes
	Couvre-joints	<b>4 - Plafonds et faux plafonds</b>	
	Appuis de fenêtres en fibres-ciment	Plafonds	Flocages
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium)		Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés
	Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure		Panneaux collés vissés ou cloués
	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes		Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite)
	Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)		Bandes calicot

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
<b>5 - Planchers et planchers techniques</b>	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
<b>6 - Conduits et accessoires intérieurs</b>	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
<b>7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques</b>	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
<b>8 - Équipements divers et accessoires</b>	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
<b>9 - Fondations et soubassements</b>	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
<b>10 - Aménagements, voiries et réseaux divers</b>	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

## 4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

### 4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
29/10/2024	Repérage amiante avant travaux

### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

#### 4.3 Analyse Documentaire :

Néant



#### 4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant


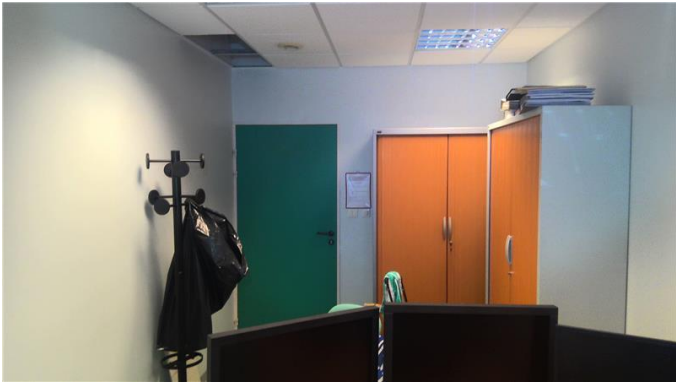
### 5 Résultats détaillés du repérage



#### 5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### ➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
<p>Toiture terrasse</p> 	Extérieur
<p>Sas livraison</p> 	RDJ
Réception	RDJ





Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etag
	
<p>Bureau médecin 1</p> 	RDC
<p>Bureau médecin 2</p>	RDC


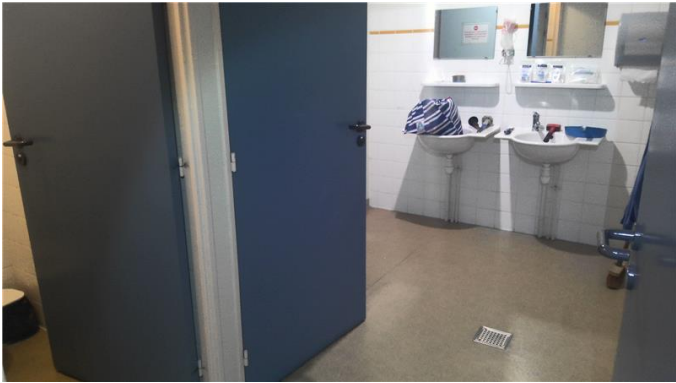


Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
<p>Circulation A</p> 	RDC
Attente	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Secrétariat	RDC




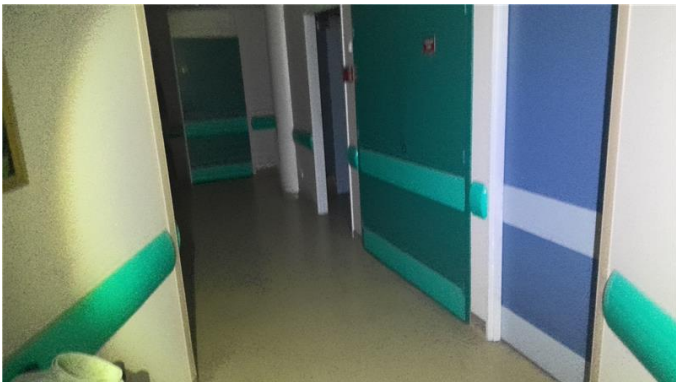
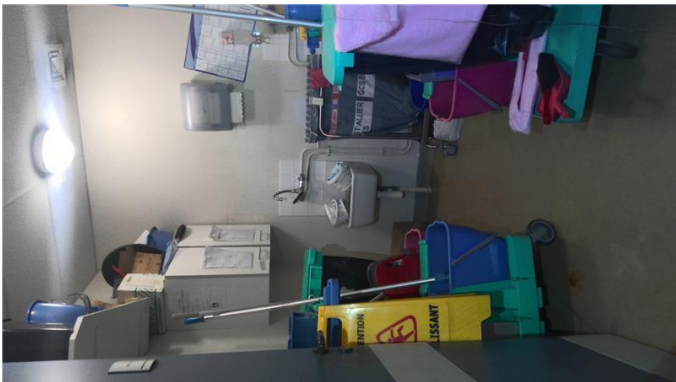

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etag
	
Archives	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etag
	
<p data-bbox="523 1435 611 1462">Détente</p> 	RDC
Sas décontamination	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Vestiaires Hommes 1 	RDC
Vestiaires Femmes 1 	RDC
Vestiaires Femmes 2 	RDC
Vestiaires Hommes 2	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
<p>Circulation B</p> 	RDC
<p>Salle d'interprétation</p> 	RDC
<p>Échographie</p> 	RDC
<p>Salle des injections</p>	RDC



Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Circulation C 	RDC
Ménage 	RDC
Réception décartonnage 	RDC
Labo prépa injections	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	
Labo radiochimie 	RDC
Rangement A 	RDC
Salle d'effort 	RDC
Local déchets radioactifs	RDC

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
	

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
<b>Toiture terrasse</b>	Extérieur	Complexe d'étanchéité n°1 - Couche supérieure	Matériau bitumineux et fibre	Résultat d'analyse (P001)	Z001	<b>Non</b>	
		Complexe d'étanchéité n°2 - Couche intermédiaire	Mousse et enveloppe cartonnée	Résultat d'analyse (P002)	Z002	<b>Non</b>	
		Complexe d'étanchéité n°3 - Couche inférieure	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P003)	Z003	<b>Non</b>	
		Toiture	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
<b>Sas livraison</b>	RDJ	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P004)	Z004	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P005)	Z005	<b>Non</b>	
		Cadre porte livraison	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Z006	<b>Non</b>	
		Poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P007)	Z007	<b>Non</b>	
		Conduit de fluide	Calorifugeage vert - Peinture	Résultat d'analyse (P008)	Z008	<b>Non</b>	
		Joint porte métal	Mastic gris - Non peint	Résultat d'analyse (P009)	Z009	<b>Non</b>	
		Cloisons interne	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P010)	Z010	<b>Non</b>	
		Plafond	Enduit - Peinture verte	Résultat d'analyse (P011)	Z011	<b>Non</b>	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	<b>Non</b>	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse (P013)	Z013	<b>Non</b>	
<b>Réception</b>	RDJ	Cloisons interne	Béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z010	<b>Non</b>	
		Conduit de fluide n°1	Calorifugeage vert - Peinture	Résultat d'analyse	Z008	<b>Non</b>	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Enduit - Peinture verte	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Doublage murs extérieur	Enduit, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Poutre	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P016)	Z016	Non	
		Conduit de fluide n°2	Calorifugeage vert - Peinture	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
Bureau médecin 1	RDC	Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P018)	Z018	Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse (P019)	Z019	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P020)	Z020	Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse (P021)	Z021	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse (P022)	Z022	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse (P023)	Z023	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P024)	Z024	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Doublage enduit, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse (P025)	Z025	Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Bureau médecin 2	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

20/114



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de mur	Doublage enduit, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
Circulation A	RDC	Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P027)	Z027	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P026)	Z026	Non	
		Poutre n°1	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse (P028)	Z028	Non	
		Entourage de poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse (P031)	Z031	Non	
		Conduit de ventilation	Isolation aluminium et laine de verre - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
Attente	RDC	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Conduit de ventilation	Isolation aluminium et laine de verre - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plinthes	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z028	Non	
		Revêtement de sol	Colle - Carrelage	Résultat d'analyse	Z027	Non	
		Revêtement de mur	Doublage enduit, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Secrétariat	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z018	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Archives	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse (P030)	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Revêtement de sol	Dalle de sol, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P029)	Z029	Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Détente	RDC	Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P032)	Z032	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plinthes	Plastique et colle	Résultat d'analyse	Z019	Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Entourage de poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Évier	Plaques bitumineuses	Résultat d'analyse (P033)	Z033	Non	
Sas décontamination	RDC	Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P034)	Z034	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas		Non	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
				d'amiante			
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	<b>Non</b>	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
<b>Vestiaires Hommes 1</b>	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P036)	Z036	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	<b>Non</b>	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse (P037)	Z037	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle, plastic	Résultat d'analyse (P035)	Z035	<b>Non</b>	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse (P038)	Z038	<b>Non</b>	
<b>Vestiaires Femmes 1</b>	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	<b>Non</b>	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle, plastic	Résultat d'analyse	Z035	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	
<b>Vestiaires Femmes 2</b>	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	<b>Non</b>	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	<b>Non</b>	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	<b>Non</b>	
		Plinthes	Colle, plastic	Résultat d'analyse	Z035	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z037	<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Lino, colle et	Résultat d'analyse	Z034	<b>Non</b>	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	<b>Non</b>	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

23/114

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Vestiaires Hommes 2	RDC		ragréage				
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Plinthes	Colle, plastic	Résultat d'analyse	Z035	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z037	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
Circulation B	RDC	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Conduit de ventilation	Isolation aluminium et laine de verre - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Entourage de poteau n°1	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Entourage de poteau n°2	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Salle d'interprétation	RDC	Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse (P039)	Z039	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plenum	Isolation fibre	Résultat d'analyse	Z021	Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	Non	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

24/114

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Échographie	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Salle des injections	RDC	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Conduit de ventilation	Isolation aluminium et laine de verre - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Non	
Circulation C	RDC	Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
		Conduit de ventilation	Isolation aluminium et laine de verre - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Entourage de poteau	Enduit - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z031	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	

Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z039	Non	
		Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Résultat d'analyse	Z026	Non	
		Cloisons sur prepa injections	Enduit, béton - Peinture	Résultat d'analyse (P040)	Z040	Non	
Ménage	RDC	Cloisons	Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z022	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z024	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	Non	
Réception décartonna ge	RDC	Cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z036	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z030	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z034	Non	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z038	Non	
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z020	Non	
Labo prépa injections	RDC	Cloisons	Enduit, béton - Peinture	Résultat d'analyse (P041)	Z041	Non	
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		Non	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z032	Non	
		Plafond technique	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P042)	Z042	Non	
Labo radiochimie	RDC	Cloisons	Enduit, béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z041	Non	

Rapport n° : 80985-163553 A / Référence du donneur d'ordre : BATIMENT E - RDJ ET RDC

Apave Diagnostics - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 - CLERMONT-FERRAND

SIRET : 48333631900213 Tél : Email : clermont-ferrand@apave-diagnostics.com Site web : [www.apave-diagnostics.com](http://www.apave-diagnostics.com)

26/114



Local / Partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Pieds de cloisons	Métal, plastic sur béton	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Plafond technique	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z042	<b>Non</b>	
		Poutre	Béton - Non peint	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante		<b>Non</b>	
		Revêtement de sol	Lino, colle et ragréage	Résultat d'analyse	Z032	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Doublage enduit, isolation fibre - Peinture	Résultat d'analyse	Z025	<b>Non</b>	
		Cloisons	Calicot	Résultat d'analyse	Z023	<b>Non</b>	
<b>Rangement A</b>	RDC	Cloisons	Enduit, béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
<b>Salle d'effort</b>	RDC	Cloisons	Enduit, béton - Peinture	Résultat d'analyse	Z041	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur	Colle - Faïence	Résultat d'analyse	Z024	<b>Non</b>	
<b>Local déchets radioactifs</b>	RDC	Revêtement de sol - Bac de rétention	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P043)	Z043	<b>Non</b>	
		Remontée du bac - Bac de rétention	Béton peinture	Résultat d'analyse (P044)	Z044	<b>Non</b>	
		Revêtement de mur - Bac de rétention	Doublage enduit, peinture, isolant fibre	Résultat d'analyse (P045)	Z045	<b>Non</b>	
		Cloisons - Bac de rétention	Béton - Peinture	Résultat d'analyse (P046)	Z046	<b>Non</b>	
		Cloisons - Bac de rétention	Brique, enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P047)	Z047	<b>Non</b>	

## Commentaires :

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles.

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, aucun sondage destructif lourd n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants à des fibres d'amiante.

## 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

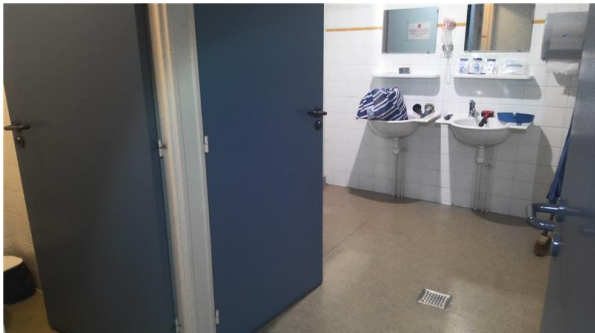
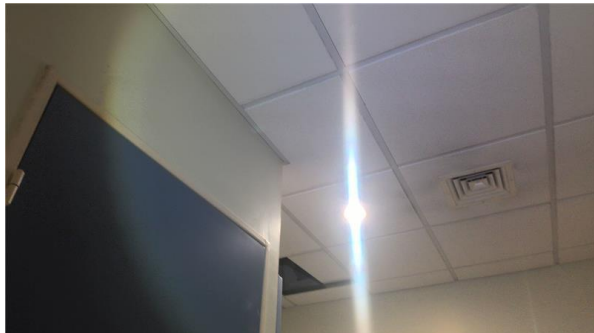
En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.



En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

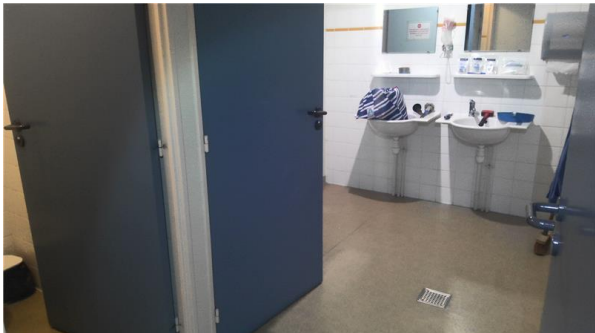

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.







## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

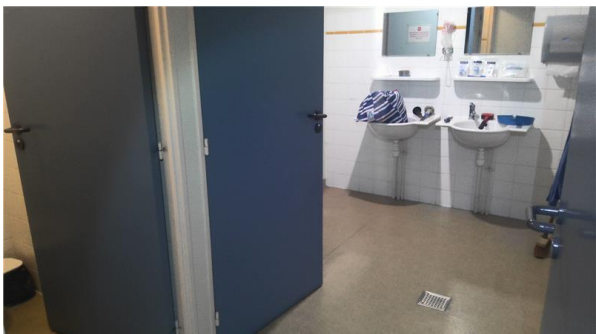

ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 <b>C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E</b> 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Faux-plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Armstrong 05-06-97		

ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 <b>C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E</b> 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sas décontamination - Faux-plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Armstrong 05-06-97		



ELEMENT : Pieds de cloisons		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Pieds de cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Métal, plastic sur béton
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		



ELEMENT : Toiture		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse - Toiture - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Béton - Non peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Entourage de poteau		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Détente - Entourage de poteau - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Enduit - Toile de verre peinte
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

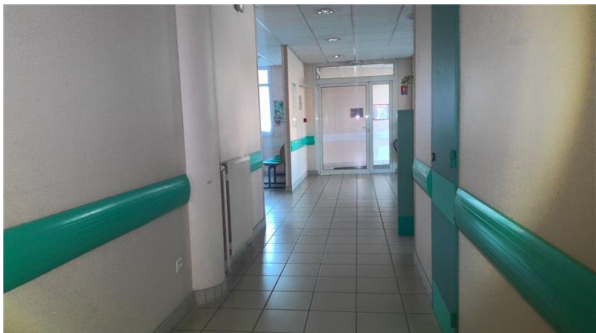

ELEMENT : Plenum		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Plenum - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Isolation fibre
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		







ELEMENT : Entourage de poteau n°2		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation B - Entourage de poteau n°2 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Enduit - Toile de verre peinte
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Poutre		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Archives - Poutre - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Béton - Non peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

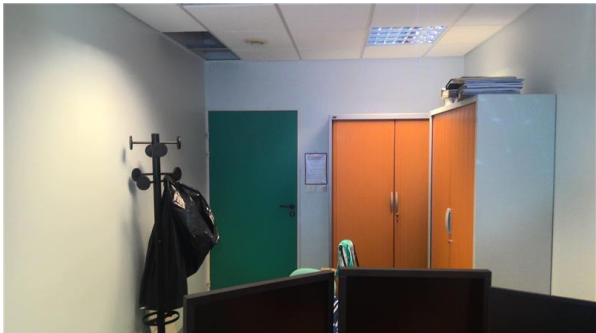

ELEMENT : Conduit de ventilation		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Conduit de ventilation - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Isolation aluminium et laine de verre - Non peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

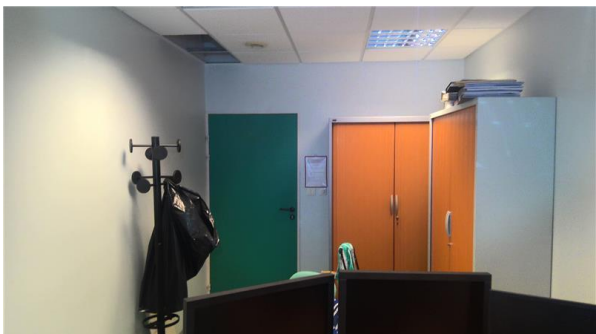
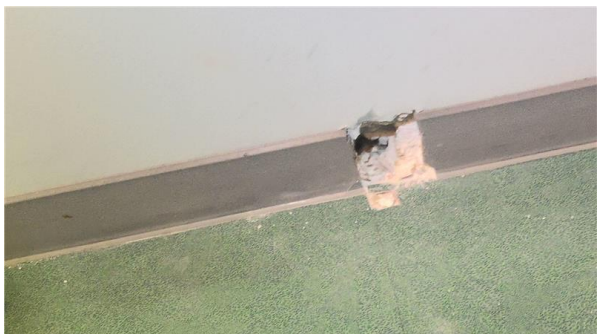
ELEMENT : Poutre n°1		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Poutre n°1 - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Béton - Non peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		



ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Faux-plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Armstrong 05-06-97		

ELEMENT : Revêtement de mur		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Salle d'effort - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		







ELEMENT : Plafond		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Béton - Non peint
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		



ELEMENT : Pieds de cloisons		
<b>Vue d'ensemble</b>	<b>Emplacement</b>	
		
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Pieds de cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Métal, plastic sur béton
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		

ELEMENT : Faux-plafond		
<b>Vue d'ensemble</b> 		<b>Emplacement</b> 
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sas décontamination - Faux-plafond - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b>	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante		
<b>Commentaires</b>		
Armstrong 05-06-97		







PRELEVEMENT : P001			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse - Complexe d'étanchéité n°1 - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Matériau bitumineux et fibre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Matériau bitumineux et fibre  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	0	Fibres d'amiante non détectées


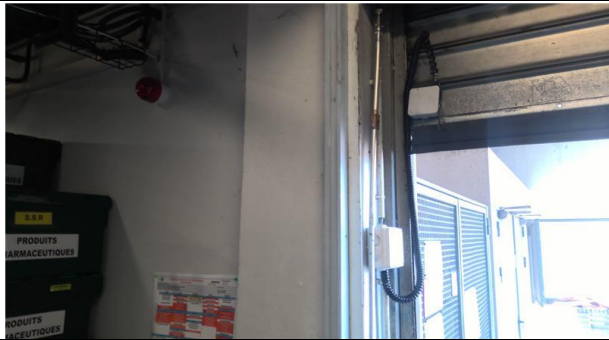
PRELEVEMENT : P002			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse - Complexe d'étanchéité n°2 - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Mousse et enveloppe cartonnée	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Mousse et enveloppe cartonnée  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P003			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> Extérieur - Toiture terrasse - Complexe d'étanchéité n°3 - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Matériau bitumineux	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Matériau bitumineux  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P004			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P005			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Plinthes - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P006			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Cadre porte livraison - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées


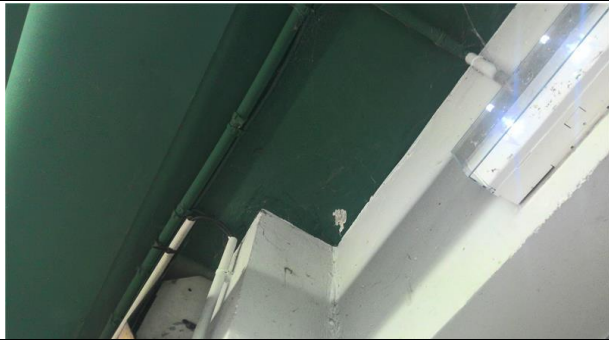
PRELEVEMENT : P007			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Poutre - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P008			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Conduit de fluide - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Calorifugeage vert - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Calorifugeage vert / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple de type plaque (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Joint porte métal - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Mastic gris - Non peint	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Mastic gris / Non peint  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Cloisons interne - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit - Peinture verte	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit / Peinture verte  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P012**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**



Enduit plâtre / Peinture



**Planche de croquis n° :**



**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées





PRELEVEMENT : P013			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Sas livraison - Plinthes - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Plastique et colle	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Plastique et colle  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

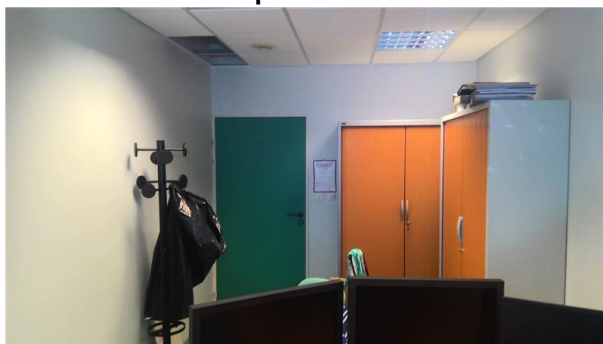
PRELEVEMENT : P014			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Réception - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Lino, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Lino, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Réception - Doublage murs extérieur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit, isolation fibre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit, isolation fibre / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Réception - Poutre - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDJ - Réception - Conduit de fluide n°2 - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Calorifugeage vert - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Calorifugeage vert / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type mousse (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées



**PRELEVEMENT : P018**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Revêtement de sol - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol, colle et ragréage

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

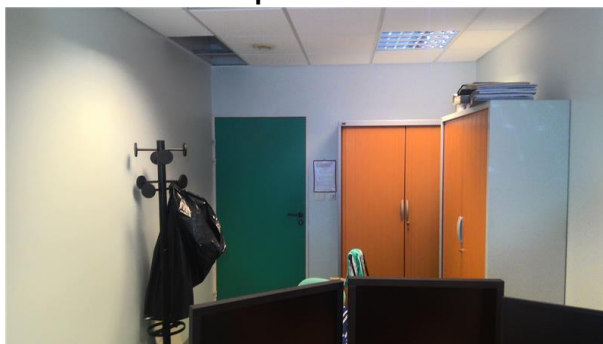
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Dalle de sol, colle et ragréage

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P019**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Plastique et colle

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

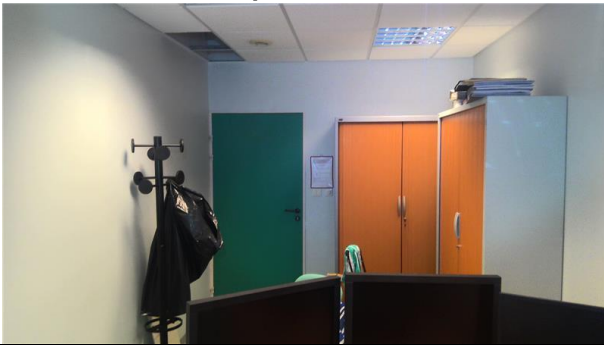
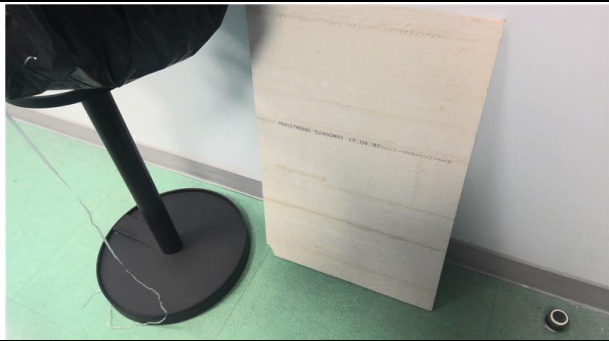
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

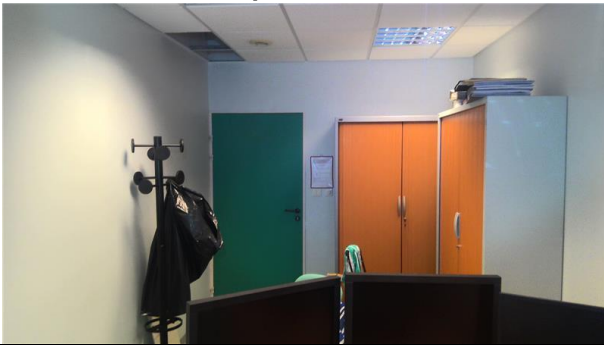

Plastique et colle

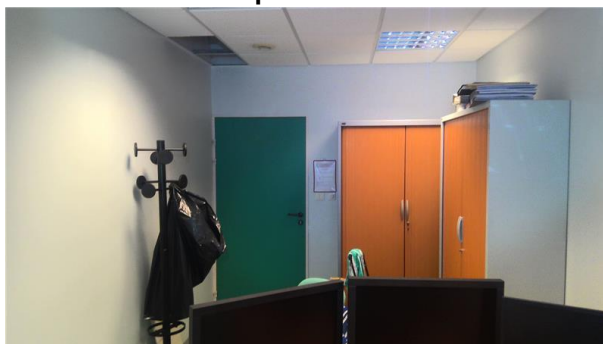
**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Faux-plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>Commentaires</b> Armstrong 05-06-97			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Plaque de faux-plafond  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Plenum - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Isolation fibre	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Isolation fibre  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P022**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

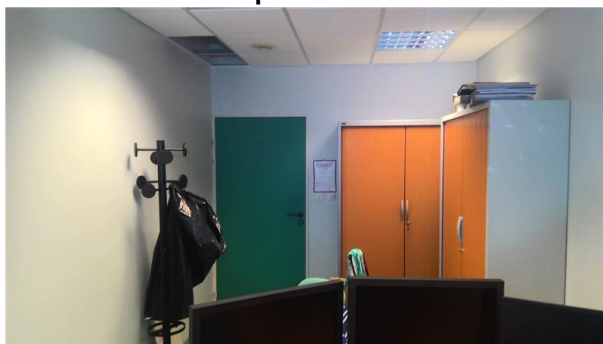
Enduit plâtre, isolation fibre / Peinture

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



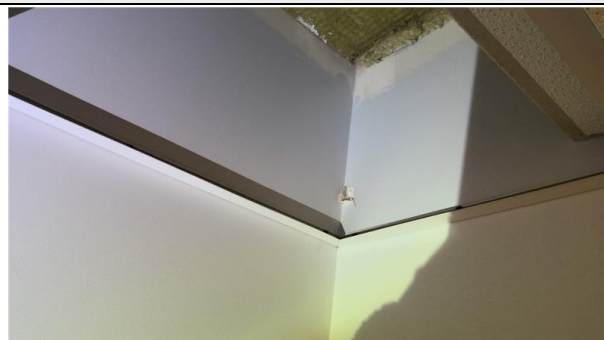
**PRELEVEMENT : P023**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Calicot

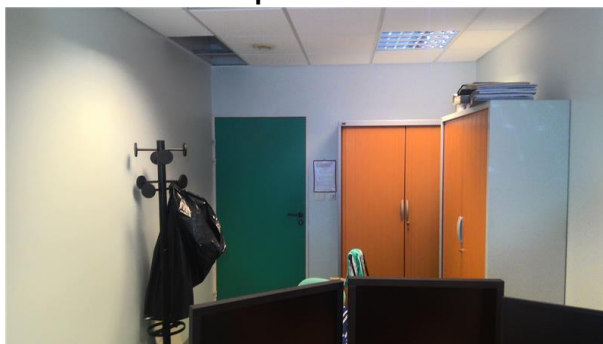
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Calicot

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P024**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

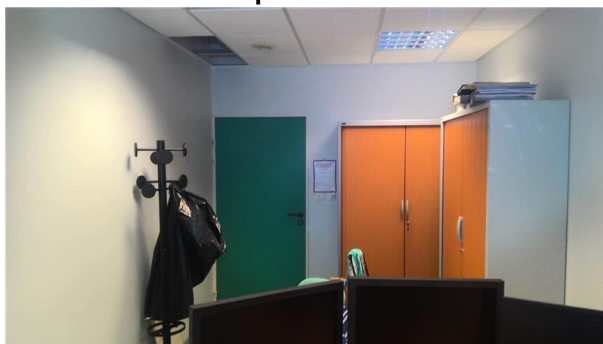
**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle / Faïence

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

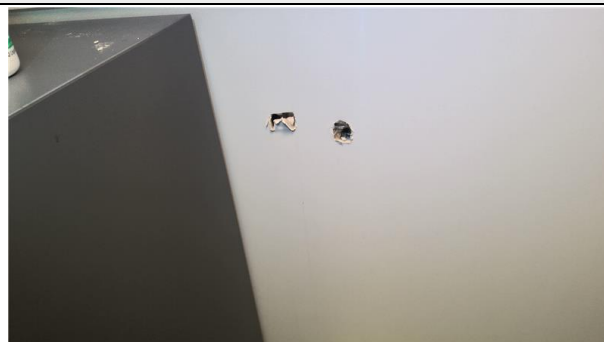
**PRELEVEMENT : P025**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Bureau médecin 1 - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Doublage enduit, isolation fibre - Peinture

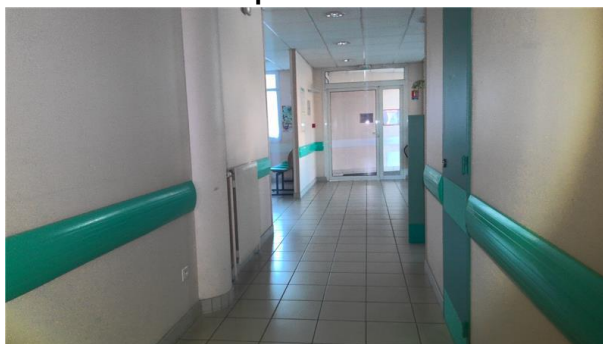
**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Doublage enduit, isolation fibre / Peinture

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

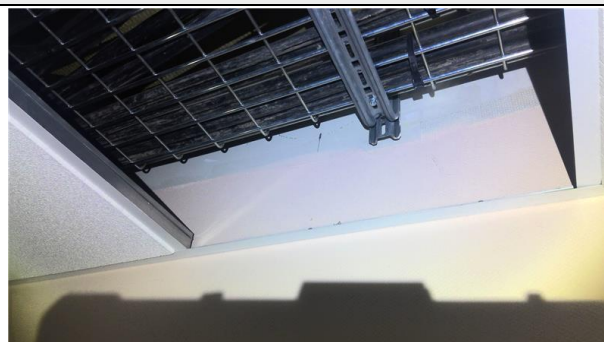
**PRELEVEMENT : P026**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte



**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**


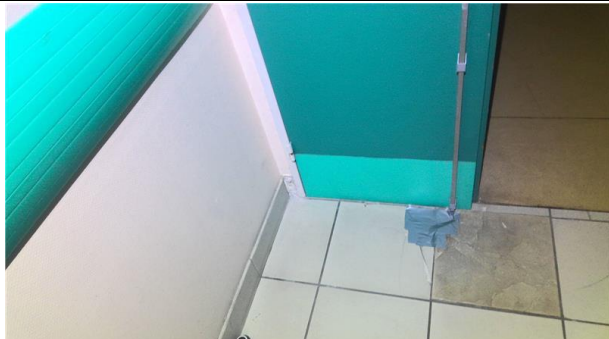
Enduit plâtre, isolation fibre / Toile de verre peinte



**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**



Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P027			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

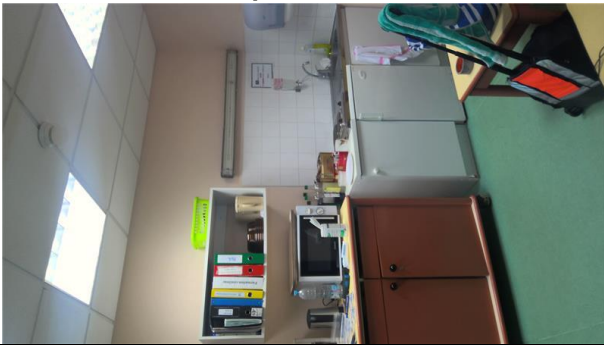



PRELEVEMENT : P028			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Plinthes - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Carrelage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Colle / Carrelage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

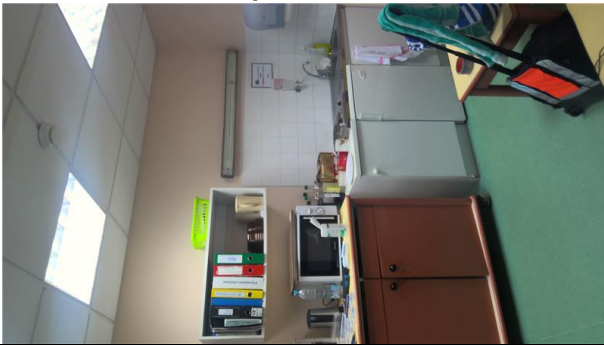

PRELEVEMENT : P029			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Archives - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Dalle de sol, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Dalle de sol, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P030			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Archives - Faux-plafond - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Plaque de faux-plafond	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>Commentaires</b> Armstrong 05-06-97			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Plaque de faux-plafond  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation A - Entourage de poteau - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit - Toile de verre peinte	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Enduit / Toile de verre peinte  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Détente - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Lino, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Lino, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P033			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Détente - Évier - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Plaques bitumineuses	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Plaques bitumineuses  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Sas décontamination - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Lino, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Lino, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P035**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Plinthes - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle, plastic

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Colle, plastic

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau semi-dur de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P036**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture

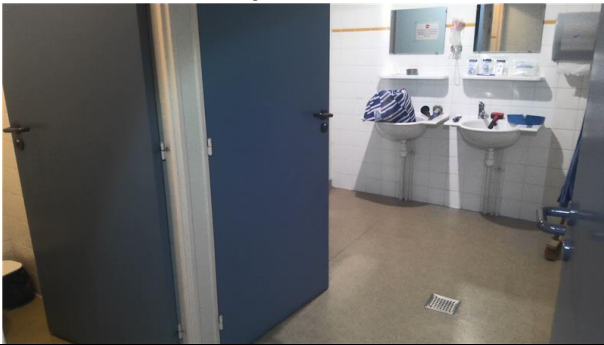

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
Enduit plâtre / Peinture

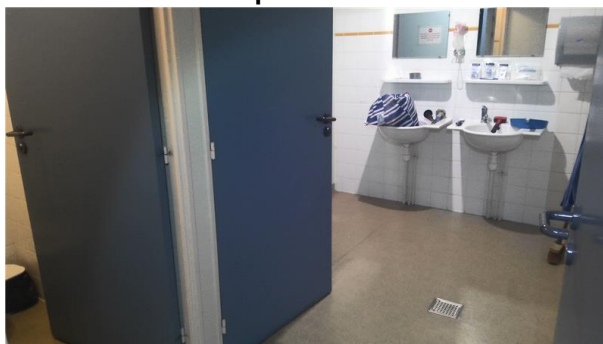
**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Revêtement de mur - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Colle - Faïence	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Colle / Faïence  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



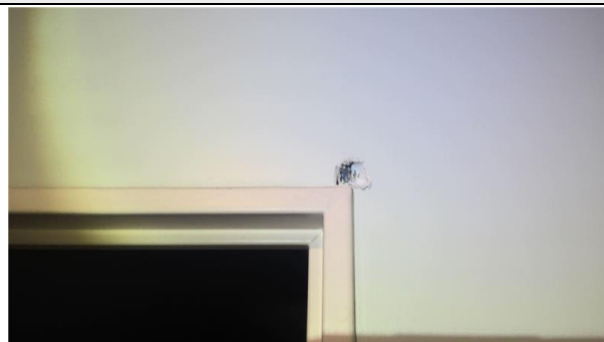
**PRELEVEMENT : P038**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Vestiaires Hommes 1 - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Calicot



**Résultat amiante :** Absence d'amiante

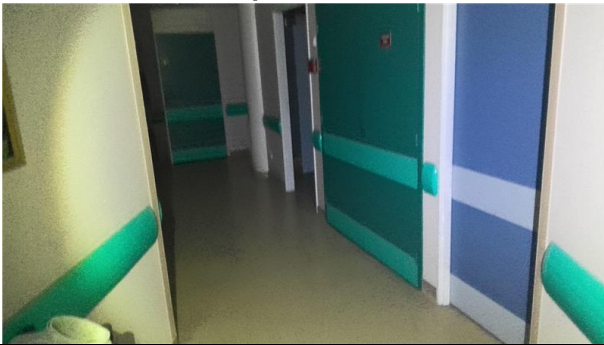

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Calicot

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation B - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Lino, colle et ragréage	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
<b>Objet :</b> Lino, colle et ragréage  <b>Planche de croquis n° :</b>			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Circulation C - Cloisons sur prepa injections - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit, béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit, béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P041**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Labo prépa injections - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit, béton - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante



**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Enduit plâtre, béton / Peinture

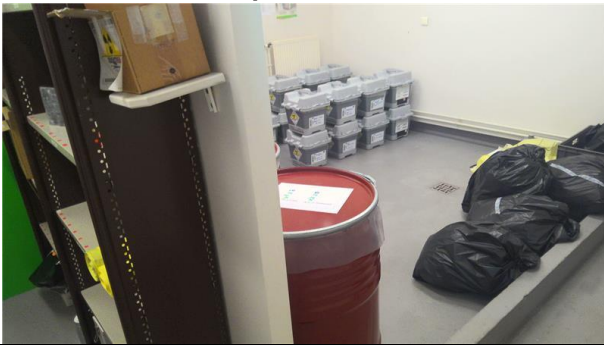

**Planche de croquis n° :**

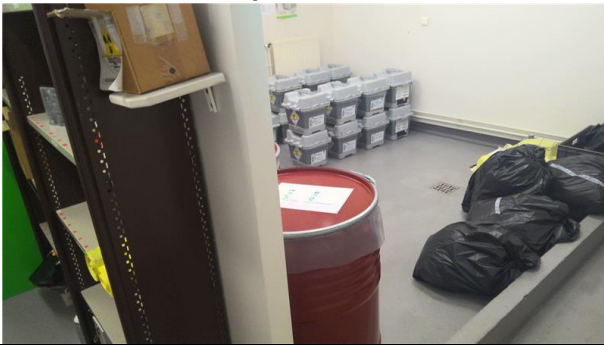

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Labo prépa injections - Plafond technique - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Enduit plâtre - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Enduit plâtre / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées



PRELEVEMENT : P043			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets radioactifs - Revêtement de sol - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets radioactifs - Remontée du bac - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Référence Couche</b>	<b>Description visuelle</b>	<b>Epaisseur (cm)</b>	<b>Conclusion amiante</b>
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P045**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets radioactifs - Revêtement de mur - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Doublage enduit, peinture, isolant fibre

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

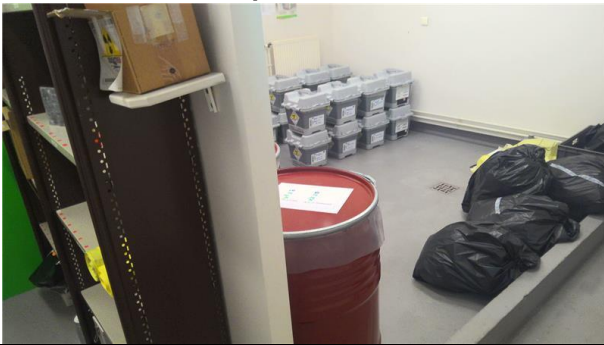

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**

Doublage enduit, peinture, isolant fibre

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
002-COUCHE	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées
001-COUCHE	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0	Fibres d'amiante non détectées
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées
003-COUCHE	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046			
<b>Emplacement :</b> 			
<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets radioactifs - Cloisons - Toutes zones	
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Béton - Peinture	
<b>Résultat amiante :</b> Absence d'amiante			
<b>DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :</b>			
<b>Objet :</b> Béton / Peinture  <b>Planche de croquis n° :</b>			
<b>DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :</b>			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

**PRELEVEMENT : P047**
**Emplacement :**


<b>Nom du client</b> CH MONTLUCON	<b>Numéro de dossier</b> 80985-163553 C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 ALLIER	<b>Pièce ou local – Composant</b> RDC - Local déchets radioactifs - Cloisons - Toutes zones
<b>Nom de l'opérateur</b> ROZAN Ludovic	<b>Date de prélèvement</b> 29/10/2024	<b>Partie de composant</b> Brique, enduit - Peinture

**Résultat amiante :** Absence d'amiante

**DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :**
**Objet :**  
Brique, enduit / Peinture

**Planche de croquis n° :**

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0	Fibres d'amiante non détectées

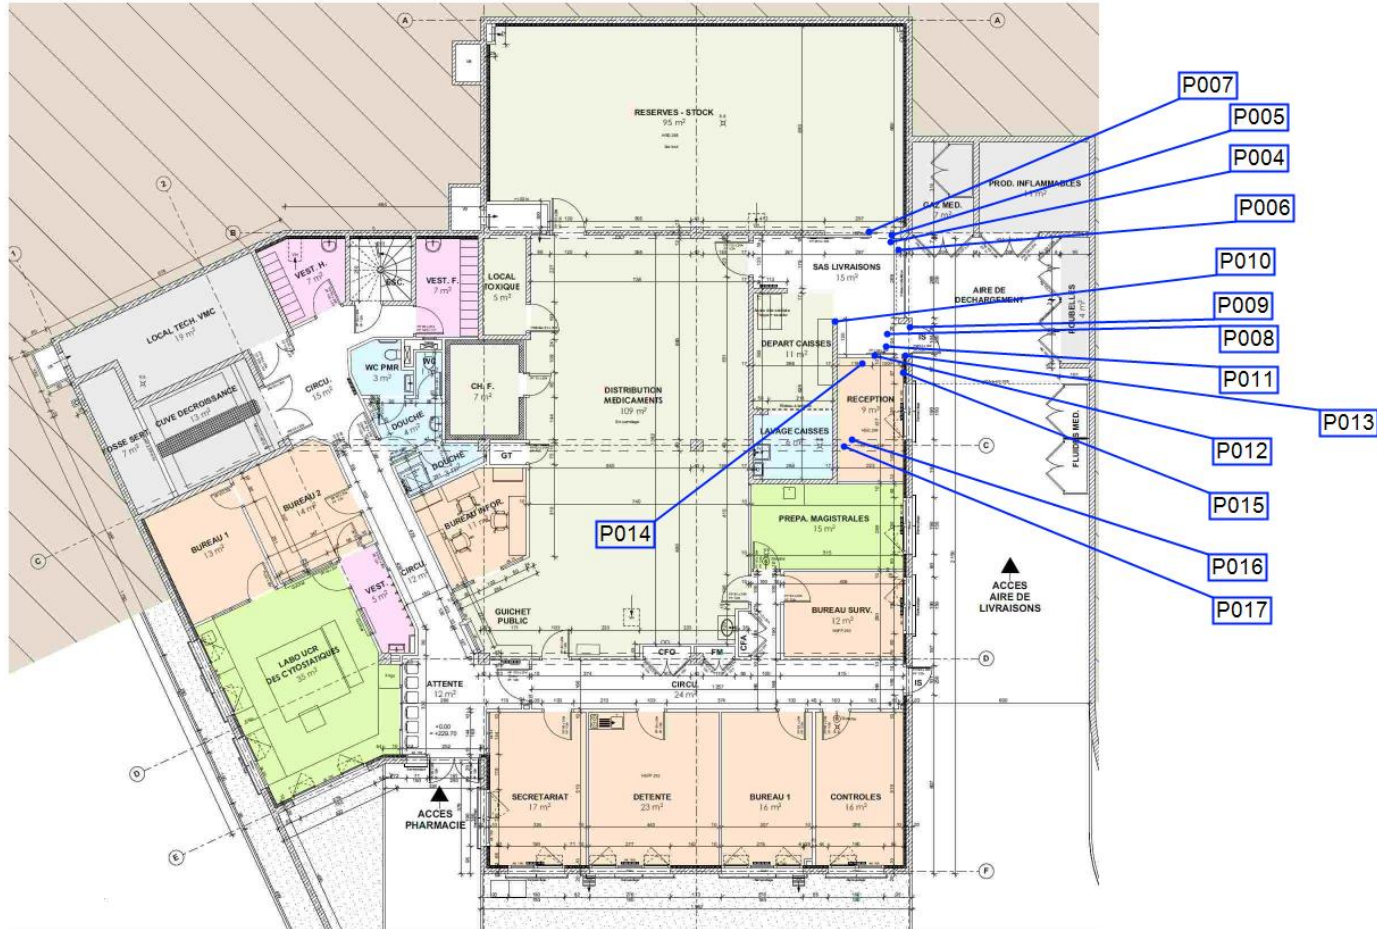


## ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Toiture	N° planche : 1/4	N° dossier : 80985-163553	Type : Croquis
Client : CH MONTLUCON	Version : 0	Adresse : C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON	
Intervenant : ROZAN Ludovic	Date : 13/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation : E	Lieu / Zone : Extérieur



Titre : BÂTIMENT E - RDJ		N° planche : 2/4	N° dossier : 80985-163553	Type : Croquis
Client : CH MONTLUCON		Version : 0	Adresse : C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON	
Intervenant : ROZAN Ludovic		Date : 13/11/2024		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire :			Localisation : E	Lieu / Zone : RDJ











## ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV\_00720241001432079



Analyses pour le Bâtiment

APAVE DIAGNOSTICS  
Monsieur Ludovic ROZAN  
30 Boulevard Maurice Pourchon  
63100 CLERMONT-FERRAND

Notre référence : AR-24-HB-171211-01

Numéro de dossier : 24N044719

Référence de dossier :

80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 24N044719-001 - Référence P001-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°1 - Matériau bitumineux et fibre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-002 - Référence P002-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°2 - Mousse et enveloppe cartonnée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-003 - Référence P003-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°3 - Matériau bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-004 - Référence P004-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-005 - Référence P005-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-006 - Référence P006-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Cadre porte livraison - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N044719-007 - Référence *P007-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Poutre* - *Béton* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-008 - Référence *P008-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Conduit de fluide* - *Calorifugeage vert* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-009 - Référence *P009-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Joint porte métal* - *Mastic gris* - *Non peint*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-010 - Référence *P010-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Cloisons interne* - *Béton* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-011 - Référence *P011-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Plafond* - *Enduit* - *Peinture verte*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-012 - Référence *P012-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Cloisons* - *Enduit plâtre* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-013 - Référence *P013-RDJ* - *Sas livraison* - *Toutes zones* - *Plinthes* - *Plastique et colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-014 - Référence *P014-RDJ* - *Réception* - *Toutes zones* - *Revêtement de sol* - *Lino, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-015 - Référence *P015-RDJ* - *Réception* - *Toutes zones* - *Doublage murs extérieur* - *Enduit, isolation fibre* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-016 - Référence *P016-RDJ* - *Réception* - *Toutes zones* - *Poutre* - *Béton* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-017 - Référence *P017-RDJ* - *Réception* - *Toutes zones* - *Conduit de fluide n°2* - *Calorifugeage vert* - *Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-018 - Référence *P018-RDC* - *Bureau médecin 1* - *Toutes zones* - *Revêtement de sol* - *Dalle de sol, colle et ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N044719-019 - Référence P019-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Plinthes - Plastique et colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-020 - Référence P020-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-021 - Référence P021-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Plenum - Isolation fibre prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-022 - Référence P022-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-023 - Référence P023-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Cloisons - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-024 - Référence P024-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-025 - Référence P025-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Doublage enduit, isolation fibre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-026 - Référence P026-RDC - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-027 - Référence P027-RDC - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-028 - Référence P028-RDC - Circulation A - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-029 - Référence P029-RDC - Archives - Toutes zones - Revêtement de sol - Dalle de sol colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS  
557, route de Noyelles  
F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>  
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N044719-030 - Référence P030-RDC - Archives - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-031 - Référence P031-RDC - Circulation A - Toutes zones - Entourage de poteau - Enduit - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-032 - Référence P032-RDC - Détente - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-033 - Référence P033-RDC - Détente - Toutes zones - Évier - Plaques bitumineuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-034 - Référence P034-RDC - Sas décontamination - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-035 - Référence P035-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Plinthes - Colle, plastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-036 - Référence P036-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-037 - Référence P037-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-038 - Référence P038-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Cloisons - Calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-039 - Référence P039-RDC - Circulation B - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-040 - Référence P040-RDC - Circulation C - Toutes zones - Cloisons sur prépa injections - Enduit, béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 24N044719-041 - Référence P041-RDC - Labo prépa injections - Toutes zones - Cloisons - Enduit, béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 24N044719-042 - Référence P042-RDC - Labo prépa injections - Toutes zones - Plafond technique - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-043 - Référence P043-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Revêtement de sol - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-044 - Référence P044-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Remontée du bac - Béton peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-045 - Référence P045-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Revêtement de mur - Doublage enduit, peinture, isolant fibre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-046 - Référence P046-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Cloisons - Béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 24N044719-047 - Référence P047-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Cloisons - Brique, enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles

F-62110 Henin-Beaumont

Tél: +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33368916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B





Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT NORD SAS**  
**Réception résultat**  
EUROFINS ABN  
557 chemin de Noyelles  
Parc du Pommier  
62110 HENIN BEAUMONT

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 1/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	24N044719-001 - P001-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°1 - Matériau bitumineux et fibre	Matériau semi-dur (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	<b>MET</b> / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	24N044719-002 - P002-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°2 - Mousse et enveloppe cartonnée	Matériau souple fibreuse de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau de type mousse (jaune)	<b>MET</b> / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	24N044719-003 - P003-Extérieur - Toiture terrasse - Toutes zones - Complexe d'étanchéité n°3 - Matériau bitumineux	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple bitumineux (noir)	<b>MET</b> / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	24N044719-004 - P004-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

**Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.**  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page2/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	24N044719-005 - P005-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (rose) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	24N044719-006 - P006-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Cadre porte livraison - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	24N044719-007 - P007-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Poutre - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	24N044719-008 - P008-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Conduit de fluide - Calorifugeage vert - Peinture	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau souple de type plaque (vert)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / DTF4	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 3/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	24N044719-009 - P009-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Joint porte métal - Mastic gris - Non peint	Matériau de type mousse (noir) ; matériau souple de type joint (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	24N044719-010 - P010-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Cloisons interne - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	24N044719-011 - P011-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Plafond - Enduit - Peinture verte	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	24N044719-012 - P012-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 4/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	24N044719-013 - P013-RDJ - Sas livraison - Toutes zones - Plinthes - Plastique et colle	Matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (blanc) ; matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	24N044719-014 - P014-RDJ - Réception Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	24N044719-015 - P015-RDJ - Réception Toutes zones - Doublage murs extérieur - Enduit, isolation fibre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 5/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / UHV8	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	24N044719-016 - P016-RDJ - Réception Toutes zones - Poutre - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	24N044719-017 - P017-RDJ - Réception Toutes zones - Conduit de fluide n°2 - Calorifugeage vert - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type mousse (noir)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	24N044719-018 - P018-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 6/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	24N044719-019 - P019-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Plinthes - Plastique et colle	Matériau souple de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
020	24N044719-020 - P020-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	24N044719-021 - P021-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Plenum - Isolation fibre	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 7/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	24N044719-022 - P022-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre, isolation fibre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune) en traces	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / VXB3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	24N044719-023 - P023-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Cloisons - Calicot	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page 8/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
024	24N044719-024 - P024-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
025	24N044719-025 - P025-RDC - Bureau médecin 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Doublage enduit, isolation fibre - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page9/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	24N044719-026 - P026-RDC - Circulation A - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre, isolation fibre - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / V9VB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	24N044719-027 - P027-RDC - Circulation A - Toutes zones - Revêtement de sol - Colle - Carrelage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.  
Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page10/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	24N044719-028 - P028-RDC - Circulation A - Toutes zones - Plinthes - Colle - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau (marron) en traces ; matériau de type maillage de fibres et liant (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	24N044719-029 - P029-RDC - Archives - Toutes zones - Revêtement de sol - Dalle de sol, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau semi-dur (gris) en traces	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	24N044719-030 - P030-RDC - Archives - Toutes zones - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page11/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	24N044719-031 - P031-RDC - Circulator A - Toutes zones - Entourage de poteau - Enduit - Toile de verre peinte	Matériau de type peinture (rose) ; matériau (fibreuse) (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	24N044719-032 - P032-RDC - Détente - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (vert)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (vert) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	24N044719-033 - P033-RDC - Détente - Toutes zones - Évier - Plaques bitumineuses	Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	24N044719-034 - P034-RDC - Sas décontamination - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page12/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple de type revêtement de sol (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	24N044719-035 - P035-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Plinthes - Colle, plastic	Matériau semi-dur de type plaque (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	24N044719-036 - P036-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Cloisons - Enduit plâtre - Peinture	Matériau (marron) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KBZ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	24N044719-037 - P037-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Revêtement de mur - Colle - Faïence					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page13/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KBZ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
038	24N044719-038 - P038-RDC - Vestiaires Hommes 1 - Toutes zones - Cloisons - Calicot	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / KBZ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / KBZ5	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page14/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	24N044719-039 - P039-RDC - Circulator B - Toutes zones - Revêtement de sol - Lino, colle et ragréage	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (jaune) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (rose)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	24N044719-040 - P040-RDC - Circulator C - Toutes zones - Cloisons sur prepa injections - Enduit, béton - Peinture	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page15/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041	24N044719-041 - P041-RDC - Labo prépa injections - Toutes zones - Cloisons - Enduit, béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	24N044719-042 - P042-RDC - Labo prépa injections - Toutes zones - Plafond technique - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
043	24N044719-043 - P043-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Revêtement de sol - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page16/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
044	24N044719-044 - P044-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Remontée du bac - Béton peinture	Matériau de type peinture (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) (clair)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045	24N044719-045 - P045-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Revêtement de mur - Doublage enduit, peinture, isolant fibre	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (jaune)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / CC7L	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
046	24N044719-046 - P046-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Cloisons - Béton - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C5KZ	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA

## RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01 Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30 Page17/18  
Référence laboratoire N° : 24RI068775 Référence de suivi du dossier N° : 24N044719  
Reçu au laboratoire le : 06/11/2024 Date de réception : 05/11/2024  
Date d'analyse : 06/11/2024  
Référence dossier Client:24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue  
DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
047	24N044719-047 - P047-RDC - Local déchets radioactifs - Toutes zones - Cloisons - Brique, enduit - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / L9RA	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

**MOLP:**Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

**MET:**Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-RI-059102-01

Date d'émission de rapport : 07/11/2024 1:30

Page 18/18

Référence laboratoire N° : 24RI068775

Référence de suivi du dossier N° : 24N044719

Reçu au laboratoire le : 06/11/2024

Date de réception : 05/11/2024

Date d'analyse : 06/11/2024

Référence dossier Client: 24N044719 - 80985-163553 A - C.H. MONTLUCON NERIS LES BAINS - Bâtiment E 18 avenue

DU 8 MAI 1945 03100 MONTLUCON - CH MONTLUCON

Validé et approuvé par :

Dominika Dolik  
Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 18 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole \* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90  
82-200 Malbork, POLSKA



## ANNEXE : Certificat de compétence

Saint Rémy les chevreuse, le 01/09/2024



La certification de compétence de personnes physiques  
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

**ROZAN Ludovic**

**sous le numéro 20-1574**

### Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DPE sans mention</b> [ arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique ]	Prise d'effet : <b>10/12/2020</b>	Validité : <b>09/12/2027</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Electricite</b> [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : <b>05/11/2020</b>	Validité : <b>04/11/2027</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante Sans Mention</b> [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : <b>05/11/2020</b>	Validité : <b>04/11/2027</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amiante Avec Mention</b> [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : <b>05/11/2020</b>	Validité : <b>04/11/2027</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Plomb Crep</b> [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : <b>02/10/2020</b>	Validité : <b>01/10/2027</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GAZ</b> [Arrêté du 1 Juillet 2024 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique]	Prise d'effet : <b>02/10/2020</b>	Validité : <b>01/10/2027</b>



Accréditation  
N° 4-0540  
portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le maintien des dates mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance  
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier  
PRO 06



Veronique DELMAY  
Gestionnaire des certifiés

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011  
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse  
01 30 85 25 71 – [www.abcidia-certification.fr](http://www.abcidia-certification.fr)  
ENR20 V10 du 02 décembre 2021



## ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur  
CBT VERLINGUE  
(AGENCE D'ILLZACH)  
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

03 89 61 64 64  
08 20 20 26 32

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

### Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE  
ENTREPRISE

### Vos références

Contrat  
10800807204

## ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE  
IMMEUBLE CANOPY  
6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

### Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités, à destination de tous les secteurs d'activité.

### A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.  
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

\*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le 10/01/2024

Pour la société :

**Mathieu GODART**

Directeur Général Délégué


**AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.**
**TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.**
**Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.**

Fin du rapport
