

Rapport de repérage du plomb avant travaux

Version : V01

Numéro de dossier : **APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT**
Norme employée : **AFNOR NF X46-035**
Date du repérage : **03/01/2024**
Heure d'arrivée : **09 h 00**
Date émission : **10/01/2024**

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant réalisation de travaux conformément l'art. R4412-5 du Code du Travail. Le diagnostic a été réalisé au regard du périmètre des travaux défini par le client.

Tous les éléments du bâti susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'une mesure. Il est de la responsabilité du donneur d'ordre d'évaluer le risque lié au plomb éventuellement contenu dans les matériaux, en fonction du matériau et du type d'intervention prévue.

Le présent rapport n'est pas un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et ne peut être utilisé dans le cadre de la vente ou la location d'un bien immobilier.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci uniquement aux éléments de la construction uniquement accessible lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.

Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : **EMILE ROUX**
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNES

Référence cadastrale : **Non communiquée**

Propriétaire

Nom : **EMILE ROUX**
Adresse : **1 avenue De Verdun**
94456 LIMEIL BREVANNES

Donneur d'ordre

Qualité du donneur d'ordre : **Propriétaire**
(Sur déclaration de l'intéressé)


Nom : **EMILE ROUX**
Adresse : **1 avenue De Verdun**
94456 LIMEIL BREVANNES

Organisme chargé de la mission

Nom : **AED Groupe**
Adresse : **4, avenue Graham Bell**
33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : **840 795 348 00019**
Désignation de la compagnie d'assurance : **AXA**
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2024

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom	Organisme certification	Détail de la certification	Signature
DIANGANA Mousa	ABCIDIA CERTIFICATION	Obtention : 12/10/2022 Échéance : 11/10/2029 N° de certification : 22-1813	

Liste de rapports antérieurs

Date	Objet
Néant	Néant

Sommaire

A.	Références réglementaires.....	4
B.	Renseignements complémentaires concernant la mission.....	4
	B.1. Commanditaire de la mission.....	4
	B.2. L'appareil à fluorescence X.....	4
	B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X.....	4
	B.4. Le bien objet de la mission.....	4
	B.5. Liste des locaux visités :.....	5
	B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :.....	5
C.	Résultats des mesures.....	6
D.	Commentaires et signature.....	45
E.	Méthodologie d'intervention.....	46
F.	Notice d'information à remettre au donneur d'ordre.....	47
G.	Planches de repérage.....	49



Programme de travaux

Les travaux seront de 2nd œuvre, sol, peintures de murs, percement de murs, dépose cloisons, électricité, plomberie, ventilation ...

A. Références réglementaires

- ❖ Principes généraux de prévention de l'article L4121-2 du code du travail
- ❖ Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Articles R4412-59 et suivants du code du travail

B. Renseignements complémentaires concernant la mission

B.1. Commanditaire de la mission

Nom et prénom: **EMILE ROUX (Propriétaire - Sur déclaration de l'intéressé)**
Adresse : **1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNES**

B.2. L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil : **Fondis Electronic**
Modèle de l'appareil : **PB200i**
N° de série de l'appareil : **8641**
Nature du radionucléide : **57Co**
Date du dernier chargement de la source : **05/07/2022** (Activité à cette date : **200 MBq**)
Déclaration ASN - N° : **T140440**
Déclaration ASN - Date : **03/04/2023**
Précision de l'appareil : **0,1 mg/cm²**

B.3. Etalonnage de l'appareil à fluorescence X

Etalon {Fab. : SRM; NIST : 2573; Concentration : 1,04 mg/cm²; Précision : 0,064 mg/cm²}

Vérification de la justesse de l'appareil	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	03/01/2024	1,12
Etalonnage sortie	03/01/2024	1,01

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque repérage une vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

B.4. Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier	EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES
Description de l'ensemble immobilier	Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Année de construction	NC
Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndicat de copropriété (dans le cas du CREP sur parties communes)	EMILE ROUX 1 avenue De Verdun 94456 LIMEIL BREVANNES

B.5. Liste des locaux visités :

- | | |
|--|--|
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460 | ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456 |
| ❖ BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456 | |

B.6. Liste des locaux non visités (avec justification) :

Néant

c. Résultats des mesures

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
2	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		1	Sol	-	Plastique (lino)	0,09	0,1	
3	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		1	Sol	-	Plastique (lino)	0,07	0,1	
4	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	A	2	Mur	-	Toile de verre peint	0,03	0,1	
5	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	A	2	Mur	-	Toile de verre peint	0,11	0,1	
6	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	A	2	Mur	-	Toile de verre peint	0,07	0,1	
7	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	B	3	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,40	0,1	
8	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	C	4	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,80	0,1	
9	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458	D	5	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,00	0,1	
10	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		6	Plafond	Béton	Peinture	0,04	0,1	
11	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		6	Plafond	Béton	Peinture	0,09	0,1	
12	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		7	Plinthes	Bois	Vernis	0,13	0,1	
13	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		7	Plinthes	Bois	Vernis	0,06	0,1	
14	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		8	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
15	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		8	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
16	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		9	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
17	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		9	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
18	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		10	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	6,30	0,1	
19	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		11	Plafond	Plâtre	Peinture	0,15	0,1	
20	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_458		11	Plafond	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
21	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		12	Sol	-	Plastique (lino)	0,05	0,1	
22	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		12	Sol	-	Plastique (lino)	0,18	0,1	
23	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	A	13	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	
24	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	A	13	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
25	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	A	13	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
26	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	B	14	Mur	-	Toile de verre peint	1,50	0,1	
27	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	C	15	Mur	-	Toile de verre peint	1,00	0,1	
28	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	D	16	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
29	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	D	16	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
30	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474	D	16	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,05	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
31	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		17	Plafond	Béton	Peinture	0,03	0,1	
32	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		17	Plafond	Béton	Peinture	0,10	0,1	
33	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		18	Plinthes	Bois	Vernis	0,09	0,1	
34	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		18	Plinthes	Bois	Vernis	0,18	0,1	
35	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		19	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
36	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		19	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
37	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		20	Porte dormant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
38	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		20	Porte dormant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
39	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		21	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	0,01	0,1	
40	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		21	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	1,00	0,1	
41	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		22	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	8,00	0,1	
42	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		23	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	8,50	0,1	
43	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		24	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,02	0,1	
44	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		24	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	0,08	0,1	
45	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		25	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,16	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
46	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		25	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,17	0,1	
47	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		26	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	1,70	0,1	
48	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		27	Radiateur	Métal	Peinture	0,00	0,1	
49	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		27	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
50	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		28	Conduit	Métal	Peinture	0,02	0,1	
51	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		28	Conduit	Métal	Peinture	0,13	0,1	
52	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		29	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
53	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_474		29	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
54	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		30	Sol	-	Plastique (lino)	0,14	0,1	
55	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		30	Sol	-	Plastique (lino)	0,02	0,1	
56	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	A	31	Mur	-	Toile de verre peint	0,20	0,1	
57	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	A	31	Mur	-	Toile de verre peint	0,16	0,1	
58	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	A	31	Mur	-	Toile de verre peint	0,08	0,1	
59	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	B	32	Mur	-	Toile de verre peint	5,30	0,1	
60	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	C	33	Mur	-	Toile de verre peint	0,11	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
61	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	C	33	Mur	-	Toile de verre peint	0,11	0,1	
62	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	C	33	Mur	-	Toile de verre peint	0,11	0,1	
63	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502	D	34	Mur	-	Toile de verre peint	6,00	0,1	
64	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		35	Plafond	Béton	Peinture	0,13	0,1	
65	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		35	Plafond	Béton	Peinture	0,07	0,1	
66	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		36	Plinthes	Bois	Vernis	0,04	0,1	
67	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		36	Plinthes	Bois	Vernis	0,07	0,1	
68	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		37	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
69	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		37	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
70	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		38	Porte dormant	Bois	Peinture	0,03	0,1	
71	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		38	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
72	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		39	Embrasure fenêtre	Plâtre	Toile de verre peint	1,10	0,1	
73	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		40	Fenêtre ouvrant intérieure	Bois	Peinture	6,30	0,1	
74	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		41	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,11	0,1	
75	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		41	Fenêtre ouvrant extérieure	Bois	Peinture	0,12	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
76	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		42	Fenêtre dormant intérieure	Bois	Peinture	7,00	0,1	
77	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		43	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,09	0,1	
78	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		43	Fenêtre dormant extérieure	Bois	Peinture	0,18	0,1	
79	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		44	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	1,80	0,1	
80	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		45	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
81	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		45	Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
82	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		46	Conduit	Métal	Peinture	0,15	0,1	
83	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Couloir 569_502		46	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
84	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		47	Sol	-	Moquette collée	0,09	0,1	
85	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		47	Sol	-	Moquette collée	0,17	0,1	
86	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	A	48	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
87	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	A	48	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
88	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	A	48	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
89	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	B	49	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
90	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	B	49	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
91	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	B	49	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
92	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	C	50	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,80	0,1	
93	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515	D	51	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,40	0,1	
94	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		52	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
95	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		52	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
96	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		53	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,13	0,1	
97	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		53	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,01	0,1	
98	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		54	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	3,00	0,1	
99	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		55	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,01	0,1	
100	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		55	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,90	0,1	
101	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_515		56	Porte dormant	Bois	Peinture	6,60	0,1	
102	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		57	Sol	-	Moquette collée	0,12	0,1	
103	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		57	Sol	-	Moquette collée	0,05	0,1	
104	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	A	58	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,10	0,1	
105	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	B	59	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,30	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
106	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	C	60	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,30	0,1	
107	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	D	61	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
108	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	D	61	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
109	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512	D	61	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
110	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		62	Plinthes	Bois	Peinture	0,17	0,1	
111	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		62	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
112	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		63	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,12	0,1	
113	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		63	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,09	0,1	
114	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		64	Porte dormant	Bois	Peinture	11,00	0,1	
115	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		65	Porte ouvrant	Bois	Peinture	10,00	0,1	
116	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_512		66	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	8,00	0,1	
117	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		67	Sol	-	Moquette collée	0,16	0,1	
118	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		67	Sol	-	Moquette collée	0,15	0,1	
119	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	A	68	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
120	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	A	68	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
121	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	A	68	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
122	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	B	69	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	1,30	0,1	
123	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	C	70	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,30	0,1	
124	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	D	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
125	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	D	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
126	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513	D	71	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
127	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		72	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
128	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		72	Plinthes	Bois	Peinture	0,14	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		73	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		74	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		75	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		76	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
129	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		77	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
130	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		77	Porte dormant	Bois	Peinture	9,70	0,1	
131	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		78	Porte ouvrant	Bois	Peinture	10,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
132	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		79	Poteaux	Bois	Peinture	4,00	0,1	
133	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		80	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	1,30	0,1	
134	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		81	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	1,50	0,1	
135	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		82	Radiateur	Métal	Peinture	0,18	0,1	
136	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		82	Radiateur	Métal	Peinture	0,01	0,1	
137	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		83	Conduit	Métal	Peinture	0,10	0,1	
138	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		83	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
139	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		84	Plafond	Bois	Peinture	0,20	0,1	
140	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_513		84	Plafond	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		85	Sol	-	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
141	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	A	86	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
142	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	A	86	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
143	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	B	87	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
144	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	B	87	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
145	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	C	88	Mur	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
146	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	C	88	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
147	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	D	89	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
148	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509	D	89	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
149	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		90	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
150	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		90	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,19	0,1	
151	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		91	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
152	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		91	Porte dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
153	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		92	Conduit	Métal	Peinture	0,13	0,1	
154	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_509		92	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
155	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		93	Sol	-	Moquette collée	0,10	0,1	
156	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		93	Sol	-	Moquette collée	0,10	0,1	
157	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	A	94	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,00	0,1	
158	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	B	95	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
159	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	B	95	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
160	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	B	95	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
161	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	C	96	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,20	0,1	
162	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505	D	97	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,30	0,1	
163	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		98	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
164	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		98	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		99	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		100	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		101	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		102	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
165	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		103	Porte dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
166	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		103	Porte dormant	Bois	Peinture	0,11	0,1	
167	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		104	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,80	0,1	
168	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		105	Poteaux	Bois	Peinture	6,30	0,1	
169	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		106	Coffrage	Bois	Peinture	0,05	0,1	
170	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		106	Coffrage	Bois	Peinture	0,18	0,1	
171	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		107	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	1,30	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
172	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		108	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	2,00	0,1	
173	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		109	Radiateur	Métal	Peinture	8,00	0,1	
174	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		110	Conduit	Métal	Peinture	0,19	0,1	
175	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		110	Conduit	Métal	Peinture	0,07	0,1	
176	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		111	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	0,18	0,1	
177	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		111	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	0,20	0,1	
178	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		112	Plafond	Bois	Peinture	0,05	0,1	
179	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_505		112	Plafond	Bois	Peinture	0,04	0,1	
180	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		113	Sol	-	Moquette collée	0,17	0,1	
181	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		113	Sol	-	Moquette collée	0,02	0,1	
182	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	A	114	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,80	0,1	
183	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	B	115	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,70	0,1	
184	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	C	116	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
185	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	C	116	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,12	0,1	
186	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	C	116	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
187	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	D	117	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
188	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	D	117	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
189	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502	D	117	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
190	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		118	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
191	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		118	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
192	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		119	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,11	0,1	
193	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		119	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,17	0,1	
194	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		120	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	15,30	0,1	
195	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		121	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
196	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		121	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
197	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		122	Porte dormant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
198	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		122	Porte dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
199	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		123	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
200	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_502		123	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
201	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		124	Sol	-	Moquette collée	0,09	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
202	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		124	Sol	-	Moquette collée	0,03	0,1	
203	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	A	125	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,70	0,1	
204	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	B	126	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,80	0,1	
205	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	C	127	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,80	0,1	
206	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493	D	128	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,30	0,1	
207	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		129	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
208	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		129	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		130	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		131	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		132	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		133	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
209	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		134	Porte dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
210	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		134	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
211	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		135	Porte ouvrant	Bois	Peinture	6,00	0,1	
212	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		136	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	5,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
213	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		137	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	3,40	0,1	
214	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		138	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
215	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		138	Radiateur	Métal	Peinture	0,04	0,1	
216	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		139	Conduit	Métal	Peinture	0,07	0,1	
217	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		139	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
218	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		140	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	7,80	0,1	
219	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		141	Poteaux	Plâtre	Peinture	2,30	0,1	
220	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		142	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
221	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_493		142	Plafond	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
222	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		143	Sol	-	Plastique (lino)	0,18	0,1	
223	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		143	Sol	-	Plastique (lino)	0,10	0,1	
224	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	A	144	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,70	0,1	
225	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	B	145	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,00	0,1	
226	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	C	146	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,80	0,1	
227	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489	D	147	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,20	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
228	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		148	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
229	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		148	Plinthes	Bois	Peinture	0,03	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		149	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		150	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		151	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		152	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
230	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		153	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
231	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		153	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
232	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		154	Porte ouvrant	Bois	Peinture	7,00	0,1	
233	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		155	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	1,10	0,1	
234	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		156	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	3,90	0,1	
235	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		157	Radiateur	Métal	Peinture	0,16	0,1	
236	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		157	Radiateur	Métal	Peinture	0,12	0,1	
237	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		158	Conduit	Métal	Peinture	0,04	0,1	
238	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		158	Conduit	Métal	Peinture	0,02	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
239	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		159	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	5,40	0,1	
240	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		160	Poteaux	Plâtre	Peinture	2,30	0,1	
241	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		161	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
242	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_489		161	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		162	Sol	-	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
243	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	A	163	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
244	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	A	163	Mur	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
245	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	B	164	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
246	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	B	164	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
247	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	C	165	Mur	Plâtre	Peinture	0,10	0,1	
248	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	C	165	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	
249	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	D	166	Mur	Plâtre	Peinture	0,20	0,1	
250	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487	D	166	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
251	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		167	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
252	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		167	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
253	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		168	Porte dormant	Bois	Peinture	0,20	0,1	
254	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		168	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
255	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		169	Conduit	Métal	Peinture	0,01	0,1	
256	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 570_487		169	Conduit	Métal	Peinture	0,12	0,1	
257	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		170	Sol	-	Moquette collée	0,12	0,1	
258	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		170	Sol	-	Moquette collée	0,05	0,1	
259	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	A	171	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	10,00	0,1	
260	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	B	172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,00	0,1	
261	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	B	172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
262	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	B	172	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,04	0,1	
263	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	C	173	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,00	0,1	
264	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484	D	174	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,10	0,1	
265	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		175	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
266	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		175	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
267	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		176	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,10	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
268	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		176	Coffrage	Bois	Toile de verre peint	0,04	0,1	
269	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		177	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	5,40	0,1	
270	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		178	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,00	0,1	
271	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_484		179	Porte dormant	Bois	Peinture	3,10	0,1	
272	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		180	Sol	-	Moquette collée	0,04	0,1	
273	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		180	Sol	-	Moquette collée	0,19	0,1	
274	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	A	181	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,80	0,1	
275	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	B	182	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,10	0,1	
276	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	C	183	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,80	0,1	
277	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485	D	184	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,00	0,1	
278	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		185	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
279	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		185	Plinthes	Bois	Peinture	0,09	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		186	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		187	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		188	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		189	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
280	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		190	Porte dormant	Bois	Peinture	0,12	0,1	
281	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		190	Porte dormant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
282	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		191	Porte ouvrant	Bois	Peinture	8,00	0,1	
283	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		192	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,00	0,1	
284	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		193	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
285	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		193	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
286	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		194	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
287	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		194	Radiateur	Métal	Peinture	0,17	0,1	
288	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		195	Conduit	Métal	Peinture	0,04	0,1	
289	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		195	Conduit	Métal	Peinture	0,08	0,1	
290	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		196	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	6,00	0,1	
291	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		197	Poteaux	Plâtre	Peinture	4,70	0,1	
292	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		198	Plafond	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
293	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_485		198	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
294	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		199	Sol	-	Moquette collée	0,01	0,1	
295	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		199	Sol	-	Moquette collée	0,08	0,1	
296	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	A	200	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	11,00	0,1	
297	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	B	201	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,06	0,1	
298	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	B	201	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
299	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	B	201	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	
300	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	C	202	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,30	0,1	
301	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481	D	203	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,90	0,1	
302	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		204	Plinthes	Bois	Peinture	0,13	0,1	
303	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		204	Plinthes	Bois	Peinture	0,15	0,1	
304	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		205	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	5,30	0,1	
305	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		206	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,00	0,1	
306	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_481		207	Porte dormant	Bois	Peinture	3,10	0,1	
307	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		208	Sol	-	Moquette collée	0,14	0,1	
308	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		208	Sol	-	Moquette collée	0,18	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
309	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481	A	209	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,00	0,1	
310	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481	B	210	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,10	0,1	
311	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481	C	211	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,80	0,1	
312	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481	D	212	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,80	0,1	
313	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		213	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
314	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		213	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		214	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		215	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		216	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		217	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
315	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		218	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
316	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		218	Porte dormant	Bois	Peinture	0,14	0,1	
317	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		219	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,18	0,1	
318	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		219	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
319	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		220	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	6,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
320	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		221	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	4,00	0,1	
321	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		222	Radiateur	Métal	Peinture	0,19	0,1	
322	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		222	Radiateur	Métal	Peinture	0,11	0,1	
323	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		223	Conduit	Métal	Peinture	0,17	0,1	
324	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		223	Conduit	Métal	Peinture	0,09	0,1	
325	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		224	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	5,30	0,1	
326	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		225	Poteaux	Bois	Peinture	4,70	0,1	
327	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		226	Coffrage	Bois	Peinture	0,12	0,1	
328	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		226	Coffrage	Bois	Peinture	0,19	0,1	
329	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		227	Plafond	Plâtre	Peinture	0,02	0,1	
330	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_481		227	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
331	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		228	Sol	-	Plastique (lino)	0,10	0,1	
332	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		228	Sol	-	Plastique (lino)	0,09	0,1	
333	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	A	229	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	9,00	0,1	
334	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	B	230	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,09	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
335	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	B	230	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,08	0,1	
336	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	B	230	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
337	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	C	231	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	9,70	0,1	
338	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476	D	232	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,50	0,1	
339	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		233	Plinthes	Bois	Peinture	0,04	0,1	
340	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		233	Plinthes	Bois	Peinture	0,02	0,1	
341	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		234	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	1,40	0,1	
342	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		235	Porte ouvrant	Bois	Peinture	4,00	0,1	
343	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_476		236	Porte dormant	Bois	Peinture	3,30	0,1	
344	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		237	Sol	-	Plastique (lino)	0,04	0,1	
345	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		237	Sol	-	Plastique (lino)	0,16	0,1	
346	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	A	238	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	1,80	0,1	
347	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	B	239	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,00	0,1	
348	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	C	240	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,40	0,1	
349	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477	D	241	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,90	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
350	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		242	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
351	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		242	Plinthes	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		243	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		244	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		245	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		246	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
352	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		247	Porte dormant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
353	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		247	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
354	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		248	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
355	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		248	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
356	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		249	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,00	0,1	
357	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		250	Poteaux	Plâtre	Peinture	3,80	0,1	
358	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		251	Radiateur	Métal	Peinture	0,16	0,1	
359	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		251	Radiateur	Métal	Peinture	0,07	0,1	
360	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		252	Conduit	Métal	Peinture	0,19	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
361	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		252	Conduit	Métal	Peinture	0,13	0,1	
362	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		253	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	1,40	0,1	
363	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		254	Plafond	Plâtre	Peinture	0,11	0,1	
364	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_477		254	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
365	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		255	Sol	-	Plastique (lino)	0,15	0,1	
366	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		255	Sol	-	Plastique (lino)	0,11	0,1	
367	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	A	256	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,00	0,1	
368	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	B	257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,07	0,1	
369	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	B	257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,13	0,1	
370	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	B	257	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,17	0,1	
371	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	C	258	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,30	0,1	
372	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472	D	259	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,80	0,1	
373	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		260	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
374	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		260	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
375	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		261	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	1,20	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
376	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		262	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,00	0,1	
377	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R 570_472		263	Porte dormant	Bois	Peinture	4,70	0,1	
378	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		264	Sol	-	Moquette collée	0,05	0,1	
379	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		264	Sol	-	Moquette collée	0,20	0,1	
380	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	A	265	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,30	0,1	
381	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	B	266	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,70	0,1	
382	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	C	267	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,40	0,1	
383	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472	D	268	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,40	0,1	
384	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		269	Plinthes	Bois	Peinture	0,10	0,1	
385	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		269	Plinthes	Bois	Peinture	0,19	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		270	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		271	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		272	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		273	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
386	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		274	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
387	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		274	Porte dormant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
388	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		275	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,02	0,1	
389	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		275	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,09	0,1	
390	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		276	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
391	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		276	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,70	0,1	
392	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		277	Poteaux	Plâtre	Peinture	3,80	0,1	
393	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		278	Radiateur	Métal	Peinture	0,05	0,1	
394	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		278	Radiateur	Métal	Peinture	0,15	0,1	
395	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		279	Conduit	Métal	Peinture	0,10	0,1	
396	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		279	Conduit	Métal	Peinture	0,09	0,1	
397	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		280	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	1,20	0,1	
398	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		281	Plafond	Plâtre	Peinture	0,07	0,1	
399	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_472		281	Plafond	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
400	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		282	Sol	-	Plastique (lino)	0,13	0,1	
401	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		282	Sol	-	Plastique (lino)	0,02	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
402	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	A	283	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	10,30	0,1	
403	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	B	284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,10	0,1	
404	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	B	284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
405	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	B	284	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,02	0,1	
406	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	C	285	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,60	0,1	
407	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468	D	286	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	8,30	0,1	
408	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		287	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
409	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		287	Plinthes	Bois	Peinture	0,05	0,1	
410	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		288	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	1,70	0,1	
411	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		289	Porte ouvrant	Bois	Peinture	5,50	0,1	
412	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R.570_468		290	Porte dormant	Bois	Peinture	4,10	0,1	
413	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		291	Sol	-	Moquette collée	0,06	0,1	
414	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		291	Sol	-	Moquette collée	0,12	0,1	
415	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	A	292	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	3,00	0,1	
416	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	B	293	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	1,80	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
417	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	C	294	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	4,70	0,1	
418	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468	D	295	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,10	0,1	
419	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		296	Plinthes	Bois	Peinture	0,20	0,1	
420	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		296	Plinthes	Bois	Peinture	0,00	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		297	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		298	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		299	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		300	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
421	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		301	Porte dormant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
422	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		301	Porte dormant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
423	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		302	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
424	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		302	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,17	0,1	
425	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		303	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	1,70	0,1	
426	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		304	Poteaux	Plâtre	Peinture	2,70	0,1	
427	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		305	Radiateur	Métal	Peinture	0,03	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
428	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		305	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
429	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		306	Conduit	Métal	Peinture	0,18	0,1	
430	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		306	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
431	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		307	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	2,10	0,1	
432	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		308	Plafond	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
433	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_468		308	Plafond	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
434	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		309	Sol	-	Plastique (lino)	0,11	0,1	
435	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		309	Sol	-	Plastique (lino)	0,15	0,1	
436	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	A	310	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	9,70	0,1	
437	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	B	311	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,15	0,1	
438	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	B	311	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
439	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	B	311	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
440	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	C	312	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,40	0,1	
441	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464	D	313	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	7,40	0,1	
442	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		314	Plinthes	Bois	Peinture	0,11	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
443	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		314	Plinthes	Bois	Peinture	0,08	0,1	
444	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		315	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	2,10	0,1	
445	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		316	Porte ouvrant	Bois	Peinture	6,10	0,1	
446	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - R. 570_464		317	Porte dormant	Bois	Peinture	3,80	0,1	
447	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		318	Sol	-	Moquette collée	0,11	0,1	
448	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		318	Sol	-	Moquette collée	0,02	0,1	
449	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	A	319	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	1,90	0,1	
450	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	B	320	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,30	0,1	
451	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	C	321	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	5,10	0,1	
452	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464	D	322	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,30	0,1	
453	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		323	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
454	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		323	Plinthes	Bois	Peinture	0,07	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		324	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		325	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		326	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		327	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
455	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		328	Porte dormant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
456	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		328	Porte dormant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
457	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		329	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,16	0,1	
458	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		329	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,13	0,1	
459	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		330	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	2,40	0,1	
460	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		331	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	2,60	0,1	
461	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		332	Radiateur	Métal	Peinture	0,02	0,1	
462	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		332	Radiateur	Métal	Peinture	0,08	0,1	
463	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		333	Conduit	Métal	Peinture	0,05	0,1	
464	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		333	Conduit	Métal	Peinture	0,19	0,1	
465	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		334	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	2,60	0,1	
466	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		335	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
467	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_464		335	Plafond	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
468	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		336	Sol	-	Plastique (lino)	0,01	0,1	

N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
469	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		336	Sol	-	Plastique (lino)	0,12	0,1	
470	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	A	337	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	2,00	0,1	
471	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	B	338	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	6,80	0,1	
472	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	C	339	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,14	0,1	
473	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	C	339	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,19	0,1	
474	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	C	339	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,03	0,1	
475	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	D	340	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
476	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	D	340	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
477	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460	D	340	Mur	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
478	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		341	Plinthes	Bois	Peinture	0,06	0,1	
479	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		341	Plinthes	Bois	Peinture	0,16	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		342	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		343	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		344	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		345	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
480	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		346	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
481	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		346	Porte dormant	Bois	Peinture	0,05	0,1	
482	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		347	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,15	0,1	
483	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		347	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,08	0,1	
484	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		348	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	1,80	0,1	
485	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		349	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	2,20	0,1	
486	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		350	Radiateur	Métal	Peinture	0,15	0,1	
487	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		350	Radiateur	Métal	Peinture	0,10	0,1	
488	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		351	Conduit	Métal	Peinture	0,11	0,1	
489	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		351	Conduit	Métal	Peinture	0,01	0,1	
490	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		352	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	0,11	0,1	
491	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Bureau 573_460		352	Embrasure porte	Plâtre	Toile de verre peint	0,16	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		353	Sol	-	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
492	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	A	354	Mur	Plâtre	Peinture	0,13	0,1	
493	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	A	354	Mur	Plâtre	Peinture	0,00	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
494	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	A	354	Mur	Plâtre	Peinture	0,19	0,1	
495	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	B	355	Mur	Plâtre	Peinture	0,08	0,1	
496	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	B	355	Mur	Plâtre	Peinture	0,16	0,1	
497	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	B	355	Mur	Plâtre	Peinture	6,30	0,1	
498	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	C	356	Mur	Plâtre	Peinture	5,00	0,1	
499	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	D	357	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
500	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	D	357	Mur	Plâtre	Peinture	6,30	0,1	
501	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	E	358	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
502	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	E	358	Mur	Plâtre	Peinture	0,01	0,1	
503	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	E	358	Mur	Plâtre	Peinture	0,06	0,1	
504	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456	F	359	Mur	Plâtre	Peinture	8,90	0,1	
505	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
506	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		360	Plafond	Plâtre	Peinture	0,18	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		361	Plinthes	Plâtre	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
507	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		362	Coffrage	Bois	Peinture	0,06	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
508	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - Sanitaire 572_456		362	Coffrage	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		363	Sol	-	Carrelage	NM		Partie non visée par la réglementation
509	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	A	364	Mur	Plâtre	Peinture	0,05	0,1	
510	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	A	364	Mur	Plâtre	Peinture	0,14	0,1	
511	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	A	364	Mur	Plâtre	Peinture	0,12	0,1	
512	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	B	365	Mur	Plâtre	Peinture	4,00	0,1	
513	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	C	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,03	0,1	
514	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	C	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,04	0,1	
515	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	C	366	Mur	Plâtre	Peinture	0,17	0,1	
516	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456	D	367	Mur	Plâtre	Peinture	8,00	0,1	
517	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		368	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,04	0,1	
518	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		368	Porte ouvrant	Bois	Peinture	0,07	0,1	
519	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		369	Porte dormant	Bois	Peinture	0,10	0,1	
520	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		369	Porte dormant	Bois	Peinture	0,06	0,1	
521	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		370	Conduit	Métal	Peinture	0,18	0,1	



N°	Localisation	Zone	N° UD	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Marge d'erreur	Observations
522	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		370	Conduit	Métal	Peinture	0,01	0,1	
523	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		371	Coffrage	Bois	Peinture	0,01	0,1	
524	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		371	Coffrage	Bois	Peinture	0,01	0,1	
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		372	Fenêtre ouvrant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		373	Fenêtre ouvrant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		374	Fenêtre dormant intérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
-	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		375	Fenêtre dormant extérieure	PVC	Brut	NM		Partie non visée par la réglementation
525	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		376	Allège fenêtre	Plâtre	Peinture	1,00	0,1	
526	BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC - WC 574_456		377	Embrasure fenêtre	Plâtre	Peinture	4,80	0,1	


D. Commentaires et signature

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Aucun document n'a été remis**

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Le donneur d'ordre**

Fait à **LIMEIL BREVANNES**, le **10/01/2024**

Par : **DIANGANA Mousa**



E. Méthodologie d'intervention

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage.

Identification des locaux et des zones

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux concernés par les travaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux concernés par les travaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux concernés par les travaux et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Si des travaux sont réalisés sur la faïence (retrait, perceuse,...) le repérage est nécessaire.

Identification des matériaux

Les matériaux susceptibles de contenir du plomb doivent faire l'objet d'un repérage par le diagnostiqueur.

Choix des points de mesures

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

F. Notice d'information à remettre au donneur d'ordre

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers

- ❖ en travaillant sans protection,
- ❖ en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- ❖ en se rongant les ongles,
- ❖ en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- ❖ Exploiter le diagnostic plomb avant démolition pour construire le projet de démolition
- ❖ Remettre le diagnostic plomb avant démolition aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- ❖ Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage
- ❖ mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- ❖ Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- ❖ Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- ❖ Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- ❖ Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- ❖ Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- ❖ Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - ✓ interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - ✓ rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - ✓ interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ✓ ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- ❖ des conseils dans le choix des protections,
- ❖ une aide à l'information et à la formation,
- ❖ une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
Tél 02 38 81 50 00
prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
Tél 02 38 83 60 21
orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
www.rsi.fr/centre
Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :


www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.


Des documents vous informent :

- ❖ le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- ❖ la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- ❖ Les guides de prévention :
 - ✓ Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - ✓ Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

G. Planches de repérage

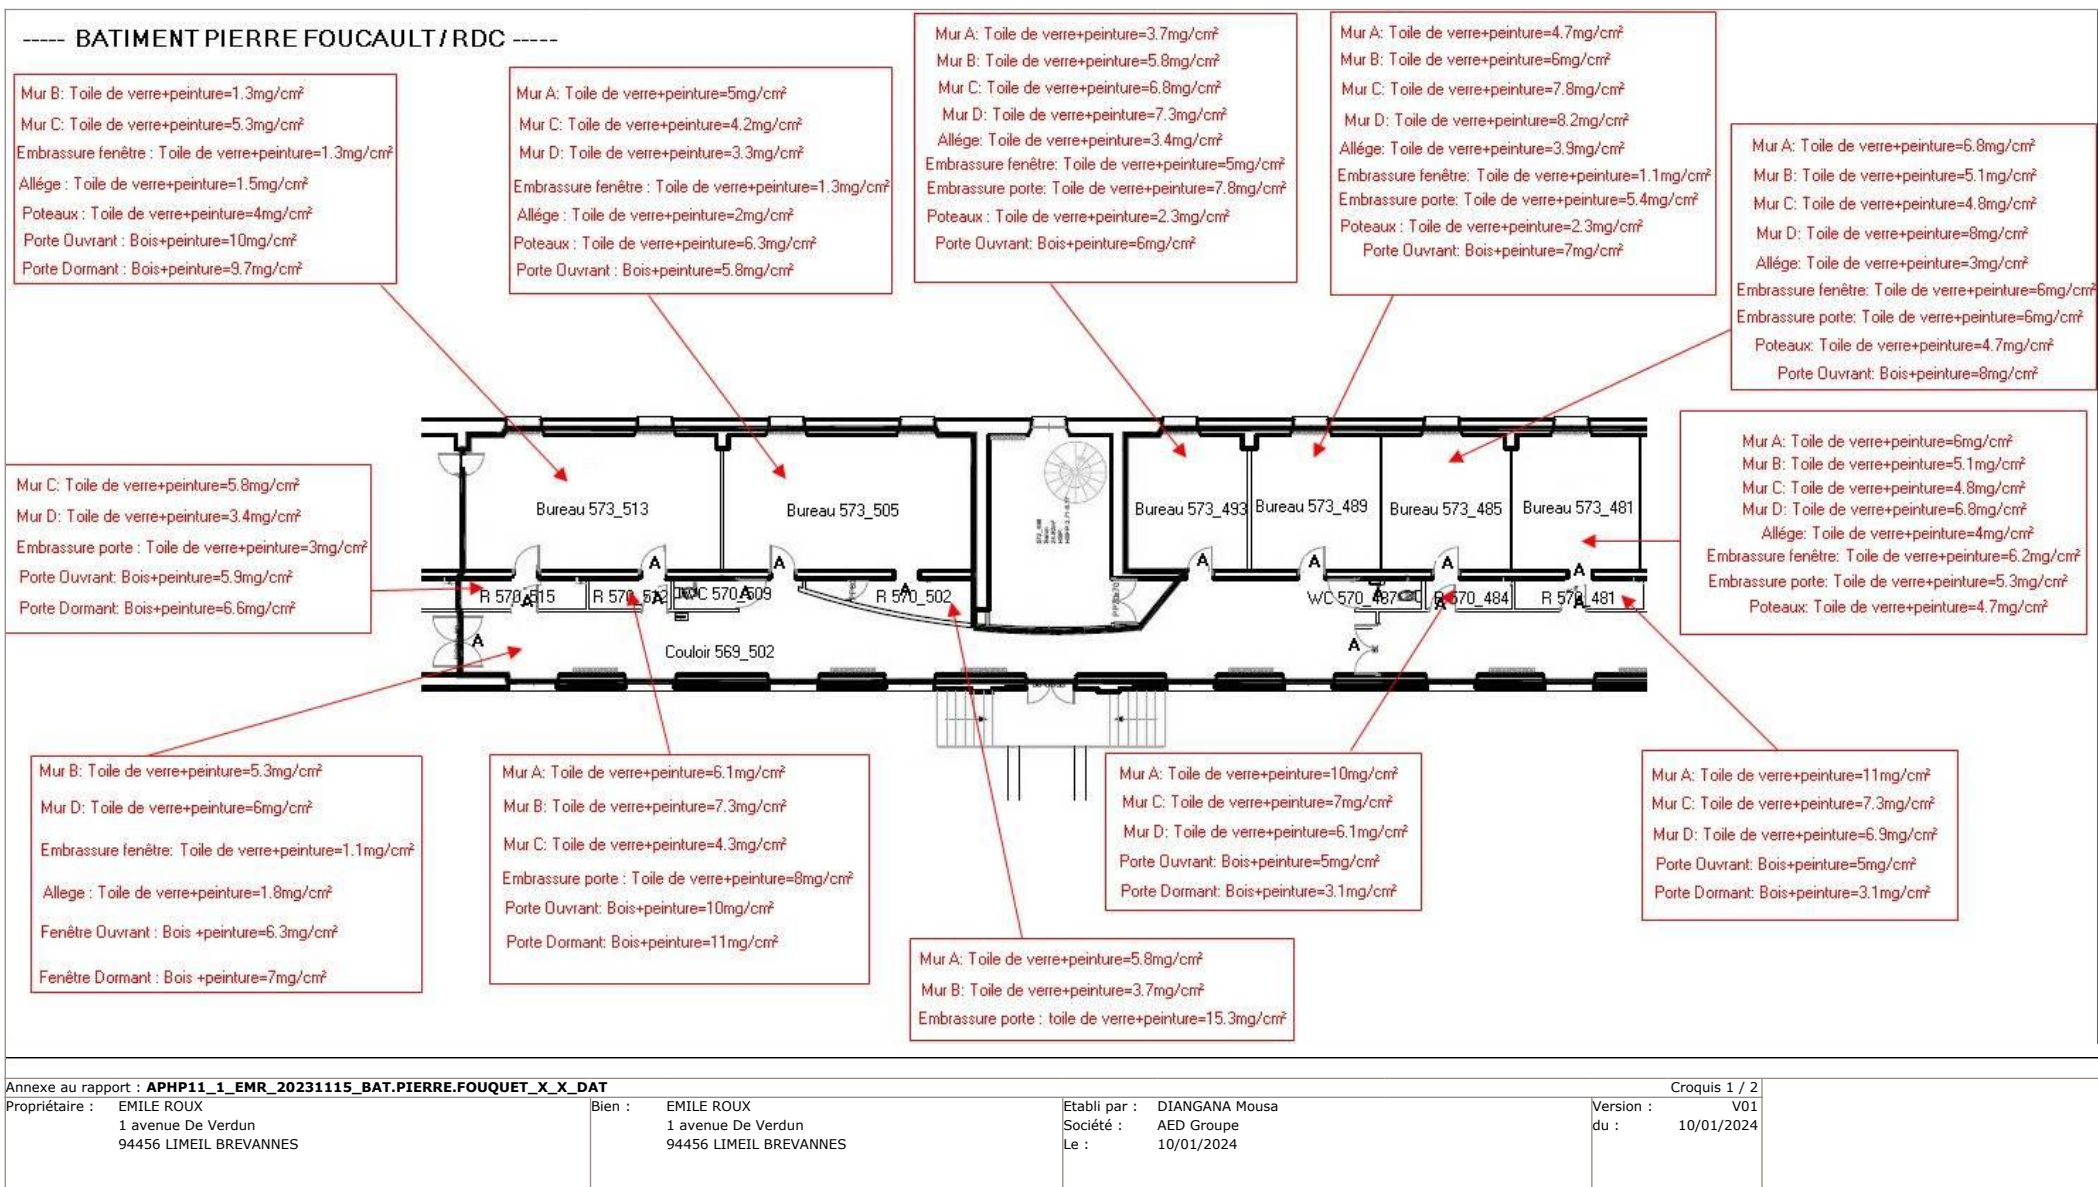

----- BATIMENT PIERRE FOUCAULT / RDC -----

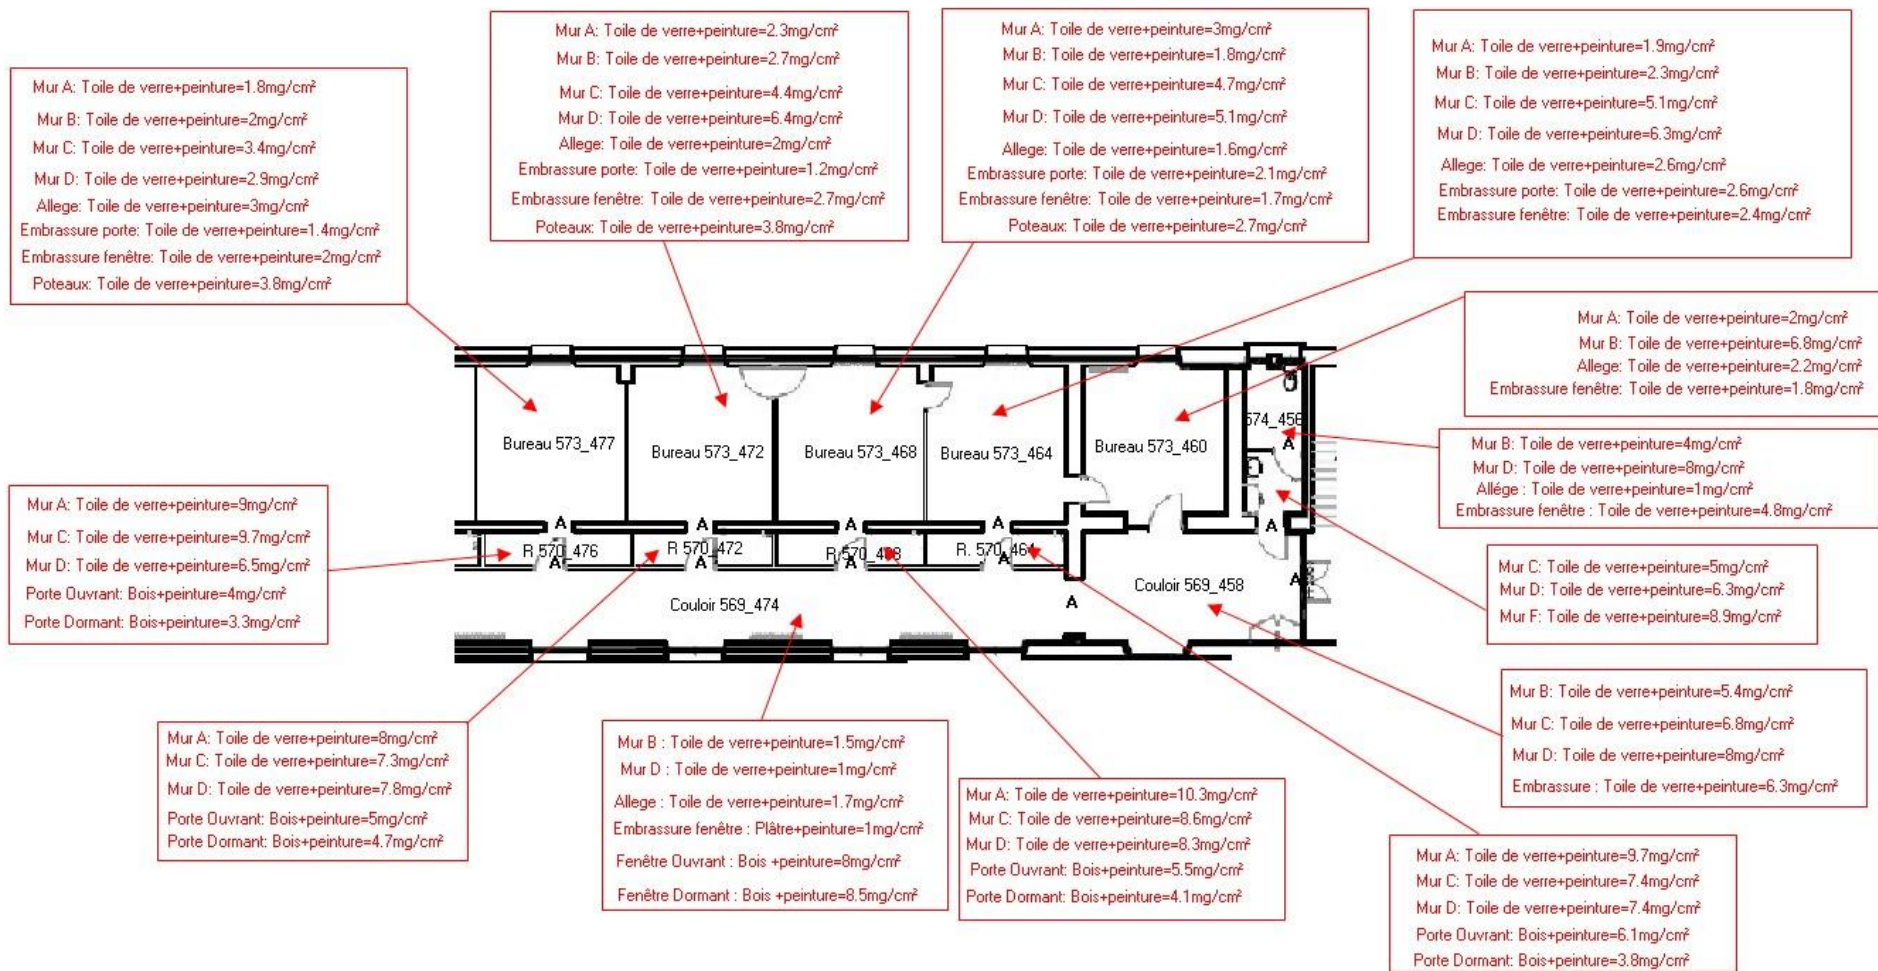

Annexe au rapport : APHP11_1_EMR_20231115_BAT.PIERRE.FOUQUET_X_X_DAT

Propriétaire : EMILE ROUX
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNESBien : EMILE ROUX
1 avenue De Verdun
94456 LIMEIL BREVANNESEtabli par : DIANGANA Mousa
Société : AED Groupe
Le : 10/01/2024Croquis 2 / 2
Version : V01
du : 10/01/2024

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

DIANGANA Mousa
sous le numéro 22-1813

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

- | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante sans mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amiante avec mention | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DPE individuel | Prise d'effet : 02/12/2022 | Validité : 01/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Gaz | Prise d'effet : 16/12/2022 | Validité : 15/12/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CREP | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Termites
Métropole | Prise d'effet : 12/10/2022 | Validité : 11/10/2029 |
| Zone d'intervention : France métropolitaine
Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Electricité | Prise d'effet : 30/11/2022 | Validité : 29/11/2029 |
| Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique. | | | |

22-1813 - v4 - 16/12/2022

SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC FR

AGENT

DE LA CHAPELLE STONESTREET
18 GALERIE MARCHANDE
33370 TRESSES

Tél : 0557341313

Fax : 05 57 34 06 62

Email : AGENCE.LCSTRESSES@AXA.FR

Portefeuille : 0033074244

Vos références :

Contrat n° 7627751904

Client n° 3425563404

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AED GROUPE
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 7627751904** ayant pris effet le **01/01/2023** garantissant sa responsabilité civile et professionnelle, tant pour son compte que pour celui de ses assurés additionnels :

A E D EXPERTISES
4 AVENUE GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED AMIANTE ET
ENVIRONNEMENT
226 RUE DE L'ECOSSAIS
69400 LIMAS

AED EXPERTISE CENTRE
AUVERGNE
1 allée Allan Turing
63170 AUBIERES

AED FIDELIS EXPERTISES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

AED SERVICES
4 AV GRAHAM BELL
33700 MERIGNAC

Pour l'ensemble des activités suivantes :

CONSTATS ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE (DDT)

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Etablissement des documents figurant dans la liste ci-après et exigés respectivement :

1/ **En cas de vente** d'un bien immobilier au titre de la constitution du dossier technique, et visés aux 1° à 7° de l'article L 271- 4 du Code de la Construction et de l'Habitation :

2/ **En cas de location** de bâtiments à usage principal d'habitation et de livraison de bâtiments neufs au titre de la constitution du dossier de diagnostic technique visé à l'article 3-3 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée

- Le constat de risque d'exposition au **plomb** prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la Santé Publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'**amiante** prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique ;
- L'état relatif à la présence de **termites** dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de **gaz** prévu à l'article L. 134-6 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état des **risques naturels, miniers et technologiques** prévu à l'article L125-5 du Code de l'environnement dans les zones mentionnées au même article
- Le diagnostic de performance énergétique (**DPE**) prévu à l'article L. 134-1 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure **d'électricité** prévu à l'article L. 134-7 du Code de la Construction et de l'habitation ;
- L'information sur la présence d'un risque de **mérule** prévu à l'article L133-9 du code de la Construction et de l'habitation

AUTRES PRESTATIONS

- Mesurages Loi Carrez et Loi Boutin
- Diagnostics de conformité aux normes de surface et d'habitabilité – prêt à taux zéro (PTZ)
- Etats de conformité de la sécurité des piscines
- Etats des lieux locatifs « Loi SCELLIER »
- Diagnostics radon
- Diagnostics relatifs à la présence d'insectes xylophages (autres que termites) et champignons lignivores
- Diagnostics réglementaires d'accessibilité handicapés
- Etat des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de raccordement au réseau d'assainissement collectif
- Rédaction des règlements de copropriété dont l'état descriptif de division (EDD)
- Calcul des tantièmes
- Contrôle de la sécurité de l'installation électrique
- Diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des bâtiments
- Diagnostic technique global (DTG)
- Recherche de fibres céramiques réfractaires (FCR)

DIAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE.

Repérages prévus aux articles R1334-20, R 1334-21 R 1334-22 du Code de la Santé publique,.

Evaluation périodique de l'état de conservation des matériaux prévue à l'article R 1334-27 du Code de la Santé publique.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Examens visuels prévus à l'article R 1334-29-3 du Code de la Santé publique.

Mesure d'empoussièrement prévue à l'article R 1334-25 du Code de la Santé publique.

Dossier Amiante des Parties Privatives (DAPP) prévu à l'article R 1334-29-4 du Code de la Santé publique

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS


DIAGNOSTICS PRODUITS - EQUIPEMENTS - MATERIAUX - DECHETS (PEMD)

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/07/2023** au **01/07/2024** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à TRESSES le 26 juin 2023

Pour la société :



NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
----------------------	-----------------------	----------------------------

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	10 000 000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	10 000 000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	2 000 000 € par année d'assurance	450 €
• Dommages immatériels non consécutifs	€ par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés	150 000 € par sinistre	
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2 000 000 € par année d'assurance dont 1 000 000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1 500 000 € par année d'assurance dont 1 500 000 € par sinistre	3 200 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance
