




N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026														
					N	D	J	F	M	Tri 2	A	M	J	Tri 3	J	A	S	Tri 4	O	N	D	Tri 1	J	F	M	Tri 2	A	M	J	Tri 3	J
1	PROJET MASN	354 jours	Mar 11/02/25	Mer 29/07/26																											
2	RESEAU EXTERIEUR	60 jours	Jeu 11/09/25	Ven 05/12/25																											
3	Arrivée Réseau de chaleur (disponible fin 2025)	60 jours	Jeu 11/09/25	Ven 05/12/25																											
4	Passage du réseau chaleur	60 jours	Jeu 11/09/25	Ven 05/12/25																											
5	PERIODE D'EXAMEN	301 jours	Mar 01/04/25	Mar 30/06/26																											
6	2025	58 jours	Mar 01/04/25	Ven 27/06/25																											
7	Oraux	38 jours	Mar 01/04/25	Mer 28/05/25																											
8	Pratiques	30 jours	Jeu 15/05/25	Ven 27/06/25																											
9	Ecrits	20 jours	Jeu 15/05/25	Ven 13/06/25																											
10	2026	61 jours	Mer 01/04/26	Mar 30/06/26																											
11	Oraux	39 jours	Mer 01/04/26	Mer 27/05/26																											
12	Pratiques	30 jours	Lun 18/05/26	Mar 30/06/26																											
13	Ecrits	20 jours	Lun 18/05/26	Mar 16/06/26																											
14	TRAVAUX	354 jours	Mar 11/02/25	Mer 29/07/26																											
15	Phase préparatoire	41 jours	Mar 11/02/25	Mer 09/04/25																											
16	Ordre de service numéro 1	1 jour	Mar 11/02/25	Mar 11/02/25																											
17	Remise des études exécutions	20 jours	Mer 12/02/25	Mar 11/03/25																											
18	Plan de synthèse des exécutions	15 jours	Mer 12/03/25	Mer 02/04/25																											
19	Remise plan structure	14 jours	Mer 12/02/25	Lun 03/03/25																											
20	Remise du PIC	10 jours	Mer 12/02/25	Mar 25/02/25																											
21	Validation du PIC MOE/SPS	4 jours	Mer 26/02/25	Lun 03/03/25																											
22	Remise plan des frangements	10 jours	Mar 04/03/25	Lun 17/03/25																											
23	Réalisation des visa MOE	14 jours	Mar 18/03/25	Lun 07/04/25																											
24	Remise des planning tâches	10 jours	Mer 12/02/25	Mar 25/02/25																											
25	Réalisation du planning TCE	20 jours	Mer 26/02/25	Mar 25/03/25																											
26	Envoi des OS Planning	1 jour	Mar 01/04/25	Mar 01/04/25																											
27	Remise des échantillons TCE	18 jours	Mer 12/02/25	Ven 07/03/25																											
28	Validations des échantillons	18 jours	Lun 10/03/25	Jeu 03/04/25																											
29	Etude organigramme	35 jours	Mer 12/02/25	Mer 02/04/25																											
30	Commande de matériaux	5 jours	Jeu 03/04/25	Mer 09/04/25																											
31	Dévoiemnt réseaux AEP-GAZ	17 jours	Mer 19/03/25	Ven 11/04/25																											
32	Terrassement	15 jours	Mer 19/03/25	Jeu 10/04/25																											
33	Dévoiemnt réseaux ELEC	10 jours	Ven 21/03/25	Ven 04/04/25																											
34	Dévoiemnt du réseaux GAZ	5 jours	Lun 07/04/25	Ven 11/04/25																											
35	Installation de chantier	9 jours	Mar 11/03/25	Ven 21/03/25																											
36	Constat d'huissier	1 jour	Mar 11/03/25	Mer 12/03/25																											
37	Clôtures et base-vie	5 jours	Mer 12/03/25	Mer 19/03/25																											
38	Voirie provisoire	2 jours	Mer 19/03/25	Jeu 20/03/25																											
39	Signalisation de chantier	1 jour	Ven 21/03/25	Ven 21/03/25																											
40	Phase Chantier sur existant	140 jours	Jeu 15/05/25	Lun 08/12/25																											



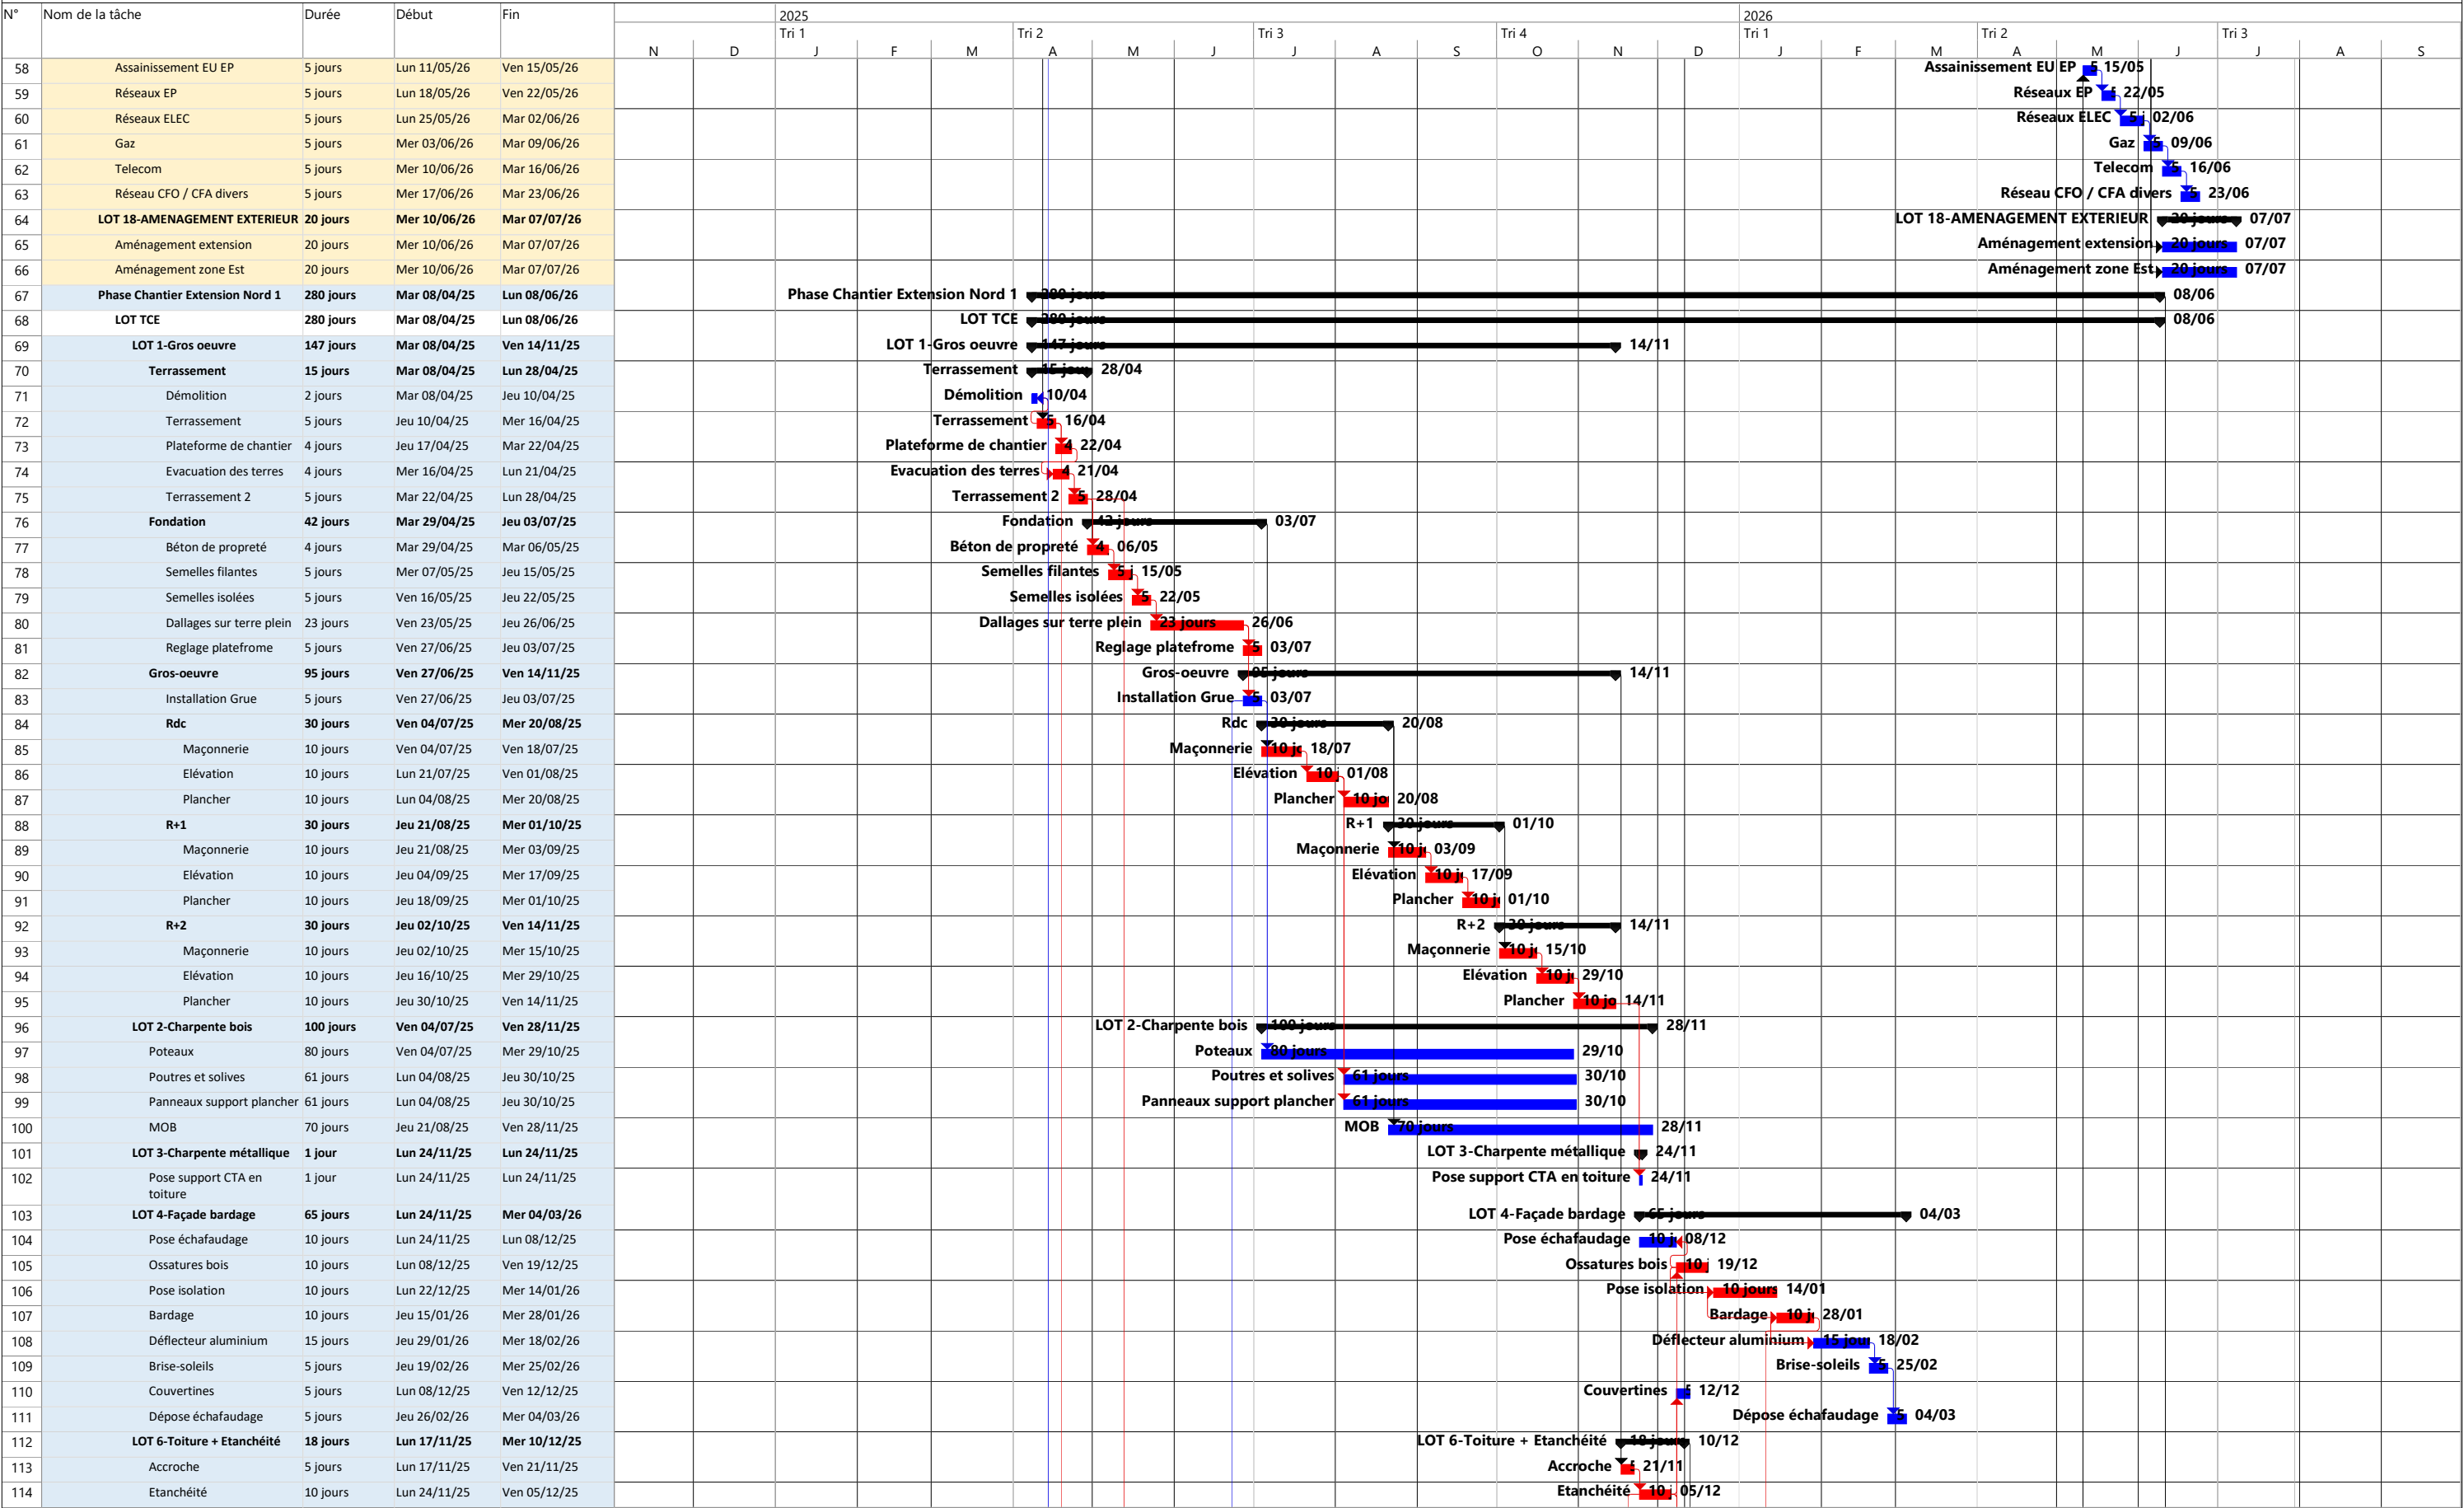

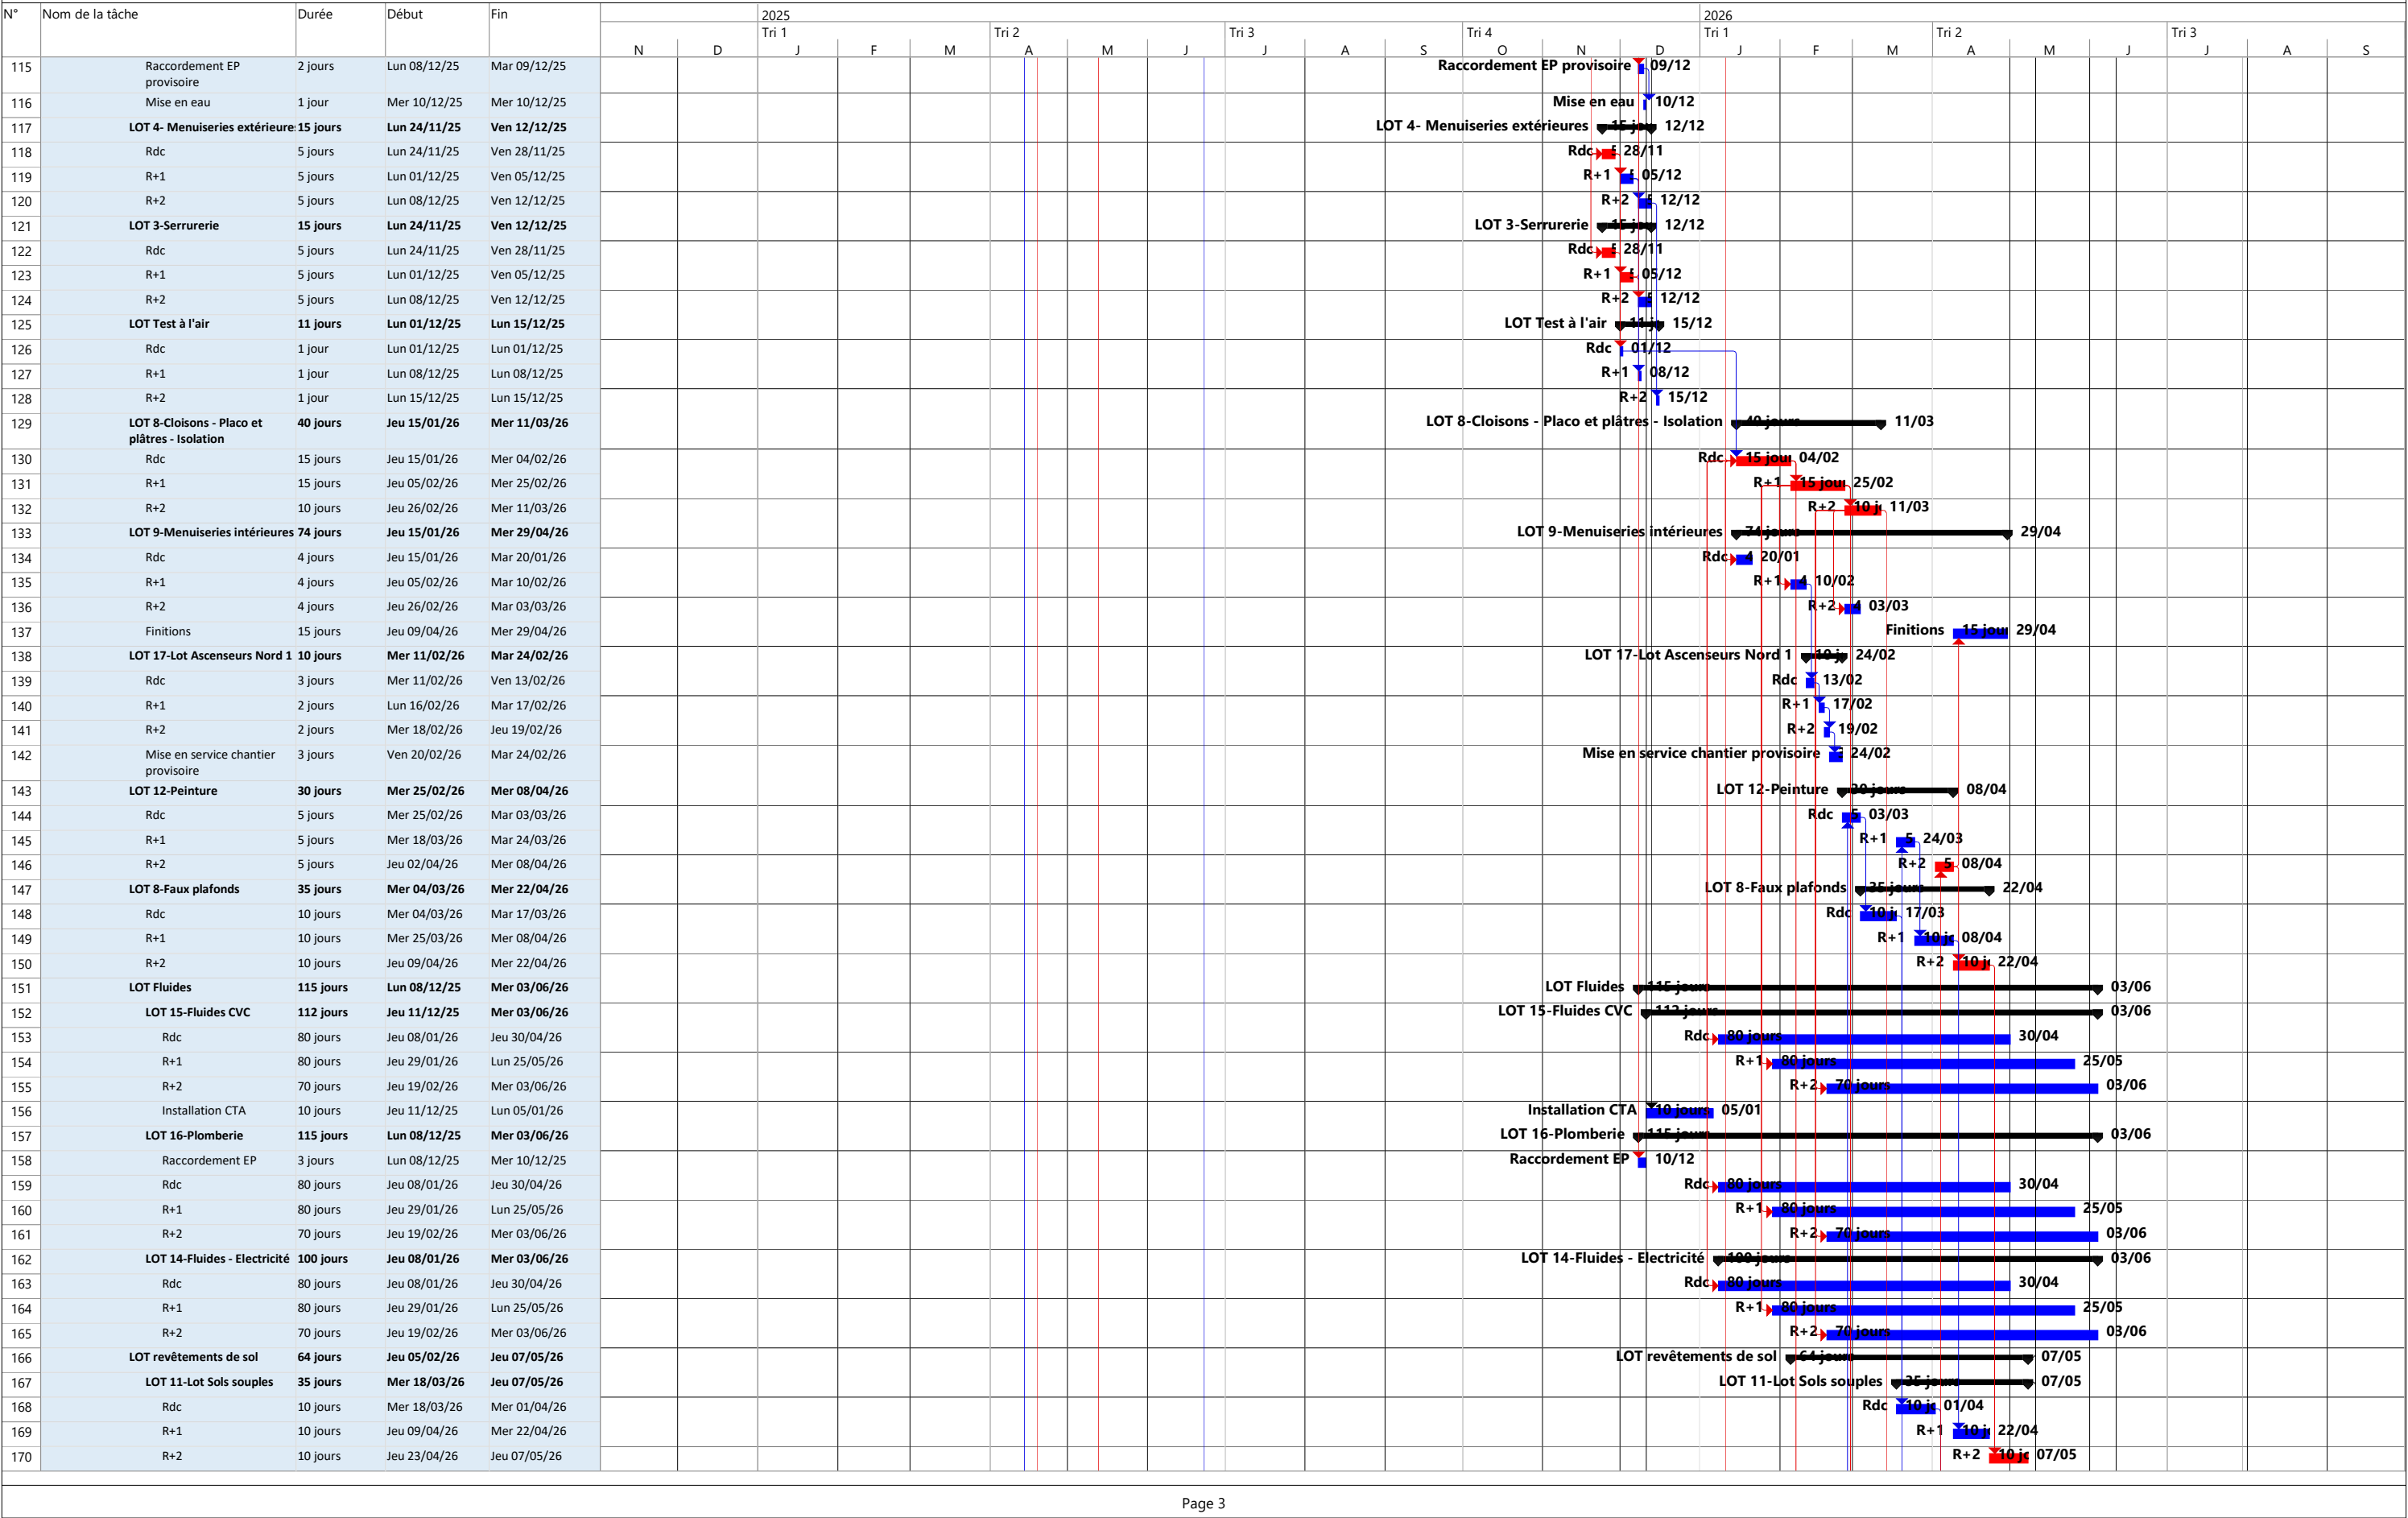

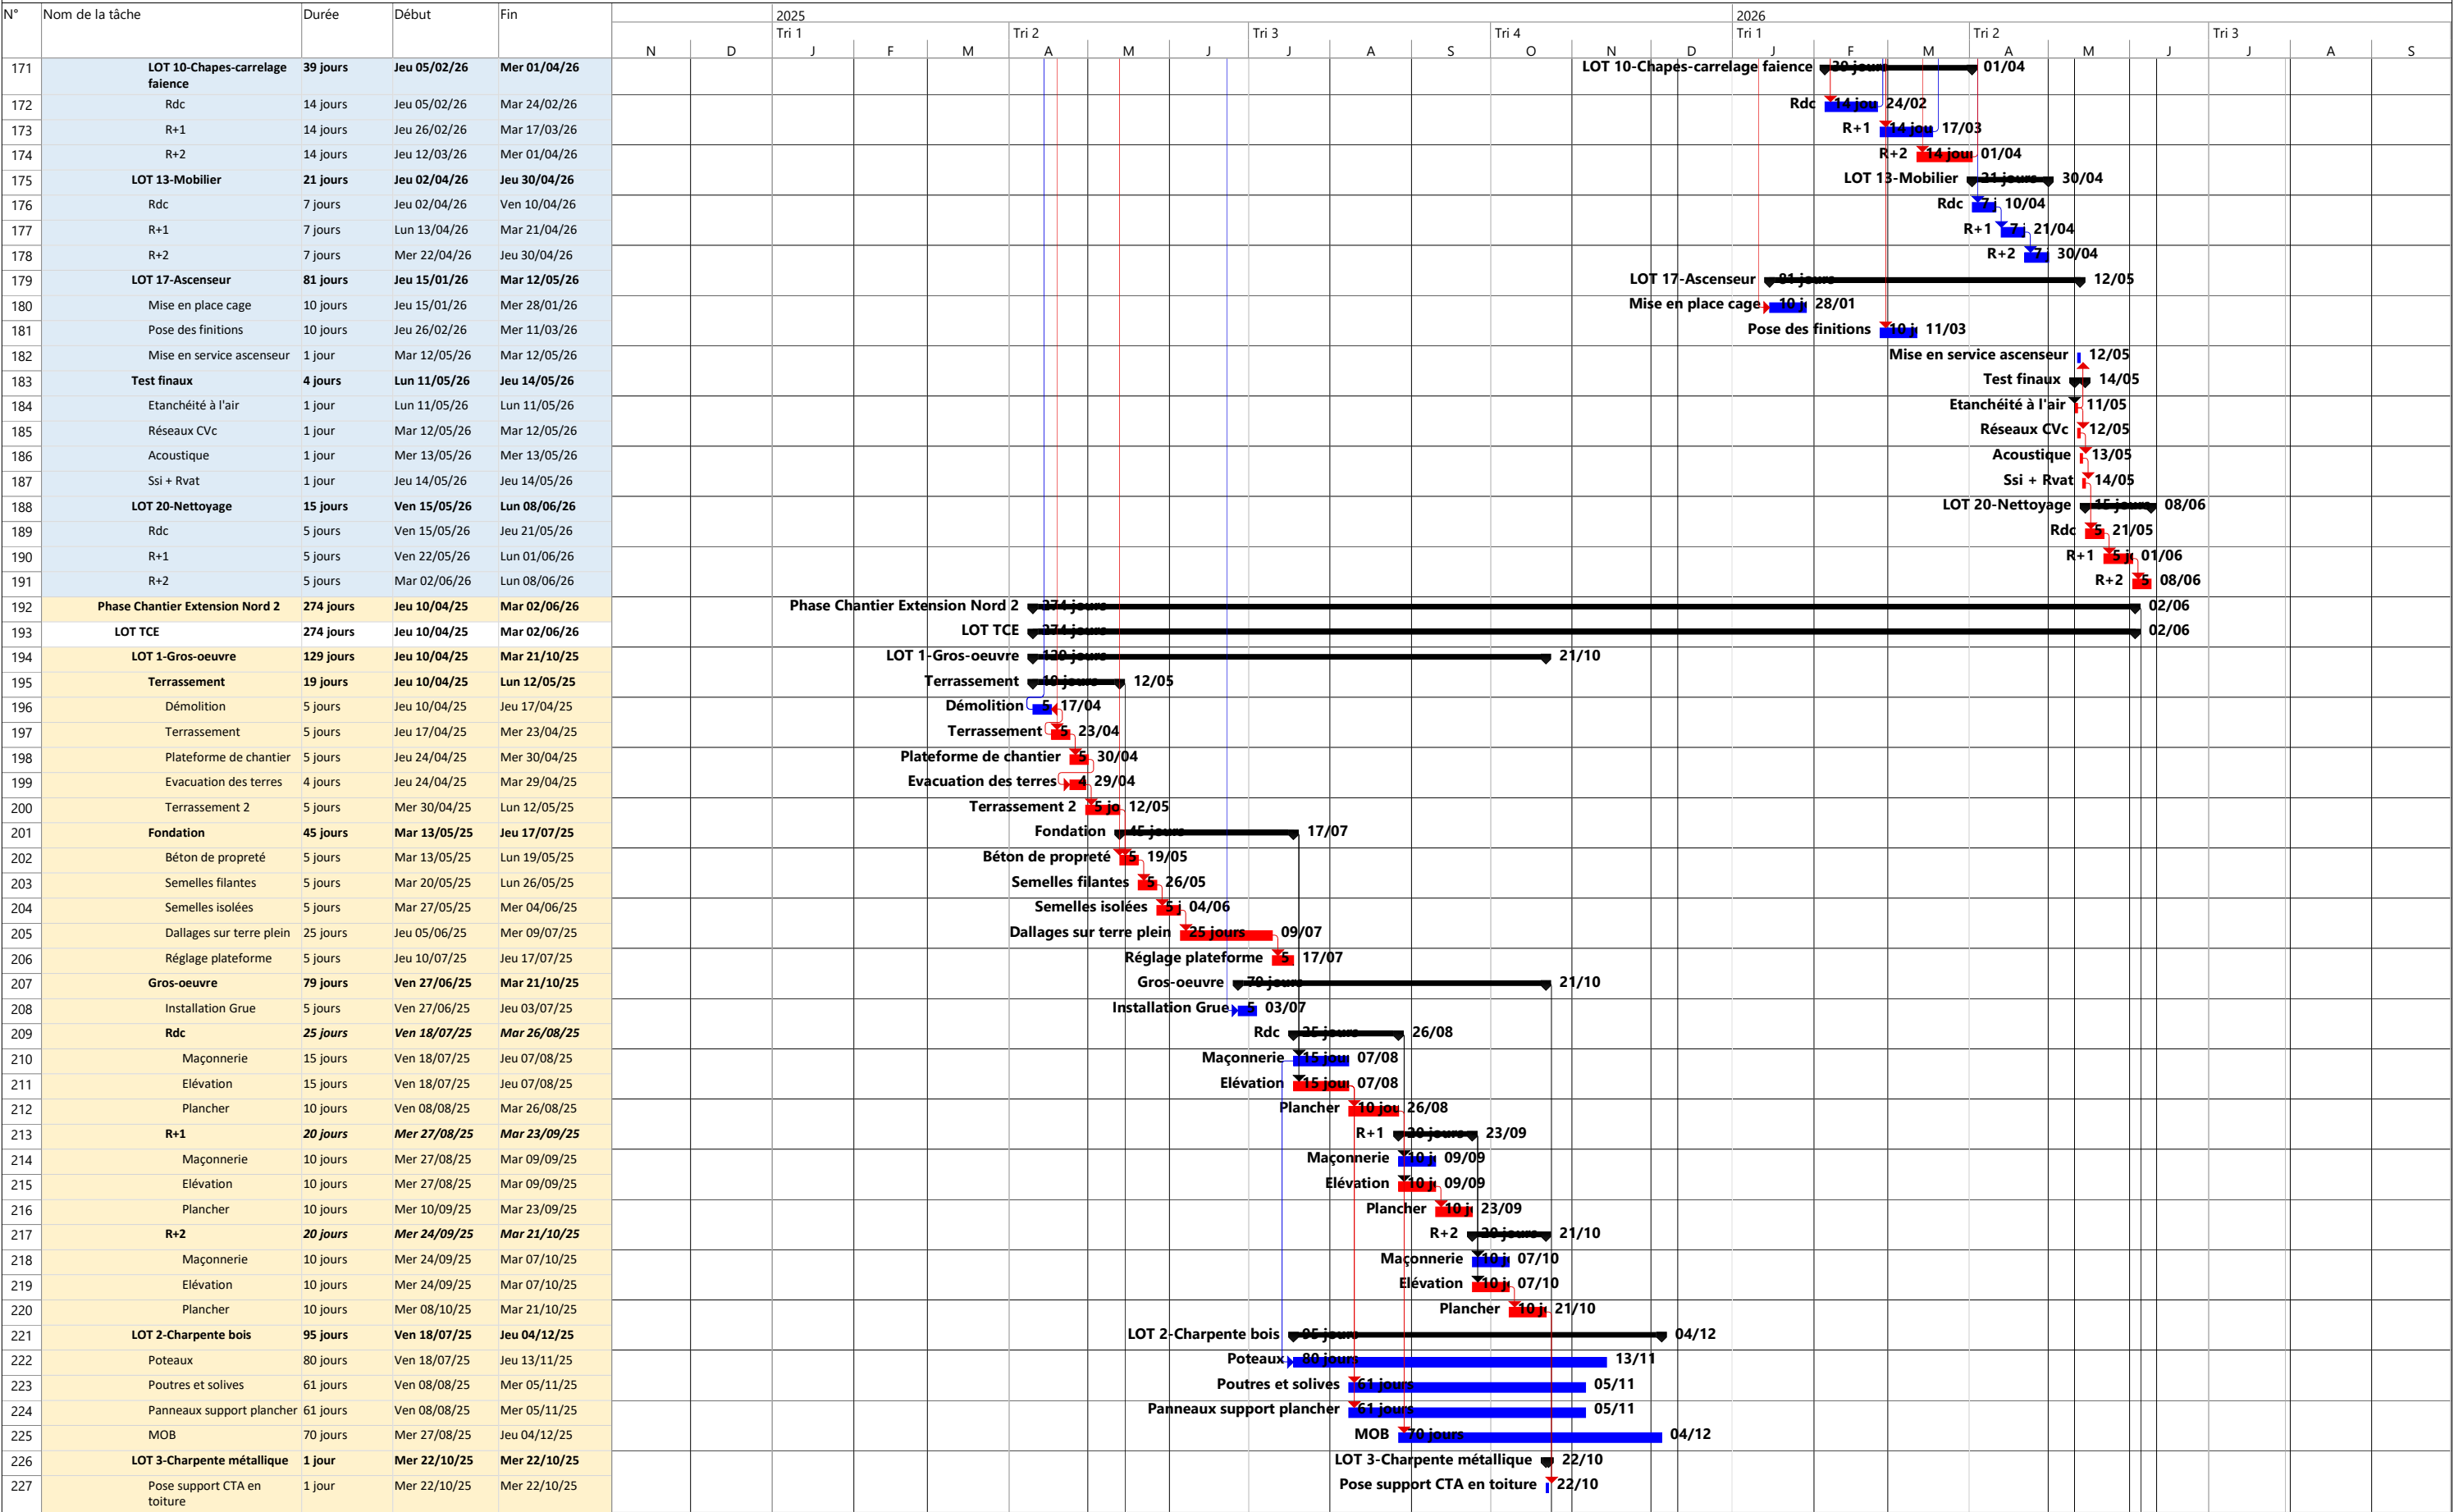

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026													
					N	D	Tri 1			A	M	J	Tri 3	A	S	Tri 4			D	Tri 1			M	Tri 2			J	Tri 3		
							J	F	M							O	N	J		F	M	A		M	S					
228	LOT 4-Façade bardage	65 jours	Mer 29/10/25	Mar 10/02/26																										
229	Pose échafaudage	10 jours	Mer 29/10/25	Ven 14/11/25																										
230	Ossatures bois	15 jours	Ven 14/11/25	Jeu 04/12/25																										
231	Pose isolation	15 jours	Ven 28/11/25	Jeu 18/12/25																										
232	Bardage	15 jours	Ven 12/12/25	Mar 13/01/26																										
233	Défecteur aluminium	15 jours	Mer 07/01/26	Mar 27/01/26																										
234	Brise-soleils	10 jours	Mer 21/01/26	Mar 03/02/26																										
235	Couvertines	10 jours	Ven 14/11/25	Jeu 27/11/25																										
236	Dépose échafaudage	5 jours	Mer 04/02/26	Mar 10/02/26																										
237	LOT 6-Toiture + Etanchéité	18 jours	Mer 22/10/25	Mar 18/11/25																										
238	Accroche	5 jours	Mer 22/10/25	Mar 28/10/25																										
239	Etanchéité	10 jours	Mer 29/10/25	Jeu 13/11/25																										
240	Raccordement EP provisoire	2 jours	Ven 14/11/25	Lun 17/11/25																										
241	Mise en eau	1 jour	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25																										
242	LOT 4-Menuiseries extérieures	15 jours	Mer 29/10/25	Jeu 20/11/25																										
243	Rdc	5 jours	Mer 29/10/25	Mar 04/11/25																										
244	R+1	5 jours	Mer 05/11/25	Jeu 13/11/25																										
245	R+2	5 jours	Ven 14/11/25	Jeu 20/11/25																										
246	LOT 3-Serrurerie	15 jours	Mer 29/10/25	Jeu 20/11/25																										
247	Rdc	5 jours	Mer 29/10/25	Mar 04/11/25																										
248	R+1	5 jours	Mer 05/11/25	Jeu 13/11/25																										
249	R+2	5 jours	Ven 14/11/25	Jeu 20/11/25																										
250	LOT Test à l'air	12 jours	Mer 05/11/25	Lun 24/11/25																										
251	Rdc	2 jours	Mer 05/11/25	Jeu 06/11/25																										
252	R+1	2 jours	Ven 14/11/25	Lun 17/11/25																										
253	R+2	2 jours	Ven 21/11/25	Lun 24/11/25																										
254	LOT 8-Cloisons - Placo et plâtres - Isolation	40 jours	Ven 19/12/25	Mar 24/02/26																										
255	Rdc	15 jours	Ven 19/12/25	Mar 20/01/26																										
256	R+1	15 jours	Mer 21/01/26	Mar 10/02/26																										
257	R+2	10 jours	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26																										
258	LOT 9-Menuiseries intérieures	85 jours	Ven 19/12/25	Mer 29/04/26																										
259	Rdc	4 jours	Ven 19/12/25	Lun 05/01/26																										
260	R+1	4 jours	Mer 21/01/26	Lun 26/01/26																										
261	R+2	4 jours	Mer 11/02/26	Lun 16/02/26																										
262	Finitions	20 jours	Jeu 02/04/26	Mer 29/04/26																										
263	LOT 12-Peinture	35 jours	Mer 11/02/26	Mer 01/04/26																										
264	Rdc	10 jours	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26																										
265	R+1	10 jours	Mer 04/03/26	Mar 17/03/26																										
266	R+2	10 jours	Mer 18/03/26	Mer 01/04/26																										
267	LOT 8-Faux plafonds	35 jours	Mer 25/02/26	Mer 15/04/26																										
268	Rdc	10 jours	Mer 25/02/26	Mar 10/03/26																										
269	R+1	10 jours	Mer 18/03/26	Mer 01/04/26																										
270	R+2	10 jours	Jeu 02/04/26	Mer 15/04/26																										
271	LOTS Fluides	130 jours	Ven 14/11/25	Mar 02/06/26																										
272	LOT 15-Fluides - CVC	127 jours	Mer 19/11/25	Mar 02/06/26																										
273	Rdc	80 jours	Ven 12/12/25	Mer 15/04/26																										
274	R+1	80 jours	Mer 14/01/26	Jeu 07/05/26																										
275	R+2	80 jours	Mer 04/02/26	Mar 02/06/26																										
276	Installation CTA	10 jours	Mer 19/11/25	Mar 02/12/25																										
277	LOT 16-Plomberie	130 jours	Ven 14/11/25	Mar 02/06/26																										
278	Raccordement EP	3 jours	Ven 14/11/25	Mar 18/11/25																										
279	Rdc	80 jours	Mer 21/01/26	Ven 15/05/26																										
280	R+1	75 jours	Mer 11/02/26	Mar 02/06/26																										
281	R+2	65 jours	Mer 25/02/26	Mar 02/06/26																										
282	LOT 14-Fluides - Electricité	110 jours	Ven 12/12/25	Mar 02/06/26																										
283	Rdc	80 jours	Ven 12/12/25	Mer 15/04/26																										
284	R+1	80 jours	Mer 14/01/26	Jeu 07/05/26																										

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					N	D	J	F	M	Tri 2		Tri 3		Tri 4		N	D	J	F	M	Tri 2		Tri 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
285	R+2	80 jours	Mer 04/02/26	Mar 02/06/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

N	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					N	D	J	F	M	Tri 2		Tri 3		Tri 4		N	D	J	F	M	Tri 2		Tri 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
360	Rdc	5 jours	Mer 29/04/26	Mer 06/05/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
