

Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)



BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

**BÂTIMENT MEDECINE
C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE
1, rue Jean Marie Laloy
BP 9
35560 ANTRAIN**

Propriétaire

C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE
1, rue Jean Marie Laloy
BP 9
35560 ANTRAIN

Demandeur

C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE
1, rue Jean Marie Laloy
BP 9
35560 ANTRAIN

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : **OUI** Démolition : **NON**

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 03/08/2023

Date de visite : 11/07/2023

Nombre de pages : 61

Fait à : 35706 RENNES CEDEX 7

Référence du dossier :
2307CBRREBCI059670/1

Le présent rapport est établi par :
Jean Marc FLAUX

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2023

Révision	Date	Objet
Version 01	11/07/2023	Etablissement des rapports de diagnostics amiante et plomb avant travaux.

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	6
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	7
2.	Stratégie de mesurage	7
3.	Présentation des résultats	8
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE	8
1.	Identification des locaux	8
2.	Identification des zones	8
3.	Identification des revêtements	8
4.	Identification des unités de repérage et substrat	9
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE	10
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	11
1.	Prestations réalisées :	11
2.	Personnes présentes lors de la visite :	11
3.	Informations complémentaires sur la visite	11
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	11
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission	11
VI.	RESULTATS DETAILLES	12
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX	51
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	56
	Annexe 3 - PV ANALYSES	57
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE	58
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	59
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	60

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Reconstruction du pôle sanitaire:

- Restructuration du bâtiment médecine
- Création d'une extension

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Sous-Sol	Dégagement 1
Sous-Sol	Dégagement 2
Sous-Sol	Dégagement 3
Sous-Sol	SSIAD
Sous-Sol	Wc 1
Sous-Sol	Wc 2
Sous-Sol	Douches
Sous-Sol	Vestiaire
Sous-Sol	Archives 1
Sous-Sol	Matériel
Sous-Sol	Dégt matériel
Sous-Sol	Archives 2
Sous-Sol	Rangement
Sous-Sol	Réserve 1
Sous-Sol	Dasri
Sous-Sol	Stockage
Sous-Sol	Méd Travail
Sous-Sol	Local technique
Sous-Sol	Local batteries
Sous-Sol	Réserve 2
Sous-Sol	Chaudière 1
Sous-Sol	Chaudière 2
Sous-Sol	Garage
Sous-Sol	Réserve garage
Sous-Sol	Cage d'escalier
Vide-sanitaire	Vide sanitaire
Rez de chaussée	Dégagement 1
Rez de chaussée	Dégagement 2
Rez de chaussée	Dégagement 3
Rez de chaussée	Dégagement 4
Rez de chaussée	Sas
Rez de chaussée	Séjour
Rez de chaussée	Linge propre
Rez de chaussée	Office
Rez de chaussée	Surveillante
Rez de chaussée	Sanitaires
Rez de chaussée	Salle de bains
Rez de chaussée	Linge sale

Rez de chaussée	Bureau partage
Rez de chaussée	Placard
Rez de chaussée	Bureau cadre
Rez de chaussée	Soins
Rez de chaussée	Reprographie
Rez de chaussée	Bureau médecin
Rez de chaussée	Chambre 2
Rez de chaussée	Chambre 3
Rez de chaussée	Chambre 4
Rez de chaussée	Chambre 5
Rez de chaussée	Chambre 6
Rez de chaussée	Chambre 7
Rez de chaussée	Chambre 8
Rez de chaussée	Chambre 9
Rez de chaussée	Chambre 10
Rez de chaussée	Chambre 11
Rez de chaussée	Chambre 12
Rez de chaussée	Chambre 13
Rez de chaussée	Chambre 14
Rez de chaussée	Chambre 15
Rez de chaussée	Chambre 16
Rez de chaussée	Chambre 17
Rez de chaussée	Chambre 18
Rez de chaussée	Cage d'escalier
Rez de chaussée	Sas extérieur
1er étage	Local technique
1er étage	Dégagement
1er étage	Salle de réunion
1er étage	SdB salle de réunion
1er étage	Psycho
1er étage	SdB Psycho
1er étage	Studio palliatif
1er étage	SdB palliatif
1er étage	Cage d'escalier
Rez de chaussée	SdB Ch. 2
Rez de chaussée	SdB Ch. 3
Rez de chaussée	SdB Ch. 4
Rez de chaussée	SdB Ch. 5
Rez de chaussée	SdB Ch. 6
Rez de chaussée	SdB Ch. 9
Rez de chaussée	SdB Ch. 10
Rez de chaussée	SdB Ch. 11
Rez de chaussée	SdB Ch. 12
Rez de chaussée	SdB Ch. 13
Rez de chaussée	SdB Ch. 14
Rez de chaussée	SdB Ch. 15
Rez de chaussée	SdB Ch. 16
Rez de chaussée	SdB Ch. 18

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
Néant	

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Néant		

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Etablissements sanitaires : Hôpitaux et cliniques
Année de construction : < 1997

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX2	
N° de série de l'appareil	22-1067	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	16/06/2022	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T350489	Date de déclaration 07/02/2022 00:00:00
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / m^{ai} 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)		

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	11/07/2023	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1516	11/07/2023	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Mr DELAUNAY

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Occupé

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Néant

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Plan de masse	Plan de masse
Sous-sol	Sous-sol
Sous-sol 2	Sous-sol 2
Sous-sol 3	Sous-sol 3
Sous-sol 4	Sous-sol 4
Rez-de-chaussée	Rez-de-chaussée
Rez-de-chaussée 2	Rez-de-chaussée 2
Rez-de-chaussée 3	Rez-de-chaussée 3
Rez-de-chaussée 4	Rez-de-chaussée 4
1er Etage	1er Etage

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Sous-Sol - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
3					Mur (partie haute)	0,3		
4					Mur (au centre)	0,06		
5	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
6					Mur (partie haute)	0,34		
7					Mur (au centre)	0,04		
8	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
9					Mur (partie haute)	0,39		
10					Mur (au centre)	0,35		
11	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
12					Mur (partie haute)	0,04		
13					Mur (au centre)	0,12		
14	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
15					Plafond (mesure 2)	0,02		
16	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,32		
17					Plinthes (mesure 2)	0,2		
18	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,26		
19					Radiateur (mesure 2)	0,29		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Dégagement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
20	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
21					Mur (partie haute)	0,36		
22					Mur (au centre)	0,08		
23	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,21		
24					Mur (partie haute)	0,23		
25					Mur (au centre)	0,05		
26	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,23		
27					Mur (partie haute)	0,09		
28					Mur (au centre)	0,17		
29	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
30					Mur (partie haute)	0,4		
31					Mur (au centre)	0,16		
32	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,12		
33					Plafond (mesure 2)	0,04		
34	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,27		
35					Plinthes (mesure 2)	0,37		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - Dégagement 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
36	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,14		
37					Mur (partie haute)	0,27		
38					Mur (au centre)	0,33		
39	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
40					Mur (partie haute)	0,17		
41					Mur (au centre)	0,2		
42	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
43					Mur (partie haute)	0,34		
44					Mur (au centre)	0,33		
45	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
46					Mur (partie haute)	0,02		
47					Mur (au centre)	0,25		
48	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09		
49					Plafond (mesure 2)	0,21		
50	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,34		
51					Plinthes (mesure 2)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - SSIAD

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
52	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
53					Mur (partie haute)	0,36		
54					Mur (au centre)	0,11		
55	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
56					Mur (partie haute)	0,31		
57					Mur (au centre)	0,02		
58	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
59					Mur (partie haute)	0,24		
60					Mur (au centre)	0,16		
61	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,4		
62					Mur (partie haute)	0,09		
63					Mur (au centre)	0,24		
64	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,4		
65					Plafond (mesure 2)	0,06		
66	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,21		
67					Plinthes (mesure 2)	0,19		
68	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01		
69					Porte (partie haute)	0,28		
70	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07		
71					Huisserie Porte (partie haute)	0,05		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Wc 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
72	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
73					Mur (partie haute)	0,22		
74					Mur (au centre)	0,06		
75	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
76					Mur (partie haute)	0,02		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
77					Mur (au centre)	0,36		
78	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06		
79					Mur (partie haute)	0,28		
80					Mur (au centre)	0,16		
81	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
82					Mur (partie haute)	0,1		
83					Mur (au centre)	0,37		
84	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,22		
85					Plafond (mesure 2)	0,39		
86	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05		
87					Porte (partie haute)	0,26		
88	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,37		
89					Huisserie Porte (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Wc 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
90	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05		
91					Mur (partie haute)	0,01		
92					Mur (au centre)	0,32		
93	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0		
94					Mur (partie haute)	0,18		
95					Mur (au centre)	0,03		
96	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
97					Mur (partie haute)	0,28		
98					Mur (au centre)	0,09		
99	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07		
100					Mur (partie haute)	0,06		
101					Mur (au centre)	0,38		
102	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07		
103					Plafond (mesure 2)	0,16		
104	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
105					Porte (partie haute)	0,21		
106	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,27		
107					Huisserie Porte (partie haute)	0,12		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Douches

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
108	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
109					Mur (partie haute)	0		
110					Mur (au centre)	0,24		
111	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
112					Mur (partie haute)	0,27		
113					Mur (au centre)	0,08		
114	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
115					Mur (partie haute)	0,04		
116					Mur (au centre)	0,23		
117	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
118					Mur (partie haute)	0,1		
119					Mur (au centre)	0,22		
120	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,27		
121					Plafond (mesure 2)	0,04		
122	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05		
123					Porte (partie haute)	0,24		
124	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,1		
125					Huisserie Porte (partie haute)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Vestiaire

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
126	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
127					Mur (partie haute)	0,34		
128					Mur (au centre)	0,37		
129	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
130					Mur (partie haute)	0,04		
131					Mur (au centre)	0,16		
132	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
133					Mur (partie haute)	0,31		
134					Mur (au centre)	0,13		
135	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
136					Mur (partie haute)	0,17		
137					Mur (au centre)	0,25		
138	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,27		
139					Plafond (mesure 2)	0,08		
140	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,2		
141					Porte (partie haute)	0,2		
142	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
143					Huisserie Porte (partie haute)	0,12		
144	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,05		
145					Radiateur (mesure 2)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Archives 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
146	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,35		
147					Sol (mesure 2)	0,01		
148	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
149					Mur (partie haute)	0,25		
150					Mur (au centre)	0,28		
151	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,23		
152					Mur (partie haute)	0,03		
153					Mur (au centre)	0,01		
154	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07		
155					Mur (partie haute)	0,1		
156					Mur (au centre)	0,33		
157	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,17		
158					Mur (partie haute)	0,29		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
159					Mur (au centre)	0,23		
160	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,3		
161					Plafond (mesure 2)	0,02		
162	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,31		
163					Plinthes (mesure 2)	0,06		
164	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,36		
165					Porte (partie haute)	0,26		
166	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,37		
167					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
168	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,19		
169					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,11		
170	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,12		
171					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,05		
172	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,17		
173					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,22		
174	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,34		
175					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0		
176	Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,16		
177					Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,14		
178	Huisserie Fenêtre 2 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie basse)	0,28		
179					Huisserie Fenêtre 2 intérieure (partie haute)	0,12		
180	Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,13		
181					Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,23		
182	Huisserie Fenêtre 2 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie basse)	0,39		
183					Huisserie Fenêtre 2 extérieure (partie haute)	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 17								

Sous-Sol - Matériel

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
184	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,12		
185					Sol (mesure 2)	0,12		
186	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
187					Mur (partie haute)	0,06		
188					Mur (au centre)	0,02		
189	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
190					Mur (partie haute)	0,26		
191					Mur (au centre)	0,33		
192	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,14		
193					Mur (partie haute)	0,38		
194					Mur (au centre)	0,39		
195	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
196					Mur (partie haute)	0,32		
197					Mur (au centre)	0,32		
198	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,19		
199					Plafond (mesure 2)	0,08		
200	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,29		
201					Porte (partie haute)	0,34		
202	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
203					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Dégât matériel

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
204	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,29		
205					Sol (mesure 2)	0,26		
206	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
207					Mur (partie haute)	0,35		
208					Mur (au centre)	0,15		
209	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
210					Mur (partie haute)	0,09		
211					Mur (au centre)	0,11		
212	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
213					Mur (partie haute)	0,29		
214					Mur (au centre)	0,3		
215	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
216					Mur (partie haute)	0,05		
217					Mur (au centre)	0,27		
218	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
219					Plafond (mesure 2)	0,31		
220	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,11		
221					Porte (partie haute)	0,01		
222	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
223					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Archives 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
224	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
225					Mur (partie haute)	0,26		
226					Mur (au centre)	0,37		
227	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
228					Mur (partie haute)	0,34		
229					Mur (au centre)	0,3		
230	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
231					Mur (partie haute)	0,4		
232					Mur (au centre)	0,06		
233	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
234					Mur (partie haute)	0,38		
235					Mur (au centre)	0,27		
236	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,15		
237					Plafond (mesure 2)	0,06		
238	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,24		
239					Plinthes (mesure 2)	0,07		
240	Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,31		
241					Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,03		
242	Huisserie Fenêtre 1 intérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie basse)	0,08		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
243					Huisserie Fenêtre 1 intérieure (partie haute)	0,21		
244	Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,27		
245					Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,01		
246	Huisserie Fenêtre 1 extérieure	B	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie basse)	0,18		
247					Huisserie Fenêtre 1 extérieure (partie haute)	0,04		
248	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,32		
249					Porte (partie haute)	0,22		
250	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03		
251					Huisserie Porte (partie haute)	0,19		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-Sol - Rangement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
252	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,14		
253					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07		
254	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07		
255					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,11		
256	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,12		
257					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,17		
258	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,3		
259					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,36		
260	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,12		
261					Porte (partie haute)	0,2		
262	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,24		
263					Huisserie Porte (partie haute)	0,18		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - Réserve 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
264	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,38		
265					Porte (partie haute)	0,36		
266	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,16		
267					Huisserie Porte (partie haute)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Sous-Sol - Dasri

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
268	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
269					Mur (partie haute)	0,16		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
270					Mur (au centre)	0,26		
271	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
272					Mur (partie haute)	0,02		
273					Mur (au centre)	0,08		
274					Mur (partie basse)	0,38		
275	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,06		
276					Mur (au centre)	0,1		
277					Mur (partie basse)	0,19		
278	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,09		
279					Mur (au centre)	0,37		
280					Mur (partie basse)	0,19		
281	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,28		
282	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,31		
283					Fenêtre intérieure (partie basse)	0,2		
284	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie haute)	0,13		
285					Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,25		
286	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,3		
287					Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02		
288	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08		
289					Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,22		
290	Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,4		
291					Porte (partie basse)	0,36		
292	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie haute)	0,2		
293					Huisserie Porte (partie basse)	0,21		
					Huisserie Porte (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Sous-Sol - Stockage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
294	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,29		
295					Sol (mesure 2)	0,28		
296	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0		
297					Mur (partie haute)	0,29		
298					Mur (au centre)	0,39		
299	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
300					Mur (partie haute)	0,04		
301					Mur (au centre)	0,1		
302	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
303					Mur (partie haute)	0,08		
304					Mur (au centre)	0,22		
305	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
306					Mur (partie haute)	0,11		
307					Mur (au centre)	0,09		
308	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01		
309					Plafond (mesure 2)	0,04		
310	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,32		
311					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,26		
312	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,37		
313					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
314	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15		
315					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
316	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,35		
317					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12		
318	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09		
319					Porte (partie haute)	0,33		
320	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23		
321					Huisserie Porte (partie haute)	0,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-Sol - Méd Travail

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
322	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
323					Mur (partie haute)	0,38		
324					Mur (au centre)	0,3		
325	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,4		
326					Mur (partie haute)	0,09		
327					Mur (au centre)	0,13		
328	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,14		
329					Mur (partie haute)	0,2		
330					Mur (au centre)	0,04		
331	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
332					Mur (partie haute)	0,32		
333					Mur (au centre)	0,17		
334	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,21		
335					Plafond (mesure 2)	0,2		
336	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0		
337					Plinthes (mesure 2)	0,03		
338	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,02		
339					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,36		
340	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,08		
341					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02		
342	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,15		
343					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,21		
344	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05		
345					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,12		
346	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
347					Porte (partie haute)	0,03		
348	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,33		
349					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-Sol - Local technique

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
350	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
351					Mur (partie haute)	0,11		
352					Mur (au centre)	0,03		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
353	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
354					Mur (partie haute)	0,11		
355					Mur (au centre)	0,26		
356	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
357					Mur (partie haute)	0,32		
358					Mur (au centre)	0,06		
359	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
360					Mur (partie haute)	0,34		
361					Mur (au centre)	0,29		
362	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,34		
363					Plafond (mesure 2)	0,32		
364	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,13		
365					Plinthes (mesure 2)	0,16		
366	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
367					Porte (partie haute)	0,08		
368	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,1		
369					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Local batteries

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
370	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
371					Mur (partie haute)	0,21		
372					Mur (au centre)	0,09		
373	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
374					Mur (partie haute)	0,29		
375					Mur (au centre)	0,15		
376	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
377					Mur (partie haute)	0,03		
378					Mur (au centre)	0,4		
379	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05		
380					Mur (partie haute)	0,16		
381					Mur (au centre)	0,09		
382	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,39		
383					Plafond (mesure 2)	0,34		
384	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05		
385					Plinthes (mesure 2)	0,19		
386	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
387					Porte (partie haute)	0,07		
388	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,02		
389					Huisserie Porte (partie haute)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Sous-Sol - Réserve 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
390	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
391					Mur (partie haute)	0,26		
392					Mur (au centre)	0,25		
393	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
394	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0		
395					Mur (au centre)	0,1		
396					Mur (partie basse)	0,27		
397					Mur (partie haute)	0,4		
398					Mur (au centre)	0,06		
399	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
400					Mur (partie haute)	0,19		
401					Mur (au centre)	0,34		
402	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,28		
403					Plafond (mesure 2)	0,08		
404	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05		
405					Porte (partie haute)	0,12		
406	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,15		
407					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Sous-Sol - Chaufferie 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
408	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
409					Mur (partie haute)	0,34		
410					Mur (au centre)	0,28		
411	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
412					Mur (partie haute)	0,2		
413					Mur (au centre)	0,08		
414	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
415					Mur (partie haute)	0,3		
416					Mur (au centre)	0,16		
417	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
418					Mur (partie haute)	0,18		
419					Mur (au centre)	0,26		
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

Sous-Sol - Chaufferie 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
420	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,06		
421					Mur (partie haute)	0,17		
422					Mur (au centre)	0,1		
423	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
424					Mur (partie haute)	0,2		
425					Mur (au centre)	0,11		
426	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
427					Mur (partie haute)	0,37		
428					Mur (au centre)	0,22		
429	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,17		
430					Mur (partie haute)	0,07		
431					Mur (au centre)	0,28		
432	Porte	A	Métal	Peinture	Porte (partie basse)	0,26		
433					Porte (partie haute)	0,25		
434	Huisserie Porte	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
435					Huisserie Porte (partie haute)	0,18		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Sous-Sol - Garage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
436	Porte	B	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,36		
437					Porte (partie haute)	0		
438	Huisserie Porte	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,36		
439					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Sous-Sol - Réserve garage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
440	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,31		
441					Porte (partie haute)	0,38		
442	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,24		
443					Huisserie Porte (partie haute)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Sous-Sol - Cage d'escalier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
444	Sol		Béton	peinture	Sol (mesure 1)	0,34		
445					Sol (mesure 2)	0,14		
446	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
447					Mur (partie haute)	0,26		
448					Mur (au centre)	0,18		
449	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
450					Mur (partie haute)	0,22		
451					Mur (au centre)	0,27		
452	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
453					Mur (partie haute)	0,08		
454					Mur (au centre)	0,32		
455	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
456					Mur (partie haute)	0,35		
457					Mur (au centre)	0,3		
458	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,2		
459					Porte (partie haute)	0,07		
460	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,39		
461					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Vide-sanitaire - Vide sanitaire

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
462	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,4		
463					Porte (partie haute)	0,28		
464	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,38		
465					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

Rez de chaussée - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
466	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
467					Mur (partie haute)	0,19		
468					Mur (au centre)	0,33		
469	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
470					Mur (partie haute)	0,22		
471					Mur (au centre)	0,16		
472	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,21		
473					Mur (partie haute)	0,19		
474					Mur (au centre)	0,4		
475	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
476					Mur (partie haute)	0,26		
477					Mur (au centre)	0,15		
478	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,36		
479					Porte (partie haute)	0,01		
480	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,14		
481					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
482	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,36		
483					Radiateur (mesure 2)	0,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Dégagement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
484	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
485					Mur (partie haute)	0,02		
486					Mur (au centre)	0,22		
487	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
488					Mur (partie haute)	0,26		
489					Mur (au centre)	0,29		
490	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
491					Mur (partie haute)	0,36		
492					Mur (au centre)	0,08		
493	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,21		
494					Mur (partie haute)	0,23		
495					Mur (au centre)	0,34		
496	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,23		
497					Porte (partie haute)	0,38		
498	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,17		
499					Huisserie Porte (partie haute)	0,03		
500	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,29		
501					Radiateur (mesure 2)	0,06		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Dégagement 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
502	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
503					Mur (partie haute)	0,04		
504					Mur (au centre)	0,04		
505	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
506					Mur (partie haute)	0,12		
507					Mur (au centre)	0,08		
508	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
509					Mur (partie haute)	0,07		
510					Mur (au centre)	0,24		
511	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
512					Mur (partie haute)	0,04		
513					Mur (au centre)	0,05		
514	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,33		
515					Porte (partie haute)	0,13		
516	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
517					Huisserie Porte (partie haute)	0,05		
518	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,14		
519					Radiateur (mesure 2)	0,23		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Dégagement 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
520	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
521					Mur (partie haute)	0,28		
522					Mur (au centre)	0,34		
523	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
524					Mur (partie haute)	0,32		
525					Mur (au centre)	0,07		
526	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
527					Mur (partie haute)	0,36		
528					Mur (au centre)	0,34		
529	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
530					Mur (partie haute)	0,28		
531					Mur (au centre)	0,11		
532	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,18		
533					Porte (partie haute)	0,3		
534	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,35		
535					Huisserie Porte (partie haute)	0,08		
536	Radiateur		Métal	Peinture	Radiateur (mesure 1)	0,02		
537					Radiateur (mesure 2)	0,29		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Sas

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
538	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
539	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,38		
540					Mur (au centre)	0,36		
541					Mur (partie basse)	0,36		
542					Mur (partie haute)	0,12		
543					Mur (au centre)	0,09		
544	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
545					Mur (partie haute)	0,26		
546					Mur (au centre)	0,3		
547	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
548					Mur (partie haute)	0,04		
549					Mur (au centre)	0,06		
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

Rez de chaussée - Séjour

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
550	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
551					Mur (partie haute)	0,06		
552					Mur (au centre)	0,32		
553	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
554					Mur (partie haute)	0,02		
555					Mur (au centre)	0,23		
556	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
557					Mur (partie haute)	0,34		
558					Mur (au centre)	0,27		
559	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
560					Mur (partie haute)	0,3		
561					Mur (au centre)	0,35		
562	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,1		
563					Plafond (mesure 2)	0,16		
564	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,31		
565					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,4		
566	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,03		
567					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,38		
568	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,28		
569					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,09		
570	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,25		
571					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,22		
572	Porte	A	Métal	Peinture	Porte (partie basse)	0,38		
573					Porte (partie haute)	0,38		
574	Huisserie Porte	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,32		
575					Huisserie Porte (partie haute)	0,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Linge propre

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
576	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,17		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
577	Mur	B	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie haute)	0,18		
578					Mur (au centre)	0		
579					Mur (partie basse)	0,19		
580					Mur (partie haute)	0,04		
581					Mur (au centre)	0,12		
582	Mur	C	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,14		
583					Mur (partie haute)	0,35		
584					Mur (au centre)	0,12		
585	Mur	D	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,07		
586					Mur (partie haute)	0,39		
587					Mur (au centre)	0,4		
588	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,32		
589					Plafond (mesure 2)	0,07		
590	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,22		
591					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,28		
592	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,13		
593					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,2		
594	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05		
595					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24		
596	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,1		
597					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,3		
598	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,38		
599					Porte (partie haute)	0,34		
600	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,37		
601					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Office

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
602	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
603					Mur (partie haute)	0,16		
604					Mur (au centre)	0,1		
605	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
606					Mur (partie haute)	0,02		
607					Mur (au centre)	0,3		
608	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06		
609					Mur (partie haute)	0,25		
610					Mur (au centre)	0,12		
611	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
612					Mur (partie haute)	0,14		
613					Mur (au centre)	0,21		
614	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,12		
615					Plafond (mesure 2)	0,12		
616	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,05		
617					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,2		
618	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,16		
619					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07		
620	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,29		
621					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,17		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
622	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,14		
623					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,28		
624	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,23		
625					Porte (partie haute)	0,03		
626	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01		
627					Huisserie Porte (partie haute)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Surveillante

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
628	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
629					Mur (partie haute)	0,33		
630					Mur (au centre)	0,22		
631	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
632					Mur (partie haute)	0,23		
633					Mur (au centre)	0,36		
634	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
635					Mur (partie haute)	0,03		
636					Mur (au centre)	0,01		
637	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
638					Mur (partie haute)	0,24		
639					Mur (au centre)	0,04		
640	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,26		
641					Plafond (mesure 2)	0,34		
642	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,01		
643					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,12		
644	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,05		
645					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,17		
646	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,22		
647					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,34		
648	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0		
649					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,14		
650	Porte	A	Métal	Peinture	Porte (partie basse)	0,14		
651					Porte (partie haute)	0,28		
652	Huisserie Porte	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
653					Huisserie Porte (partie haute)	0,02		
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

Rez de chaussée - Sanitaires

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
654	Mur	A	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,3		
655					Mur (partie haute)	0,21		
656					Mur (au centre)	0,2		
657	Mur	B	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,32		
658					Mur (partie haute)	0,21		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
659					Mur (au centre)	0,31		
660	Mur	C	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie basse)	0,23		
661					Mur (partie haute)	0,36		
662					Mur (au centre)	0,02		
663					Mur (partie basse)	0,32		
664	Mur	D	Plâtre	toile de verre peinte	Mur (partie haute)	0		
665					Mur (au centre)	0,14		
666					Plafond (mesure 1)	0,24		
667	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,03		
668					Porte (partie basse)	0,26		
669	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie haute)	0,22		
670					Huisserie Porte (partie basse)	0,25		
671	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie haute)	0,19		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Salle de bains

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
672	Mur	A	Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,18		
673					Mur (partie haute)	0,3		
674					Mur (au centre)	0,24		
675	Mur	B	Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,19		
676					Mur (partie haute)	0,01		
677					Mur (au centre)	0,18		
678	Mur	C	Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,2		
679					Mur (partie haute)	0,38		
680					Mur (au centre)	0,25		
681	Mur	D	Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,36		
682					Mur (partie haute)	0,12		
683					Mur (au centre)	0,09		
684	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,25		
685					Porte (partie haute)	0,25		
686	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,19		
687					Huisserie Porte (partie haute)	0,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Rez de chaussée - Linge sale

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
688	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
689					Mur (partie haute)	0,05		
690					Mur (au centre)	0,27		
691	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06		
692					Mur (partie haute)	0,31		
693					Mur (au centre)	0,39		
694	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
695					Mur (partie haute)	0,22		
696					Mur (au centre)	0,38		
697	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
698					Mur (partie haute)	0,26		
699					Mur (au centre)	0,26		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
700	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,19		
701					Plafond (mesure 2)	0,34		
702	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09		
703					Porte (partie haute)	0,15		
704	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,4		
705					Huisserie Porte (partie haute)	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Bureau partage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
706	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
707					Mur (partie haute)	0,38		
708					Mur (au centre)	0,28		
709	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
710					Mur (partie haute)	0,36		
711					Mur (au centre)	0,35		
712	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07		
713					Mur (partie haute)	0,36		
714					Mur (au centre)	0,05		
715	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
716					Mur (partie haute)	0,21		
717					Mur (au centre)	0,27		
718	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,17		
719					Plafond (mesure 2)	0,26		
720	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,12		
721					Porte (partie haute)	0,38		
722	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,28		
723					Huisserie Porte (partie haute)	0,16		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Placard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
724	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
725					Mur (partie haute)	0,1		
726					Mur (au centre)	0,34		
727	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
728					Mur (partie haute)	0,04		
729					Mur (au centre)	0,09		
730	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
731					Mur (partie haute)	0,16		
732					Mur (au centre)	0,04		
733	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05		
734					Mur (partie haute)	0,24		
735					Mur (au centre)	0,1		
736	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,1		
737					Plafond (mesure 2)	0,27		
738	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08		
739					Porte (partie haute)	0,4		
740	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,4		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
741					Huisserie Porte (partie haute)	0,04		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Bureau cadre

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
742	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
743					Mur (partie haute)	0,29		
744					Mur (au centre)	0,2		
745	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
746					Mur (partie haute)	0,2		
747					Mur (au centre)	0,06		
748	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
749					Mur (partie haute)	0,26		
750					Mur (au centre)	0,37		
751	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
752					Mur (partie haute)	0,19		
753					Mur (au centre)	0,01		
754	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,32		
755					Plafond (mesure 2)	0,02		
756	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,19		
757					Porte (partie haute)	0,32		
758	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,38		
759					Huisserie Porte (partie haute)	0,12		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Soins

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
760	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
761					Mur (partie haute)	0,26		
762					Mur (au centre)	0,1		
763	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,4		
764					Mur (partie haute)	0,27		
765					Mur (au centre)	0,18		
766	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,36		
767					Mur (partie haute)	0,3		
768					Mur (au centre)	0,19		
769	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
770					Mur (partie haute)	0,2		
771					Mur (au centre)	0,33		
772	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,12		
773					Plafond (mesure 2)	0,29		
774	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,16		
775					Plinthes (mesure 2)	0,35		
776	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,26		
777					Porte (partie haute)	0,07		
778	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23		
779					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Rez de chaussée - Reprographie

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
780	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
781					Mur (partie haute)	0,22		
782					Mur (au centre)	0,15		
783	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
784					Mur (partie haute)	0,15		
785					Mur (au centre)	0,16		
786	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
787					Mur (partie haute)	0,32		
788					Mur (au centre)	0,17		
789	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
790					Mur (partie haute)	0,12		
791					Mur (au centre)	0,33		
792	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,31		
793					Plafond (mesure 2)	0,3		
794	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,32		
795					Plinthes (mesure 2)	0,21		
796	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,28		
797					Porte (partie haute)	0,33		
798	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06		
799					Huisserie Porte (partie haute)	0,12		

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Rez de chaussée - Bureau médecin

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
800	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
801					Mur (partie haute)	0,1		
802					Mur (au centre)	0,14		
803	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
804					Mur (partie haute)	0,14		
805					Mur (au centre)	0,12		
806	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
807					Mur (partie haute)	0,35		
808					Mur (au centre)	0,18		
809	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
810					Mur (partie haute)	0,29		
811					Mur (au centre)	0,34		
812	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,29		
813					Plafond (mesure 2)	0		
814	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
815					Porte (partie haute)	0,3		
816	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
817					Huisserie Porte (partie haute)	0,35		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - Chambre 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
818	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
819					Mur (partie haute)	0,22		
820					Mur (au centre)	0,19		
821	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
822					Mur (partie haute)	0,36		
823					Mur (au centre)	0,29		
824	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
825					Mur (partie haute)	0,14		
826					Mur (au centre)	0,15		
827	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
828					Mur (partie haute)	0,16		
829					Mur (au centre)	0,31		
830	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,21		
831					Plafond (mesure 2)	0,11		
832	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,14		
833					Porte (partie haute)	0,05		
834	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04		
835					Huisserie Porte (partie haute)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
836	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
837					Mur (partie haute)	0,29		
838					Mur (au centre)	0,04		
839	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
840					Mur (partie haute)	0,25		
841					Mur (au centre)	0,39		
842	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
843					Mur (partie haute)	0,13		
844					Mur (au centre)	0,37		
845	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
846					Mur (partie haute)	0,25		
847					Mur (au centre)	0,06		
848	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,34		
849					Plafond (mesure 2)	0,17		
850	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,02		
851					Porte (partie haute)	0,13		
852	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
853					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
854	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
855					Mur (partie haute)	0,36		
856					Mur (au centre)	0,33		
857	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
858					Mur (partie haute)	0,16		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
859					Mur (au centre)	0,36		
860	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
861					Mur (partie haute)	0,26		
862					Mur (au centre)	0,29		
863					Mur (partie basse)	0,17		
864	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,1		
865					Mur (au centre)	0,22		
866					Plafond (mesure 1)	0,21		
867	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,12		
868	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,2		
869					Porte (partie haute)	0,38		
870	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,23		
871					Huisserie Porte (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
872	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
873					Mur (partie haute)	0,29		
874					Mur (au centre)	0,05		
875	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
876					Mur (partie haute)	0,18		
877					Mur (au centre)	0,18		
878	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,36		
879					Mur (partie haute)	0,01		
880					Mur (au centre)	0,37		
881	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07		
882					Mur (partie haute)	0,32		
883					Mur (au centre)	0,39		
884	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,2		
885					Plafond (mesure 2)	0,04		
886	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09		
887					Porte (partie haute)	0,07		
888	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,28		
889					Huisserie Porte (partie haute)	0,27		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
890	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
891					Mur (partie haute)	0,03		
892					Mur (au centre)	0,23		
893	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
894					Mur (partie haute)	0,02		
895					Mur (au centre)	0,08		
896	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
897					Mur (partie haute)	0,32		
898					Mur (au centre)	0,36		
899	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
900					Mur (partie haute)	0,2		
901					Mur (au centre)	0,08		
902	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
903					Plafond (mesure 2)	0,17		
904	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,31		
905					Porte (partie haute)	0,24		
906	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,36		
907					Huisserie Porte (partie haute)	0,01		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
908	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
909					Mur (partie haute)	0,33		
910					Mur (au centre)	0,1		
911	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
912					Mur (partie haute)	0,05		
913					Mur (au centre)	0,02		
914	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
915					Mur (partie haute)	0,04		
916					Mur (au centre)	0,01		
917	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
918					Mur (partie haute)	0,32		
919					Mur (au centre)	0,36		
920	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,4		
921					Plafond (mesure 2)	0,36		
922	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,21		
923					Porte (partie haute)	0,05		
924	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
925					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
926	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
927					Mur (partie haute)	0,33		
928					Mur (au centre)	0,04		
929	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
930					Mur (partie haute)	0		
931					Mur (au centre)	0,33		
932	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
933					Mur (partie haute)	0,11		
934					Mur (au centre)	0,26		
935	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
936					Mur (partie haute)	0,32		
937					Mur (au centre)	0,06		
938	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,31		
939					Plafond (mesure 2)	0,35		
940	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
941					Porte (partie haute)	0,34		
942	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
943					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
944	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
945					Mur (partie haute)	0,39		
946					Mur (au centre)	0,28		
947	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
948					Mur (partie haute)	0,15		
949					Mur (au centre)	0,28		
950	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,21		
951					Mur (partie haute)	0,09		
952					Mur (au centre)	0,07		
953	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
954					Mur (partie haute)	0,16		
955					Mur (au centre)	0,35		
956	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,32		
957					Plafond (mesure 2)	0,4		
958	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06		
959					Porte (partie haute)	0,06		
960	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,1		
961					Huisserie Porte (partie haute)	0,21		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
962	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
963					Mur (partie haute)	0,12		
964					Mur (au centre)	0,34		
965	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
966					Mur (partie haute)	0,38		
967					Mur (au centre)	0,17		
968	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
969					Mur (partie haute)	0,29		
970					Mur (au centre)	0,06		
971	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
972					Mur (partie haute)	0,33		
973					Mur (au centre)	0,04		
974	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,37		
975					Plafond (mesure 2)	0,12		
976	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,27		
977					Porte (partie haute)	0,33		
978	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07		
979					Huisserie Porte (partie haute)	0,24		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
980	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,21		
981					Mur (partie haute)	0,05		
982					Mur (au centre)	0,35		
983	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
984					Mur (partie haute)	0,14		
985					Mur (au centre)	0,13		
986	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
987					Mur (partie haute)	0,14		
988					Mur (au centre)	0,23		
989	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
990					Mur (partie haute)	0,28		
991					Mur (au centre)	0,34		
992	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,24		
993					Plafond (mesure 2)	0,33		
994	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,3		
995					Porte (partie haute)	0,16		
996	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,36		
997					Huisserie Porte (partie haute)	0,34		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - Chambre 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
998	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
999					Mur (partie haute)	0,18		
1000					Mur (au centre)	0,11		
1001	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1002					Mur (partie haute)	0,22		
1003					Mur (au centre)	0,16		
1004	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1005					Mur (partie haute)	0,34		
1006					Mur (au centre)	0,11		
1007	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1008					Mur (partie haute)	0,31		
1009					Mur (au centre)	0,17		
1010	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,28		
1011					Plafond (mesure 2)	0,04		
1012	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,25		
1013					Porte (partie haute)	0,18		
1014	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
1015					Huisserie Porte (partie haute)	0,11		

Nombre d'unités de diagnostic : 7

Rez de chaussée - Chambre 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1016	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1017					Mur (partie haute)	0,36		
1018					Mur (au centre)	0,38		
1019					Mur (partie basse)	0,2		
1020	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,38		
1021					Mur (au centre)	0,24		
1022					Mur (partie basse)	0,04		
1023	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,34		
1024					Mur (au centre)	0,15		
1025					Mur (partie basse)	0,27		
1026	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,26		
1027					Mur (au centre)	0,19		
1028					Plafond (mesure 1)	0,02		
1029	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,12		
1030					Porte (partie basse)	0,29		
1031	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie haute)	0,02		
1032					Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
1033	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie haute)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1034	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
1035					Mur (partie haute)	0,35		
1036					Mur (au centre)	0,3		
1037	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1038					Mur (partie haute)	0,08		
1039					Mur (au centre)	0,28		
1040	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
1041					Mur (partie haute)	0,4		
1042					Mur (au centre)	0,28		
1043	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,36		
1044					Mur (partie haute)	0,3		
1045					Mur (au centre)	0,13		
1046	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,22		
1047					Plafond (mesure 2)	0,1		
1048	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,26		
1049					Porte (partie haute)	0,04		
1050	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,31		
1051					Huisserie Porte (partie haute)	0,21		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Chambre 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1052	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
1053					Mur (partie haute)	0		
1054					Mur (au centre)	0,03		
1055	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
1056					Mur (partie haute)	0,25		
1057					Mur (au centre)	0,37		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1058	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
1059					Mur (partie haute)	0,26		
1060					Mur (au centre)	0,08		
1061	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1062					Mur (partie haute)	0,37		
1063					Mur (au centre)	0,16		
1064	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,33		
1065					Plafond (mesure 2)	0,03		
1066	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09		
1067					Porte (partie haute)	0,08		
1068	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0		
1069					Huisserie Porte (partie haute)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - Cage d'escalier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1070	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
1071					Mur (partie haute)	0,34		
1072					Mur (au centre)	0,29		
1073	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
1074					Mur (partie haute)	0,14		
1075					Mur (au centre)	0,21		
1076	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
1077					Mur (partie haute)	0,26		
1078					Mur (au centre)	0,27		
1079	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
1080					Mur (partie haute)	0,2		
1081					Mur (au centre)	0,2		
1082	Plafond		Ciment	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
1083					Plafond (mesure 2)	0,35		
1084	Marches		Béton	Peinture	Marches (mesure 1)	0,17		
1085					Marches (mesure 2)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - Local technique

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1086	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06		
1087					Porte (partie haute)	0,28		
1088	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,16		
1089					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 2								

1er étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1090	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1091					Mur (partie haute)	0,23		
1092					Mur (au centre)	0,02		
1093	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,4		
1094					Mur (partie haute)	0,36		
1095					Mur (au centre)	0,39		
1096	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
1097					Mur (partie haute)	0,17		
1098					Mur (au centre)	0,18		
1099	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
1100					Mur (partie haute)	0,33		
1101					Mur (au centre)	0,15		
1102	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,33		
1103					Plafond (mesure 2)	0,19		
1104	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,39		
1105					Plinthes (mesure 2)	0,29		
1106	Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,02		
1107					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,22		
1108	Huisserie Fenêtre intérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,22		
1109					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,14		
1110	Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,24		
1111					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,18		
1112	Huisserie Fenêtre extérieure		Métal	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,3		
1113					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,24		
1114	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,19		
1115					Porte (partie haute)	0,01		
1116	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
1117					Huisserie Porte (partie haute)	0,27		
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Salle de réunion

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1118	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
1119					Mur (partie haute)	0,25		
1120					Mur (au centre)	0,15		
1121	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1122					Mur (partie haute)	0,09		
1123					Mur (au centre)	0,12		
1124	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1125					Mur (partie haute)	0,19		
1126					Mur (au centre)	0,31		
1127	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
1128					Mur (partie haute)	0,06		
1129					Mur (au centre)	0,28		
1130	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
1131					Plafond (mesure 2)	0,32		
1132	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		
1133					Plinthes (mesure 2)	0,02		
1134	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0,14		
1135					Garde corps (mesure 2)	0,35		
1136	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,38		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1137					Porte (partie haute)	0,21		
1138	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,1		
1139					Huisserie Porte (partie haute)	0,19		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - SdB salle de réunion

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1140	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
1141					Mur (partie haute)	0,1		
1142					Mur (au centre)	0,16		
1143	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
1144					Mur (partie haute)	0,4		
1145					Mur (au centre)	0,03		
1146	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
1147					Mur (partie haute)	0,17		
1148					Mur (au centre)	0,15		
1149	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
1150					Mur (partie haute)	0,24		
1151					Mur (au centre)	0,07		
1152	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,32		
1153					Plafond (mesure 2)	0,03		
1154	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,17		
1155					Plinthes (mesure 2)	0,18		
1156	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0,38		
1157					Garde corps (mesure 2)	0,16		
1158	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,27		
1159					Porte (partie haute)	0,22		
1160	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
1161					Huisserie Porte (partie haute)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - Psycho

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1162	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05		
1163					Mur (partie haute)	0,04		
1164					Mur (au centre)	0,37		
1165	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
1166					Mur (partie haute)	0,3		
1167					Mur (au centre)	0,05		
1168	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
1169					Mur (partie haute)	0,26		
1170					Mur (au centre)	0,4		
1171	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
1172					Mur (partie haute)	0,13		
1173					Mur (au centre)	0,37		
1174	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,27		
1175					Plafond (mesure 2)	0,26		
1176	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,32		
1177					Plinthes (mesure 2)	0,34		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1178	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0,38		
1179					Garde corps (mesure 2)	0,02		
1180	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,31		
1181					Porte (partie haute)	0,27		
1182	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,18		
1183					Huisserie Porte (partie haute)	0,4		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - SdB Psycho

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1184	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
1185					Mur (partie haute)	0,04		
1186					Mur (au centre)	0,22		
1187	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,24		
1188					Mur (partie haute)	0,35		
1189					Mur (au centre)	0,11		
1190	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,17		
1191					Mur (partie haute)	0,39		
1192					Mur (au centre)	0,1		
1193	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02		
1194					Mur (partie haute)	0,17		
1195					Mur (au centre)	0,13		
1196	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,38		
1197					Plafond (mesure 2)	0,12		
1198	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,12		
1199					Plinthes (mesure 2)	0,26		
1200	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,2		
1201					Porte (partie haute)	0		
1202	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,28		
1203					Huisserie Porte (partie haute)	0,19		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Studio palliatif

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1204	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,36		
1205					Mur (partie haute)	0,3		
1206					Mur (au centre)	0,19		
1207	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
1208					Mur (partie haute)	0,2		
1209					Mur (au centre)	0,33		
1210	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1211					Mur (partie haute)	0,3		
1212					Mur (au centre)	0,38		
1213	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
1214					Mur (partie haute)	0,22		
1215					Mur (au centre)	0,01		
1216	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,24		
1217					Plafond (mesure 2)	0,2		
1218	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,11		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1219					Plinthes (mesure 2)	0,22		
1220	Garde corps		Métal	Peinture	Garde corps (mesure 1)	0,15		
1221					Garde corps (mesure 2)	0,2		
1222	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,34		
1223					Porte (partie haute)	0		
1224	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,25		
1225					Huisserie Porte (partie haute)	0,32		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - SdB palliatif

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1226	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1227					Mur (partie haute)	0,23		
1228					Mur (au centre)	0,12		
1229	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0		
1230					Mur (partie haute)	0,32		
1231					Mur (au centre)	0,31		
1232	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,32		
1233					Mur (partie haute)	0,21		
1234					Mur (au centre)	0,3		
1235	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
1236					Mur (partie haute)	0,06		
1237					Mur (au centre)	0,12		
1238	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02		
1239					Plafond (mesure 2)	0,11		
1240	Plinthes		Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,37		
1241					Plinthes (mesure 2)	0,34		
1242	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07		
1243					Porte (partie haute)	0,23		
1244	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,2		
1245					Huisserie Porte (partie haute)	0,22		
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

1er étage - Cage d'escalier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1246	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
1247					Mur (partie haute)	0,15		
1248					Mur (au centre)	0,16		
1249	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,15		
1250					Mur (partie haute)	0,16		
1251					Mur (au centre)	0,28		
1252	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
1253					Mur (partie haute)	0,17		
1254					Mur (au centre)	0,36		
1255	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1256					Mur (partie haute)	0,22		
1257					Mur (au centre)	0,1		
1258	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,2		
1259					Plafond (mesure 2)	0,12		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1260	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,21		
1261					Porte (partie haute)	0,3		
1262	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,05		
1263					Huisserie Porte (partie haute)	0,01		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1264	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1265					Mur (partie haute)	0,25		
1266					Mur (au centre)	0,03		
1267	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,14		
1268					Mur (partie haute)	0,08		
1269					Mur (au centre)	0,38		
1270	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
1271					Mur (partie haute)	0,32		
1272					Mur (au centre)	0,31		
1273	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
1274					Mur (partie haute)	0,07		
1275					Mur (au centre)	0,16		
1276	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,34		
1277					Plafond (mesure 2)	0,06		
1278	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0		
1279					Porte (partie haute)	0,28		
1280	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,26		
1281					Huisserie Porte (partie haute)	0		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1282	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,35		
1283					Mur (partie haute)	0,14		
1284					Mur (au centre)	0,12		
1285	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
1286					Mur (partie haute)	0,21		
1287					Mur (au centre)	0,04		
1288	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,29		
1289					Mur (partie haute)	0		
1290					Mur (au centre)	0,35		
1291	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05		
1292					Mur (partie haute)	0,27		
1293					Mur (au centre)	0,14		
1294	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,3		
1295					Plafond (mesure 2)	0,09		
1296	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,11		
1297					Porte (partie haute)	0,22		
1298	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,38		
1299					Huisserie Porte (partie haute)	0,05		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1300	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1301					Mur (partie haute)	0,36		
1302					Mur (au centre)	0,3		
1303	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
1304					Mur (partie haute)	0		
1305					Mur (au centre)	0,31		
1306	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,39		
1307					Mur (partie haute)	0,17		
1308					Mur (au centre)	0,02		
1309	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,37		
1310					Mur (partie haute)	0,27		
1311					Mur (au centre)	0,08		
1312	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
1313					Plafond (mesure 2)	0,05		
1314	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,17		
1315					Porte (partie haute)	0,06		
1316	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,15		
1317					Huisserie Porte (partie haute)	0,2		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1318	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,2		
1319					Mur (partie haute)	0,26		
1320					Mur (au centre)	0,11		
1321	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,25		
1322					Mur (partie haute)	0,39		
1323					Mur (au centre)	0,23		
1324	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1325					Mur (partie haute)	0,26		
1326					Mur (au centre)	0,07		
1327	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1328					Mur (partie haute)	0,04		
1329					Mur (au centre)	0,22		
1330	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,14		
1331					Plafond (mesure 2)	0,08		
1332	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
1333					Porte (partie haute)	0,26		
1334	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03		
1335					Huisserie Porte (partie haute)	0,11		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1336	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,23		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1337					Mur (partie haute)	0,09		
1338					Mur (au centre)	0,4		
1339					Mur (partie basse)	0,37		
1340	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,34		
1341					Mur (au centre)	0,36		
1342	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1343					Mur (partie haute)	0,03		
1344					Mur (au centre)	0,15		
1345	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1346					Mur (partie haute)	0,3		
1347					Mur (au centre)	0,12		
1348	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,38		
1349					Plafond (mesure 2)	0,24		
1350	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
1351					Porte (partie haute)	0,34		
1352	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,15		
1353					Huisserie Porte (partie haute)	0,31		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1354	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
1355					Mur (partie haute)	0,19		
1356					Mur (au centre)	0,19		
1357	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,12		
1358					Mur (partie haute)	0,27		
1359					Mur (au centre)	0,23		
1360	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
1361					Mur (partie haute)	0,32		
1362					Mur (au centre)	0,4		
1363	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,36		
1364					Mur (partie haute)	0,3		
1365					Mur (au centre)	0,2		
1366	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08		
1367					Plafond (mesure 2)	0,28		
1368	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,17		
1369					Porte (partie haute)	0,4		
1370	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,29		
1371					Huisserie Porte (partie haute)	0,38		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1372	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
1373					Mur (partie haute)	0,14		
1374					Mur (au centre)	0,2		
1375	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1376					Mur (partie haute)	0,18		
1377					Mur (au centre)	0,22		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1378	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,31		
1379					Mur (partie haute)	0,21		
1380					Mur (au centre)	0,09		
1381	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01		
1382					Mur (partie haute)	0,03		
1383					Mur (au centre)	0,26		
1384	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,25		
1385					Plafond (mesure 2)	0,37		
1386	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,36		
1387					Porte (partie haute)	0,26		
1388	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08		
1389					Huisserie Porte (partie haute)	0,36		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1390	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
1391					Mur (partie haute)	0,16		
1392					Mur (au centre)	0,03		
1393	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03		
1394					Mur (partie haute)	0,2		
1395					Mur (au centre)	0,27		
1396	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,33		
1397					Mur (partie haute)	0,33		
1398					Mur (au centre)	0,37		
1399	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1400					Mur (partie haute)	0,22		
1401					Mur (au centre)	0,13		
1402	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06		
1403					Plafond (mesure 2)	0,13		
1404	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,35		
1405					Porte (partie haute)	0,19		
1406	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,19		
1407					Huisserie Porte (partie haute)	0,3		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1408	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
1409					Mur (partie haute)	0,12		
1410					Mur (au centre)	0,34		
1411	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1412					Mur (partie haute)	0,37		
1413					Mur (au centre)	0,12		
1414	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
1415					Mur (partie haute)	0,33		
1416					Mur (au centre)	0,07		
1417	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07		
1418					Mur (partie haute)	0,21		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1419					Mur (au centre)	0,05		
1420	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,35		
1421					Plafond (mesure 2)	0,22		
1422	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,29		
1423					Porte (partie haute)	0,32		
1424	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,25		
1425					Huisserie Porte (partie haute)	0,14		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 13

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1426	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
1427					Mur (partie haute)	0,16		
1428					Mur (au centre)	0,28		
1429	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
1430					Mur (partie haute)	0,25		
1431					Mur (au centre)	0,33		
1432	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,3		
1433					Mur (partie haute)	0,16		
1434					Mur (au centre)	0,36		
1435	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,18		
1436					Mur (partie haute)	0,15		
1437					Mur (au centre)	0,18		
1438	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,17		
1439					Plafond (mesure 2)	0,1		
1440	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,14		
1441					Porte (partie haute)	0,1		
1442	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,12		
1443					Huisserie Porte (partie haute)	0,34		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 14

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1444	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,27		
1445					Mur (partie haute)	0,12		
1446					Mur (au centre)	0,31		
1447	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08		
1448					Mur (partie haute)	0,29		
1449					Mur (au centre)	0,05		
1450	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1451					Mur (partie haute)	0,18		
1452					Mur (au centre)	0,18		
1453	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,26		
1454					Mur (partie haute)	0,01		
1455					Mur (au centre)	0,36		
1456	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,34		
1457					Plafond (mesure 2)	0,08		
1458	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,33		
1459					Porte (partie haute)	0,36		

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1460	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,31		
1461					Huisserie Porte (partie haute)	0,21		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 15

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1462	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,34		
1463					Mur (partie haute)	0,14		
1464					Mur (au centre)	0,14		
1465	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0		
1466					Mur (partie haute)	0,29		
1467					Mur (au centre)	0,39		
1468	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,16		
1469					Mur (partie haute)	0,29		
1470					Mur (au centre)	0,35		
1471	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,1		
1472					Mur (partie haute)	0,19		
1473					Mur (au centre)	0,22		
1474	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,17		
1475					Plafond (mesure 2)	0,37		
1476	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04		
1477					Porte (partie haute)	0,01		
1478	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04		
1479					Huisserie Porte (partie haute)	0,27		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 16

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1480	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,11		
1481					Mur (partie haute)	0,23		
1482					Mur (au centre)	0,17		
1483	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,38		
1484					Mur (partie haute)	0,09		
1485					Mur (au centre)	0,37		
1486	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,13		
1487					Mur (partie haute)	0,32		
1488					Mur (au centre)	0,18		
1489	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04		
1490					Mur (partie haute)	0,2		
1491					Mur (au centre)	0,28		
1492	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,18		
1493					Plafond (mesure 2)	0,19		
1494	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,12		
1495					Porte (partie haute)	0,27		
1496	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
1497					Huisserie Porte (partie haute)	0,13		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Rez de chaussée - SdB Ch. 18

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1498	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,22		
1499					Mur (partie haute)	0,39		
1500					Mur (au centre)	0,24		
1501	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,19		
1502					Mur (partie haute)	0,2		
1503					Mur (au centre)	0,3		
1504	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1505					Mur (partie haute)	0,27		
1506					Mur (au centre)	0,2		
1507	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,28		
1508					Mur (partie haute)	0,38		
1509					Mur (au centre)	0,13		
1510	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03		
1511					Plafond (mesure 2)	0,08		
1512	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,1		
1513					Porte (partie haute)	0,07		
1514	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,22		
1515					Huisserie Porte (partie haute)	0,06		
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

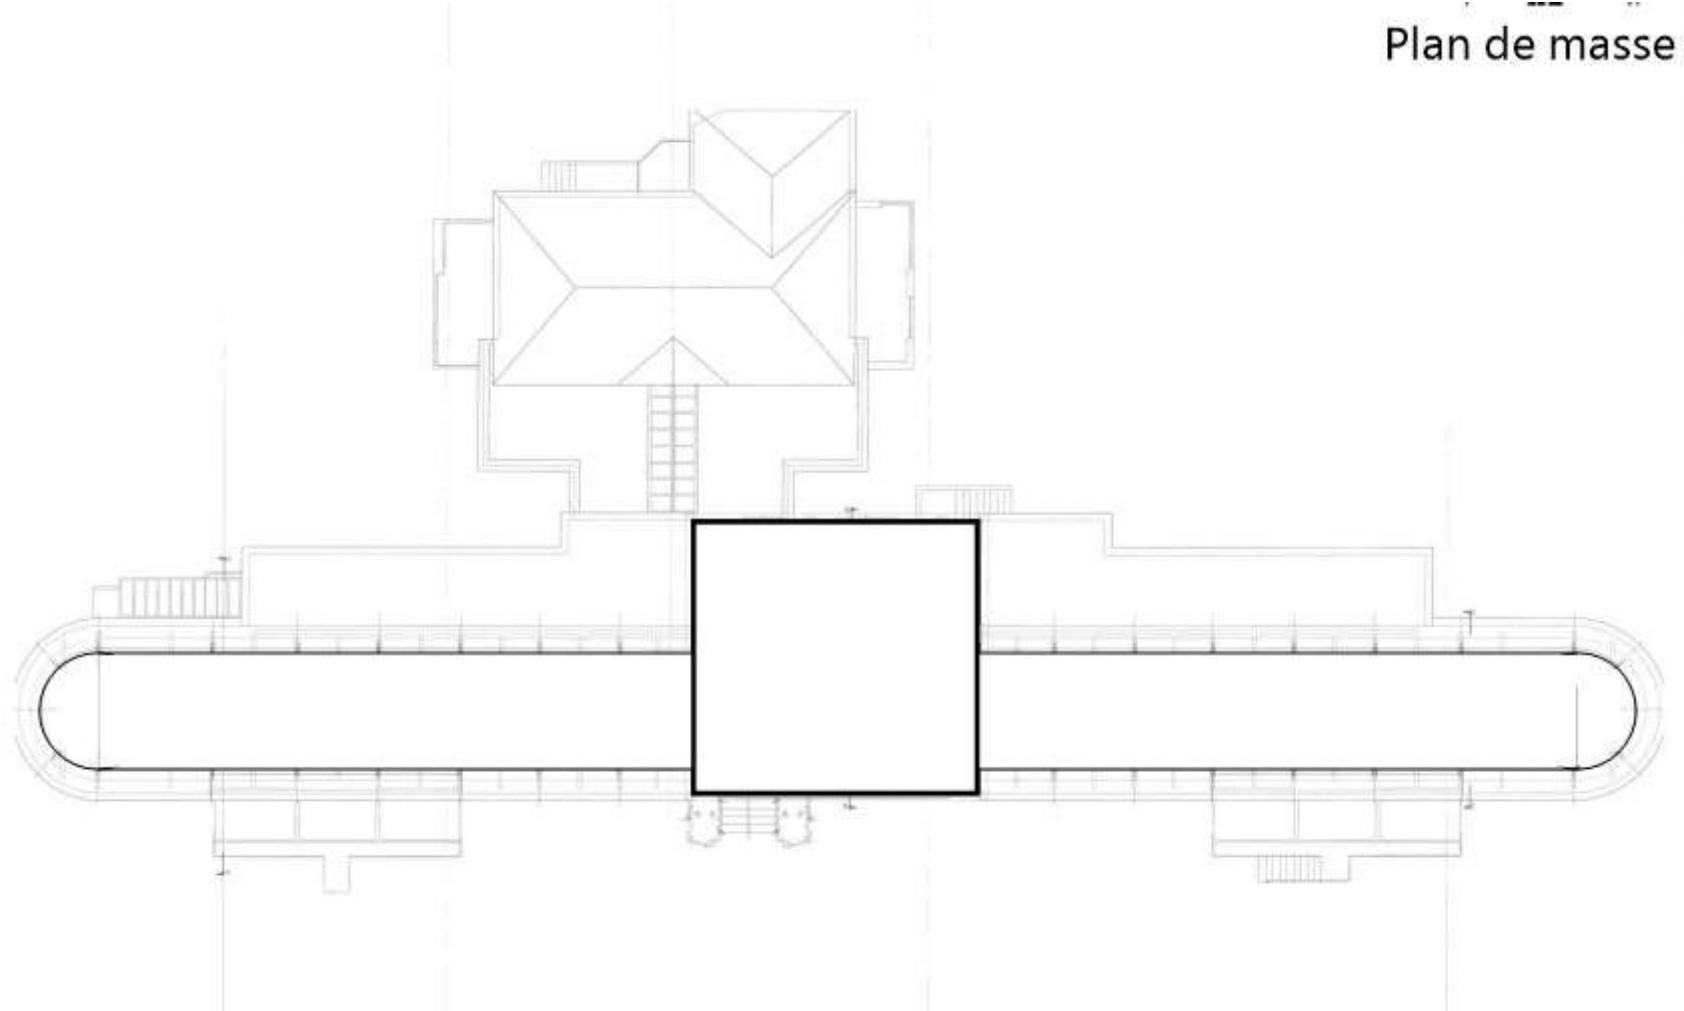
	Planche de repérage technique
	N° planche: 1/10
	Nom du plan: Plan de masse
	<u>Entreprise réalisant le repérage :</u> SOCOTEC Diagnostic Rennes 318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642 35706 RENNES CEDEX 7
	<u>Adresse du bien :</u> BÂTIMENT MEDECINE C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE 1, rue Jean Marie Laloy BP 9 35560 ANTRAIN
	<u>Informations relatives au rapport du repérage :</u> Réf. du rapport : 2307CBRREBCI059670/1 Rédacteur : Jean Marc FLAUX Date : 03/08/2023
	<u>Commentaires :</u>

Planche de repérage technique

N° planche: 2/10

Nom du plan:

Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le
Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :

BÂTIMENT MEDECINE
C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE
1, rue Jean Marie Laloy
BP 9
35560 ANTRAIN

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :
2307CBRREBCI059670/1
Rédacteur : Jean Marc FLAUX
Date : 03/08/2023

Commentaires :

Sous-sol

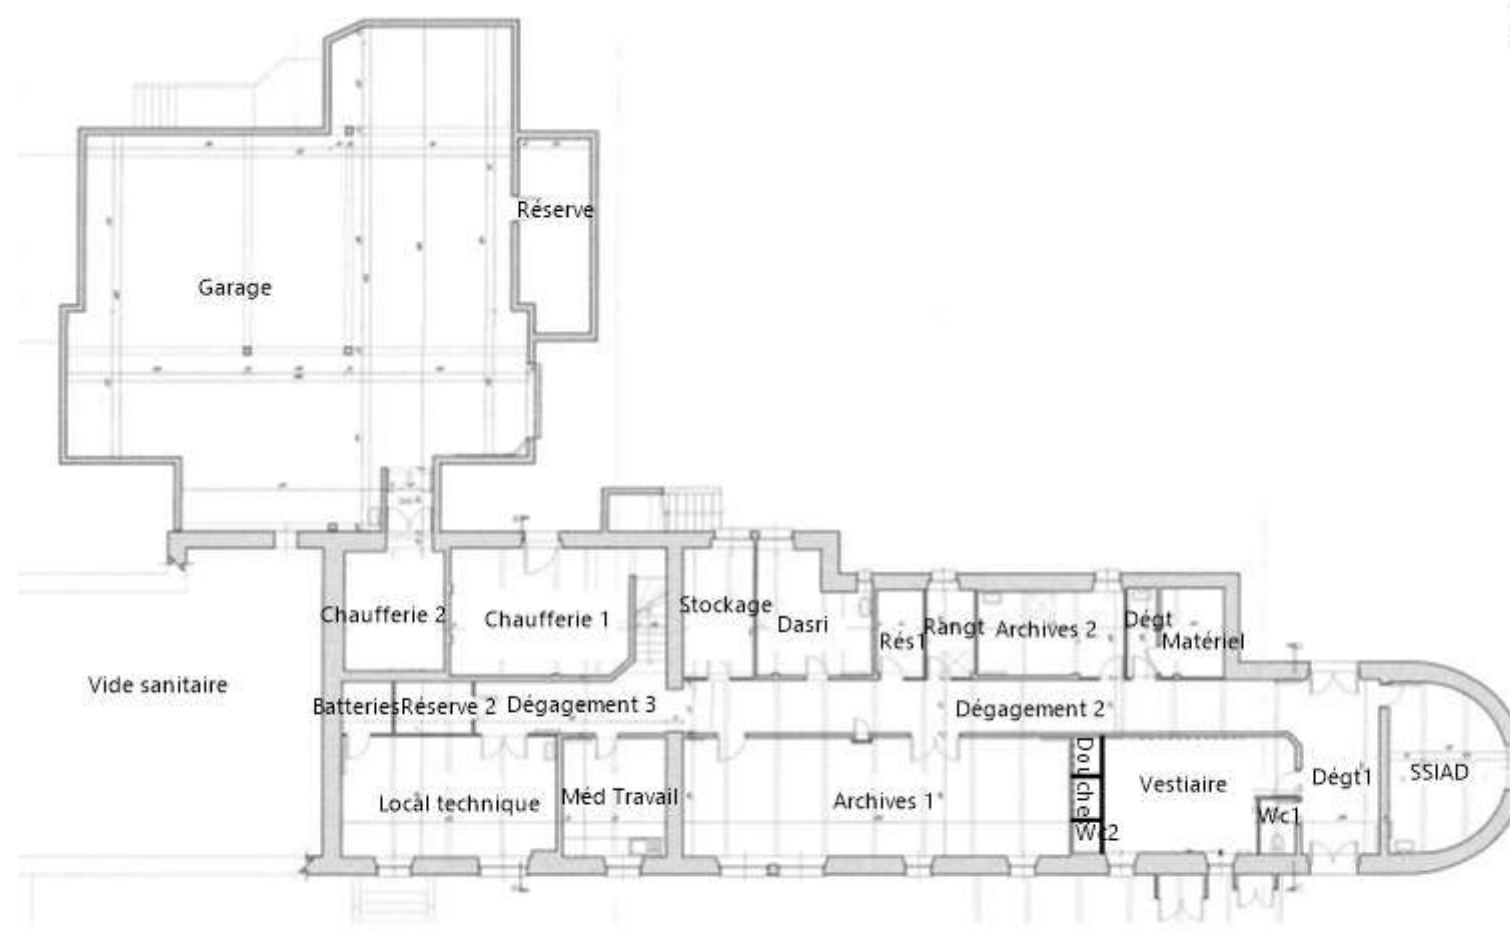


Planche de repérage technique

N° planche: 6/10

Nom du plan:
Rez-de-chaussée

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Rennes
318 route de Fougères - Immeuble le
Noven- CS60642
35706 RENNES CEDEX 7

Adresse du bien :


BÂTIMENT MEDECINE
C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE
1, rue Jean Marie Laloy
BP 9
35560 ANTRAIN


Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport :
2307CBRREBCI059670/1
Rédacteur : Jean Marc FLAUX
Date : 03/08/2023

Commentaires :

Rez-de-chaussée

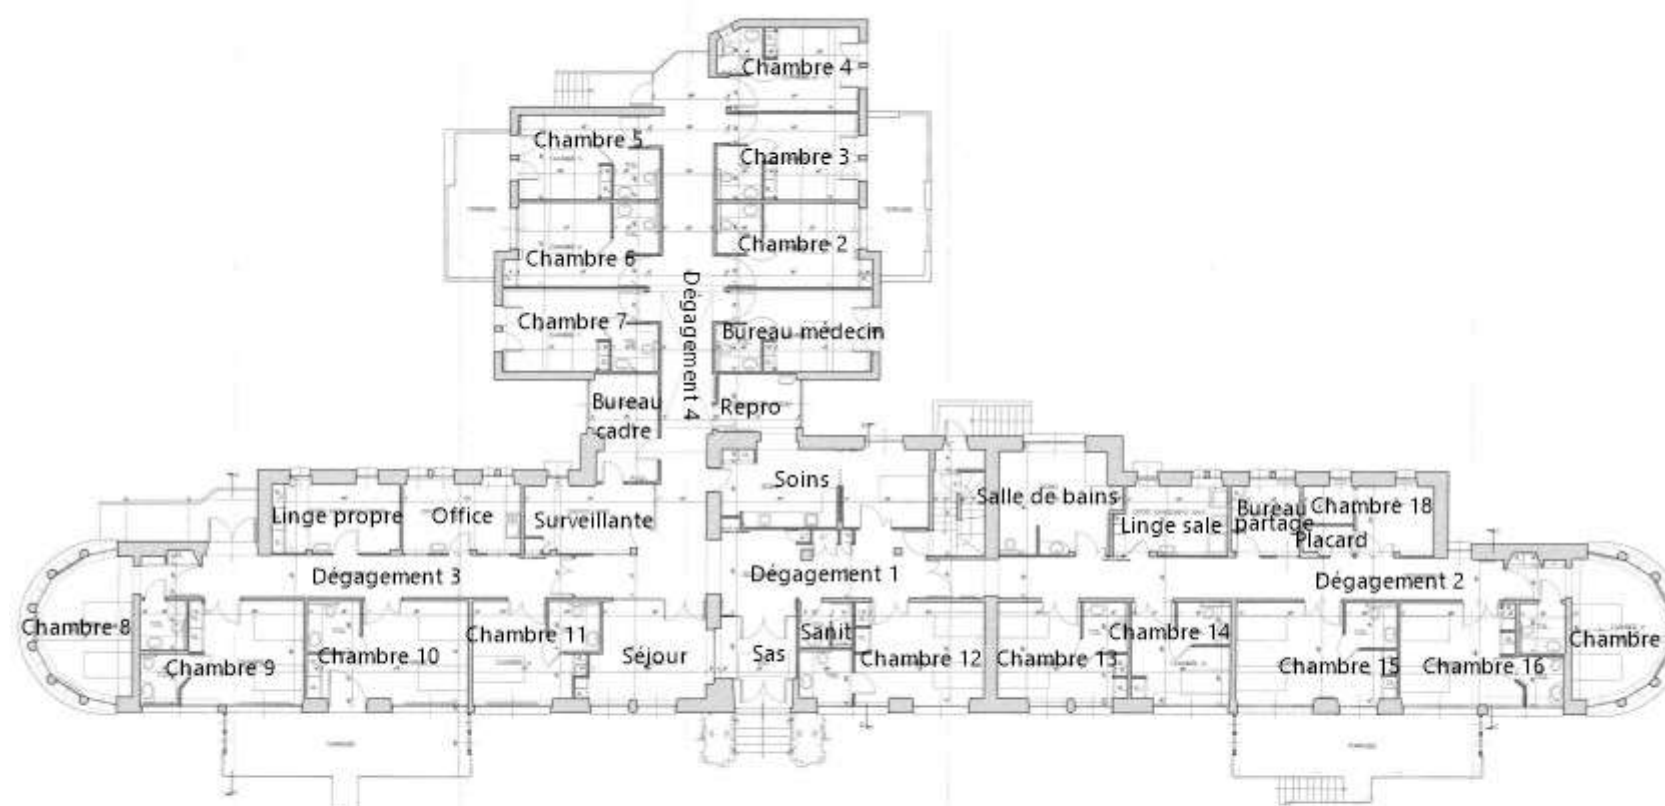

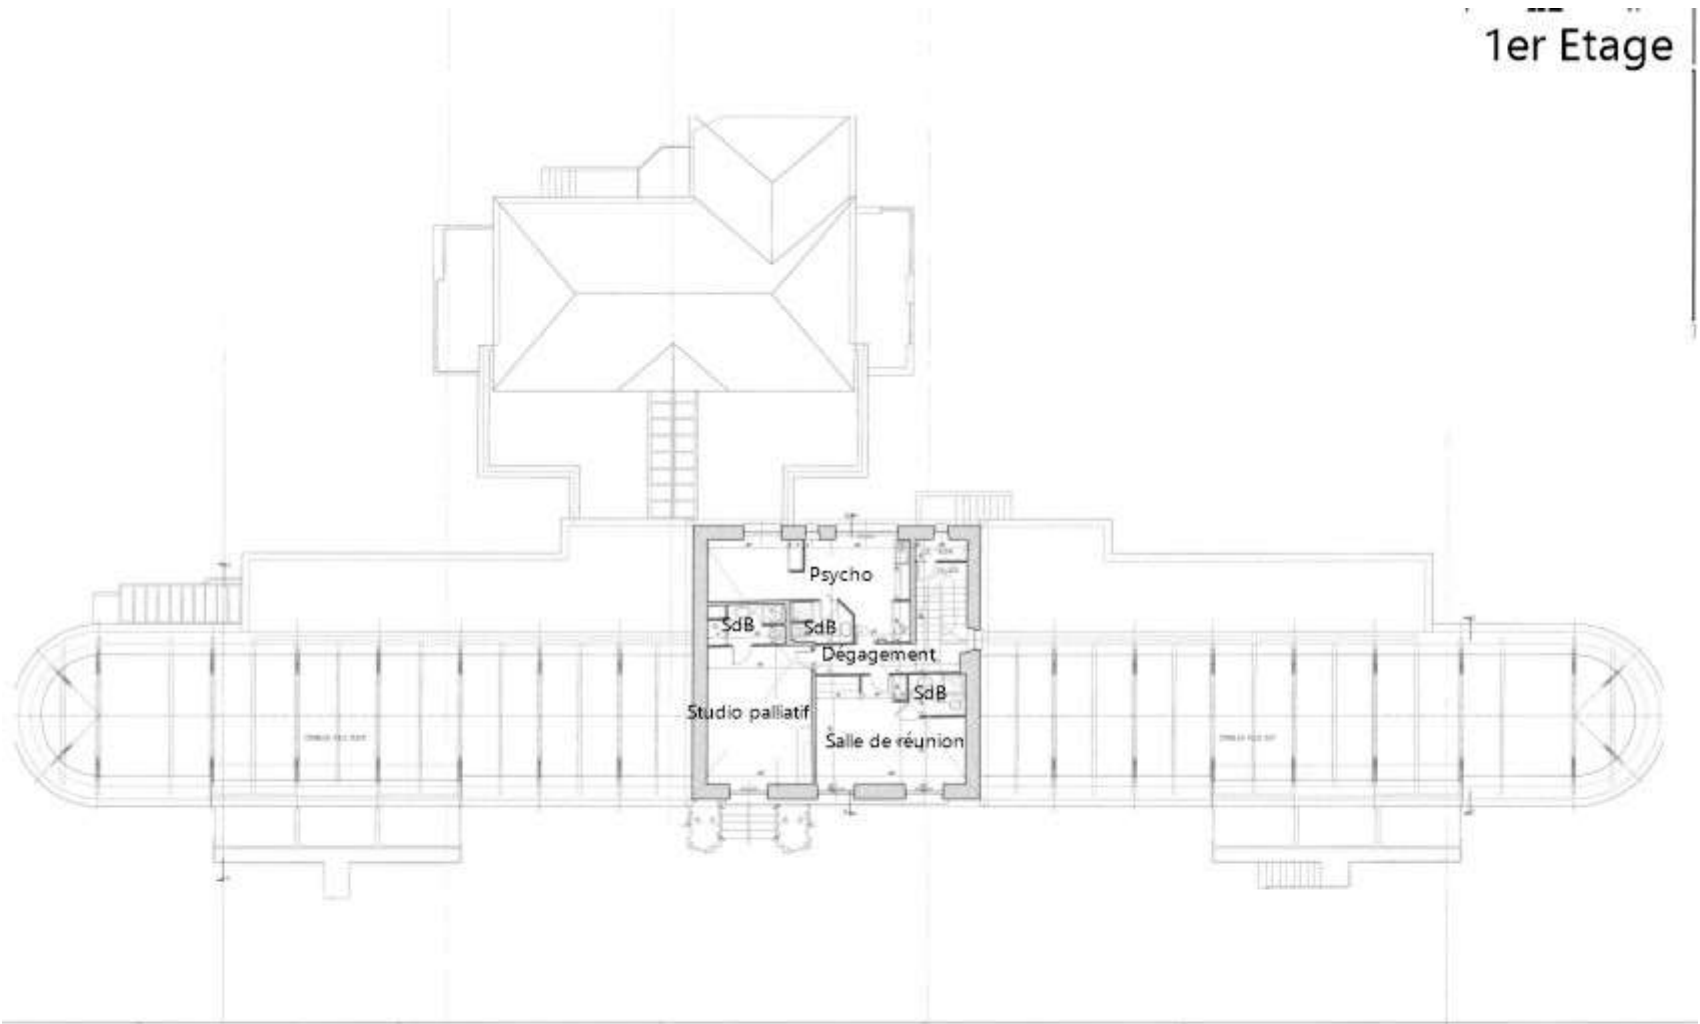	Planche de repérage technique
	N° planche: 10/10
	Nom du plan: 1er Etage
	Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Rennes 318 route de Fougères - Immeuble le Noven- CS60642 35706 RENNES CEDEX 7
	Adresse du bien : BÂTIMENT MEDECINE C.H. DES MARCHES DE BRETAGNE 1, rue Jean Marie Laloy BP 9 35560 ANTRAIN
	Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2307CBRREBCI059670/1 Rédacteur : Jean Marc FLAUX Date : 03/08/2023
	Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 02/12/2022

POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 24 799 030 € - 722 037 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 16 722 037 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 489 939 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 723 099 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 723 099 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation. Siren 353 457 243 - Régime simplifié. 313, Terrasse de l'Asche 92077 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 84 637 854,08 € - 512 039 130 RCS Nanterre - Siège social : 1, place Victorien Sardou 75010 Paris-Ville-Bois. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 235 660 041,393,728 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92130 Châillon. TVA intracommunautaire n° FR 21 451 392 134. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Groupe
PHYSITEK Devices

Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.
- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **370 MBq** cette valeur limite est atteinte après **36 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : Socotec

Modèle de l'analyseur :	FEnX2
Numéro de série analyseur :	22-1067
Numéro de série de la source :	RTV-1502-23
Activité de la source (MBq) :	850
Date d'origine de la source :	16/06/2022
Date de fin de validité de la source :	16/06/2027



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D - CS 60507
78961 Vnissins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre

www.carsat-centre.fr

Tél 02 38 81 50 00

prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre

www.preventionbtp.fr

Tél 02 38 83 60 21

orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre

<http://www.rsi.fr/centre>

Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :

www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
