

AMENAGEMENTS A PREVOIR (LOT 03) POUR LA BASE VIE

- 1

Equipements à prévoir (Réfectoire) : Evier sur meuble bas (installation et raccordement aux attentes existantes (arrivées et évacuations), tables, chaises, réfrigérateur, micro-onde, poubelles, consommables (savon, essuie-tout, sac poubelles),
- 2

Equipements à prévoir (Salle de réunion) : tables, chaises (en quantité adaptée pour réunions avec MOA, MOE, BC, SPS, Entreprises)
- 3

Equipements à prévoir (vestiaire) : Casiers cadenassables, aménagement d'un point d'eau (installation d'un évier et raccordement aux attentes existantes (arrivées et évacuations), Aménagement d'une douche pour 8 personnes
- 4

Equipements à prévoir : Ossature bois + panneaux OSB toute hauteur, bloc porte de service avec poignée à code côté extérieur + molette côté chantier
- 5


Equipements à prévoir (porte existante) : Serrure à code mécanique côté extérieur + molette côté chantier
- 6

Equipements à prévoir (Porte existante) : Serrure à code côté extérieur

2A 1er

1A 1er

Cloisonnement + bloc porte à mettre en oeuvre

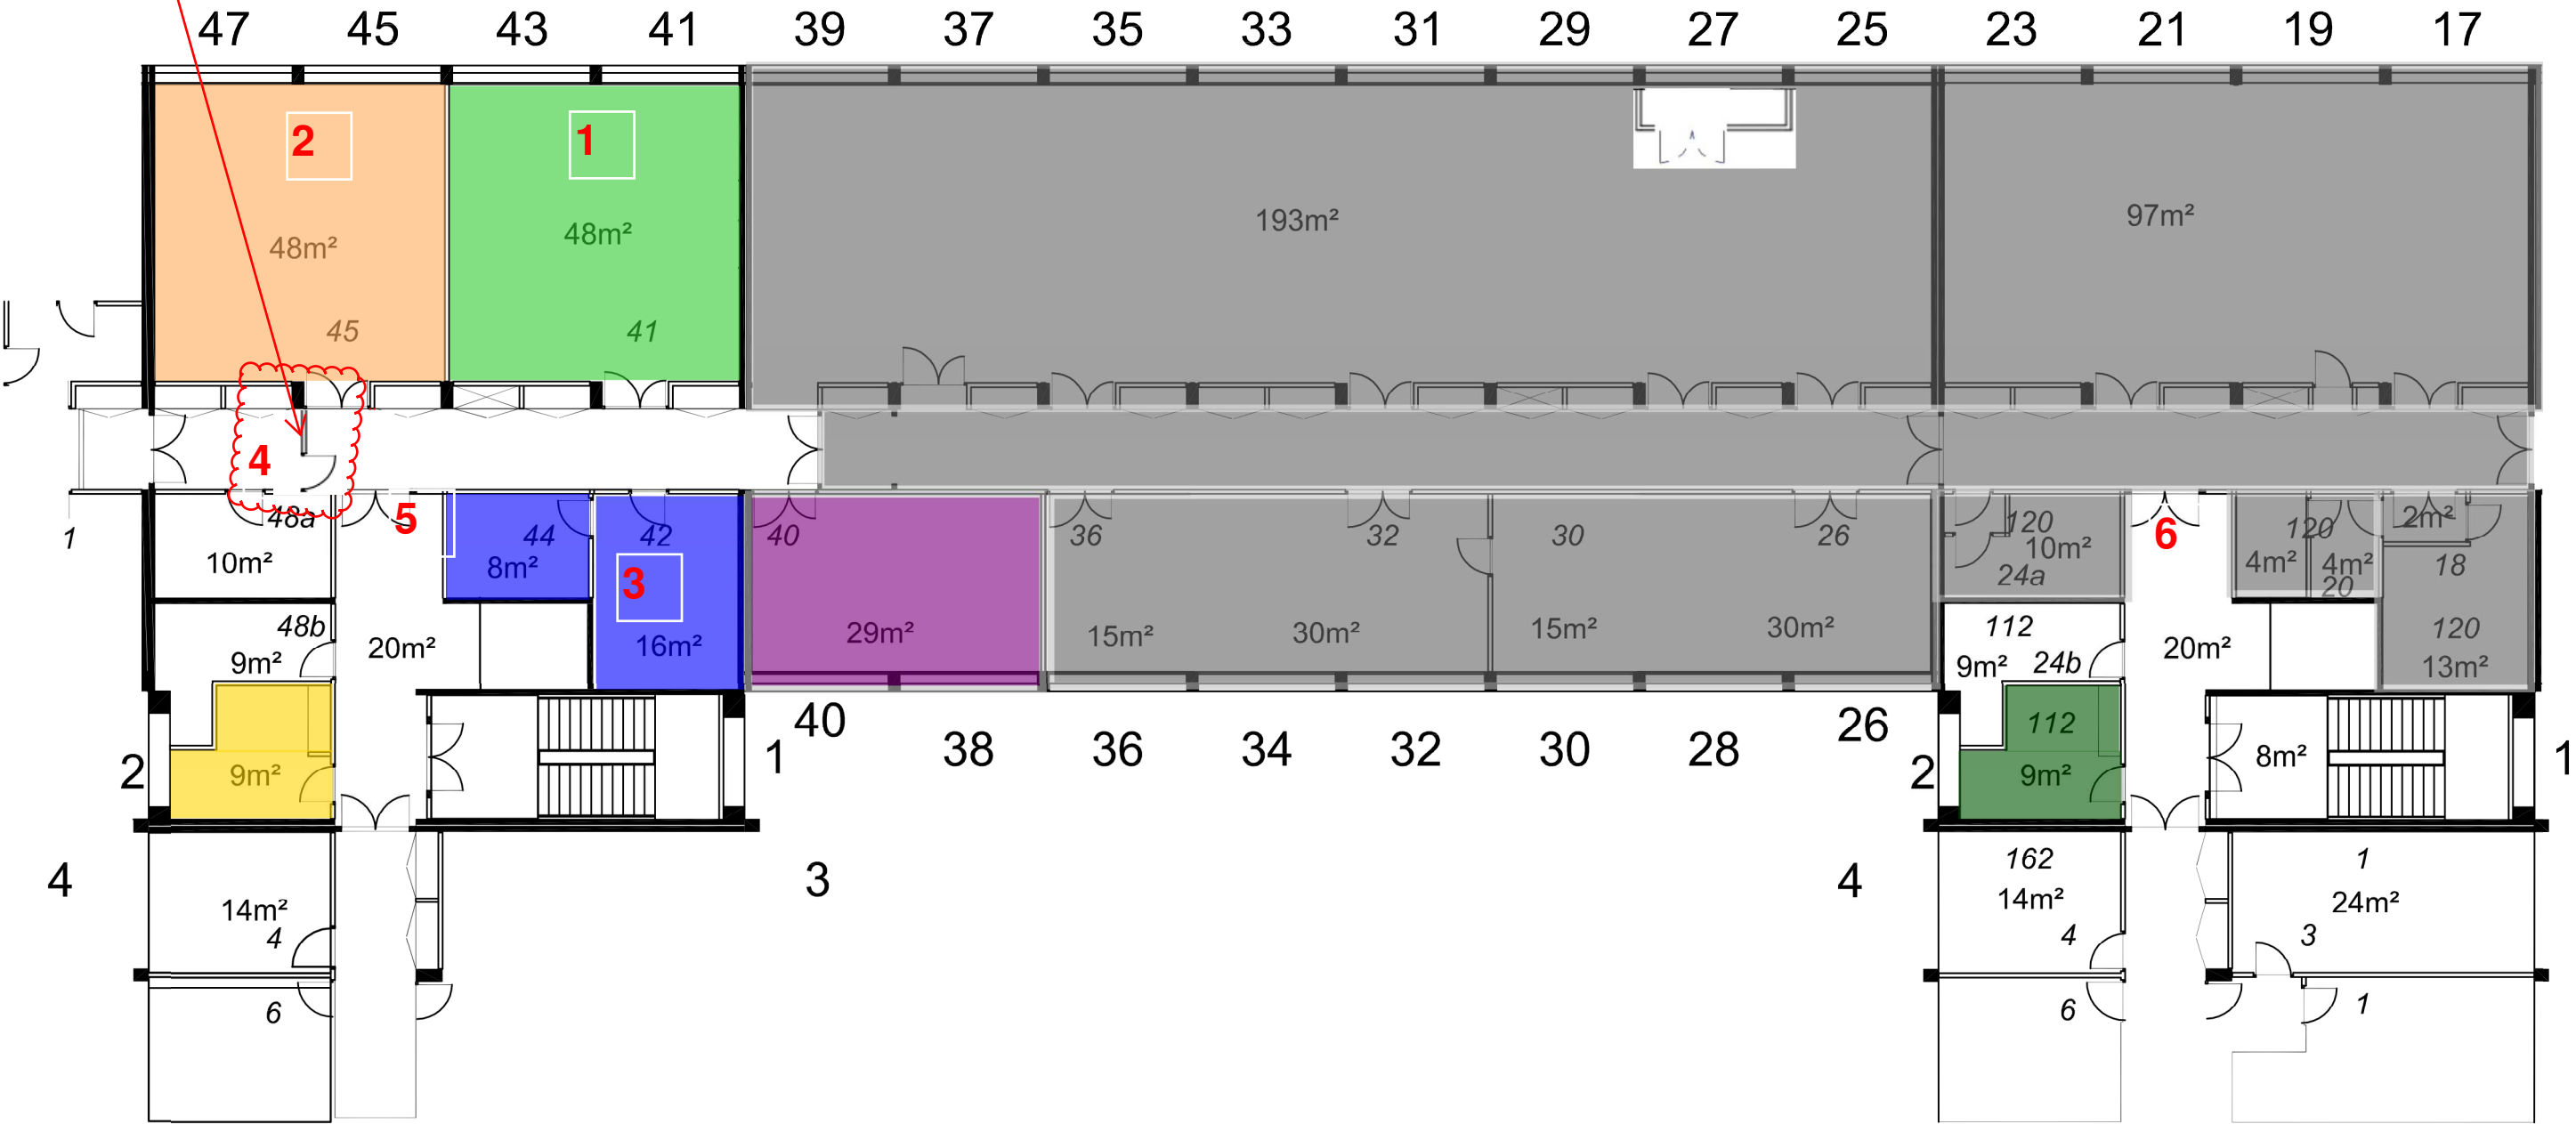

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| <div></div> Aménagement d'une zone Réfectoire / cuisine | <div></div> Aménagement d'une zone Vestiaire | <div></div> Zone de chantier | <div></div> Sanitaire chantier |
| <div></div> Aménagement d'une zone Salle de réunion | <div></div> Sanitaires existants mis à disposition des compagnons | <div></div> Zone de chantier option | |
