

CJ DE RENNES/ PETIT DEPOT-ADAP

Modalités d'intervention en site occupé

Les travaux étant réalisés en site occupé et sécurisé, une vigilance particulière est à porter aux modalités d'intervention.

GENERALITES

Les travaux sont possibles de 6h45 à 21h.

Les interventions très bruyantes (ex : percements dans du béton, démolitions bruyantes) devront être réalisés

- En dehors des audiences, soit avant 9h pour les espaces publics
- Avant la mise en fonctionnement du petit dépôt, soit avant 8h pour le petit dépôt.

PETIT DEPOT

Le petit dépôt fait partie des zones sécurisées du tribunal judiciaire.


Les personnes sous main de justice devant être présentées aux magistrats dans le cadre de déferrements ou d'audiences pénales y sont conduites par les forces de sécurités via le SAS fourgon.

Le petit dépôt se compose :

- De geôles, dans lesquelles les personnes sous main de justice sont placées en attente de leur présentation aux magistrats ;
- D'un poste de garde, local d'attente des forces de sécurité ;
- De bureaux d'entretien.

Le phasage permet de maintenir le poste de garde fonctionnel pendant la majorité des travaux.

Tvx Phase 1 A	DESAMIANPAGE	Méthodologie à préciser avec l'entreprise pour voir s'il est possible de maintenir le fonctionnement du couloir pendant le désamiantage. Dans le cas contraire, fermeture du petit dépôt pendant le désamiantage. La possibilité de réaliser le désamiantage en maintenant le fonctionnement du petit dépôt fait partie des critères d'analyse du lot dépollution (cf. RC)
Tvx Phase 1B	LOCAUX « CENTRAUX »	Travaux côté « intérieur ». Locaux coté façade et couloir fonctionnels. Petit dépôt utilisable.
Tvx Phase 2	LOCAUX « EN FACADE »	Travaux côté « façade ». Locaux coté intérieur et couloir fonctionnels. Petit dépôt utilisable. Les escortes utilisent l'espace sas+ bureaux d'entretiens 3 et 4 comme espace de détente
Tvx Phase 3	COULOIRS	Reprise des faux plafonds à réaliser en fonctionnement du petit dépôt. Principe de croisement à définir entre l'entreprise et les escortes. Fermeture du petit dépôt pendant 3 jours pour la peinture

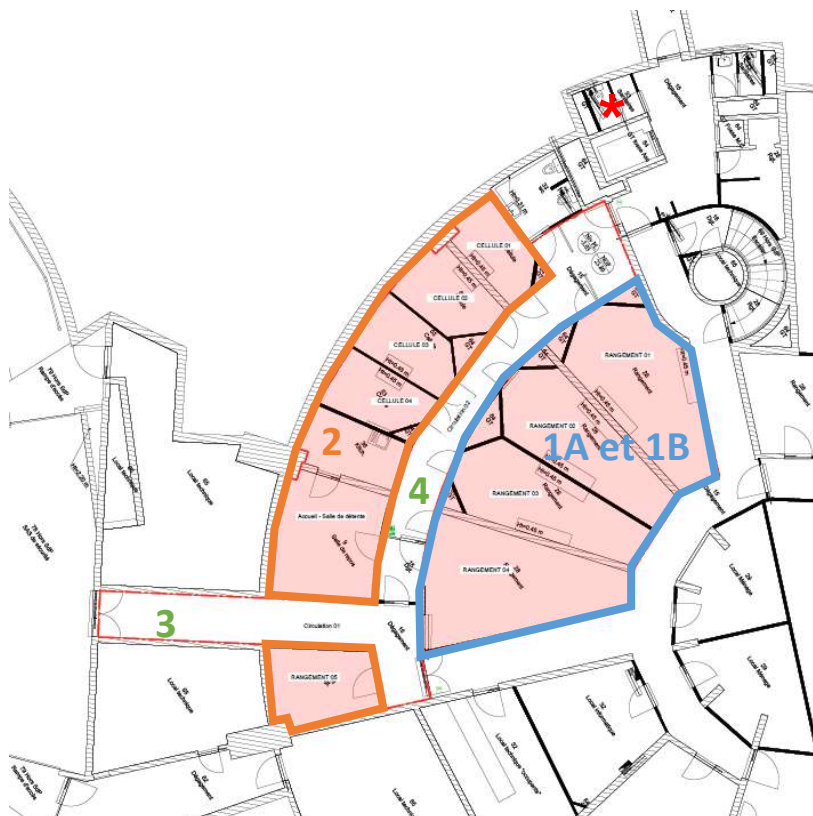

Ci-dessous les modalités d'interventions définies avec la juridiction :

Accès des entreprises	Par le sas fourgon Interphone, avec ouverture par le personnel de sécurité Mise en place d'un registre en bas, pour signature Les policiers réservistes vérifient la conformité du registre avec les personnels présents, à leur arrivée à 8h15
Déchargement, évacuations	Les déchargements de matériel et les évacuations de gravats devront se faire avant 8h. Avant 8h, les entreprises pourront descendre ponctuellement leur véhicule dans le sas fourgon.
Stationnement	Dans l'espace public
Badges	Fourniture de badges visiteurs pour identifier les compagnons
Sanitaires de chantier	Repérés par une étoile rouge sur le plan ci-dessus
Point d'eau	Dans le SAS fourgon + dans le local détente des forces de sécurité
Réfectoire	Non prévu
Vestiaire	Les compagnons arrivent en tenue de chantier
Benne	Non prévue (évacuation au fil du chantier, avant 8h)
Réunions	Réunions de chantier sur site. Ponctuellement dans une salle de réunion du site.
Consignes de sécurité	L'ensemble des personnels travaillant sur site devra fournir au préalable un scan de sa carte d'identité. Les entreprises ne doivent rien laisser trainer dans le couloir (outils, déchets). Lorsqu'elles interviennent dans les zones 2 et 3, l'ensemble de leur matériel doit être stocké strictement dans ces zones. Lors des interventions dans le couloir en période de fonctionnement du petit dépôt, (ex : pose des faux plafonds en placo dans le couloir 1), l'entreprise devra limiter au minimum l'emprise de son matériel. Un mode opératoire devra être défini avec les forces de sécurité pour les croisements avec les détenus.

ESPACES PUBLICS

Les travaux de mise en accessibilité sont localisés dans les espaces publics du tribunal, c'est-à-dire fréquentés par du personnel et de personnes de l'extérieur, en circulation libre sur les horaires d'ouverture (8h30 -17h).

Un phasage a été déterminé pour intervenir par niveaux.

Les interventions sur les deux escaliers seront réalisées l'une après l'autre. Un escalier public doit être en permanence en fonctionnement.

Les interventions devront être localisées et délimitées afin de permettre la cohabitation des travaux avec le fonctionnement normal du tribunal.

Les approvisionnements devront être réalisés au maximum avant l'heure d'ouverture au public à 8h30.

Les consignes de sécurité générales s'appliquent également : fourniture des scans des pièces d'identité, ne rien laisser trainer dans les couloirs, identification des travaux bruyants.
