

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400
TOULOUSE

Référence client : EX-Cuisine, service d'imagerie
, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1A
GB

Désignation : Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service
d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18,
RH1AGB

Date de construction : Avant 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : BOBIN NICOLAS

Accompagnateur : CHU - M VALENTIN Franck (06 28 79 26 31)

Date de repérage : 20/12/2023

Numéro attestation : CPDI6419

Délivré le : 23/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires,
Espace Performance - Bât K - 35760 ST Grégoire



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
Société CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
TOULOUSE (HOTE
2, RUE VIGUERIE - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31300 TOULOUSE

Donneur d'ordre :
Société CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE
TOULOUSE (HOTE
2, RUE VIGUERIE - 2, Rue Viguerie - TSA 80035
31300 TOULOUSE

A-4 SOCIÉTÉ

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 27/12/2023

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 27/12/2023

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	R-2 - Vol 2 (BT)
R-2 - Vol 3 (BK)	R-2 - Vol 4 (BG)
R-2 - Vol 5 (BF)	R-2 - Vol 6 (BE)
R-2 - Vol 7 (AC)	R-2 - Vol 8 (BA)
R-2 - Vol 9 (BC)	R-2 - Vol 10 (RH1BCF)
R-2 - Vol 11 (RH1BBQ)	R-2 - Vol 12 (AP)
R-2 - Vol 13 (AQ)	R-2 - Vol 14 (AN)
R-2 - Vol 15 (Ai 1)	R-2 - Vol 16 (Ai 2)
R-2 - Vol 17 (AK)	R-2 - Vol 18 (AE)
R-2 - Vol 19 (AD)	R-2 - Vol 20 (AF)
R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)
R-2 - Vol 23 (Couloir 2)	R-2 - Vol 24 (Couloir 3)
R-2 - Vol 25 (Douche)	R-2 - Vol 26 (Placard)
R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	R-2 - Vol 28 (W.c 1)

R-2 - Vol 29 (Salle de repos)	R-2 - Vol 30 (Bureau 1)
R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	R-2 - Vol 32 (Accueil)
R-2 - Vol 33 (RH1BT1)	R-2 - Vol 34 (Bureau 2)
R-2 - Vol 35 (W.c 2)	R-2 - Vol 36 (Bureau 3)
R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	R-2 - Vol 40 (Couloir 5)
R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	R-2 - Vol 42 (Salle d'interprétation 1)
R-2 - Vol 43 (Console 1)	R-2 - Vol 44 (Salle de préparation 1)
R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)	R-2 - Vol 46 (Salle patient)
R-2 - Vol 47 (Console 2)	R-2 - Vol 48 (Couloir 7)
R-2 - Vol 49 (Local recherche)	R-2 - Vol 50 (Salle d'interprétation 2)
R-2 - Vol 51 (Couloir 8)	R-2 - Vol 52 (Console 3)
R-2 - Vol 53 (Console 4)	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)
R-2 - Vol 55 (W.c 3)	R-2 - Vol 56 (Local 1)
R-2 - Vol 57 (Chambre 1)	R-2 - Vol 58 (Chambre 2)
R-2 - Vol 59 (Chambre 3)	R-2 - Vol 60 (Chambre 4)
R-2 - Vol 61 (Chambre 5)	R-2 - Vol 62 (Chambre 6)
R-2 - Vol 63 (W.c 4)	R-2 - Vol 64 (W.c 5)
R-2 - Vol 65 (Local 2)	R-2 - Vol 66 (Couloir 9)
R-2 - Vol 67 (Scanner 1)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
R-2 - Vol 69 (Vestiaire 3)	R-2 - Vol 70 (Couloir 10)
R-2 - Vol 71 (W.c 6)	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
R-2 - Vol 73 (Local 3)	R-2 - Vol 74 (Local 4)
R-2 - Vol 75 (Rh 2)	R-2 - Vol 76 (Chaufferie)
R-2 - Vol 77 (Local 5)	R-2 - Vol 78 (Local 6)
R-2 - Vol 79 (Couloir 11)	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)
R-2 bis - Vol 81 (RH1BAD)	R-2 bis - Vol 82 (RH1BAE)
R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)	R-2 bis - Vol 84 (RH1BBT)
R-2 bis - Vol 85 (RH1BCJ)	R-2 bis - Vol 86 (RH1BCM)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
R-2 - Vol 38 (Irm 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	Interdiction d'y pénétrer avec outils et tablette.
R-2 - Vol 37 (Irm 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	Interdiction d'y pénétrer avec outils et tablette.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Le programme des travaux (en annexe) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence FO ACTI 005-2 rédigé par M VALENTIN Franck le 21/05/2021.

Intervention le 19/12 imagerie, cuisine R-3 complément pour Mme gettiaux

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

RH1712 RH1723

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

DTA - A531957733_9445962-001-2_CHU-RANGUEIL-BAT-H1_K161-1_2017_03 -
Apave - 19/12/2018

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Equipements divers et accessoires	R-2	Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 72 (Cuisine)	

Parois verticales intérieures
et enduits

R-2

Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 2 (BT) -
Vol 3 (BK) - Vol 4 (BG) - Vol 5
(BF) - Vol 6 (BE) - Vol 8 (BA) -
Vol 9 (BC) - Vol 10 (RH1BCF)
- Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 13
(AQ) - Vol 14 (AN) - Vol 18 (AE)
- Vol 19 (AD) - Vol 20 (AF) - Vol
21 (Couloir 1) - Vol 22
(B012703BIS) - Vol 23
(Couloir 2) - Vol 24 (Couloir 3)
- Vol 25 (Douche) - Vol 26
(Placard) - Vol 27 (Vestiaire 1)
- Vol 28 (W.c 1) - Vol 29 (Salle
de repos) - Vol 30 (Bureau 1)
- Vol 31 (Scanner 2) - Vol 32
(Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) -
Vol 34 (Bureau 2) - Vol 35
(W.c 2) - Vol 36 (Bureau 3) -
Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 40
(Couloir 5) - Vol 41 (Couloir 6)
- Vol 42 (Salle d'interprétation
1) - Vol 43 (Console 1) - Vol
44 (Salle de préparation 1) -
Vol 45 (Salle de préparation
2) - Vol 46 (Salle patient) - Vol
47 (Console 2) - Vol 48
(Couloir 7) - Vol 49 (Local
recherche) - Vol 50 (Salle
d'interprétation 2) - Vol 51
(Couloir 8) - Vol 52 (Console
3) - Vol 53 (Console 4) - Vol
54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 55
(W.c 3) - Vol 56 (Local 1) - Vol
57 (Chambre 1) - Vol 58
(Chambre 2) - Vol 59
(Chambre 3) - Vol 60
(Chambre 4) - Vol 61
(Chambre 5) - Vol 62
(Chambre 6) - Vol 63 (W.c 4) -
Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local
2) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 67
(Scanner 1) - Vol 68 (Vestiaire
2) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol
70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c
6) - Vol 72 (Cuisine) - Vol 73
(Local 3) - Vol 74 (Local 4) -
Vol 75 (Rh 2) - Vol 76
(Chaufferie) - Vol 77 (Local 5)
- Vol 78 (Local 6) - Vol 79
(Couloir 11)

Plafond et faux-plafonds

R-2

Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 2 (BT) -
Vol 3 (BK) - Vol 4 (BG) - Vol 5
(BF) - Vol 6 (BE) - Vol 7 (AC) -
Vol 8 (BA) - Vol 9 (BC) - Vol 10
(RH1BCF) - Vol 11 (RH1BBQ)
- Vol 12 (AP) - Vol 14 (AN) - Vol
16 (Ai 2) - Vol 17 (AK) - Vol 20
(AF) - Vol 23 (Couloir 2) - Vol
24 (Couloir 3) - Vol 25
(Douche) - Vol 26 (Placard) -
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28
(W.c 1) - Vol 29 (Salle de
repos) - Vol 30 (Bureau 1) -
Vol 31 (Scanner 2) - Vol 32
(Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) -
Vol 34 (Bureau 2) - Vol 35
(W.c 2) - Vol 36 (Bureau 3) -
Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 40
(Couloir 5) - Vol 41 (Couloir 6)
- Vol 42 (Salle d'interprétation
1) - Vol 43 (Console 1) - Vol
44 (Salle de préparation 1) -
Vol 45 (Salle de préparation
2) - Vol 46 (Salle patient) - Vol
47 (Console 2) - Vol 48
(Couloir 7) - Vol 49 (Local
recherche) - Vol 50 (Salle
d'interprétation 2) - Vol 51
(Couloir 8) - Vol 52 (Console
3) - Vol 53 (Console 4) - Vol
54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 55
(W.c 3) - Vol 56 (Local 1) - Vol
57 (Chambre 1) - Vol 58
(Chambre 2) - Vol 59
(Chambre 3) - Vol 60
(Chambre 4) - Vol 61
(Chambre 5) - Vol 62
(Chambre 6) - Vol 63 (W.c 4) -
Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local
2) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 67
(Scanner 1) - Vol 68 (Vestiaire
2) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol
70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c
6) - Vol 72 (Cuisine) - Vol 73
(Local 3) - Vol 74 (Local 4) -
Vol 75 (Rh 2) - Vol 76
(Chaufferie) - Vol 77 (Local 5)
- Vol 78 (Local 6) - Vol 79
(Couloir 11)

Revêtement de mur

R-2

Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 2 (BT) -
Vol 3 (BK) - Vol 4 (BG) - Vol 5
(BF) - Vol 6 (BE) - Vol 7 (AC) -
Vol 8 (BA) - Vol 9 (BC) - Vol 10
(RH1BCF) - Vol 11 (RH1BBQ)
- Vol 12 (AP) - Vol 13 (AQ) - Vol
14 (AN) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 16
(Ai 2) - Vol 17 (AK) - Vol 18
(AE) - Vol 19 (AD) - Vol 20 (AF)
- Vol 23 (Couloir 2) - Vol 25
(Douche) - Vol 27 (Vestiaire 1)
- Vol 28 (W.c 1) - Vol 29 (Salle
de repos) - Vol 35 (W.c 2) - Vol
41 (Couloir 6) - Vol 44 (Salle
de préparation 1) - Vol 45
(Salle de préparation 2) - Vol
46 (Salle patient) - Vol 54
(PCFrH1-B-3-06) - Vol 55 (W.c
3) - Vol 56 (Local 1) - Vol 63
(W.c 4) - Vol 64 (W.c 5) - Vol
65 (Local 2) - Vol 74 (Local 4)
- Vol 75 (Rh 2)

Revêtement de sol	R-2	<p>Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 2 (BT) - Vol 3 (BK) - Vol 4 (BG) - Vol 5 (BF) - Vol 6 (BE) - Vol 7 (AC) - Vol 8 (BA) - Vol 9 (BC) - Vol 10 (RH1BCF) - Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 12 (AP) - Vol 13 (AQ) - Vol 14 (AN) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 17 (AK) - Vol 18 (AE) - Vol 19 (AD) - Vol 20 (AF) - Vol 21 (Couloir 1) - Vol 22 (B012703BIS) - Vol 23 (Couloir 2) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 25 (Douche) - Vol 26 (Placard) - Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 31 (Scanner 2) - Vol 32 (Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 47 (Console 2) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 49 (Local recherche) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 53 (Console 4) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 56 (Local 1) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 67 (Scanner 1) - Vol 68 (Vestiaire 2) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c 6) - Vol 72 (Cuisine) - Vol 73 (Local 3) - Vol 74 (Local 4) - Vol 75 (Rh 2) - Vol 76 (Chaufferie) - Vol 77 (Local 5) - Vol 78 (Local 6) - Vol 79 (Couloir 11)</p>
Conduits, canalisations et équipements	R-2	<p>Vol 3 (BK) - Vol 8 (BA) - Vol 14 (AN) - Vol 21 (Couloir 1) - Vol 32 (Accueil)</p>
Plafond et faux-plafonds	R-2 bis	<p>Vol 80 (RH1BAF) - Vol 81 (RH1BAD) - Vol 82 (RH1BAE) - Vol 83 (RH1BAN) - Vol 84 (RH1BBT) - Vol 85 (RH1BCJ) - Vol 86 (RH1BCM)</p>

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°31 Phase 1
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°31 Phase 1
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°31 Phase 1
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°31 Phase 1
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°31 Phase 1
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	002AC031471 n°115

L'attention du donneur d'ordre/maître d'ouvrage/propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, de composants ou de parties de composant non inspectés faisant partie du périmètre et du programme des travaux, l'information sur la présence ou l'absence d'amiante ne peut être considérée comme exhaustive et ses obligations réglementaires de repérage définies aux articles R4412 - 97 et suivants du Code du travail ne sont pas remplies. Des investigations approfondies complémentaires seront à réaliser lorsque ces locaux/ parties de locaux, composant ou partie de composant seront accessibles de manière sécurisée.

Localisation	Matériau	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser	Moyen d'accès à mettre en oeuvre
R-2 - Vol 38 (Irm 2)		Risque sanitaire ou physique avéré	Interdiction d'y pénétrer avec outils et tablette.	
R-2 - Vol 37 (Irm 1)		Risque sanitaire ou physique avéré	Interdiction d'y pénétrer avec outils et tablette.	

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet



Amiante

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°1 - 1	002AC031471 n°1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S390	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC031471 n°1 - 1	002AC031471 n°1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC031471 n°1 - 1	002AC031471 n°1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE) - Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S390 - S423	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002AC031471 n°1 - 1	002AC031471 n°1	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°2 - 1	002AC031471 n°2	Colle Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002AC031471 n°2 - 1	002AC031471 n°2	Colle Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°3 - 1	002AC031471 n°3	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BCF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC031471 n°3 - 1	002AC031471 n°3	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (Rh 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC031471 n°3 - 1	002AC031471 n°3	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BCF) - Vol 75 (Rh 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S22 - S425	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002AC031471 n°3 - 1	002AC031471 n°3	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°4 - 1	002AC031471 n°4	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°5 - 1	002AC031471 n°5 Phase 1	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Vert Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P5	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°5 - 1	002AC031471 n°5 Phase 3	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°6 - 1	002AC031471 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S424	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC031471 n°6 - 1	002AC031471 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC031471 n°6 - 1	002AC031471 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (Rh 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	S424 - S426	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002AC031471 n°6 - 1	002AC031471 n°6	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°7 - 1	002AC031471 n°7	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°8 - 1	002AC031471 n°8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002AC031471 n°8 - 1	002AC031471 n°8	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°9 - 1	002AC031471 n°9	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002AC031471 n°9 - 1	002AC031471 n°9	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	WC	002AC031471 n°10 - 1	002AC031471 n°10	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P11	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°11 - 1	002AC031471 n°11	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P12	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (BK)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (AQ)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S38	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (BF)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S39	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (AD)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK) - Vol 8 (BA) - Vol 9 (BC) - Vol 14 (AN) - Vol 13 (AQ) - Vol 5 (BF) - Vol 19 (AD)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S2 - S14 - S15 - S16 - S31 - S38 - S39 - S54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P12		002AC031471 n°12 - 1	002AC031471 n°12	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (BT)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°13 - 1	002AC031471 n°13	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC031471 n°13 - 1	002AC031471 n°13	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC031471 n°13 - 1	002AC031471 n°13	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT) - Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S372	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002AC031471 n°13 - 1	002AC031471 n°13	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1BBQ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BCF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK) - Vol 2 (BT) - Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 10 (RH1BCF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14 - S3 - S18 - S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002AC031471 n°14 - 1	002AC031471 n°14	Colle Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse





Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 2 (BT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle de faïence	P15	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°15 - 1	002AC031471 n°15	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°16 - 1	002AC031471 n°16	Fibres Souple Fibreux Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1BBQ)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AC031471 n°16 - 1	002AC031471 n°16	Fibres Souple Fibreux Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BCF)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AC031471 n°16 - 1	002AC031471 n°16	Fibres Souple Fibreux Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 10 (RH1BCF)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002AC031471 n°16 - 1	002AC031471 n°16	Fibres Souple Fibreux Beige Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°17 - 1	002AC031471 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC031471 n°17 - 1	002AC031471 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (BE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC031471 n°17 - 1	002AC031471 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (BC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1BBQ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S21	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (AQ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK) - Vol 6 (BE) - Vol 9 (BC) - Vol 8 (BA) - Vol 2 (BT) - Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 13 (AQ) - Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P17 - S4 - S5 - S6 - S7 - S20 - S21 - S36 - S37	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P17		002AC0 31471 n °17 - 1	002AC 03147 1 n°17	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (AQ)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S34	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (BF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S35	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 19 (AD)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S56	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN) - Vol 13 (AQ) - Vol 5 (BF) - Vol 19 (AD) - Vol 18 (AE)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S33 - S34 - S35 - S56 - S392	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002AC0 31471 n °18 - 1	002AC 03147 1 n°18	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °19 - 1	002AC 03147 1 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC0 31471 n °19 - 1	002AC 03147 1 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (BE)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC0 31471 n °19 - 1	002AC 03147 1 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC0 31471 n °19 - 1	002AC 03147 1 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC0 31471 n °19 - 1	002AC 03147 1 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (BK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (AQ)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S40	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (BF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S41	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (AD)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S55	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK) - Vol 6 (BE) - Vol 9 (BC) - Vol 8 (BA) - Vol 14 (AN) - Vol 13 (AQ) - Vol 5 (BF) - Vol 19 (AD) - Vol 18 (AE)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P19 - S1 - S8 - S9 - S17 - S32 - S40 - S41 - S55 - S393	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P19		002AC031471 n°19 - 1	002AC031471 n°19	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	P20	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°20 - 1	002AC031471 n°20	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (AF)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	S373	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002AC031471 n°20 - 1	002AC031471 n°20	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (BE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°21 - 1	002AC031471 n°21 Phase 1	Revêtement Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (BE)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P21	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°21 - 1	002AC031471 n°21 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P22	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°22 - 1	002AC031471 n°22	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Dur Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC031471 n°22 - 1	002AC031471 n°22	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Dur Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC031471 n°22 - 1	002AC031471 n°22	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Dur Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC) - Vol 3 (BK)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P22		002AC031471 n°22 - 1	002AC031471 n°22	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Dur Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°23 - 1	002AC031471 n°23	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Réalisation d'un prélèvement	Wc	002AC031471 n°24 - 1	002AC031471 n°24	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (BA)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24	Wc	002AC031471 n°24 - 1	002AC031471 n°24	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°25 - 1	002AC031471 n°25	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (BC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002AC031471 n°25 - 1	002AC031471 n°25	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°26 - 1	002AC031471 n°26	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (RH1BCF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P27	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S23	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 11 (RH1BBQ)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (BA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 9 (BC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (BE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (BF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (RH1BCJ)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S427	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (BT) - Vol 3 (BK) - Vol 11 (RH1BBQ) - Vol 8 (BA) - Vol 9 (BC) - Vol 6 (BE) - Vol 14 (AN) - Vol 5 (BF) - Vol 1 (RH1BCJ) - Vol 75 (Rh 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S23 - S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S427 - S428	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002AC031471 n°27 - 1	002AC031471 n°27	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélèvement	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 7 (AC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S43	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S371	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 20 (AF) - Vol 17 (AK)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S42 - S43 - S44 - S371 - S429	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P28	Chambre froide	002AC031471 n°28 - 1	002AC031471 n°28	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P29	Réalisation d'un prélèvement	Rampe	002AC031471 n°29 - 1	002AC031471 n°29	Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Ciment Dur Gris Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 20 (AF) - Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45 - S46 - S47 - S370 - S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 20 (AF) - Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45 - S46 - S47 - S370 - S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S46	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S47	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S370	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 20 (AF) - Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S45 - S46 - S47 - S370 - S430	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P30		002AC031471 n°30 - 1	002AC031471 n°30 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 1	Colle Dur Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S48 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 1	Colle Dur Blanc	Positif	Présence sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S49 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 1	Colle Dur Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 1	Colle Dur Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S431 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 1	Colle Dur Blanc	Positif	Présence sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S48 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S49 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S431 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 2	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P31	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S48 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Ai 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S49 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S50 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (AK)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S431 (P31)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P31		002AC031471 n°31 - 1	002AC031471 n°31 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P32	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°32 - 1	002AC031471 n°32	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 18 (AE)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S394	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P32		002AC031471 n°32 - 1	002AC031471 n°32	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°33 - 1	002AC031471 n°33 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC031471 n°33 - 1	002AC031471 n°33 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P33	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°33 - 1	002AC031471 n°33 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S395	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P33		002AC031471 n°33 - 1	002AC031471 n°33 Phase 3	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (AP)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P34	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°34 - 1	002AC031471 n°34	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC031471 n°34 - 1	002AC031471 n°34	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Ai 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC031471 n°34 - 1	002AC031471 n°34	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (AK)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC0 31471 n °34 - 1	002AC 03147 1 n°34	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (AC) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 17 (AK)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	S51 - S52 - S432	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P34		002AC0 31471 n °34 - 1	002AC 03147 1 n°34	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P35	Réalisation d'un prélèvement	Gaine technique	002AC0 31471 n °35 - 1	002AC 03147 1 n°35	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °36 - 1	002AC 03147 1 n°36	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P36	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P36		002AC0 31471 n °36 - 1	002AC 03147 1 n°36	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (AN)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P37	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °37 - 1	002AC 03147 1 n°37	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 15 (Ai 1)	Équipements divers et accessoires	Tuyauteries	Isolant	P38	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °38 - 1	002AC 03147 1 n°38	Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Ai 2)	Équipements divers et accessoires	Tuyauteries	Isolant	S53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P38		002AC0 31471 n °38 - 1	002AC 03147 1 n°38	Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °39 - 1	002AC 03147 1 n°39 Phase 1	Enveloppe de calorifuge	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (BK)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge	P39	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°39 - 1	002AC031471 n°39 Phase 2	Enveloppe de calorifuge	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (BK)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P40	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°40 - 1	002AC031471 n°40	Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P41	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°41 - 1	002AC031471 n°41	Ciment Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S396	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P41		002AC031471 n°41 - 1	002AC031471 n°41	Ciment Dur Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plâtre	P42	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°42 - 1	002AC031471 n°42	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plâtre	P42	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC031471 n°42 - 1	002AC031471 n°42	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plâtre	S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC031471 n°42 - 1	002AC031471 n°42	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1) - Vol 22 (B012703BIS)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plâtre	P42 - S57	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P42		002AC031471 n°42 - 1	002AC031471 n°42	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P43	Réalisation d'un prélèvement	Parpaing	002AC031471 n°43 - 1	002AC031471 n°43	Ciment Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P43	Parpaing	002AC031471 n°43 - 1	002AC031471 n°43	Ciment Dur Blanc Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	P44	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°44 - 1	002AC031471 n°44	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	P44	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC031471 n°44 - 1	002AC031471 n°44	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC031471 n°44 - 1	002AC031471 n°44	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS) - Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Syporex	P44 - S59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P44		002AC031471 n°44 - 1	002AC031471 n°44	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P45	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°45 - 1	002AC031471 n°45	Peinture Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 22 (B012703BIS)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau	P46	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°46 - 1	002AC031471 n°46	Matériau Effritable Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	P47	Réalisation d'un prélèvement	Brique	002AC031471 n°47 - 1	002AC031471 n°47	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S389	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Brique	002AC031471 n°47 - 1	002AC031471 n°47	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Brique	002AC031471 n°47 - 1	002AC031471 n°47	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4) - Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de scellement	S389 - S408	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P47	Brique	002AC031471 n°47 - 1	002AC031471 n°47	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P48	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°48 - 1	002AC031471 n°48	Laine Souple Fibreux Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P49	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°49 - 1	002AC031471 n°49	Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Réalisation d'un prélèvement	Pailleté	002AC031471 n°50 - 1	002AC031471 n°50	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P50	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P50	Pailleté	002AC031471 n°50 - 1	002AC031471 n°50	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°51 - 1	002AC031471 n°51	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P51	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P51		002AC031471 n°51 - 1	002AC031471 n°51	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P52	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°52 - 1	002AC031471 n°52	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P52	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002AC031471 n°52 - 1	002AC031471 n°52	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002AC031471 n°52 - 1	002AC031471 n°52	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1) - Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P52 - S404	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P52		002AC031471 n°52 - 1	002AC031471 n°52	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P53	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°53 - 1	002AC031471 n°53 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC031471 n°53 - 1	002AC031471 n°53 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P53	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°53 - 1	002AC031471 n°53 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P53	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P53		002AC031471 n°53 - 1	002AC031471 n°53 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°54 - 1	002AC031471 n°54	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 21 (Couloir 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P54	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P54		002AC031471 n°54 - 1	002AC031471 n°54	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P55	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°55 - 1	002AC031471 n°55	Peinture Effritable Gris Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P56	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S62	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S63	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S69	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S95	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S97	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S102	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S103	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S104	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 46 (Salle patient)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S140	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S141	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S142	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S143	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S144	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S145	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S146	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S147	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S148	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S149	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S150	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S159	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (Local 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S160	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S161	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S162	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S321	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC031471 n°56 - 1	002AC031471 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61 - S62 - S63 - S69 - S95 - S97 - S102 - S103 - S104 - S137 - S138 - S139 - S140 - S141 - S142 - S143 - S144 - S145 - S146 - S147 - S148 - S149 - S150 - S151 - S159 - S160 - S161 - S162 - S321 - S322	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P56		002AC0 31471 n °56 - 1	002AC 03147 1 n°56	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P57	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °57 - 1	002AC 03147 1 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Revêtement t de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S64	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC0 31471 n °57 - 1	002AC 03147 1 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (Douche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S65	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S66	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S67	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S68	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S96	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S99	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S100	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S101	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S111	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S112	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S113	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S114	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S116	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S117	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S118	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S119	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (Couloir 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S121	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Chambre 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S123	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S124	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S125	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S126	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S127	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S128	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S129	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S130	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S132	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S133	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S134	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (W.c 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S135	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Local 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S136	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S163	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S323	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 34 (Bureau 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S324	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S328	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC031471 n°57 - 1	002AC031471 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 32 (Accueil) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 53 (Console 4) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 49 (Local recherche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S64 - S65 - S66 - S67 - S68 - S96 - S99 - S100 - S101 - S111 - S112 - S113 - S114 - S115 - S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121 - S122 - S123 - S124 - S125 - S126 - S127 - S128 - S129 - S130 - S131 - S132 - S133 - S134 - S135 - S136 - S163 - S323 - S324 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P57		002AC0 31471 n°57 - 1	002AC 03147 1 n°57	Ragréage Dur Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S328 P58	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 24 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Couloir 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 61 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (Couloir 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 53 (Console 4) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58 - S60 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S98 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n°58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



R-2

Localisation (Local recherche)	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
				S332 - S333 - S334							
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S60	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S73	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n °58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S77	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S98	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S191	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S192	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S193	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S194	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S195	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S196	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S197	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S198	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S199	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S200	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S201	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S202	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (Couloir 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S203	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S204	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S205	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (Chambre 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S206	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S207	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S208	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S209	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 55 (W.c 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S210	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S211	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S212	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S213	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S214	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S215	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S216	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S217	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Couloir 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S218	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S219	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S220	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S332	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S333	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S334	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC031471 n°58 - 1	002AC031471 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 53 (Console 4) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 49	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P58 - S60 - S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S98 - S191 - S192 - S193 - S194 - S195 - S196 - S197 - S198 - S199 - S200 - S201 - S202 - S203 - S204 - S205 - S206 - S207 - S208 - S209 - S210 - S211 - S212 - S213 - S214 - S215 - S216 - S217 - S218 - S219 - S220 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P58		002AC0 31471 n°58 - 1	002AC 03147 1 n°58 Phase 4	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
(Local recherche)				S332 - S333 - S334							
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S78	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S79	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S80	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S82	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S105	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S221	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S222	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S223	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (W.c 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S224	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Local 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S225	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S226	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S227	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S228	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S229	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S230	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S231	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S232	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S233	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Couloir 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S234	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S235	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S236	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Couloir 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S237	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S238	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S239	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S240	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S241	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S242	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S243	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S244	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S245	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S246	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 62 (Chambre 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S247	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S248	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S249	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S329	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S330	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S331	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC031471 n°59 - 1	002AC031471 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 25 (Douche) - Vol 26 (Placard) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 52 (Console 3) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 56 (Local 1) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 53 (Console 4) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P59 - S78 - S79 - S80 - S81 - S82 - S105 - S221 - S222 - S223 - S224 - S225 - S226 - S227 - S228 - S229 - S230 - S231 - S232 - S233 - S234 - S235 - S236 - S237 - S238 - S239 - S240 - S241 - S242 - S243 - S244 - S245 - S246 - S247 - S248 - S249 - S329 - S330 -	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P59		002AC0 31471 n °59 - 1	002AC 03147 1 n°59	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
49 (Local recherche)				S331							
Vol 26 (Placard)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P60	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S71	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S72	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S83	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S106	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S173	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S174	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S175	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 40 (Couloir 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S176	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Couloir 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S177	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S178	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S179	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S180	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S181	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S182	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S183	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S184	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC031471 n°60 - 1	002AC031471 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 59 (Chambre 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S185	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S186	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S187	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S188	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S189	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S190	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 24 (Couloir 3) - Vol 25 (Douche) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 52 (Console 3) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 56 (Local 1) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 53 (Console 4) - Vol 49 (Local recherche)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S70 - S71 - S72 - S83 - S106 - S173 - S174 - S175 - S176 - S177 - S178 - S179 - S180 - S181 - S182 - S183 - S184 - S185 - S186 - S187 - S188 - S189 - S190 - S335	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P60		002AC0 31471 n °60 - 1	002AC 03147 1 n°60	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P61	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312 - S313 - S314 - S315 - S336 - S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 1	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P61	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC0 31471 n °61 - 1	002AC 03147 1 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312 - S313 - S314 - S315 - S336 - S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 3	Panneaux de cloisons	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P61	Réalisation d'un prélèvement	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S313	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S314	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 43 (Console 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S315	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S336	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S312 - S313 - S314 - S315 - S336 - S337	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P61	Extérieur	002AC031471 n°61 - 1	002AC031471 n°61 Phase 6	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°62 - 1	002AC031471 n°62 Phase 1	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P62	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°62 - 1	002AC031471 n°62 Phase 3	Ragréage Effritable Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P63	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°63 - 1	002AC031471 n°63	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P64	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°64 - 1	002AC031471 n°64	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P65	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°65 - 1	002AC031471 n°65	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P66	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°66 - 1	002AC031471 n°66	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P67	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°67 - 1	002AC031471 n°67	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P68	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S84	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S85	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S108	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S110	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S279	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S280	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S281	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S282	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S283	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S284	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 51 (Couloir 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S285	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S286	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S287	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S289	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 62 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S290	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S291	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S292	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S293	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 30 (Bureau 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S338	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S339	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 32 (Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 47 (Console 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 52 (Console 3) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 78 (Local 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S84 - S85 - S108 - S110 - S279 - S280 - S281 - S282 - S283 - S284 - S285 - S286 - S287 - S289 - S290 - S291 - S292 - S293 - S338 - S339 - S420	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P68		002AC031471 n°68 - 1	002AC031471 n°68	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 27 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P69	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 64 (W.c 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 32 (Accueil) - Vol 53 (Console 4) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86 - S87 - S88 - S107 - S294 - S295 - S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P69	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 25 (Douche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S87	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S88	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S107	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC0 31471 n°69 - 1	002AC 03147 1 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 48 (Couloir 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S294	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S295	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (W.c 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S296	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S297	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S298	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S299	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S300	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S301	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 32 (Accueil) - Vol 53 (Console 4) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	S86 - S87 - S88 - S107 - S294 - S295 - S296 - S297 - S298 - S299 - S300 - S301 - S302	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P69		002AC031471 n°69 - 1	002AC031471 n°69 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P70	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 26 (Placard)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S89	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 25 (Douche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S90	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 28 (W.c 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S91	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 36 (Bureau 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S109	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S303	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S304	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 64 (W.c 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S305	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 65 (Local 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S306	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S307	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S308	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S309	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S310	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC031471 n°70 - 1	002AC031471 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 26 (Placard) - Vol 25 (Douche) - Vol 28 (W.c 1) - Vol 36 (Bureau 3) - Vol 32 (Accueil) - Vol 35 (W.c 2) - Vol 64 (W.c 5) - Vol 65 (Local 2) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	S89 - S90 - S91 - S109 - S303 - S304 - S305 - S306 - S307 - S308 - S309 - S310 - S311	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P70		002AC0 31471 n °70 - 1	002AC 03147 1 n°70	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 24 (Couloir 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P71	Réalisation d'un prélèvement	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S92	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 29 (Salle de repos)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S93	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S94	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 52 (Console 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S255	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 47 (Console 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S256	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC0 31471 n °71 - 1	002AC 03147 1 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 51 (Couloir 8)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S257	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 50 (Salle d'interprétation 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S258	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S259	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S260	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S261	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S262	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S263	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S264	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S265	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S266	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 33 (RH1BT1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S267	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Couloir 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S268	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S269	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S270	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S271	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S272	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 60 (Chambre 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S273	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 61 (Chambre 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S274	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 62 (Chambre 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S275	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S276	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S277	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 30 (Bureau 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S340	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 34 (Bureau 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S341	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S376	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S399	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S418	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S419	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 79 (Couloir 11)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 27 (Vestiaire 1) - Vol 29 (Salle de repos) - Vol 31 (Scanner 2) - Vol 52 (Console 3) - Vol 47 (Console 2) - Vol 51 (Couloir 8) - Vol 50 (Salle d'interprétation 2) - Vol 45 (Salle de préparation 2) - Vol 46 (Salle patient) - Vol 44 (Salle de préparation 1) - Vol 43 (Console 1) - Vol 42 (Salle d'interprétation 1) - Vol 39 (PA-H1-B-3-01) - Vol 32 (Accueil) - Vol 33 (RH1BT1) - Vol 40 (Couloir 5) - Vol 59 (Chambre 3) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 60 (Chambre 4) - Vol 61 (Chambre 5) - Vol 62 (Chambre 6) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 63 (W.c 4) - Vol 30 (Bureau 1) - Vol 34 (Bureau 2) - Vol 73 (Local 3) - Vol 76 (Chaufferie) - Vol 78 (Local 6) - Vol 77 (Local 5) - Vol 79 (Couloir 11)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S92 - S93 - S94 - S255 - S256 - S257 - S258 - S259 - S260 - S261 - S262 - S263 - S264 - S265 - S266 - S267 - S268 - S269 - S270 - S271 - S272 - S273 - S274 - S275 - S276 - S277 - S340 - S341 - S376 - S399 - S418 - S419 - S421	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P71	En plénum	002AC031471 n°71 - 1	002AC031471 n°71	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (Scanner 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°72 - 1	002AC031471 n°72 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC031471 n°72 - 1	002AC031471 n°72 Phase 1	Revêtement Souple Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P72	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°72 - 1	002AC031471 n°72 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S316	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P72		002AC031471 n°72 - 1	002AC031471 n°72 Phase 2	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P73	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°73 - 1	002AC031471 n°73	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S317	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P73		002AC031471 n°73 - 1	002AC031471 n°73	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°74 - 1	002AC031471 n°74	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC0 31471 n °74 - 1	002AC 03147 1 n°74	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC0 31471 n °74 - 1	002AC 03147 1 n°74	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2) - Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P74 - S318	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P74		002AC0 31471 n °74 - 1	002AC 03147 1 n°74	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °75 - 1	002AC 03147 1 n°75 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC0 31471 n °75 - 1	002AC 03147 1 n°75 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC0 31471 n °75 - 1	002AC 03147 1 n°75 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2) - Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75 - S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC0 31471 n °75 - 1	002AC 03147 1 n°75 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°75 - 1	002AC031471 n°75 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC031471 n°75 - 1	002AC031471 n°75 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC031471 n°75 - 1	002AC031471 n°75 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2) - Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P75 - S319	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P75		002AC031471 n°75 - 1	002AC031471 n°75 Phase 3	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°76 - 1	002AC031471 n°76	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC031471 n°76 - 1	002AC031471 n°76	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC031471 n°76 - 1	002AC031471 n°76	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 31 (Scanner 2) - Vol 67 (Scanner 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P76 - S320	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P76		002AC031471 n°76 - 1	002AC031471 n°76	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 31 (Scanner 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P77	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°77 - 1	002AC031471 n°77	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S278	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P77		002AC031471 n°77 - 1	002AC031471 n°77	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P78	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°78 - 1	002AC031471 n°78	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 43 (Console 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S152	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P78		002AC031471 n°78 - 1	002AC031471 n°78	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P79	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°79 - 1	002AC031471 n°79	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 40 (Couloir 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S153	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P79		002AC031471 n°79 - 1	002AC031471 n°79	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P80	Réalisation d'un prélèvement	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S155	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 53 (Console 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S156	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S157	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 48 (Couloir 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S158	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 66 (Couloir 9)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S164	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 53 (Console 4) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 48 (Couloir 7) - Vol 66 (Couloir 9) - Vol 49 (Local recherche)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S154 - S155 - S156 - S157 - S158 - S164 - S327	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P80	Marron	002AC031471 n°80 - 1	002AC031471 n°80	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°81 - 1	002AC031471 n°81	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 35 (W.c 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P81	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P81		002AC031471 n°81 - 1	002AC031471 n°81	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 65 (Local 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P82	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°82 - 1	002AC031471 n°82	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 64 (W.c 5)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P83	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°83 - 1	002AC031471 n°83	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 44 (Salle de préparation 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P84	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°84 - 1	002AC031471 n°84	Colle Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 46 (Salle patient)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P85	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°85 - 1	002AC031471 n°85	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P86	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°86 - 1	002AC031471 n°86	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P87	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°87 - 1	002AC031471 n°87	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P88	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°88 - 1	002AC031471 n°88	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P89	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°89 - 1	002AC031471 n°89	Colle Dur Blanc Matériau Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P90	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°90 - 1	002AC031471 n°90	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P91	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°91 - 1	002AC031471 n°91	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 63 (W.c 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P92	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°92 - 1	002AC031471 n°92	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P93	Réalisation d'un prélèvement	Gaine	002AC031471 n°93 - 1	002AC031471 n°93	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S165	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Gaine	002AC031471 n°93 - 1	002AC031471 n°93	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 32 (Accueil)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S342	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Gaine	002AC031471 n°93 - 1	002AC031471 n°93	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Gaine	002AC031471 n°93 - 1	002AC031471 n°93	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil) - Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S165 - S342 - S407	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P93	Gaine	002AC031471 n°93 - 1	002AC031471 n°93	Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 32 (Accueil)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Calorifugeage	P94	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°94 - 1	002AC031471 n°94	Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P95	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°95 - 1	002AC031471 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreuse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S166	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC031471 n°95 - 1	002AC031471 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreuse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 58 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S167	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC031471 n°95 - 1	002AC031471 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreuse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 57 (Chambre 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S168	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC031471 n°95 - 1	002AC031471 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreuse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S169	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC031471 n°95 - 1	002AC031471 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreuse Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S170	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC0 31471 n °95 - 1	002AC 03147 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S171	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC0 31471 n °95 - 1	002AC 03147 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S172	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC0 31471 n °95 - 1	002AC 03147 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC0 31471 n °95 - 1	002AC 03147 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 59 (Chambre 3) - Vol 58 (Chambre 2) - Vol 57 (Chambre 1) - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 56 (Local 1) - Vol 53 (Console 4) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 49 (Local recherche)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S166 - S167 - S168 - S169 - S170 - S171 - S172 - S325	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P95		002AC0 31471 n °95 - 1	002AC 03147 1 n°95	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P96	Réalisation d'un prélèvement	En plénum	002AC0 31471 n °96 - 1	002AC 03147 1 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S250	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC0 31471 n °96 - 1	002AC 03147 1 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 53 (Console 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S251	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC0 31471 n °96 - 1	002AC 03147 1 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S252	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC031471 n°96 - 1	002AC031471 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 55 (W.c 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S253	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC031471 n°96 - 1	002AC031471 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 67 (Scanner 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S254	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC031471 n°96 - 1	002AC031471 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 49 (Local recherche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC031471 n°96 - 1	002AC031471 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06) - Vol 53 (Console 4) - Vol 41 (Couloir 6) - Vol 55 (W.c 3) - Vol 67 (Scanner 1) - Vol 49 (Local recherche)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S250 - S251 - S252 - S253 - S254 - S326	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P96	En plénum	002AC031471 n°96 - 1	002AC031471 n°96	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 45 (Salle de préparation 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P97	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°97 - 1	002AC031471 n°97	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P98	Réalisation d'un prélèvement	Gaine	002AC031471 n°98 - 1	002AC031471 n°98	Matériau Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	S388	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P98	Gaine	002AC031471 n°98 - 1	002AC031471 n°98	Matériau Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 41 (Couloir 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P99	Réalisation d'un prélèvement	Gaine technique	002AC031471 n°99 - 1	002AC031471 n°99	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 41 (Couloir 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P100	Réalisation d'un prélèvement	Gaine technique	002AC031471 n°100 - 1	002AC031471 n°100	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P101	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°101 - 1	002AC031471 n°101	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S351	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P101		002AC031471 n°101 - 1	002AC031471 n°101	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P102	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S347	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S348	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S349	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S350	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S385	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 73 (Local 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S386	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c 6) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 72 (Cuisine) - Vol 74 (Local 4) - Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	S347 - S348 - S349 - S350 - S385 - S386 - S401	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P102		002AC031471 n°102 - 1	002AC031471 n°102	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P103	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°103 - 1	002AC031471 n°103	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S352	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P103		002AC031471 n°103 - 1	002AC031471 n°103	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P104	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°104 - 1	002AC031471 n°104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S345	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC031471 n°104 - 1	002AC031471 n°104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S353	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S354	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S355	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S359	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S383	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S384	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c 6) - Vol 74 (Local 4) - Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S345 - S353 - S354 - S355 - S359 - S383 - S384 - S402	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P104		002AC0 31471 n °104 - 1	002AC 03147 1 n °104	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P105	Réalisation d'un prélèvement			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S343	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S356	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S357	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 70 (Couloir 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S358	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S381	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S382	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2) - Vol 71 (W.c 6) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 74 (Local 4) - Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S343 - S356 - S357 - S358 - S381 - S382 - S405	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P105			002AC 03147 1 n °105	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P106	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °106 - 1	002AC 03147 1 n °106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 68 (Vestiaire 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S344	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S360	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S361	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S362	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S379	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S380	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC031471 n°106 - 1	002AC031471 n°106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC0 31471 n °106 - 1	002AC 03147 1 n °106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 71 (W.c 6) - Vol 74 (Local 4) - Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S344 - S360 - S361 - S362 - S379 - S380 - S406	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P106		002AC0 31471 n °106 - 1	002AC 03147 1 n °106	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P107	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °107 - 1	002AC 03147 1 n °107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S363	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC0 31471 n °107 - 1	002AC 03147 1 n °107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S364	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC0 31471 n °107 - 1	002AC 03147 1 n °107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S377	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC0 31471 n °107 - 1	002AC 03147 1 n °107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S378	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC0 31471 n °107 - 1	002AC 03147 1 n °107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (Couloir 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC031471 n°107 - 1	002AC031471 n°107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 74 (Local 4) - Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S363 - S364 - S377 - S378 - S411	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P107		002AC031471 n°107 - 1	002AC031471 n°107	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 71 (W.c 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S365 - S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 1	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 68 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P108	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S365	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 71 (W.c 6)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S365 - S366	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P108		002AC031471 n°108 - 1	002AC031471 n°108 Phase 3	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 68 (Vestiaire 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	P109	Réalisation d'un prélèvement	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S367	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S368	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 69 (Vestiaire 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S369	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S374	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S375	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S410	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6) - Vol 70 (Couloir 10) - Vol 69 (Vestiaire 3) - Vol 73 (Local 3) - Vol 74 (Local 4) - Vol 23 (Couloir 2) - Vol 79 (Couloir 11)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits projetés (plâtre)	S367 - S368 - S369 - S374 - S375 - S410 - S422	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P109	En plénum	002AC031471 n°109 - 1	002AC031471 n°109	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 70 (Couloir 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P110	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°110 - 1	002AC031471 n°110	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 71 (W.c 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S346	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P110		002AC031471 n°110 - 1	002AC031471 n°110	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 72 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°111 - 1	002AC031471 n°111 Phase 1	Revêtement Souple Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P111	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°111 - 1	002AC031471 n°111 Phase 2	Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P112	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°112 - 1	002AC031471 n°112	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Jaune Translucide	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P113	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°113 - 1	002AC031471 n°113	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 72 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P114	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°114 - 1	002AC031471 n°114	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°115 - 1	002AC031471 n°115	Colle Dur Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P115	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P115		002AC031471 n°115 - 1	002AC031471 n°115	Colle Dur Beige	Positif	Présence sur analyse
Vol 20 (AF)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P116	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°116 - 1	002AC031471 n°116	Matériau Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 20 (AF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits plâtre	P117	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°117 - 1	002AC031471 n°117	Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P118	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°118 - 1	002AC031471 n°118	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S387	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC031471 n°118 - 1	002AC031471 n°118	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC031471 n°118 - 1	002AC031471 n°118	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 73 (Local 3) - Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S387 - S400	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P118		002AC031471 n°118 - 1	002AC031471 n°118	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 74 (Local 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P119	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°119 - 1	002AC031471 n°119	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	S403	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P119		002AC031471 n°119 - 1	002AC031471 n°119	Colle Dur Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P120	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°120 - 1	002AC031471 n°120	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (AE)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P120	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P120		002AC031471 n°120 - 1	002AC031471 n°120	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P121	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°121 - 1	002AC031471 n°121	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°122 - 1	002AC031471 n°122 Phase 1	Colle Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC031471 n°122 - 1	002AC031471 n°122 Phase 1	Colle Effritable Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°122 - 1	002AC031471 n°122 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 75 (Rh 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P122	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P122		002AC031471 n°122 - 1	002AC031471 n°122 Phase 3	Joint Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P123	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°123 - 1	002AC031471 n°123	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P124	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°124 - 1	002AC031471 n°124	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (BG)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P125	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °125 - 1	002AC 03147 1 n °125	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S409	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P125		002AC0 31471 n °125 - 1	002AC 03147 1 n °125	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P126	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °126 - 1	002AC 03147 1 n °126	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaufferie)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S397	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002AC0 31471 n °126 - 1	002AC 03147 1 n °126	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S413	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002AC0 31471 n °126 - 1	002AC 03147 1 n °126	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002AC0 31471 n °126 - 1	002AC 03147 1 n °126	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 76 (Chaufferie) - Vol 77 (Local 5) - Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S397 - S413 - S414	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P126		002AC0 31471 n °126 - 1	002AC 03147 1 n °126	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P127	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471 n °127 - 1	002AC 03147 1 n °127 Phase 1	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaufferie)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC0 31471 n °127 - 1	002AC 03147 1 n °127 Phase 1	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC0 31471 n °127 - 1	002AC 03147 1 n °127 Phase 1	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC0 31471 n °127 - 1	002AC 03147 1 n °127 Phase 1	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaufferie) - Vol 77 (Local 5) - Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S398 - S415 - S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC0 31471 n °127 - 1	002AC 03147 1 n °127 Phase 1	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (BG)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P127	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°127 - 1	002AC031471 n°127 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaudière)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S398	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC031471 n°127 - 1	002AC031471 n°127 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S415	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC031471 n°127 - 1	002AC031471 n°127 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC031471 n°127 - 1	002AC031471 n°127 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaudière) - Vol 77 (Local 5) - Vol 78 (Local 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	S398 - S415 - S416	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P127		002AC031471 n°127 - 1	002AC031471 n°127 Phase 2	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°128 - 1	002AC031471 n°128 Phase 1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 4 (BG)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués	P128	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°128 - 1	002AC031471 n°128 Phase 2	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (BG)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Panneaux vissés	P129	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°129 - 1	002AC031471 n°129	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 76 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P130	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°130 - 1	002AC031471 n°130	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S412	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC031471 n°130 - 1	002AC031471 n°130	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC031471 n°130 - 1	002AC031471 n°130	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5) - Vol 78 (Local 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	S412 - S417	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P130		002AC031471 n°130 - 1	002AC031471 n°130	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P131	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°131 - 1	002AC031471 n°131 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC031471 n°131 - 1	002AC031471 n°131 Phase 1	Colle Dur Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P131	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°131 - 1	002AC031471 n°131 Phase 2	Matériau Bitumineux Noir Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P131	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P131		002AC031471 n°131 - 1	002AC031471 n°131 Phase 2	Matériau Bitumineux Noir Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P132	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°132 - 1	002AC031471 n°132	Colle Dur Gris Matériau Bitumineux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 23 (Couloir 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joint de dilatation	P133	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°133 - 1	002AC031471 n°133	Matériau Fibreux Souple Beige Fibres Souple Fibreux Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 77 (Local 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P134	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°134 - 1	002AC031471 n°134	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Peinture Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 78 (Local 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P135	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°135 - 1	002AC031471 n°135	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 79 (Couloir 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P136	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°136 - 1	002AC031471 n°136	Colle Dur Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P137	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°137 - 1	002AC031471 n°137	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P137	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P137		002AC031471 n°137 - 1	002AC031471 n°137	Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P138	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°138 - 1	002AC031471 n°138	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P138	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P138		002AC031471 n°138 - 1	002AC031471 n°138	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P139	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471 n°139 - 1	002AC031471 n°139	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 79 (Couloir 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits projetés (plâtre)	P139	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P139		002AC031471 n°139 - 1	002AC031471 n°139	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P140	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°140 - 2	P140	Matériau brillant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P141	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°141 - 2	P141	Matériau brillant beige	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P142	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°142 - 2	P142	Matériau brillant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P143	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°143 - 2	P143	Matériau brillant beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 56 (Local 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S433	Réalisation d'un sondage		S433 - 2				Négatif sur document Dalle ecophon
Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S433	Sondage et extension de la ZPSO du sondage S433		S433 - 2				Négatif sur document Dalle ecophon
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P144	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°144 - 2	P144	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P145	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°145 - 2	P145	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P146	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°146 - 2	P146	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P147	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°147 - 2	P147	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

R-2 bis

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 80 (RH1BAF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P148	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°148 - 2	P148 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH1BAF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P148	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°148 - 2	P148 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2 bis

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 80 (RH1BAF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P149	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471-2 n°149 - 2	P149 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH1BAF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduits ciment	P149	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471-2 n°149 - 2	P149 Phase 2	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 80 (RH1BAF)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis brique	S434	Réalisation d'un sondage		S434 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Hourdis brique
Vol 81 (RH1BAD)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis brique	S435	Réalisation d'un sondage		S435 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Hourdis brique
Vol 82 (RH1BAE)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis brique	S436	Réalisation d'un sondage		S436 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature Hourdis brique
Vol 83 (RH1BAN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P150	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471-2 n°150 - 2	P150	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RH1BAN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S437	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P150		002AC0 31471-2 n°150 - 2	P150	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RH1BAN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P151	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471-2 n°151 - 2	P151	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 83 (RH1BAN)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	S438	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P151		002AC0 31471-2 n°151 - 2	P151	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 84 (RH1BBT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P152	Réalisation d'un prélèvement		002AC0 31471-2 n°152 - 2	P152	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Amiante

R-2 bis

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 84 (RH1BBT)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P153	Réalisation d'un prélèvement		002AC031471-2 n°153 - 2	P153	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 85 (RH1BCJ)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis brique	S439	Réalisation d'un sondage		S439 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureHourdis brique
Vol 86 (RH1BCM)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Hourdis brique	S440	Réalisation d'un sondage		S440 - 2				Materiau ne contenant pas d'amiante par natureHourdis brique


ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref pré.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité(s)
R-2							
002AC0314 71 n°31 Phase 1	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc	Vol 12 (AP) - Vol 7 (AC) - Vol 16 (Ai 2) - Vol 15 (Ai 1) - Vol 17 (AK)	70,26 m			
002AC0314 71 n°115	Revêtement de mur	Colle Dur Beige	Vol 20 (AF) - Vol 20 (AF) - Vol 20 (AF) - Vol 20 (AF) - Vol 20 (AF)	48,9 m			


ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	R-2	R-2 - Plan de repérage - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1 - MPCA Revêtement de mur
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1.1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1.1.1 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 1.2 - Actions menées
	R-2	R-2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	R-2 bis	R-2 bis - Plan de repérage - Actions menées
	R-2 bis	R-2 bis - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

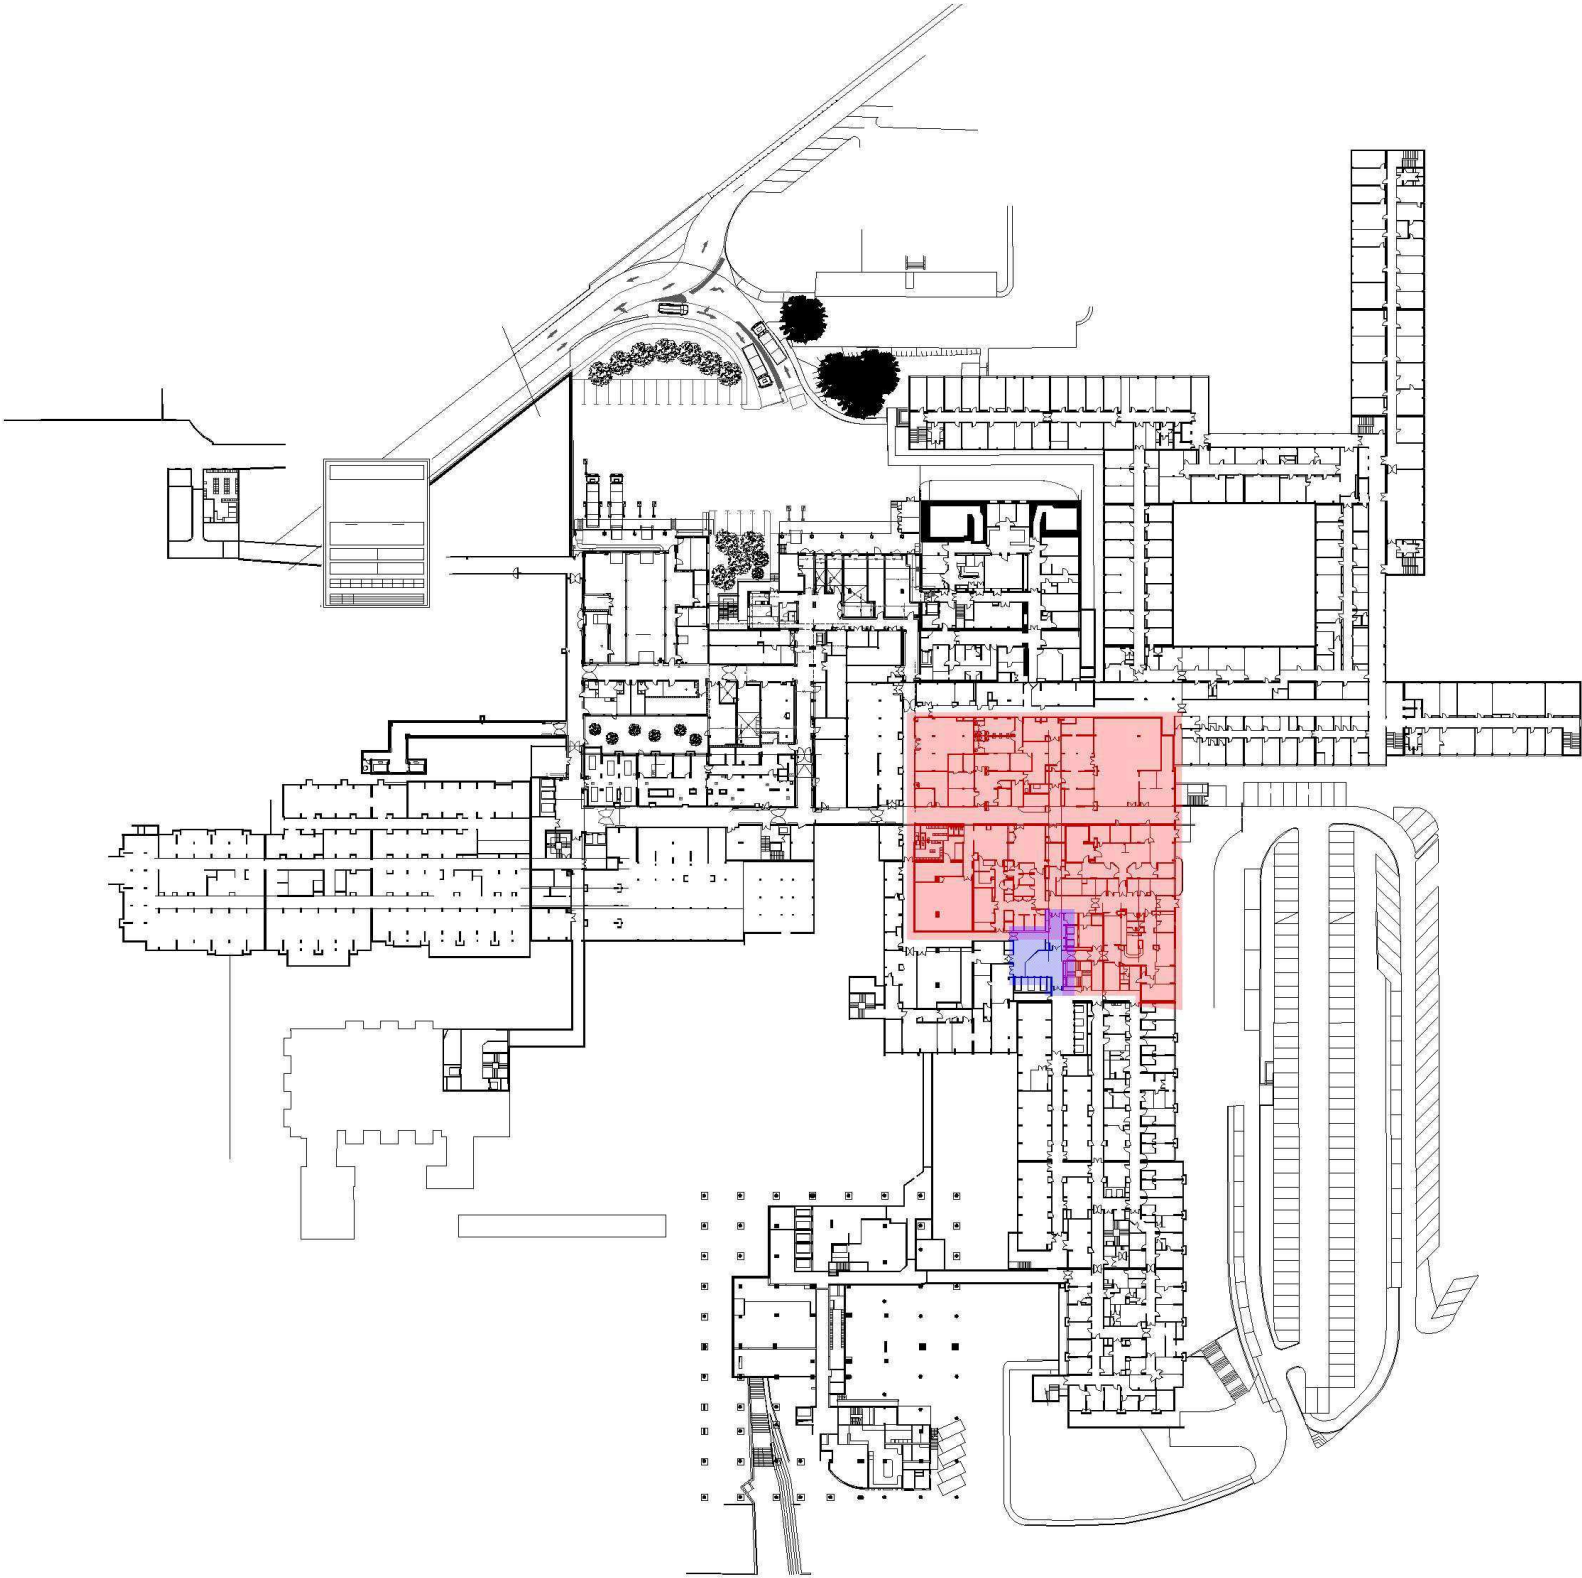R-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002AC031471-2
				Légende
				<div></div> Périmètre d'intervention 1
				<div></div> Périmètre d'intervention 2
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE		Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB	20/12/2023	BOBIN NICOLAS

R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC031471-2

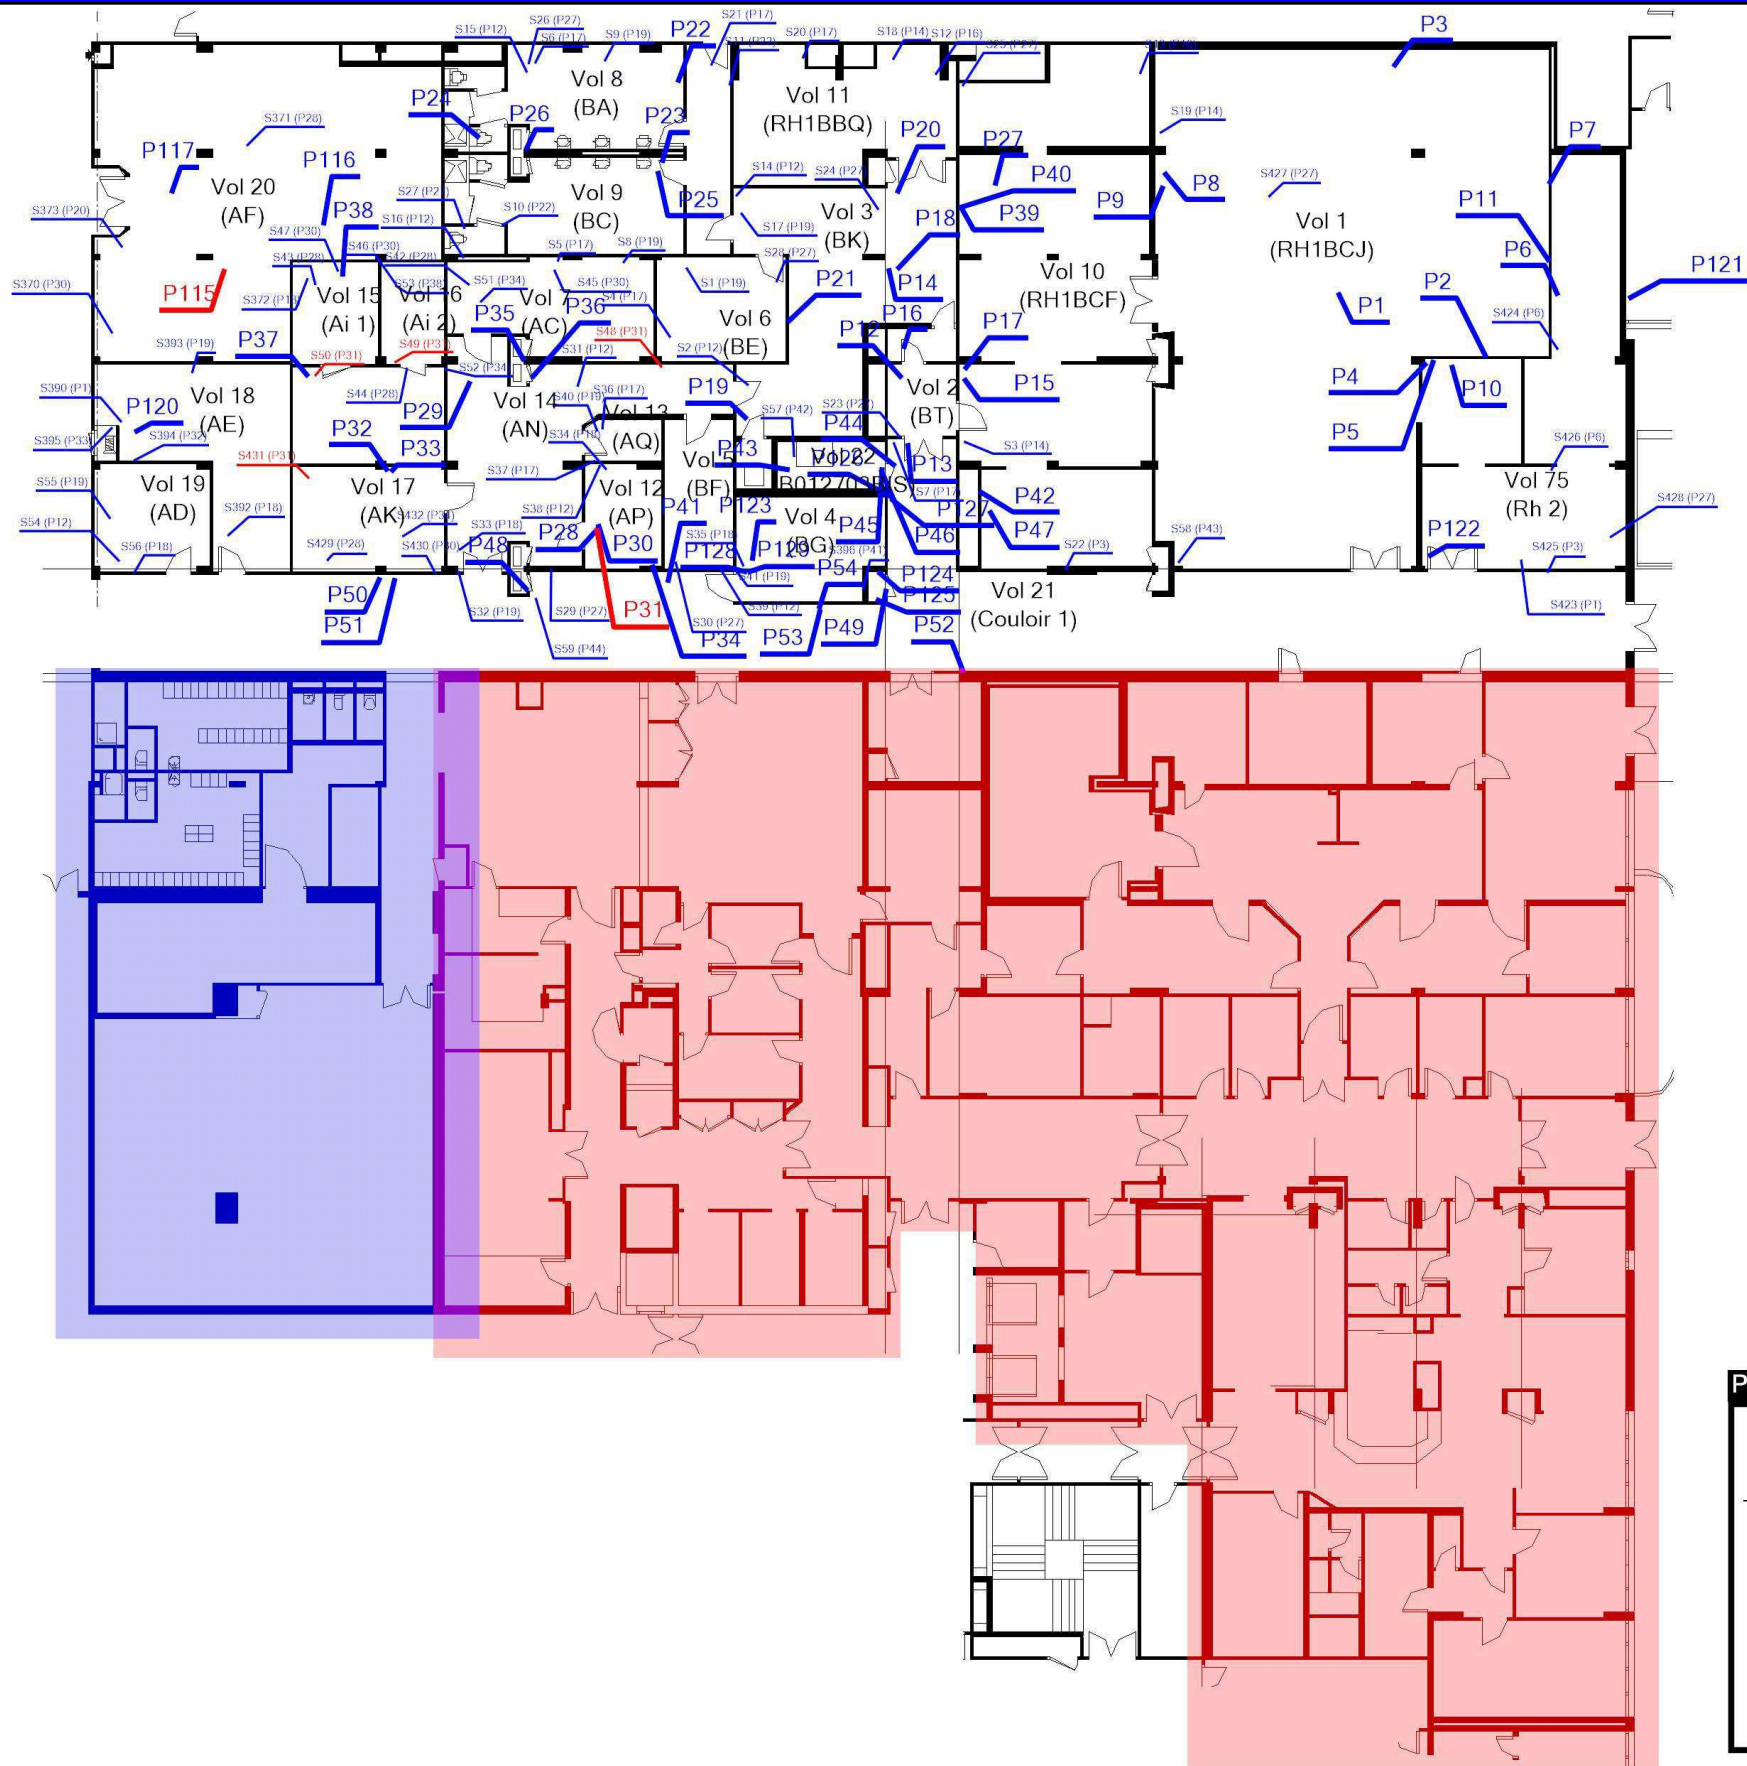

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement négatif
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Périmètre d'intervention 1.1
	Périmètre d'intervention 1.2



Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation




Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ,
RHA1FY, RH1A18, RH1AGB

Date intervention

20/12/2023



Technicien intervenant

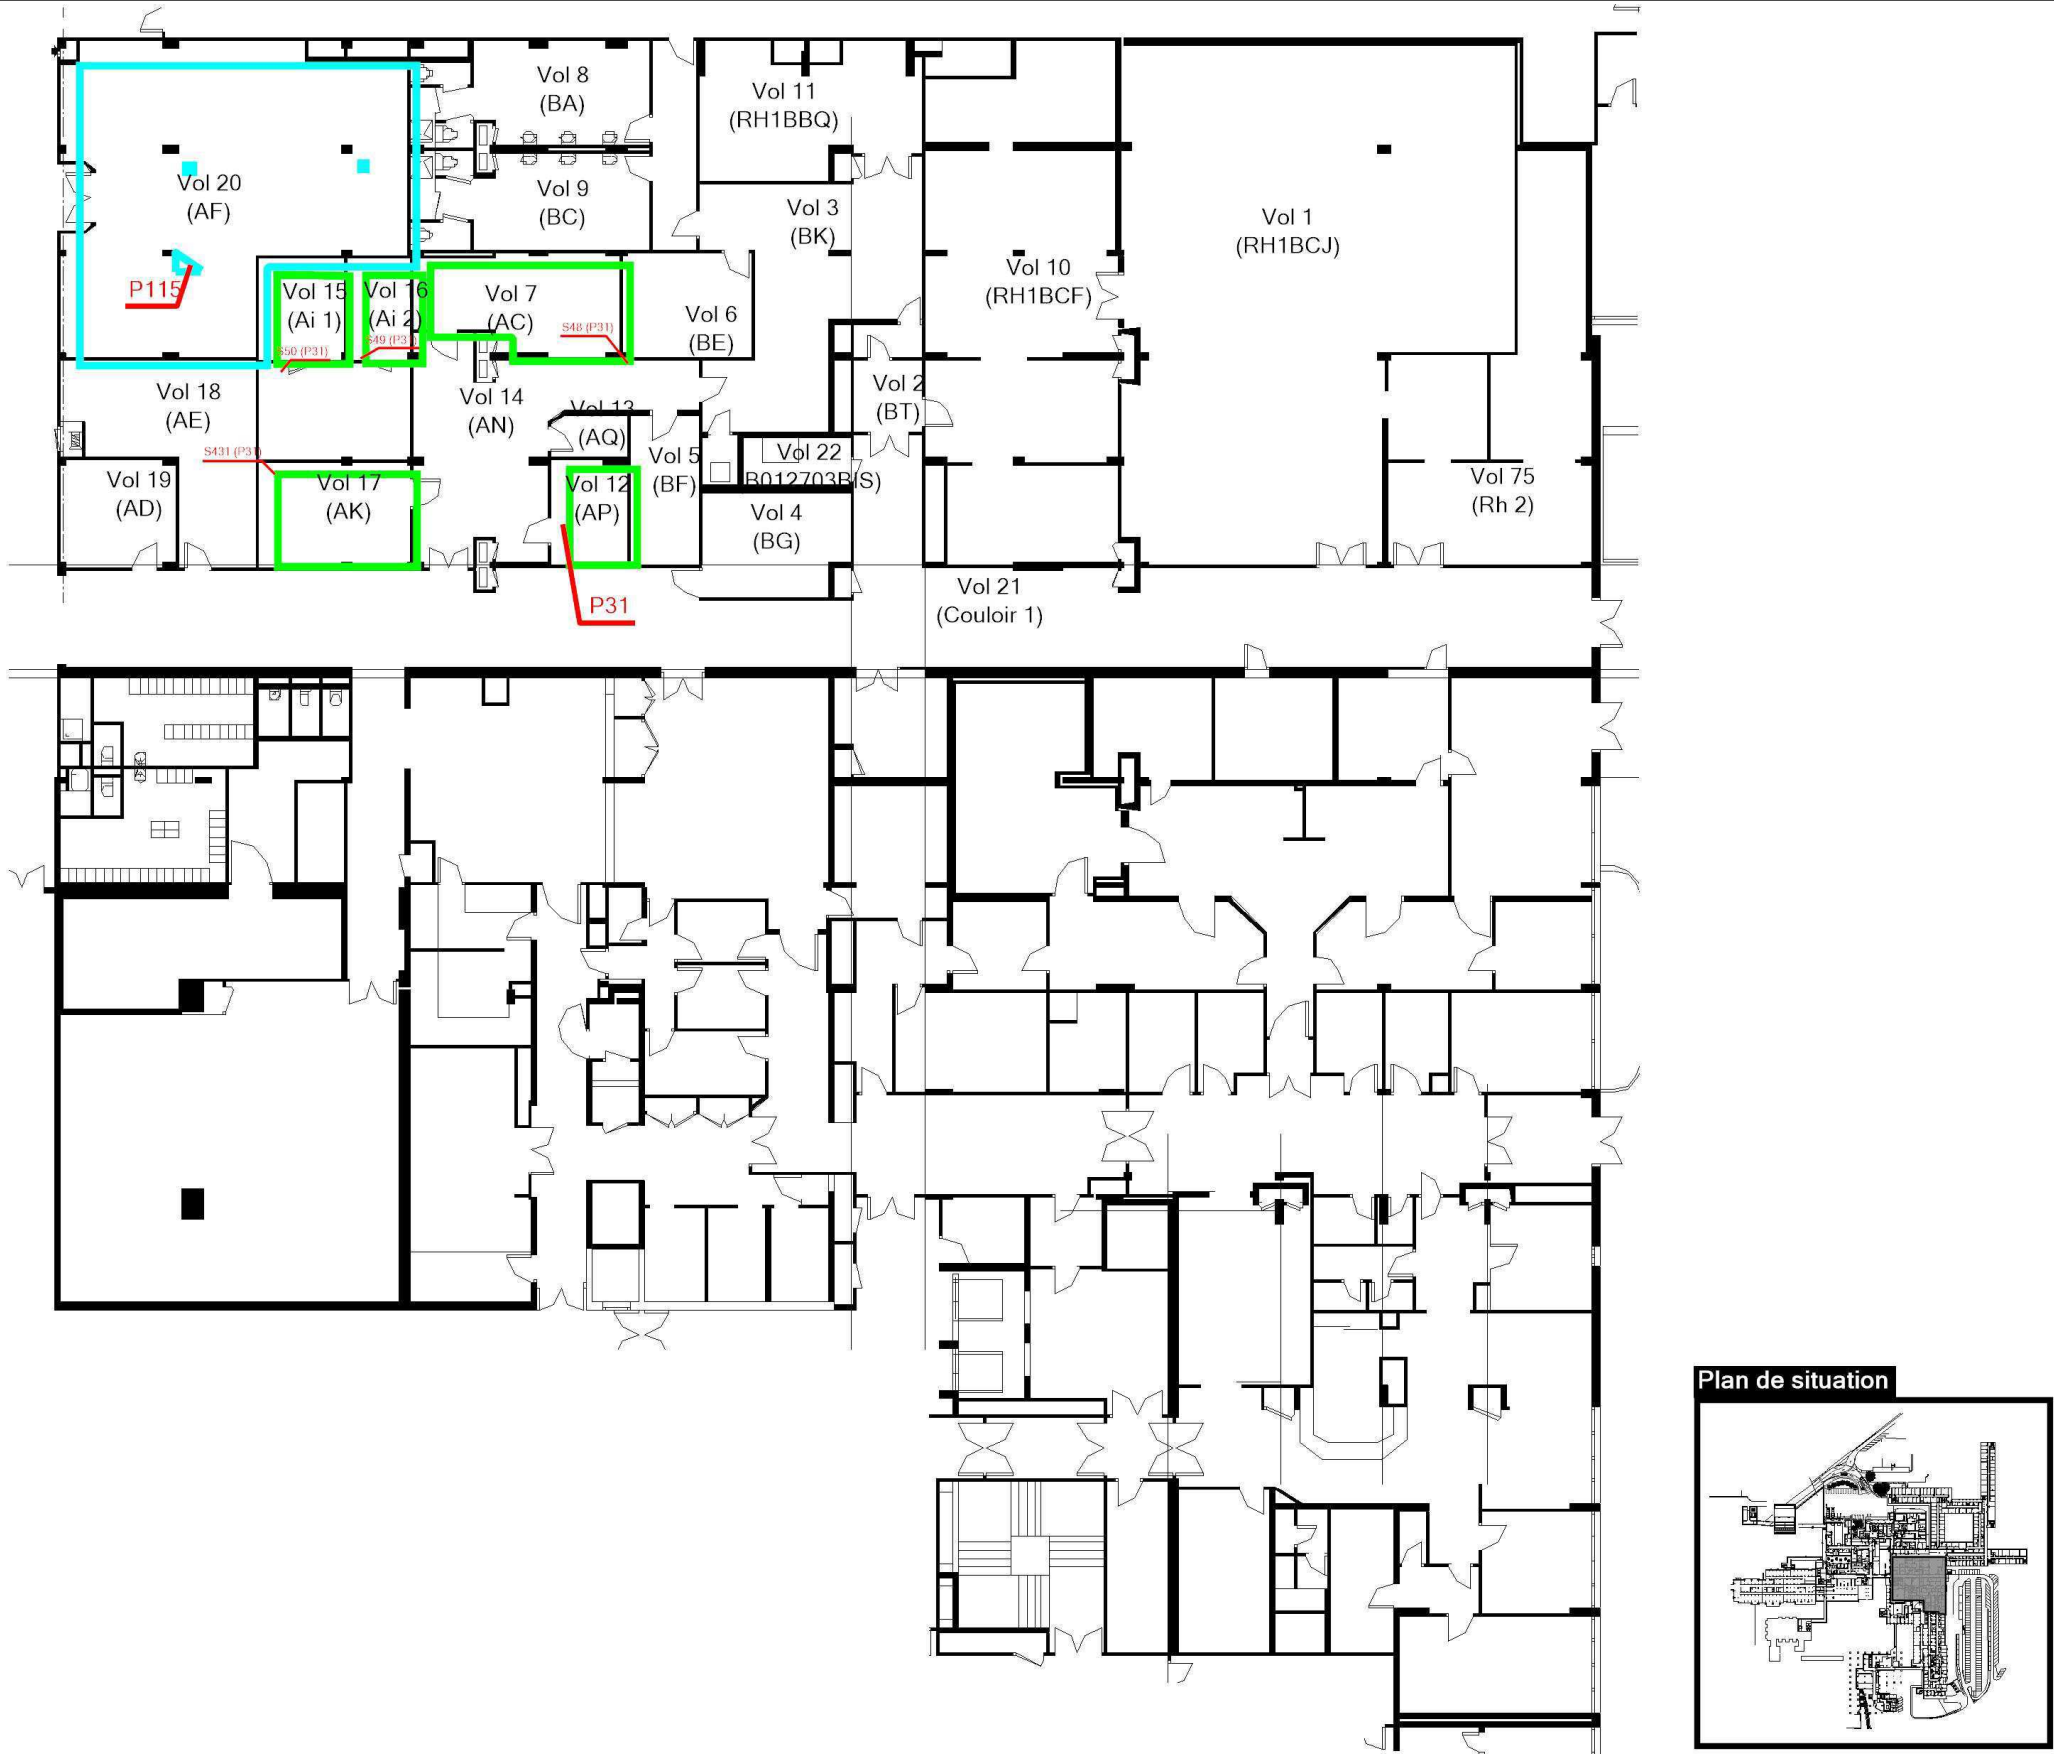BOBIN NICOLAS

R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002AC031471-2	
<div></div>				Légende	
					P31 : Colle Dur Blanc
					P115 : Colle de carrelage (faïence)
AC ENVIRONNEMENT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS		Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
		1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE	Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB	20/12/2023	BOBIN NICOLAS

R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - MPCA REVÊTEMENT DE MUR

Référence:
002AC031471-2

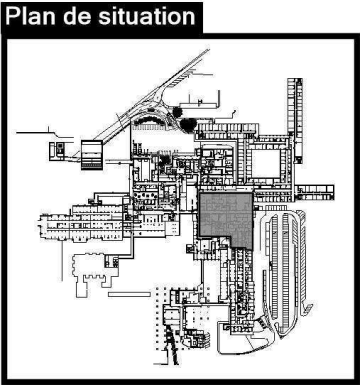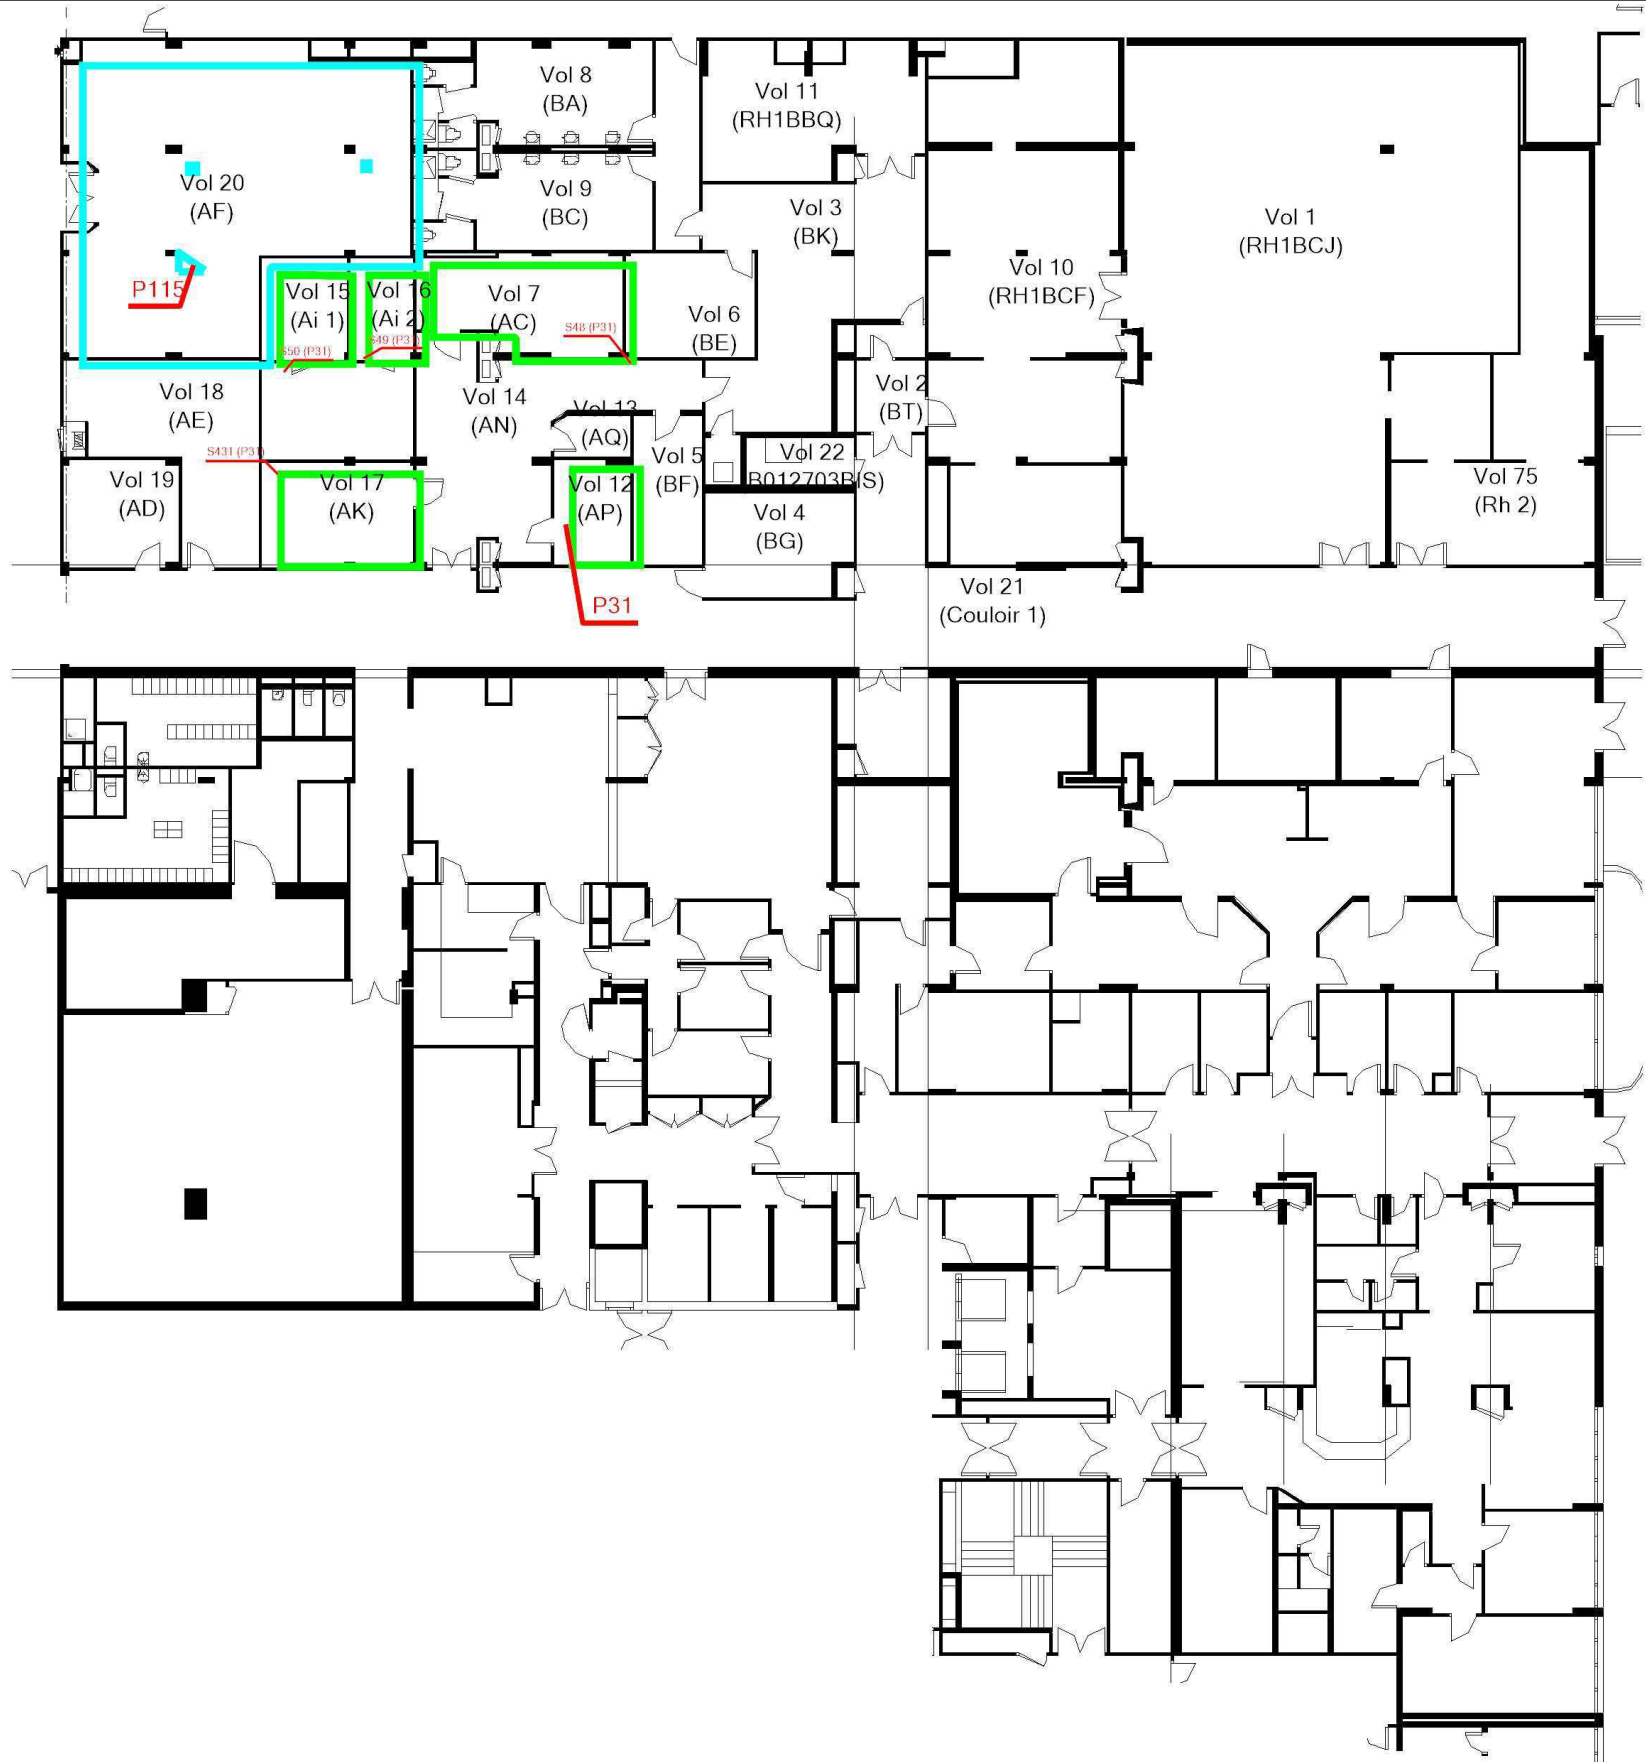

Légende



P31 : Colle Dur Blanc



P115 : Colle de carrelage (faïence)



Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ,
RHA1FY, RH1A18, RH1AGB

Date intervention

20/12/2023

Technicien intervenant

BOBIN NICOLAS


R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1.1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC031471-2



Légende

	Localisation d'un prélèvement négatif
---	---------------------------------------

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------



Adresse du bien
1 Avenue du Professeur Jean Poulhes 31400 TOULOUSE

Désignation
Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB


Date intervention
20/12/2023

Techniciens intervenant
BOBIN NICOLAS


R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1.1.1 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC031471-2


Légende



Localisation d'un prélèvement négatif



Localisation d'un sondage négatif

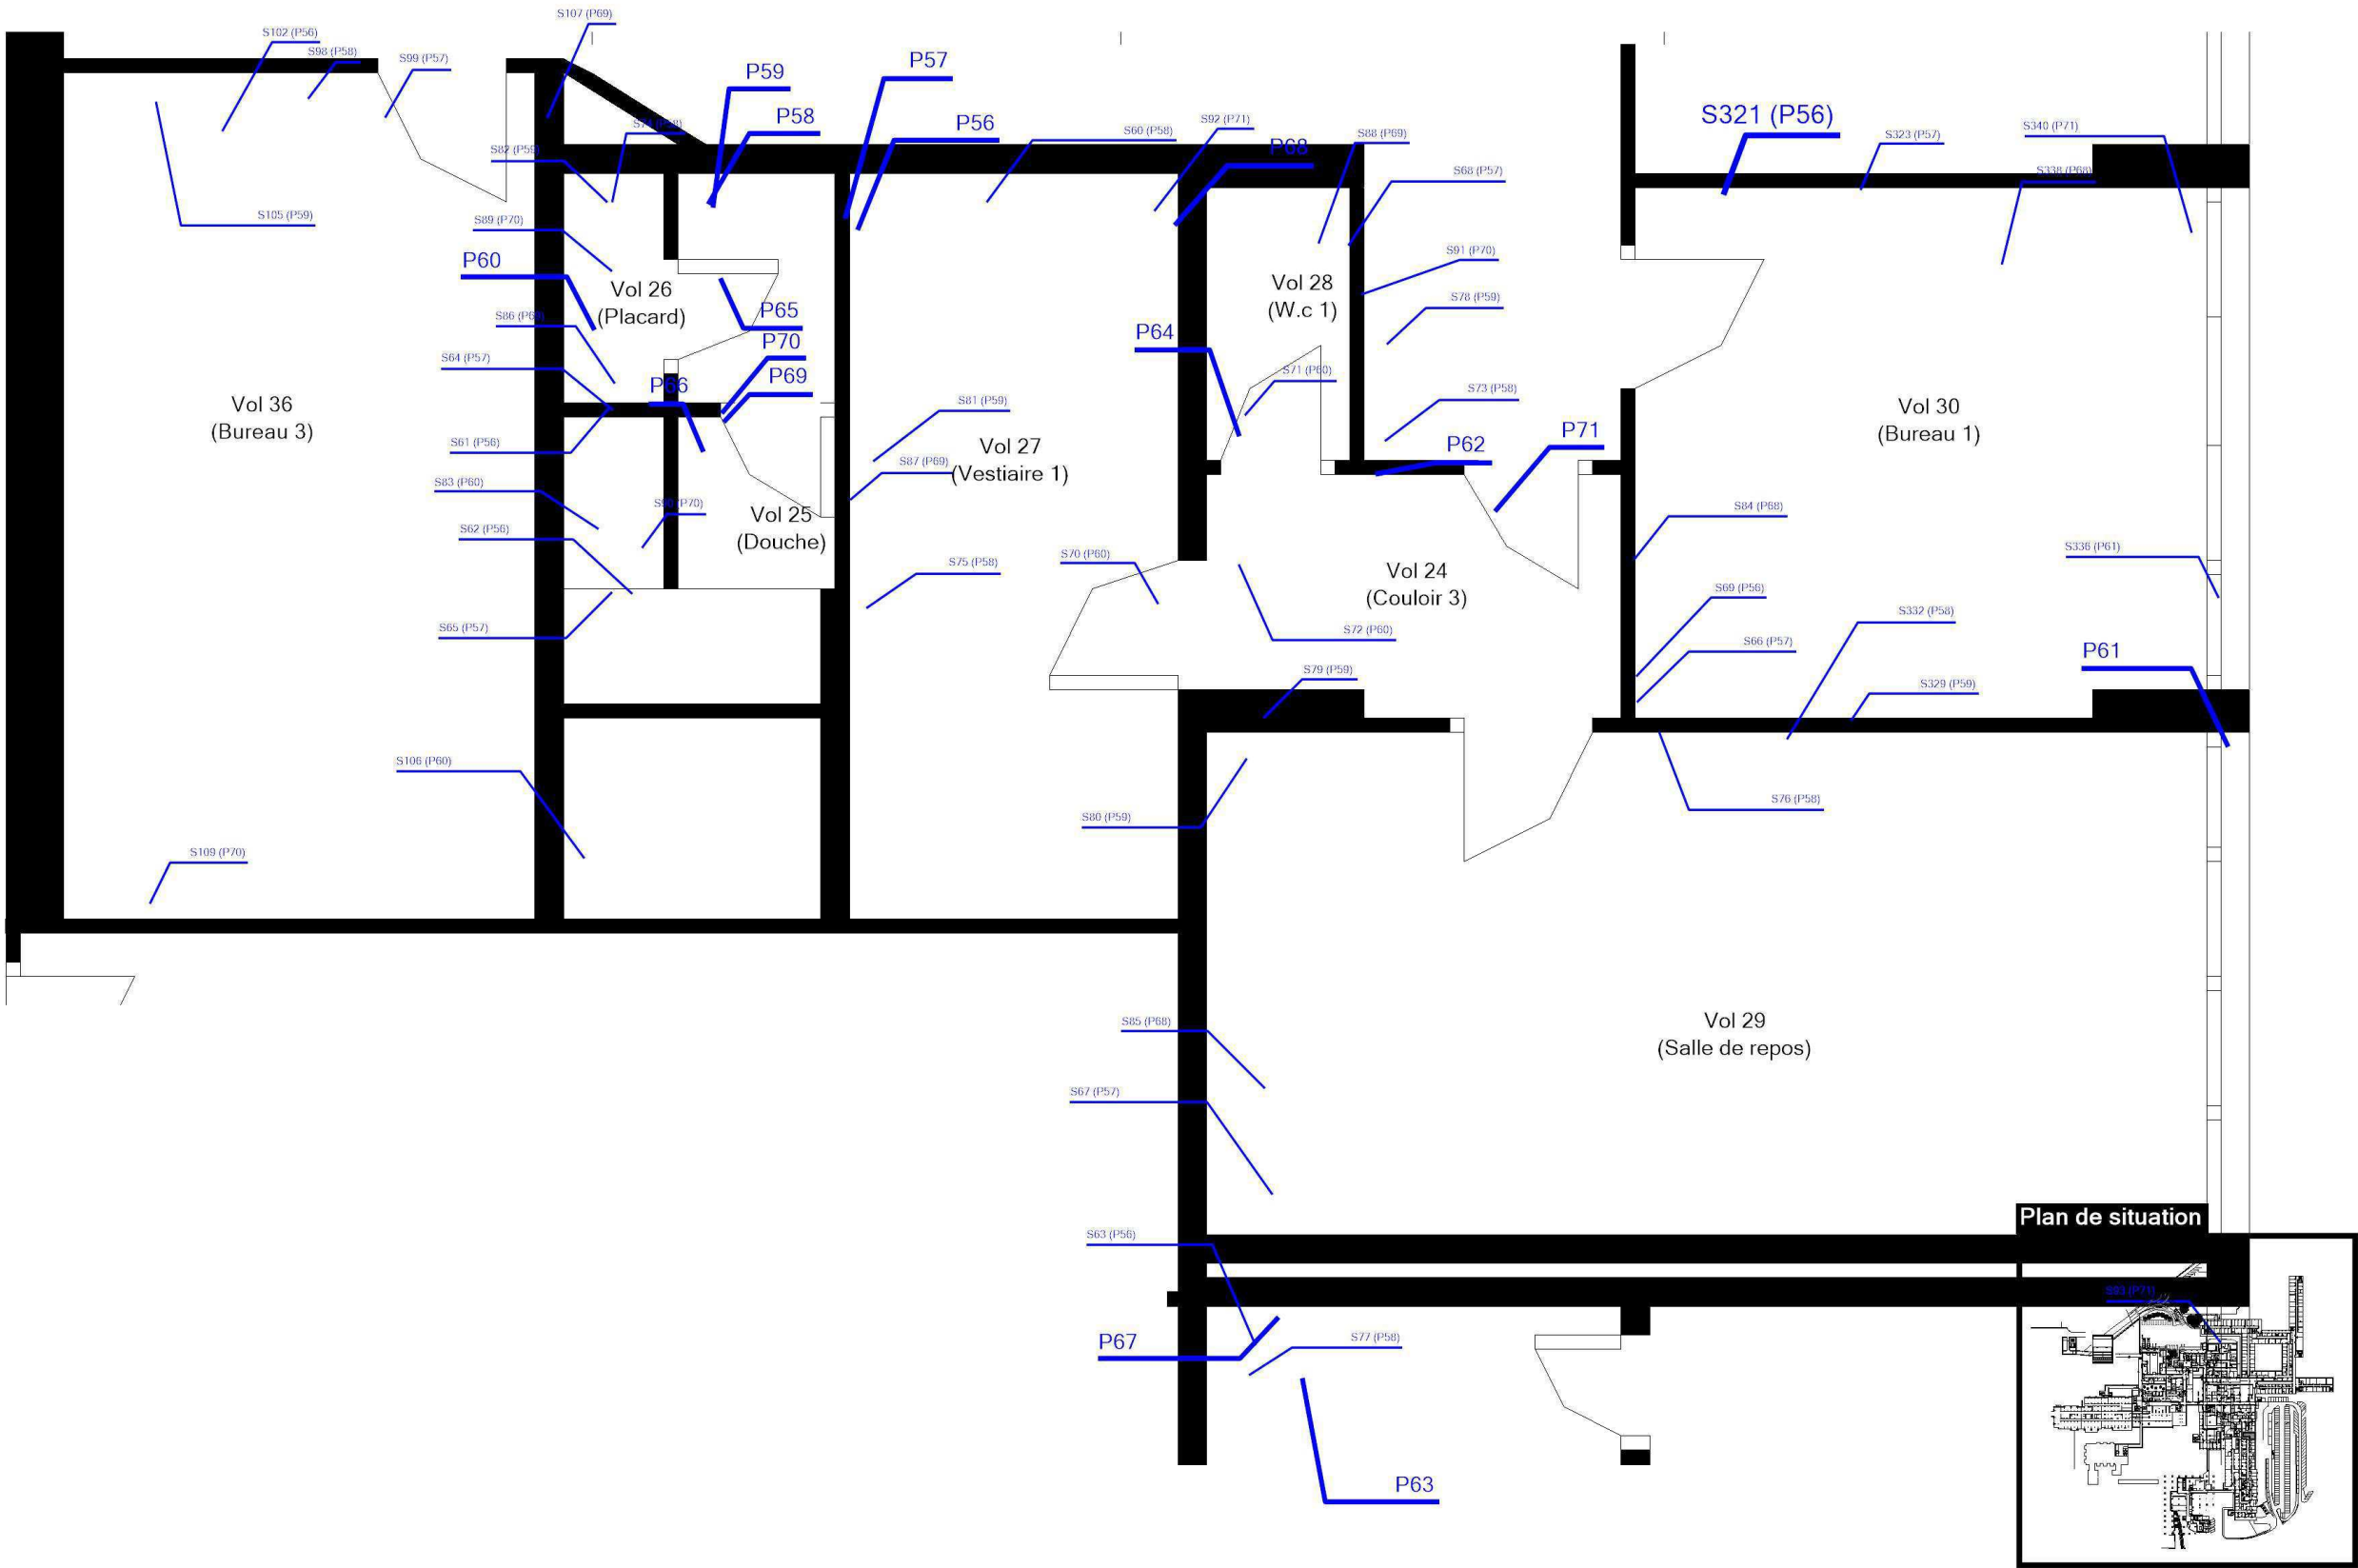

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ,
RHA1FY, RH1A18, RH1AGB

Date intervention

20/12/2023

Technicien intervenant

BOBIN NICOLAS

R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1.2 - ACTIONS MENÉES


Référence:
002AC031471-2

Légende

Localisation d'un prélèvement négatif

A graph showing a horizontal line at a constant value S_0 on the vertical axis, indicating that the quantity S remains constant over time t .

Localisation dun sondage négatif

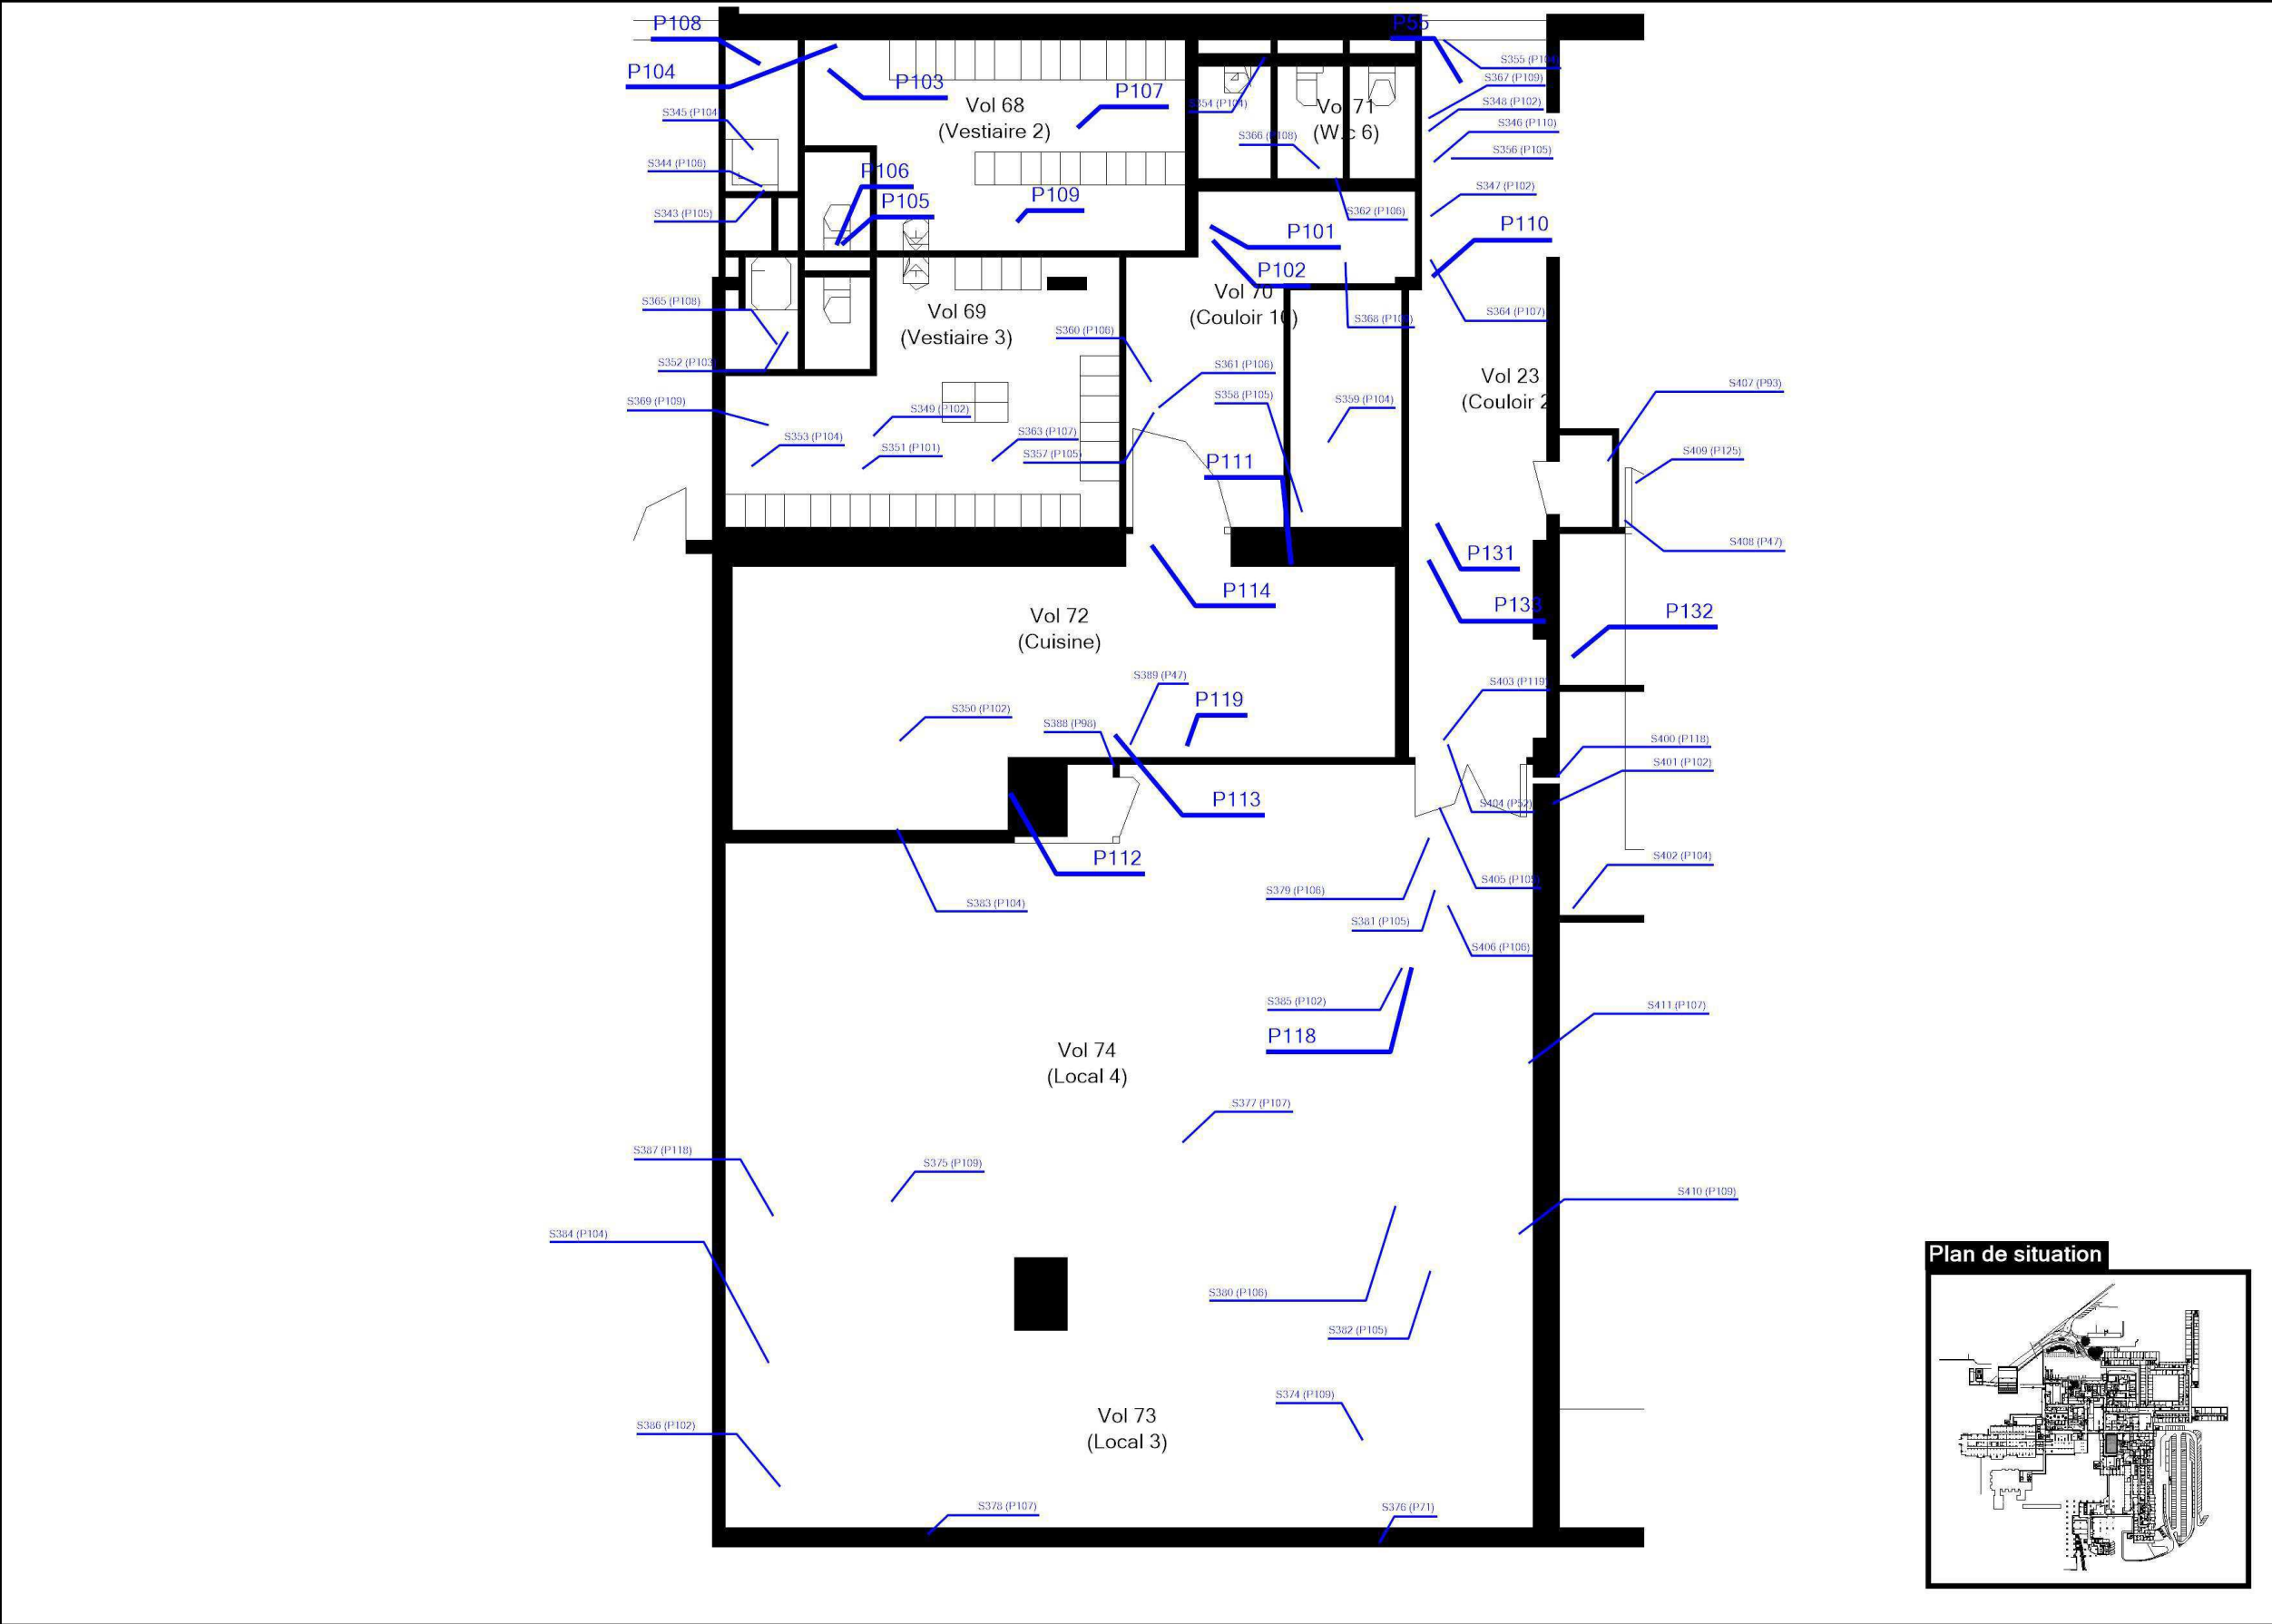

Adresse du bien

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Ranguel - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ,
RHA1FY, RH1A18, RH1AGB

Date intervention

20/12/2023

Techniciens intervenant	
-------------------------	--

BOBIN NICOLAS



R-2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 2 - ACTIONS MENÉES

Référence:
002AC031471-2

Légende

Localisation du prélèvement négatif

Localisation dun sondage négatif

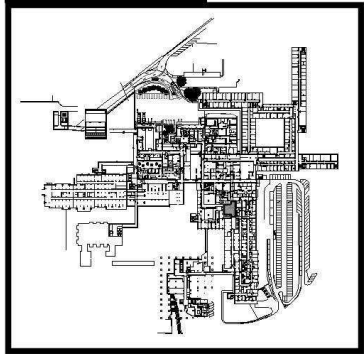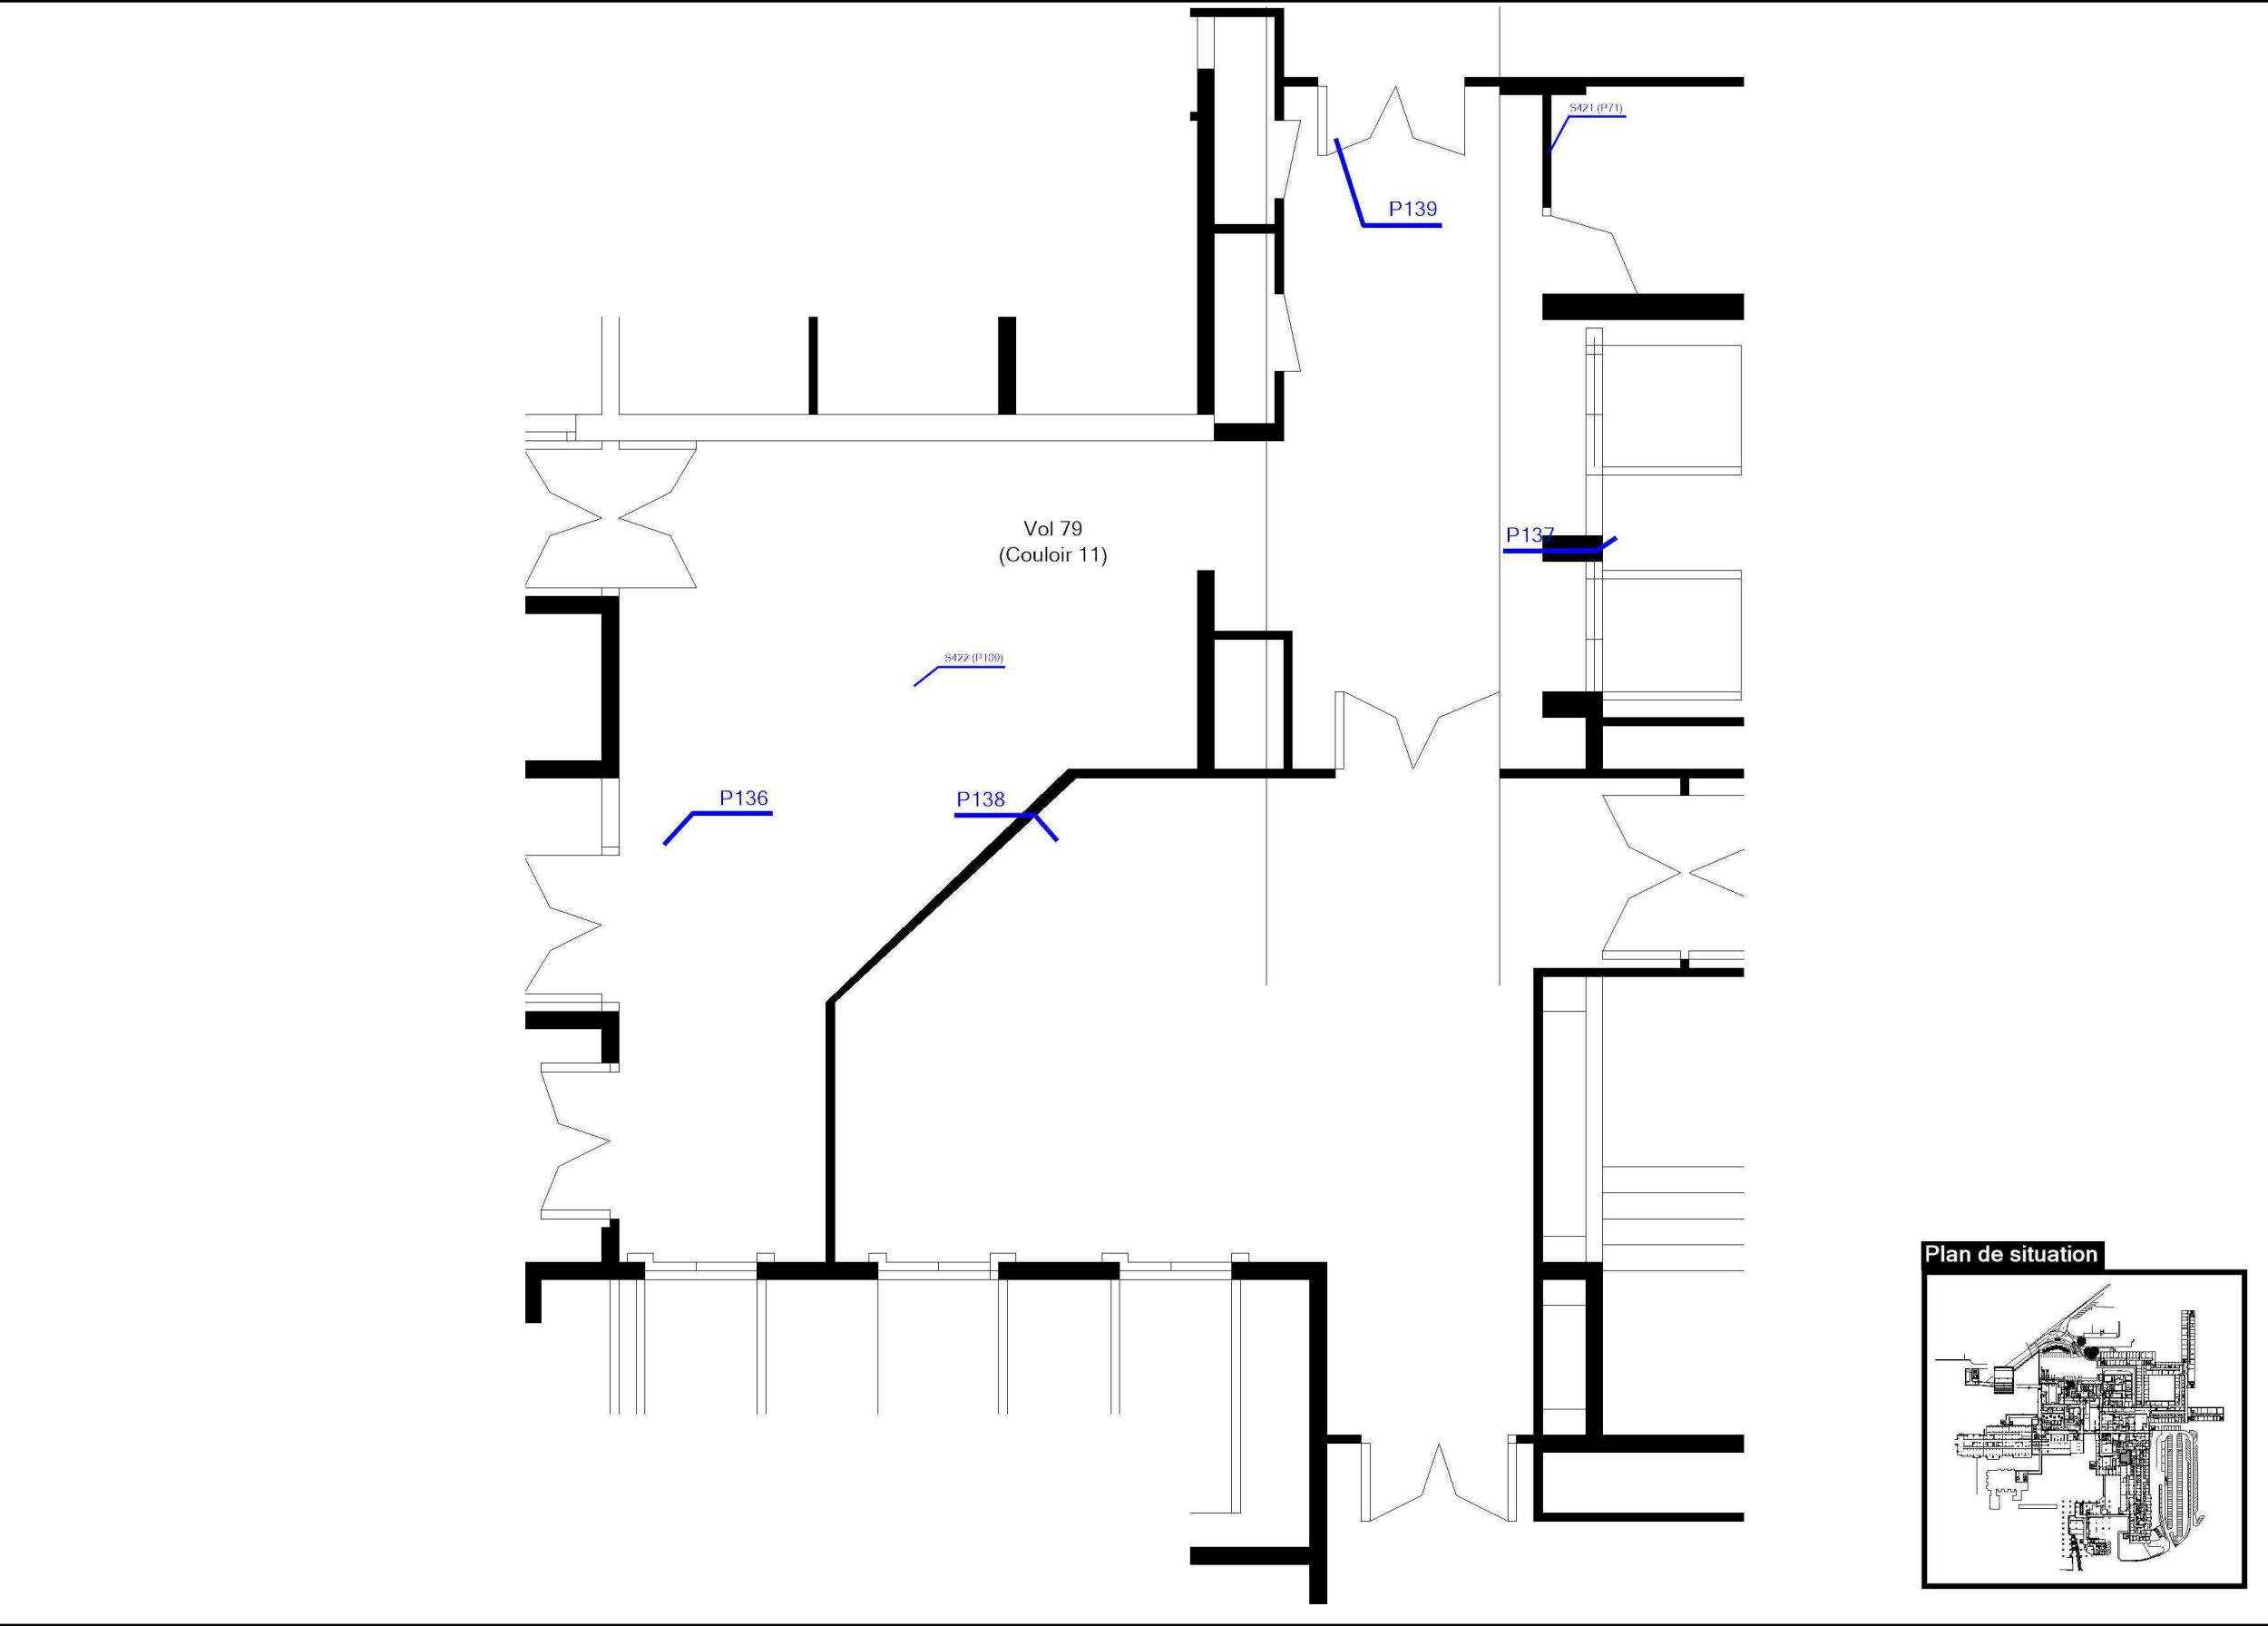


AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	

1 Avenue du Professeur Jean Poulhes
31400 TOULOUSE

Désignation

Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service dimagerie, RH1AFZ,
RHA1FY, RH1A18, RH1AGB

Date intervention

20/12/2023


Techniciens intervenant	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

BOBIN NICOLAS


Légende




Périmètre d'intervention 1

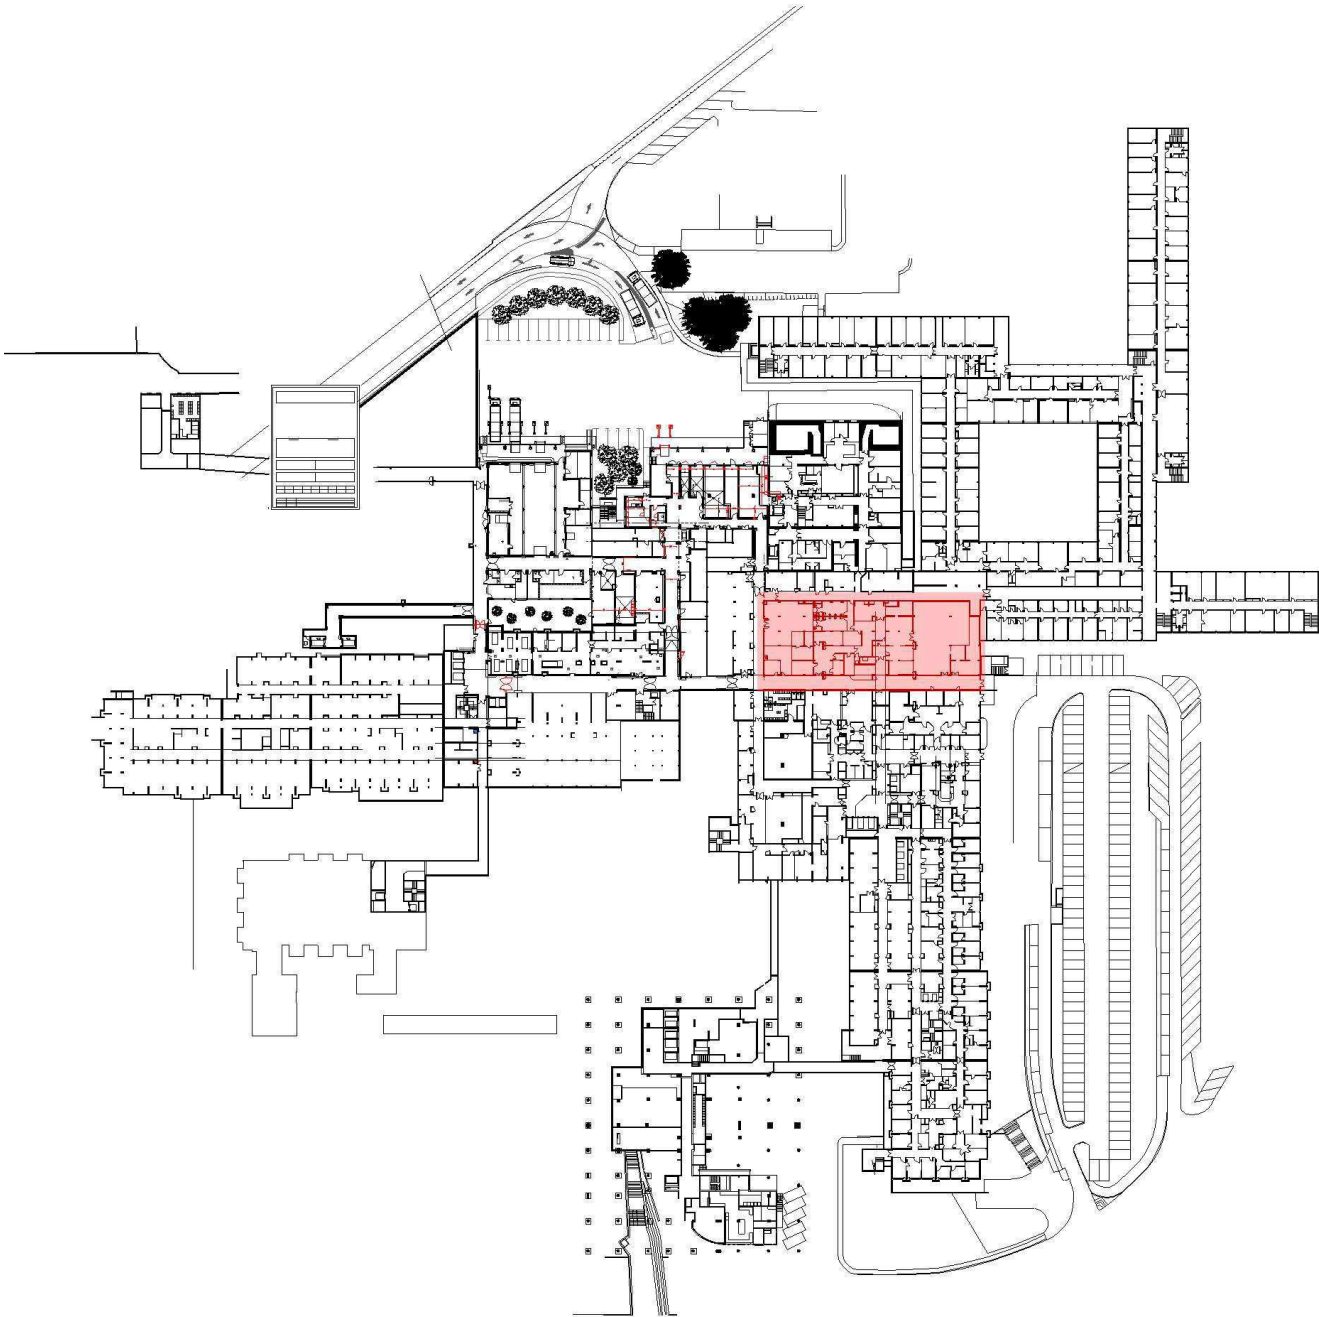


Légende



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

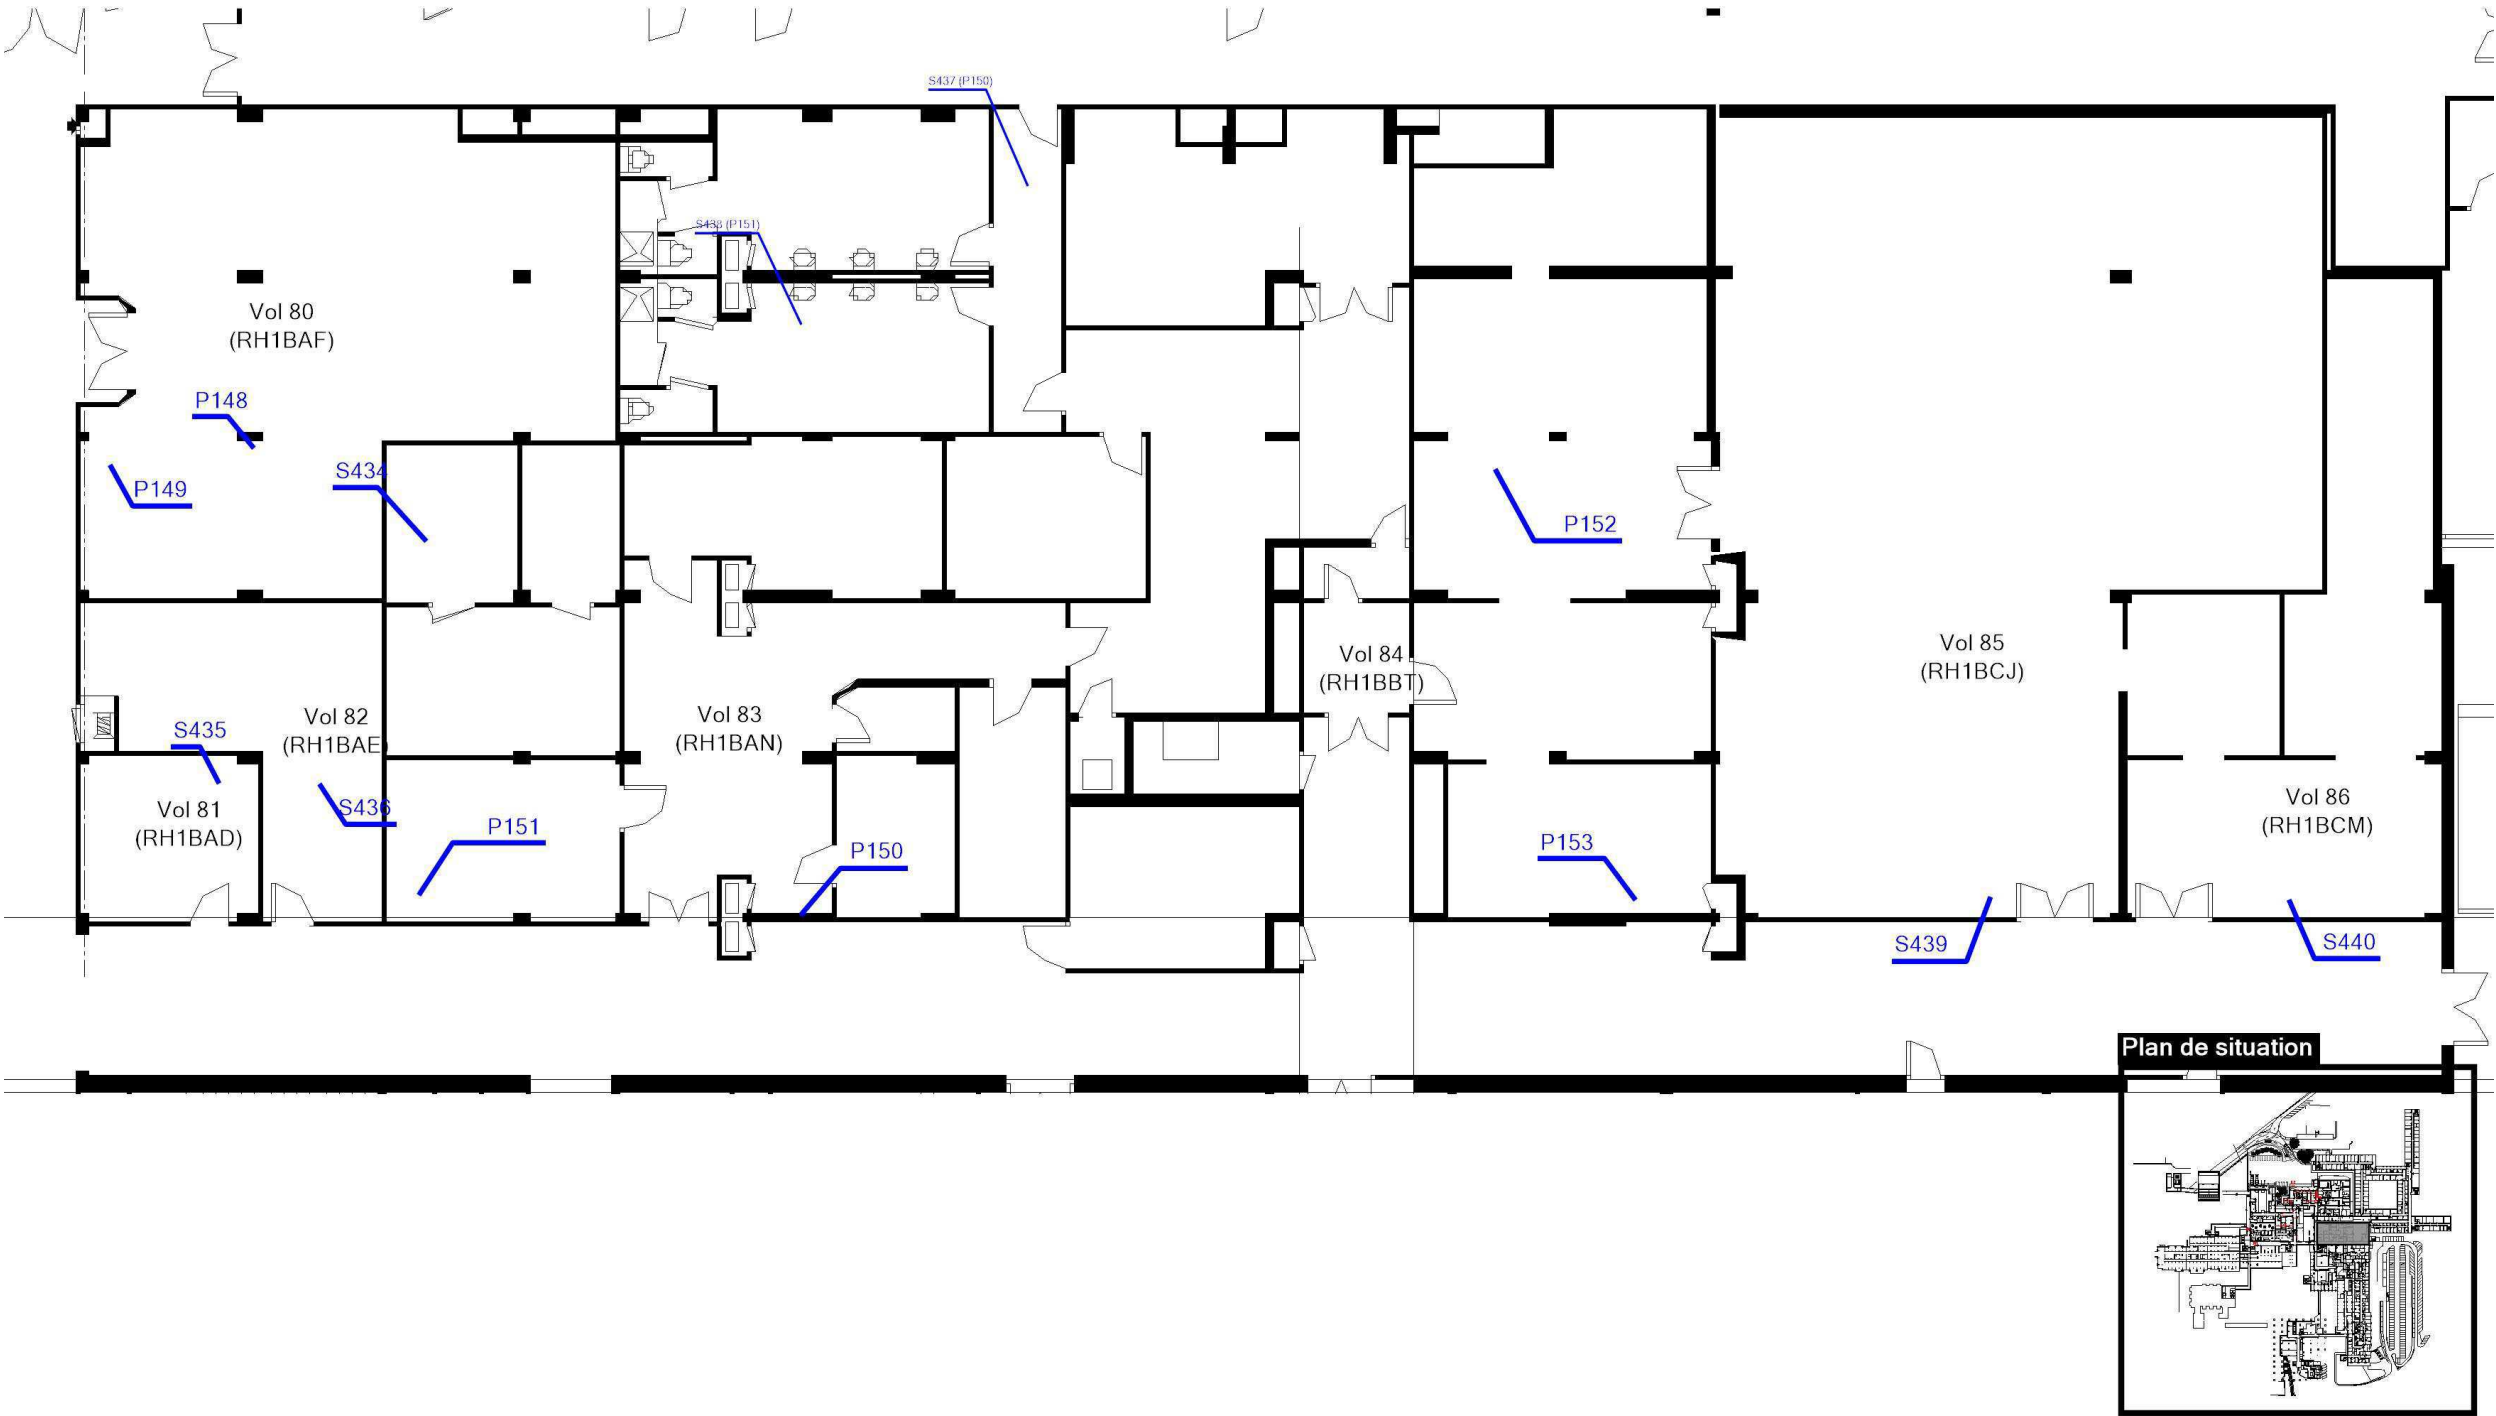

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002AC031471 n°1 - 1 (P1)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°2 - 1 (P2)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°3 - 1 (P3)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°4 - 1 (P4)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°5 - 1 (P5)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°6 - 1 (P6)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°7 - 1 (P7)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°8 - 1 (P8)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°9 - 1 (P9)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°10 - 1 (P10)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°11 - 1 (P11)	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°12 - 1 (P12)	R-2 - Vol 2 (BT)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°13 - 1 (P13)	R-2 - Vol 2 (BT)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°14 - 1 (P14)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°15 - 1 (P15)	R-2 - Vol 2 (BT)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°16 - 1 (P16)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°17 - 1 (P17)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°18 - 1 (P18)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°19 - 1 (P19)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°20 - 1 (P20)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°21 - 1 (P21)	R-2 - Vol 6 (BE)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°22 - 1 (P22)	R-2 - Vol 8 (BA)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°23 - 1 (P23)	R-2 - Vol 8 (BA)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°24 - 1 (P24)	R-2 - Vol 8 (BA)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°25 - 1 (P25)	R-2 - Vol 9 (BC)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°26 - 1 (P26)	R-2 - Vol 8 (BA)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°27 - 1 (P27)	R-2 - Vol 10 (RH1BCF)	Prélèvement négatif

002AC031471 n°28 - 1 (P28)	R-2 - Vol 12 (AP)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°29 - 1 (P29)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°30 - 1 (P30)	R-2 - Vol 12 (AP)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°31 - 1 (P31)	R-2 - Vol 12 (AP)	Prélèvement positif
002AC031471 n°32 - 1 (P32)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°33 - 1 (P33)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°34 - 1 (P34)	R-2 - Vol 12 (AP)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°35 - 1 (P35)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°36 - 1 (P36)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°37 - 1 (P37)	R-2 - Vol 14 (AN)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°38 - 1 (P38)	R-2 - Vol 15 (Ai 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°39 - 1 (P39)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°40 - 1 (P40)	R-2 - Vol 3 (BK)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°41 - 1 (P41)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°42 - 1 (P42)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°43 - 1 (P43)	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°44 - 1 (P44)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°45 - 1 (P45)	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°46 - 1 (P46)	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°47 - 1 (P47)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°48 - 1 (P48)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°49 - 1 (P49)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°50 - 1 (P50)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°51 - 1 (P51)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°52 - 1 (P52)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°53 - 1 (P53)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°54 - 1 (P54)	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°55 - 1 (P55)	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°56 - 1 (P56)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°57 - 1 (P57)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif

002AC031471 n°58 - 1 (P58)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°59 - 1 (P59)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°60 - 1 (P60)	R-2 - Vol 26 (Placard)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°61 - 1 (P61)	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°62 - 1 (P62)	R-2 - Vol 28 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°63 - 1 (P63)	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°64 - 1 (P64)	R-2 - Vol 28 (W.c 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°65 - 1 (P65)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°66 - 1 (P66)	R-2 - Vol 25 (Douche)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°67 - 1 (P67)	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°68 - 1 (P68)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°69 - 1 (P69)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°70 - 1 (P70)	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°71 - 1 (P71)	R-2 - Vol 24 (Couloir 3)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°72 - 1 (P72)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°73 - 1 (P73)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°74 - 1 (P74)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°75 - 1 (P75)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°76 - 1 (P76)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°77 - 1 (P77)	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°78 - 1 (P78)	R-2 - Vol 42 (Salle d'interprétation 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°79 - 1 (P79)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°80 - 1 (P80)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°81 - 1 (P81)	R-2 - Vol 35 (W.c 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°82 - 1 (P82)	R-2 - Vol 65 (Local 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°83 - 1 (P83)	R-2 - Vol 64 (W.c 5)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°84 - 1 (P84)	R-2 - Vol 44 (Salle de préparation 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°85 - 1 (P85)	R-2 - Vol 46 (Salle patient)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°86 - 1 (P86)	R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°87 - 1 (P87)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif

002AC031471 n°88 - 1 (P88)	R-2 - Vol 56 (Local 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°89 - 1 (P89)	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°90 - 1 (P90)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°91 - 1 (P91)	R-2 - Vol 55 (W.c 3)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°92 - 1 (P92)	R-2 - Vol 63 (W.c 4)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°93 - 1 (P93)	R-2 - Vol 32 (Accueil)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°94 - 1 (P94)	R-2 - Vol 32 (Accueil)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°95 - 1 (P95)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°96 - 1 (P96)	R-2 - Vol 56 (Local 1)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°97 - 1 (P97)	R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°98 - 1 (P98)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°99 - 1 (P99)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°100 - 1 (P100)	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°101 - 1 (P101)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°102 - 1 (P102)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°103 - 1 (P103)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°104 - 1 (P104)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°106 - 1 (P106)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°107 - 1 (P107)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°108 - 1 (P108)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°109 - 1 (P109)	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°110 - 1 (P110)	R-2 - Vol 70 (Couloir 10)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°111 - 1 (P111)	R-2 - Vol 72 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°112 - 1 (P112)	R-2 - Vol 72 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°113 - 1 (P113)	R-2 - Vol 72 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°114 - 1 (P114)	R-2 - Vol 72 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°115 - 1 (P115)	R-2 - Vol 20 (AF)	Prélèvement positif
002AC031471 n°116 - 1 (P116)	R-2 - Vol 20 (AF)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°117 - 1 (P117)	R-2 - Vol 20 (AF)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°118 - 1 (P118)	R-2 - Vol 74 (Local 4)	Prélèvement négatif

002AC031471 n°119 - 1 (P119)	R-2 - Vol 74 (Local 4)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°120 - 1 (P120)	R-2 - Vol 18 (AE)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°121 - 1 (P121)	R-2 - Vol 75 (Rh 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°122 - 1 (P122)	R-2 - Vol 75 (Rh 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°123 - 1 (P123)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°124 - 1 (P124)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°125 - 1 (P125)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°126 - 1 (P126)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°127 - 1 (P127)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°128 - 1 (P128)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°129 - 1 (P129)	R-2 - Vol 4 (BG)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°130 - 1 (P130)	R-2 - Vol 76 (Chaufferie)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°131 - 1 (P131)	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°132 - 1 (P132)	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°133 - 1 (P133)	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°134 - 1 (P134)	R-2 - Vol 77 (Local 5)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°135 - 1 (P135)	R-2 - Vol 78 (Local 6)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°136 - 1 (P136)	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°137 - 1 (P137)	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°138 - 1 (P138)	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)	Prélèvement négatif
002AC031471 n°139 - 1 (P139)	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°140 - 2 (P140)	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°141 - 2 (P141)	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°142 - 2 (P142)	R-2 - Vol 56 (Local 1)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°143 - 2 (P143)	R-2 - Vol 56 (Local 1)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°144 - 2 (P144)	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°145 - 2 (P145)	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°146 - 2 (P146)	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Prélèvement négatif
002AC031471-2 n°147 - 2 (P147)	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)	Prélèvement négatif
S433 - 2 (S433)	R-2 - Vol 56 (Local 1)	Absence sur présentation de documents

002AC031471-2 n°148 - 2 (P148)	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)	Prélevement négatif
S439 - 2 (S439)	R-2 bis - Vol 85 (RH1BCJ)	Absence : pas d'amiante par nature
002AC031471-2 n°149 - 2 (P149)	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)	Prélevement négatif
002AC031471-2 n°150 - 2 (P150)	R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)	Prélevement négatif
S434 - 2 (S434)	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)	Absence : pas d'amiante par nature
002AC031471-2 n°152 - 2 (P152)	R-2 bis - Vol 84 (RH1BBT)	Prélevement négatif
S436 - 2 (S436)	R-2 bis - Vol 82 (RH1BAE)	Absence : pas d'amiante par nature
002AC031471-2 n°153 - 2 (P153)	R-2 bis - Vol 84 (RH1BBT)	Prélevement négatif
002AC031471-2 n°151 - 2 (P151)	R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)	Prélevement négatif
S435 - 2 (S435)	R-2 bis - Vol 81 (RH1BAD)	Absence : pas d'amiante par nature
S440 - 2 (S440)	R-2 bis - Vol 86 (RH1BCM)	Absence : pas d'amiante par nature



002AC031471 n°1 - 1 (P1) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°2 - 1 (P2) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°3 - 1 (P3) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°4 - 1 (P4) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°5 - 1 (P5) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°6 - 1 (P6) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°7 - 1 (P7) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°8 - 1 (P8) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°9 - 1 (P9) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°10 - 1 (P10) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°11 - 1 (P11) - R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)



002AC031471 n°12 - 1 (P12) - R-2 - Vol 2 (BT)



002AC031471 n°13 - 1 (P13) - R-2 - Vol 2 (BT)




002AC031471 n°14 - 1 (P14) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°15 - 1 (P15) - R-2 - Vol 2 (BT)



002AC031471 n°16 - 1 (P16) - R-2 - Vol 3 (BK)

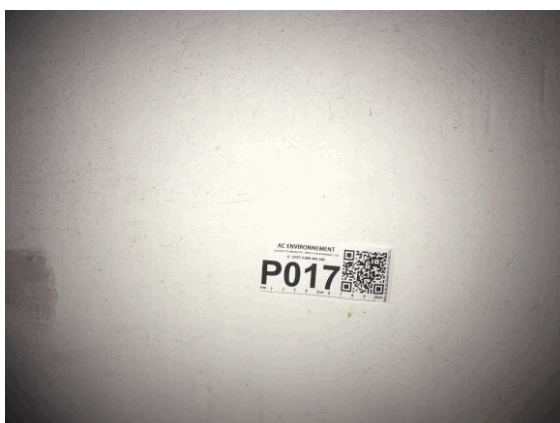

002AC031471 n°17 - 1 (P17) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°18 - 1 (P18) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°19 - 1 (P19) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471-2 n°148 - 2 (P148) - R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)



S439 - 2 (S439) - R-2 bis - Vol 85 (RH1BCJ)



002AC031471 n°20 - 1 (P20) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°21 - 1 (P21) - R-2 - Vol 6 (BE)



002AC031471 n°22 - 1 (P22) - R-2 - Vol 8 (BA)



002AC031471 n°23 - 1 (P23) - R-2 - Vol 8 (BA)



002AC031471 n°24 - 1 (P24) - R-2 - Vol 8 (BA)



002AC031471 n°25 - 1 (P25) - R-2 - Vol 9 (BC)



002AC031471 n°26 - 1 (P26) - R-2 - Vol 8 (BA)



002AC031471 n°27 - 1 (P27) - R-2 - Vol 10 (RH1BCF)



002AC031471 n°28 - 1 (P28) - R-2 - Vol 12 (AP)



002AC031471 n°29 - 1 (P29) - R-2 - Vol 14 (AN)



002AC031471 n°30 - 1 (P30) - R-2 - Vol 12 (AP)



002AC031471 n°31 - 1 (P31) - R-2 - Vol 12 (AP)



002AC031471 n°32 - 1 (P32) - R-2 - Vol 14 (AN)



002AC031471 n°33 - 1 (P33) - R-2 - Vol 14 (AN)



002AC031471 n°34 - 1 (P34) - R-2 - Vol 12 (AP)




002AC031471 n°35 - 1 (P35) - R-2 - Vol 14 (AN)



002AC031471 n°36 - 1 (P36) - R-2 - Vol 14 (AN)



002AC031471 n°37 - 1 (P37) - R-2 - Vol 14 (AN)

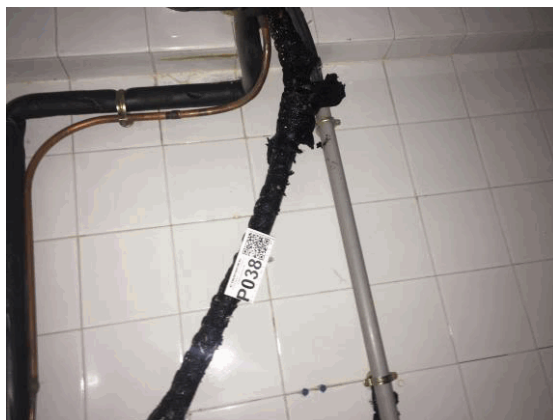

002AC031471 n°38 - 1 (P38) - R-2 - Vol 15 (Ai 1)



002AC031471 n°39 - 1 (P39) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°40 - 1 (P40) - R-2 - Vol 3 (BK)



002AC031471 n°41 - 1 (P41) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°42 - 1 (P42) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°43 - 1 (P43) - R-2 - Vol 22 (B012703BIS)



002AC031471 n°44 - 1 (P44) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°45 - 1 (P45) - R-2 - Vol 22 (B012703BIS)



002AC031471 n°46 - 1 (P46) - R-2 - Vol 22
(B012703BIS)



002AC031471 n°47 - 1 (P47) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°48 - 1 (P48) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°49 - 1 (P49) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°50 - 1 (P50) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°51 - 1 (P51) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°52 - 1 (P52) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°53 - 1 (P53) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°54 - 1 (P54) - R-2 - Vol 21 (Couloir 1)



002AC031471 n°55 - 1 (P55) - R-2 - Vol 23 (Couloir 2)



002AC031471 n°56 - 1 (P56) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°57 - 1 (P57) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°58 - 1 (P58) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°59 - 1 (P59) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°60 - 1 (P60) - R-2 - Vol 26 (Placard)



002AC031471 n°61 - 1 (P61) - R-2 - Vol 29 (Salle de repos)



002AC031471 n°62 - 1 (P62) - R-2 - Vol 28 (W.c 1)



002AC031471 n°63 - 1 (P63) - R-2 - Vol 29 (Salle de repos)



002AC031471 n°64 - 1 (P64) - R-2 - Vol 28 (W.c 1)



002AC031471 n°65 - 1 (P65) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°66 - 1 (P66) - R-2 - Vol 25 (Douche)



002AC031471 n°67 - 1 (P67) - R-2 - Vol 29 (Salle de repos)



002AC031471 n°68 - 1 (P68) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)




002AC031471 n°69 - 1 (P69) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°70 - 1 (P70) - R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)



002AC031471 n°71 - 1 (P71) - R-2 - Vol 24 (Couloir 3)

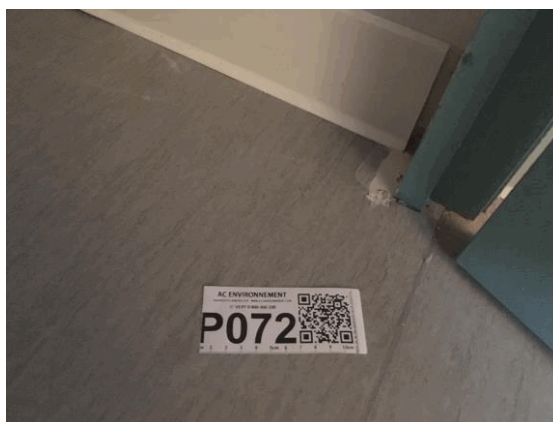

002AC031471 n°72 - 1 (P72) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)



002AC031471 n°73 - 1 (P73) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)



002AC031471 n°74 - 1 (P74) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)



002AC031471 n°75 - 1 (P75) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)




002AC031471 n°76 - 1 (P76) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)



002AC031471-2 n°149 - 2 (P149) - R-2 bis - Vol 80
(RH1BAF)



002AC031471-2 n°150 - 2 (P150) - R-2 bis - Vol 83
(RH1BAN)

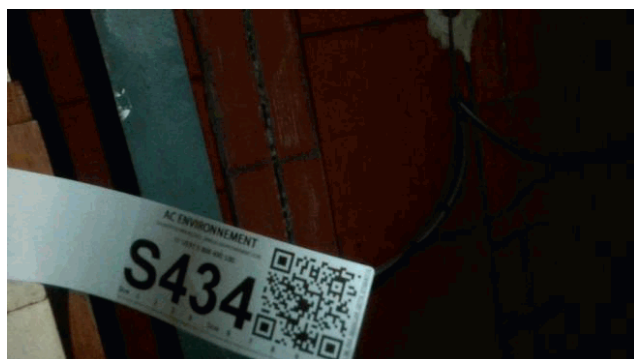

S434 - 2 (S434) - R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)



002AC031471 n°77 - 1 (P77) - R-2 - Vol 31 (Scanner 2)



002AC031471 n°78 - 1 (P78) - R-2 - Vol 42 (Salle
d'interprétation 1)



002AC031471 n°79 - 1 (P79) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)



002AC031471 n°80 - 1 (P80) - R-2 - Vol 41 (Coulour 6)



002AC031471 n°81 - 1 (P81) - R-2 - Vol 35 (W.c 2)



002AC031471 n°82 - 1 (P82) - R-2 - Vol 65 (Local 2)



002AC031471 n°83 - 1 (P83) - R-2 - Vol 64 (W.c 5)



002AC031471 n°84 - 1 (P84) - R-2 - Vol 44 (Salle de préparation 1)



002AC031471 n°85 - 1 (P85) - R-2 - Vol 46 (Salle patient)




002AC031471 n°86 - 1 (P86) - R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)



002AC031471 n°87 - 1 (P87) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)



002AC031471 n°88 - 1 (P88) - R-2 - Vol 56 (Local 1)

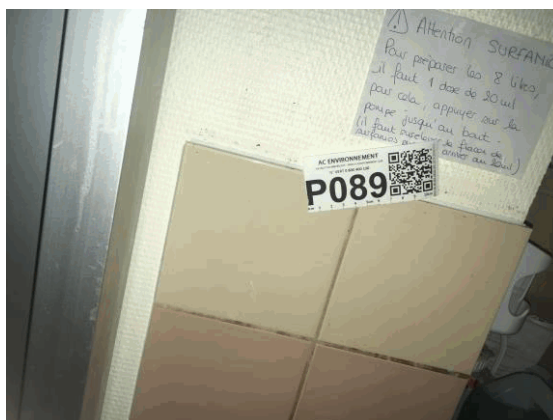

002AC031471 n°89 - 1 (P89) - R-2 - Vol 54
(PCFrH1-B-3-06)



002AC031471 n°90 - 1 (P90) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)



002AC031471 n°91 - 1 (P91) - R-2 - Vol 55 (W.c 3)



002AC031471 n°92 - 1 (P92) - R-2 - Vol 63 (W.c 4)



002AC031471 n°93 - 1 (P93) - R-2 - Vol 32 (Accueil)



002AC031471 n°94 - 1 (P94) - R-2 - Vol 32 (Accueil)



002AC031471 n°95 - 1 (P95) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)



002AC031471 n°96 - 1 (P96) - R-2 - Vol 56 (Local 1)



002AC031471 n°97 - 1 (P97) - R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)



002AC031471 n°98 - 1 (P98) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)




002AC031471 n°99 - 1 (P99) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)



002AC031471 n°100 - 1 (P100) - R-2 - Vol 41 (Couloir 6)




002AC031471 n°101 - 1 (P101) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)

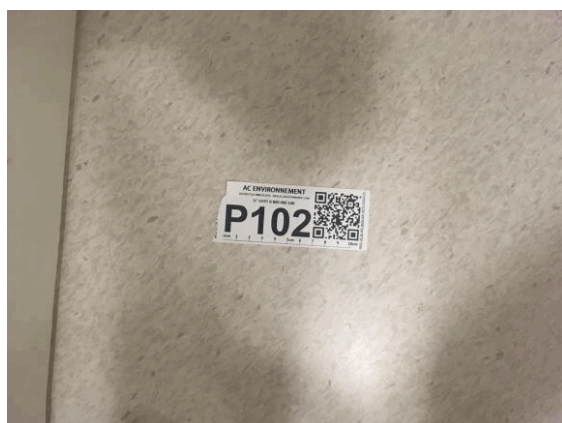

002AC031471 n°102 - 1 (P102) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°103 - 1 (P103) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)

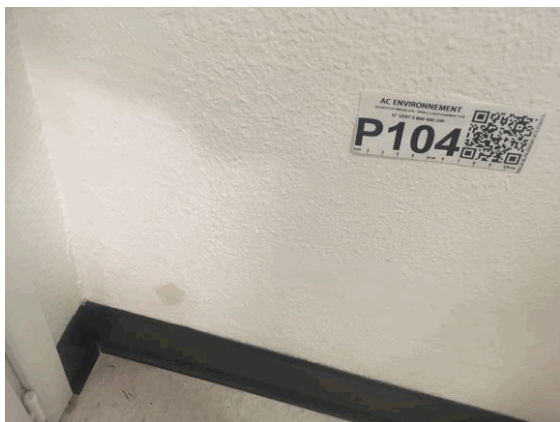

002AC031471 n°104 - 1 (P104) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°106 - 1 (P106) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°107 - 1 (P107) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°108 - 1 (P108) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°109 - 1 (P109) - R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)



002AC031471 n°110 - 1 (P110) - R-2 - Vol 70 (Couloir 10)



002AC031471 n°111 - 1 (P111) - R-2 - Vol 72 (Cuisine)



002AC031471 n°112 - 1 (P112) - R-2 - Vol 72 (Cuisine)



002AC031471 n°113 - 1 (P113) - R-2 - Vol 72 (Cuisine)



002AC031471-2 n°152 - 2 (P152) - R-2 bis - Vol 84
(RH1BBT)



002AC031471 n°114 - 1 (P114) - R-2 - Vol 72 (Cuisine)



002AC031471 n°115 - 1 (P115) - R-2 - Vol 20 (AF)




002AC031471 n°116 - 1 (P116) - R-2 - Vol 20 (AF)



002AC031471 n°117 - 1 (P117) - R-2 - Vol 20 (AF)



S436 - 2 (S436) - R-2 bis - Vol 82 (RH1BAE)

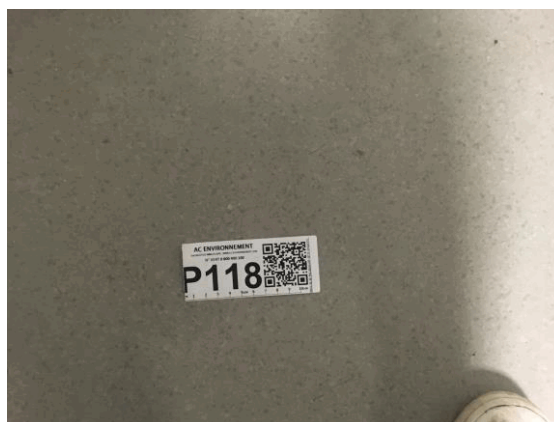

002AC031471 n°118 - 1 (P118) - R-2 - Vol 74 (Local 4)




002AC031471 n°119 - 1 (P119) - R-2 - Vol 74 (Local 4)



002AC031471 n°120 - 1 (P120) - R-2 - Vol 18 (AE)



002AC031471 n°121 - 1 (P121) - R-2 - Vol 75 (Rh 2)

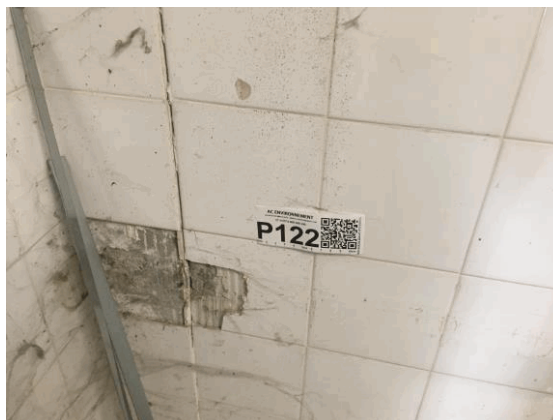

002AC031471 n°122 - 1 (P122) - R-2 - Vol 75 (Rh 2)



002AC031471 n°123 - 1 (P123) - R-2 - Vol 4 (BG)




002AC031471 n°124 - 1 (P124) - R-2 - Vol 4 (BG)




002AC031471-2 n°153 - 2 (P153) - R-2 bis - Vol 84
(RH1BBT)



002AC031471 n°125 - 1 (P125) - R-2 - Vol 4 (BG)

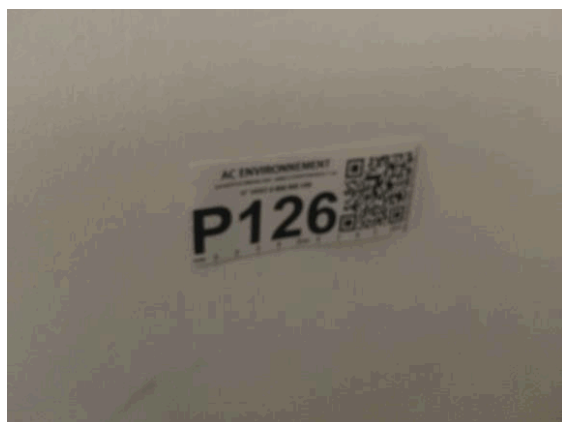

002AC031471 n°126 - 1 (P126) - R-2 - Vol 4 (BG)

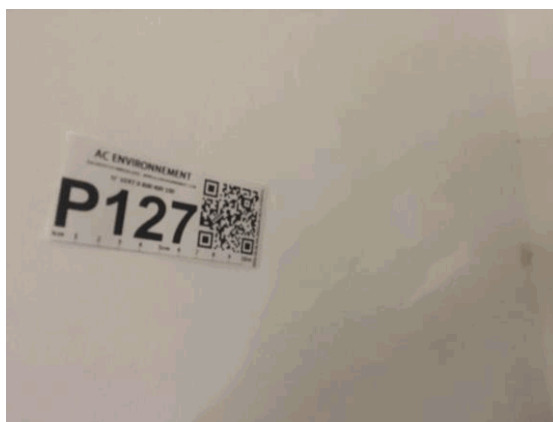

002AC031471 n°127 - 1 (P127) - R-2 - Vol 4 (BG)



002AC031471 n°128 - 1 (P128) - R-2 - Vol 4 (BG)



002AC031471 n°129 - 1 (P129) - R-2 - Vol 4 (BG)



002AC031471 n°130 - 1 (P130) - R-2 - Vol 76 (Chaufferie)




002AC031471 n°131 - 1 (P131) - R-2 - Vol 23 (Couloir 2)



002AC031471 n°132 - 1 (P132) - R-2 - Vol 23 (Couloir 2)



002AC031471 n°133 - 1 (P133) - R-2 - Vol 23 (Couloir 2)

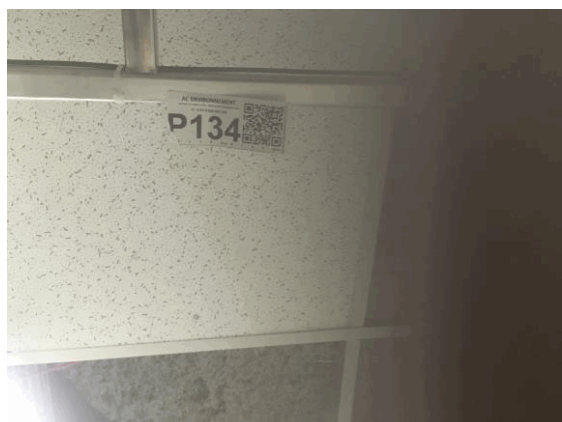

002AC031471 n°134 - 1 (P134) - R-2 - Vol 77 (Local 5)



002AC031471 n°135 - 1 (P135) - R-2 - Vol 78 (Local 6)



002AC031471 n°136 - 1 (P136) - R-2 - Vol 79 (Couloir 11)



002AC031471-2 n°151 - 2 (P151) - R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)



002AC031471 n°137 - 1 (P137) - R-2 - Vol 79 (Couloir 11)



002AC031471 n°138 - 1 (P138) - R-2 - Vol 79 (Couloir 11)



002AC031471 n°139 - 1 (P139) - R-2 - Vol 79 (Couloir 11)



002AC031471-2 n°140 - 2 (P140) - R-2 - Vol 54
(PCFrH1-B-3-06)




002AC031471-2 n°141 - 2 (P141) - R-2 - Vol 54
(PCFrH1-B-3-06)





002AC031471-2 n°142 - 2 (P142) - R-2 - Vol 56 (Local 1)



002AC031471-2 n°143 - 2 (P143) - R-2 - Vol 56 (Local 1)

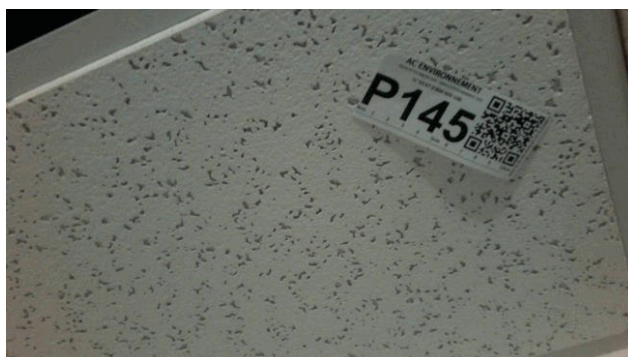

002AC031471-2 n°144 - 2 (P144) - R-2 - Vol 39
(PA-H1-B-3-01)

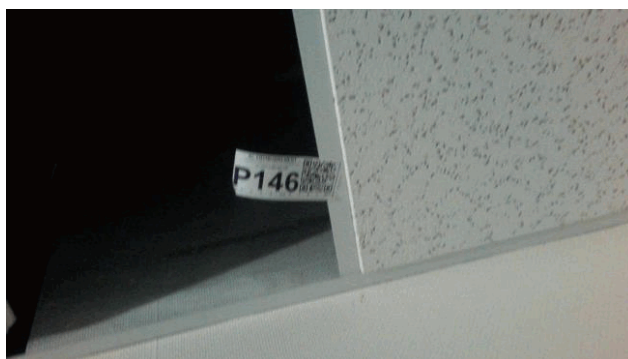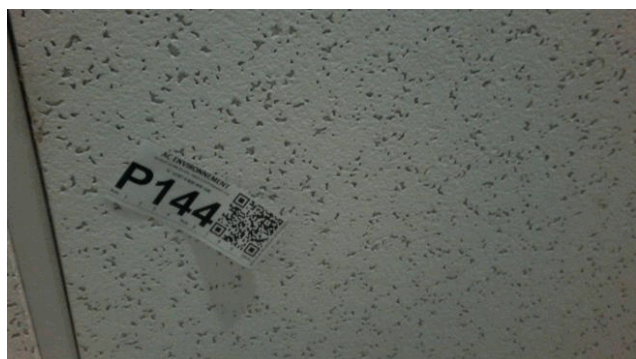

002AC031471-2 n°145 - 2 (P145) - R-2 - Vol 39
(PA-H1-B-3-01)

002AC031471-2 n°146 - 2 (P146) - R-2 - Vol 39
(PA-H1-B-3-01)



002AC031471-2 n°147 - 2 (P147) - R-2 - Vol 39
(PA-H1-B-3-01)



S433 - 2 (S433) - R-2 - Vol 56 (Local 1)



S435 - 2 (S435) - R-2 bis - Vol 81 (RH1BAD)



S440 - 2 (S440) - R-2 bis - Vol 86 (RH1BCM)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002AC031471 n°1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Souple Translucide - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°5 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Vert Marron - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°5 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux-plafond Effritable Fibreux Beige - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - WC -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°11	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Translucide - -	R-2 - Vol 1 (RH1BCJ)	
002AC031471 n°12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 2 (BT)	
002AC031471 n°13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 2 (BT)	
002AC031471 n°14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Fibreux Beige - -	R-2 - Vol 3 (BK)	
002AC031471 n°15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 2 (BT)	
002AC031471 n°16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Fibres Souple Fibreux Beige Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 3 (BK)	

002AC031471 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris - -	R-2 - Vol 6 (BE)
002AC031471 n°21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	R-2 - Vol 6 (BE)
002AC031471 n°22	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Faux plafond Dur Fibreux Blanc - -	R-2 - Vol 8 (BA)
002AC031471 n°23	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Gris - -	R-2 - Vol 8 (BA)
002AC031471 n°24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - Wc -	R-2 - Vol 8 (BA)
002AC031471 n°25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Effritable Beige - -	R-2 - Vol 9 (BC)
002AC031471 n°26	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Souple Fibreux Jaune - -	R-2 - Vol 8 (BA)
002AC031471 n°27	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Souple Fibreux Blanc Matériau Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 10 (RH1BCF)
002AC031471 n°28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - Chambre froide -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Ciment Dur Gris - Rampe -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°30 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°30 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°30 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°31 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°31 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 12 (AP)

002AC031471 n°31 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°32	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige - -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°33 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°33 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Fibreux Blanc - -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°34	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 12 (AP)
002AC031471 n°35	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - Gaine technique -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°36	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Souple Fibreux Jaune - -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°37	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 14 (AN)
002AC031471 n°38	Equipements divers et accessoires	Tuyauteries	Matériau Bitumineux Noir - -	R-2 - Vol 15 (Ai 1)
002AC031471 n°39 Phase 1	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°39 Phase 2	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Enveloppe de calorifuge - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°40	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Carton Souple Fibreux Marron Laine Souple Fibreux Jaune Matériau Bitumineux Noir - -	R-2 - Vol 3 (BK)
002AC031471 n°41	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Marron - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°42	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Blanc Ciment Dur Gris - Parpaing -	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)
002AC031471 n°44	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°45	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)
002AC031471 n°46	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau Effritable Fibreux Gris - -	R-2 - Vol 22 (B012703BIS)

002AC031471 n°47	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - Brique -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°48	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Laine Souple Fibreux Jaune - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°49	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Bitumineux Noir Toile Souple Fibreux Blanc - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°50	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Multicolore Enduit Effritable Blanc - Pailleté -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°51	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°52	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°53 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°53 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°54	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 21 (Couloir 1)
002AC031471 n°55	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Gris Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)
002AC031471 n°56	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Fibreux Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°57	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Dur Rose - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°58 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°58 Phase 4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Beige Enduit Effritable Beige - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°59	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°60	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 26 (Placard)

002AC031471 n°61 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Vert Toile Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige - Extérieur -	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)
002AC031471 n°61 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons - Extérieur -	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)
002AC031471 n°61 Phase 6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - Extérieur -	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)
002AC031471 n°62 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune -	R-2 - Vol 28 (W.c 1)
002AC031471 n°62 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Fibreux Beige - -	R-2 - Vol 28 (W.c 1)
002AC031471 n°63	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)
002AC031471 n°64	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	R-2 - Vol 28 (W.c 1)
002AC031471 n°65	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°66	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 25 (Douche)
002AC031471 n°67	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - -	R-2 - Vol 29 (Salle de repos)
002AC031471 n°68	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°69 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°69 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°70	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 27 (Vestiaire 1)
002AC031471 n°71	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage Fibreux Effritable Blanc Gris - En plénum -	R-2 - Vol 24 (Couloir 3)
002AC031471 n°72 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°72 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Gris - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)

002AC031471 n°73	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage Effritable Gris Matériau Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°74	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°75 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°75 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°76	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°77	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Beige Peinture Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 31 (Scanner 2)
002AC031471 n°78	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 42 (Salle d'interprétation 1)
002AC031471 n°79	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°80	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Dur Fibreux Marron Colle Souple Jaune - Marron -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°81	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 35 (W.c 2)
002AC031471 n°82	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 65 (Local 2)
002AC031471 n°83	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 64 (W.c 5)
002AC031471 n°84	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 44 (Salle de préparation 1)
002AC031471 n°85	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 46 (Salle patient)
002AC031471 n°86	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)
002AC031471 n°87	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°88	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Peinture Effritable Beige - -	R-2 - Vol 56 (Local 1)
002AC031471 n°89	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc Matériau Souple Jaune - -	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)

002AC031471 n°90	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°91	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 55 (W.c 3)
002AC031471 n°92	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 63 (W.c 4)
002AC031471 n°93	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ciment Dur Gris - Gaine -	R-2 - Vol 32 (Accueil)
002AC031471 n°94	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Matériau Bitumineux Noir - -	R-2 - Vol 32 (Accueil)
002AC031471 n°95	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Laine Fibreux Souple Jaune - -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°96	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc - En plénum -	R-2 - Vol 56 (Local 1)
002AC031471 n°97	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Semi-dur Bleu Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 45 (Salle de préparation 2)
002AC031471 n°98	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Dur Blanc - Gaine -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°99	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Plâtre Effritable Blanc Matériau Effritable Beige - Gaine technique -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°100	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - Gaine technique -	R-2 - Vol 41 (Couloir 6)
002AC031471 n°101	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°102	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°103	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°104	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°105	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Blanc Peinture Effritable Gris - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)

002AC031471 n°106	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°107	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux plafond Fibreux Effritable Marron Peinture Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°108 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°108 Phase 3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Plâtre Effritable Fibreux Blanc Carton Souple Fibreux Gris - -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°109	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc - En plénum -	R-2 - Vol 68 (Vestiaire 2)
002AC031471 n°110	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Bleu Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 70 (Couloir 10)
002AC031471 n°111 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Beige - -	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
002AC031471 n°111 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
002AC031471 n°112	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Noir Matériau Souple Jaune Translucide - -	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
002AC031471 n°113	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
002AC031471 n°114	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 72 (Cuisine)
002AC031471 n°115	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	R-2 - Vol 20 (AF)
002AC031471 n°116	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau Dur Gris - -	R-2 - Vol 20 (AF)
002AC031471 n°117	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 20 (AF)
002AC031471 n°118	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune - -	R-2 - Vol 74 (Local 4)
002AC031471 n°119	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige - -	R-2 - Vol 74 (Local 4)
002AC031471 n°120	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Matériau Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 18 (AE)

002AC031471 n°121	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 75 (Rh 2)
002AC031471 n°122 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Effritable Beige Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 75 (Rh 2)
002AC031471 n°122 Phase 3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc - -	R-2 - Vol 75 (Rh 2)
002AC031471 n°123	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°124	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Beige Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°125	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Blanc Beige Enduit Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°126	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Blanc Enduit Effritable Beige Papier Souple Fibreux Blanc - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°127 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Papier Souple Fibreux Blanc Enduit Effritable Beige Carton Souple Fibreux Marron - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°127 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°128 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°128 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Jonction entre panneaux préfabriqués - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°129	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc Carton Souple Fibreux Marron Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 4 (BG)
002AC031471 n°130	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Marron Ciment Dur Gris - -	R-2 - Vol 76 (Chaudière)
002AC031471 n°131 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle Dur Blanc - -	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)
002AC031471 n°131 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau Bitumineux Noir Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)

002AC031471 n°132	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris Matériau Bitumineux Noir - -	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)
002AC031471 n°133	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau Fibreux Souple Beige Fibres Souple Fibreux Blanc - -	R-2 - Vol 23 (Couloir 2)
002AC031471 n°134	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige Peinture Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 77 (Local 5)
002AC031471 n°135	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Gris Colle Souple Jaune Ragréage Effritable Rose - -	R-2 - Vol 78 (Local 6)
002AC031471 n°136	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle Dur Gris - -	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)
002AC031471 n°137	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)
002AC031471 n°138	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Gris Enduit Effritable Blanc Ciment Effritable Gris - -	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)
002AC031471 n°139	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige Plâtre Effritable Blanc - -	R-2 - Vol 79 (Couloir 11)
P140	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige - -	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)
P141	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige - -	R-2 - Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)
P142	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige - -	R-2 - Vol 56 (Local 1)
P143	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau brillant beige - -	R-2 - Vol 56 (Local 1)
P144	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige - -	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)
P145	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit blanc non séparable + matériau fibreux beige avec poussières - -	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)
P146	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)
P147	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 - Vol 39 (PA-H1-B-3-01)
P148 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact blanc - -	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)
P148 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - -	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)

P149 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact blanc - -	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)
P149 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - -	R-2 bis - Vol 80 (RH1BAF)
P150	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)
P151	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 bis - Vol 83 (RH1BAN)
P152	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 bis - Vol 84 (RH1BBT)
P153	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	R-2 bis - Vol 84 (RH1BBT)

CHANTIER

COORDONNÉES DESTINATAIRE

Référence C022020166554
Adresse Commande : 002AC031471
Affaire : R_H1
HOPITAL RANGUEIL - BATIMENT H1 - 1
AVENUE DU PR JEAN POULHES
31400 TOULOUSE

AC Environnement
64, rue Clément Ader
42153 RIORGES

Riorges, le 04/08/2020

RAPPORT DE SYNTHÈSE DOSSIER MATÉRIAU n°C022020166554 (139 prélèvements) RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064845

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_001 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 1 (RH1BCJ)	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064846

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_002 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1 (RH1BCJ)	1	Colle	Souple	Translucide	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064847

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_003 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 1 (RH1BCJ)	1 2 3	Peinture Enduit Ciment	Effritable Effritable Effritable	Gris Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064848

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_004 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 1 (RH1BCJ)	1 2	Papier Enduit	Souple Fibreux Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064849

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 1 (RH1BCJ)	1 2 3	Enduit Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Vert Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone Attaque chimique : Acétone	1 1	MET* MET*	Non détecté ● Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064850

Date de réception	29/06/2020	Date de préparation	29/06/2020	Date d'analyse	29/06/2020			
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_006 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment Vol 1 (RH1BCJ)	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique : Acétone, Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064851

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_007	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 1 (RH1BCJ)	2	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064852

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_008	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 1 (RH1BCJ)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064853

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_009	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1 (RH1BCJ)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064854

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_010	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 1 (RH1BCJ)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064855

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_011	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 1 (RH1BCJ)	2	Matériau	Souple	Translucide	Acétone,Chloroforme			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064856

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_012	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage Vol 2 (BT)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064857

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_013	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) Vol 2 (BT)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064858

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_014	1	Colle	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 3 (BK)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064859

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_015	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Colle de faïence Vol 2 (BT)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064860

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_016	1	Fibres	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Chape maigre (base ciment)								
Vol 3 (BK)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064861

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_017	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment	3	Ciment	Effritable	Gris				
Vol 3 (BK)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064862

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_018	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Enduit	Effritable	Beige				
Vol 3 (BK)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064863

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_019	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 3 (BK)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064864

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_020	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Syporex								
Vol 3 (BK)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064865

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_021	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Dalles plastiques	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 6 (BE)	3	Ragréage	Effritable	Rose	Acétone			
Remarque	Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064866

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_022	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafonds / Panneaux et plaques	2	Faux plafond	Dur Fibreux	Blanc	Acétone			
Vol 8 (BA)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064867

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_023	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 8 (BA)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064868

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_024	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 8 (BA)								
Remarque	RAS							



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
 SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
 Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133
 labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V3

PAGE 3 / 18

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064869

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_025	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Beige	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 9 (BC)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064870

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_026	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage					Acétone			
Vol 8 (BA)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064871

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_027	1	Flocage	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 10 (RH1BCF)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064872

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_028	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 12 (AP)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064873

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_029	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 14 (AN)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064874

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_030	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 12 (AP)	2	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064875

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_031	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 12 (AP)	2	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	RAS							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064876

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_032	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Papier	Souple Fibreux	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Beige				
Jonction entre panneaux préfabriqués								
Vol 14 (AN)								
Remarque	Les couches Enduit / Effritable / Blanc, Enduit / Effritable / Beige sont présentes en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064877

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_033	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Panneaux de cloisons	4	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Acétone			
Vol 14 (AN)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064878

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_034	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Ciment	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique			
Enduits plâtre								
Vol 12 (AP)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064879

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_035	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone, Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Joint de scellement								
Vol 14 (AN)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064880

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_036	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements					Acétone			
/ Conduit fluide non identifié /								
Calorifugeage								
Vol 14 (AN)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064881

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_037	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique			
Vol 14 (AN)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064882

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_038	1	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Équipements divers et accessoires / Tuyauteries / Isolant					Chloroforme			
Vol 15 (Ai 1)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064883

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	04/08/2020		Date d'analyse	04/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_039	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Toile	Souple Fibreux	Beige	Acétone			
/ Conduit fluide non identifié /	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Enveloppe de calorifuge	4	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Vol 3 (BK)	5	Matériau	Effritable	Gris	Acétone, Chloroforme			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064884

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_040	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Conduits, canalisations et équipements	2	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Acétone,Chloroforme			
/ Conduit fluide non identifié /	3	Matériau	Bitumineux	Noir				
Calorifugeage								
Vol 3 (BK)								
Remarque	La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064885

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_041	1	Ciment	Dur	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Chape maigre (base ciment)								
Vol 21 (Couloir 1)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064886

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_042	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Plâtre								
Vol 21 (Couloir 1)								
Remarque	La couche Colle / Souple / Jaune n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064887

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_043	1	Ciment	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Joint de scellement								
Vol 22 (B012703BIS)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064888

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_044	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Symporex								
Vol 21 (Couloir 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064889

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_045	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Enduits ciment								
Vol 22 (B012703BIS)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064890

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_046	1	Matériau	Effritable Fibreux	Gris	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Matériau								
Vol 22 (B012703BIS)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064891

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_047	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Joint de scellement								
Vol 21 (Couloir 1)								
Remarque	RAS							

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064892

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_048 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 21 (Couloir 1)	1	Laine	Souple Fibreux	Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque La couche Matériau / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064893

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_049 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 21 (Couloir 1)	1 2	Matériau Toile	Bitumineux Souple Fibreux	Noir Blanc	Attaque chimique : Acétone,Chloroforme	1	MET*	Non détecté ●
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064894

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_050 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 21 (Couloir 1)	1 2	Peinture Enduit	Effritable Effritable	Multicolore Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064895

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_051 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre Vol 21 (Couloir 1)	1 2	Peinture Plâtre	Effritable Effritable	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064896

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_052 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits ciment Vol 21 (Couloir 1)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque RAS								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064897

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	04/08/2020		Date d'analyse	04/08/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_053 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 21 (Couloir 1)	1 2 3 4	Peinture Enduit Papier Enduit	Effritable Effritable Souple Fibreux Effritable	Beige Beige Beige Blanc	Attaque chimique : Acétone Attaque chimique : Acétone	2 2	MET* MET*	Non détecté ● Non détecté ●
Remarque La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064898

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_054 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons Vol 21 (Couloir 1)	1 2 3	Enduit Carton Plâtre	Effritable Souple Fibreux Effritable	Blanc Marron Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.								

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064899

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_055 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) Vol 23 (Couloir 2)	1 2	Peinture Ciment	Effritable Dur	Gris Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.								



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064900

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_056	1	Revêtement	Semi-dur Fibreux	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 27 (Vestiaire 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064901

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_057	1	Ragréage	Dur	Rose	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Ragréage								
Vol 27 (Vestiaire 1)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064902

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_058	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Jonction entre panneaux préfabriqués	4	Papier	Souple Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 27 (Vestiaire 1)	5	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Remarque	La couche Carton / Souple Fibreux / Marron n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante. La couche Enduit / Effritable / Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064903

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_059	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Panneaux de cloisons								
Vol 27 (Vestiaire 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064904

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_060	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 26 (Placard)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064905

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	04/08/2020		Date d'analyse	04/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_061	1	Peinture	Effritable	Vert	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Toile	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Enduit	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons	4	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Vol 29 (Salle de repos)	5	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
	6	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
	7	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 5 non dissociable analysée avec la couche 4. Couche 7 non dissociable analysée avec la couche 6.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064906

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_062	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche	3	Ragréage	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 28 (W.c 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064907

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_063	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone, Acide chlorhydrique			
/ Colle de carrelage (faïence)								
Vol 29 (Salle de repos)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064908

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_064 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 28 (W.c 1)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064909

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_065 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 27 (Vestiaire 1)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064910

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_066 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 25 (Douche)	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	2	MET*	Non détecté ●
2	Ciment	Effritable	Gris					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064911

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_067 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 29 (Salle de repos)	1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064912

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_068 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 27 (Vestiaire 1)	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
2	Peinture	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064913

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	04/08/2020		Date d'analyse	04/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_069 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 27 (Vestiaire 1)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté ●
2	Enduit	Effritable	Blanc					
3	Papier	Souple Fibreux	Blanc		Attaque chimique : Acétone	3	MET*	Non détecté ●
4	Enduit	Effritable	Beige					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064914

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_070 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés Vol 27 (Vestiaire 1)	1	Enduit	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
2	Carton	Souple Fibreux	Marron					
3	Plâtre	Effritable	Blanc					
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064915

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_071 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages Vol 24 (Couloir 3)	1	Flocage	Fibreux Effritable	Blanc Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064916

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_072 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 31 (Scanner 2)	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
2	Colle	Souple	Jaune		Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
3	Ragréage	Effritable	Gris					
Remarque	La couche Ragréage / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V3

PAGE 9 / 18

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064917

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_073	1	Ragréage	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 31 (Scanner 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064918

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_074	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone, Acide			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique			
Vol 31 (Scanner 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064919

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_075	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Jonction entre panneaux préfabriqués	4	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 31 (Scanner 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064920

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_076	1	Carton	Souple Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Panneaux de cloisons								
Vol 31 (Scanner 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064921

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_077	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 31 (Scanner 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064922

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_078	1	Revêtement	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 42 (Salle d'interprétation 1)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064923

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_079	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 41 (Coulair 6)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064924

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_080	1	Revêtement	Dur Fibreux	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 41 (Coulair 6)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064925

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_081 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 35 (W.c 2)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064926

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_082 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 65 (Local 2)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064927

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_083 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 64 (W.c 5)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064928

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_084 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 44 (Salle de préparation 1)	1	Colle	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064929

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_085 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 46 (Salle patient)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064930

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_086 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 45 (Salle de préparation 2)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064931

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_087 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 41 (Couloir 6)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064932

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_088 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 56 (Local 1)	1 2	Colle Peinture	Dur Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064933

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_089 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 54 (PCFH1-B-3-06)	1 2	Colle Matériau	Dur Souple	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064934

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_090 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 41 (Coulair 6)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064935

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_091 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 55 (W.c 3)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064936

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_092 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) Vol 63 (W.c 4)	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064937

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_093 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) Vol 32 (Accueil)	1	Ciment	Dur	Gris	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064938

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_094 Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Calorifugeage Vol 32 (Accueil)	1	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064939

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_095 Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques Vol 41 (Coulair 6)	1 2	Peinture Laine	Effritable Fibreux Souple	Blanc Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064940

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_096 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits projetés (plâtre) Vol 56 (Local 1)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064941

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_097 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques Vol 45 (Salle de préparation 2)	1 2	Revêtement Colle	Semi-dur Souple	Bleu Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté ●
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064942

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_098	1	Matériau	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Chape maigre								
Vol 41 (Couloir 6)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064943

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_099	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits								
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 41 (Couloir 6)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064944

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_100	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /								
Enduits plâtre								
Vol 41 (Couloir 6)								
Remarque	La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage. Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064945

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_101	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064946

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_102	1	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Ragréage								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064947

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_103	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol								
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064948

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_104	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits								
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064949

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_105	1	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits								
/ Cloisons légères ou préfabriquées /								
Jonction entre panneaux préfabriqués								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064950

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_106	1	Enduit	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées /	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Panneaux de cloisons								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064951

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_107	1	Faux plafond	Fibreux Effritable	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064952

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_108	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone			
plafonds / Panneaux et plaques	3	Plâtre	Effritable Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 68 (Vestiaire 2)	4	Carton	Souple Fibreux	Gris	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064953

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_109	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /					Acétone			
Enduits projetés (plâtre)								
Vol 68 (Vestiaire 2)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064954

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_110	1	Revêtement	Souple	Bleu	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche								
Vol 70 (Coulair 10)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064955

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_111	1	Revêtement	Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone			
/ Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Vol 72 (Cuisine)					Acétone			
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064956

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_112	1	Tampon	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Equipements divers et accessoires /	2	Matériau	Souple	Jaune Translucide	Acétone,Chloroforme			
Evier / Tampon bitumineux								
Vol 72 (Cuisine)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064957

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_113	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds /	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
Enduits plâtre								
Vol 72 (Cuisine)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064958

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_114	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre								
Vol 72 (Cuisine)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064959

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_115	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Détecté : Chrysotile ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 20 (AF)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064960

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_116	1	Matériau	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre					Acétone			
Vol 20 (AF)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064961

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_117	1	Matériau	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 20 (AF)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064962

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_118	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
Vol 74 (Local 4)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064963

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	30/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_119	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 74 (Local 4)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064964

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	30/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_120	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Matériau	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 18 (AE)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064965

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_121	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 75 (Rh 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064966

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_122	1	Colle	Effritable	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence)	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 75 (Rh 2)	3	Joint	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone,Acide chlorhydrique			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064967

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_123	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 4 (BG)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064968

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_124	1	Colle	Dur	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthé)	2	Ciment	Effritable	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 4 (BG)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064969

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_125	1	Peinture	Effritable	Blanc Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Vol 4 (BG)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064970

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_126	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc				
Vol 4 (BG)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064971

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_127	1	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
/ Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons	3	Carton	Souple Fibreux	Marron				
Vol 4 (BG)	4	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
					Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064972

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	04/08/2020		Date d'analyse	04/08/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_128	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Jonction entre panneaux préfabriqués	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 4 (BG)	3	Papier	Souple Fibreux	Blanc	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
	4	Enduit	Effritable	Beige	Acétone			
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 4 non dissociable analysée avec la couche 3.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064973

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_129	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés	2	Carton	Souple Fibreux	Marron	Acétone			
Vol 4 (BG)	3	Plâtre	Effritable	Blanc				
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064974

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_130	1	Peinture	Effritable	Marron	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Ciment	Dur	Gris	Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Chape maigre (base ciment)								
Vol 76 (Chaufferie)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064975

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_131	1	Colle	Dur	Blanc	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe)					Acétone,Acide chlorhydrique			
Vol 23 (Couloir 2)	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
	3	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone,Chloroforme			
Remarque	La couche Matériau / Bitumineux / Noir est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 2.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064976

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_132	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Matériau	Bitumineux	Noir	Acétone,Chloroforme, Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage								
Vol 23 (Couloir 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064977

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_133	1	Matériau	Fibreux Souple	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Fibres	Souple Fibreux	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Joint de dilatation								
Vol 23 (Couloir 2)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064978

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_134	1	Faux-plafond	Effritable Fibreux	Beige	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques	2	Peinture	Effritable	Blanc	Acétone			
Vol 77 (Local 5)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064979

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_135	1	Revêtement	Souple	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol	2	Colle	Souple	Jaune	Acétone			
/ Dalles plastiques								
Vol 78 (Local 6)								
Remarque	La couche Ragréage / Effritable / Rose est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064980

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_136	1	Colle	Dur	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Revêtement de sol / Revêtement de sol					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Colles de carrelage								
Vol 79 (Couloir 11)								
Remarque	RAS							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064981

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matériau	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_137	1	Ciment	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits					Acétone,Acide chlorhydrique			
/ Murs et cloisons / Enduits ciment								
Vol 79 (Couloir 11)								
Remarque	RAS							



Annule et remplace le précédent rapport datant du 30/06/2020

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064982

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_138	1	Peinture	Effritable	Gris	Attaque chimique :	1	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Enduit	Effritable	Blanc	Acétone, Acide			
/ Murs et cloisons / Enduits plâtre	3	Ciment	Effritable	Gris	chlorhydrique			
Vol 79 (Couloir 11)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1. Couche 3 non dissociable analysée avec la couche 1.							

RÉFÉRENCE ÉCHANTILLON LABORATOIRE : 42PM01064983

Date de réception	29/06/2020		Date de préparation	29/06/2020		Date d'analyse	29/06/2020	
Description client	Couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb Prép.	Type analyse	Résultat
002AC031471_139	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique :	2	MET*	Non détecté ●
Parois verticales intérieures et enduits	2	Plâtre	Effritable	Blanc	Acétone			
/ Murs et cloisons / Enduits projetés (plâtre)								
Vol 79 (Couloir 11)								
Remarque	Couche 2 non dissociable analysée avec la couche 1.							

* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable d'équipe

Anthony Chanteloup



HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Date	Modification(s) apportée(s)
04/08/2020	Révision des rapports R42PM01064883, R42PM01064897, R42PM01064905, R42PM01064913, R42PM01064972



Accréditation
N°1-6001
Portée
Disponible sur
www.cofrac.fr

L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.



AC ENVIRONNEMENT - 64, rue Clément Ader - 42153 Riorges - Fax : 0 825 800 954
SIRET : 441 355 914 000298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE N°76208471-30015 (date de validité : du 01/01/2020 au 31/12/2020)

Tél. : 0 800 600 133
labs@ac-environnement.fr

L.MO.F 07.8 V3

PAGE 18 / 18



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue clement Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT1123-25383 Réf. Commande Client : 002AC031471-2
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 22/12/2023

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux

(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB		Réf échantillon ITGA : IT112312-15225	
Réf échantillon client : 002AC031471-2140 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)		Description ITGA : Matériau brillant beige	
Matériau brillant beige	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2141 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 54 (PCFrH1-B-3-06)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15226 Description ITGA : Matériau brillant beige	
Matériau brillant beige	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2142 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 56 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15227 Description ITGA : Matériau brillant beige	
Matériau brillant beige	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2143 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 56 (Local 1)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15228 Description ITGA : Matériau brillant beige	
Matériau brillant beige	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2144 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 39 (PA-H1-B-3-01)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15229 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (2)
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2145 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 39 (PA-H1-B-3-01)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15230 Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige avec poussières	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (2)
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2146 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 39 (PA-H1-B-3-01)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15231 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2147 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 39 (PA-H1-B-3-01)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-15232 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières			
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2148 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 80 (RH1BAF)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-15233 Description ITGA : Enduit compact blanc / Enduit compact gris hétérogène			
Enduit compact blanc	META (A) le 26/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 26/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2149 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits ciment / Vol 80 (RH1BAF)			
Réf échantillon ITGA : IT112312-15234 Description ITGA : Enduit compact blanc / Enduit compact gris hétérogène			
Enduit compact blanc	META (A) le 26/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR
Enduit compact gris hétérogène	META (A) le 26/12/2023 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : AFR


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2150 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 83 (RH1BAN)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15235 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2151 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 83 (RH1BAN)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15236 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH
Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB Réf échantillon client : 002AC031471-2152 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 84 (RH1BBT)		Réf échantillon ITGA : IT112312-15237 Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières	
Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1123-25383 EN DATE DU 27/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<div> <div> Réf dossier client : EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB 1 Avenue du Professeur Jean Poulhes - 31400 TOULOUSE Rangueil - H1/ EX-Cuisine, service d'imagerie, RH1AFZ, RHA1FY, RH1A18, RH1AGB </div> <div> Réf échantillon client : 002AC031471-2153 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 84 (RH1BBT) </div> </div> <div> Réf échantillon ITGA : IT112312-15238 </div> <div> Description ITGA : Matériau cotonneux blanc avec poussières </div>			
 Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP + META (A) le 27/12/2023 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Maxime BECK Chef d'équipe

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 1/2

Assurance AC 2023 2/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 00



ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le siège est à Roderbruchstraße 26, 30655 Hannover - Allemagne - Registre de commerce de Hannover sous le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrôle de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Grauhofendörfer Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu de la Libre Prestation de Services, attestons que la société suivante :

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE n° 76208471-30015 couvrant également toutes ses filiales dont :

AC ENVIRONNEMENT :

- Les activités garanties sont notamment les suivantes :
- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
 - Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
 - Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
 - Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
 - Caractérisation des échantillons bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
 - Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
 - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
 - Etat parasitaire
 - Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
 - Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
 - Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
 - Diagnostic de performance énergétique
 - Diagnostic Produits Matériaux Équipements et Déchets (PEMD)
 - Information sur la présence d'un risque de mûre
 - Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
 - Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
 - Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
 - Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
 - Etat de l'installation intérieure d'électricité
 - Etat de l'installation intérieure de gaz
 - Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
 - Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ENRMT ou ESRIIS)
 - Certificat de décence - Loi SRU
 - Mesure du Radon dans les bâtiments
 - Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
 - Diagnostic Technique Global (DTG)
 - Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
 - Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
 - Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Énergie)
 - Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
 - Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
 - Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
 - Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
 - Diagnostic d'accessibilité handicapés
 - Etudes thermiques

HDI Global Specialty SE
T +49 511 5604 4989
F +49 511 5604 4989
www.hdi-specialty.com

Insurance company licensed by
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht,
Grauhofendörfer Str. 108,
53117 Bonn, Germany

Registered office: Roderbruchstrasse 26,
30655 Hannover, Germany
Commercial Register Hannover, Germany
Company Number HRB 211924
Supervisory Board Ulrich Witten-Chairman
Executive Board Ralph Beutler-Chairman, Andreas
Bierschenk, Thomas Stöckl, Richard Taylor

Attestation AC 2023



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la SAS AC ENVIRONNEMENT (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L26-26 et L26-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L.126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L26-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT est souscriptrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article L271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 24 février 2023

Dominique BISAGA



AC ENVIRONNEMENT - SIEGE SOCIAL
64 Rue Clément Ader - CS 20298 - 42153 RIORGES
T +33 (0) 4 77 44 92 44 - F +33 (0) 4 77 44 92 44
www.ac-environnement.com

0800 400 100
www.ac-environnement.com



ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6419

Certificat de compétences
Diagnostic Immobilier

N° CPDI 6419 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BOBIN Nicolas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 23/12/2022 - Date d'expiration : 22/12/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 23/12/2022 - Date d'expiration : 22/12/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 25/05/2022 - Date d'expiration : 24/05/2029
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 10/03/2023 - Date d'expiration : 09/03/2030
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 10/03/2023 - Date d'expiration : 09/03/2030
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 13/05/2022 - Date d'expiration : 12/05/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 25/05/2022 - Date d'expiration : 24/05/2029
Termite	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 13/05/2022 - Date d'expiration : 12/05/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Édité à Saint-Grégoire, le 10/03/2023.



Institut de Certification

Certification de personnes

Diagnostic Immobilier

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



Ministère de la Transition Écologique

Ministère de l'Énergie

Ministère de la Santé

Ministère de l'Intérieur

Ministère de la Justice

Ministère de l'Éducation Nationale

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Ministère de l'Économie

Ministère de l'Agriculture

Ministère de l'Industrie

Ministère de l'Équipement

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Urbanisme

Ministère de l'Énergie

Ministère de la Santé

Ministère de l'Intérieur

Ministère de la Justice

Ministère de l'Éducation Nationale

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Ministère de l'Économie

Ministère de l'Agriculture

Ministère de l'Industrie

Ministère de l'Équipement

Ministère de l'Environnement

Ministère de l'Urbanisme

Ministère de l'Énergie

Ministère de la Santé

Ministère de l'Intérieur

Ministère de la Justice

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020


En lien avec la procédure [Conduite à tenir en cas d'intervention dans un bâtiment soumis à la réglementation amiante](#), (Id. session Windows/Outlook) ce formulaire est à compléter pour fournir tous les éléments nécessaires au chiffrage du devis de repérage de matériau amianté, avant une intervention ou des travaux.

Pour rappel, en amont le DTA est consulté et n'apporte pas d'information sur le caractère amianté des matériaux, équipements et matériels.

1 – Compléter les éléments ci-dessous :

Identification précise du local/lieu à vérifier	Site : RANGUEIL - Bâtiment : Bâtiment H1 - Etage/aile : SS1 SS2 et SS3 - N° pièce ou lieu : cf. plans joints et liste dans ligne « périmètre et programme des travaux »
Code Opération ou bon GMAO	Opération R1959 partie imagerie
Surface (en m ²) impactée par l'intervention	A l'extérieur : A l'intérieur : 1000 m ²
Demande URGENTE (sous 48h) ?	OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>
Date max. d'intervention souhaitée (Contractuellement ; délai max 10 jours)	Courant décembre 2023
Périmètre et programme des travaux précis	<ul style="list-style-type: none"> - Le projet consiste en : - La création de locaux imagerie (échographie, radiographie, urgences), dans la zone ex cuisine désaffectée non occupée à ce jour. Un RAT n° 002AC031471 avait été réalisé en 2020 en phase programmation mais il est à compléter notamment pour les passages de gaines et de câbles électriques en faux plafond. - Les évacuations sanitaires se faisant au SS3 il faut vérifier les locaux situés sous l'emprise de la zone travaux. - 2 montes charges sont créés du SS2 au SS1 et l'emprise de la zone créée par la monte charge est à vérifier (sol/mur/plafond). <p><u>Zone imagerie et ex cuisine SS2 :</u></p> <p><u>Plafond et faux plafond des circulations SS2</u></p> <p>Zone jaune : toute la zone ex cuisine , dans l'imagerie local ménage RHIB57, local attente malade couché RHB G, la circulation RH1B48, accueil imagerie actuel et circulation RH1B75 (je pense que cela a été fait dans le RAT du 10/11/23)</p> <p>+ 3 locaux sol/mur/plafond non visité car pas de clefs le 10/11/23 RHIB28/29/30</p> <p>+ dans bugnard le placard non visité (oubli de la visite du 10/11/23)</p>

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

	 <p><u>SS3 Sol/mur/plafond :</u></p> <p>SS3 zone hachurée sur le plan (sol/mur/plafond), a priori plafond déjà fait lors du précédent repérage du 10/11/23.</p> <p>+ local non visité au SS3 lors de la visite du 10/11/23</p> <p><u>SS1 sol/mur/plafond :</u> RH1A16,A20,RH1AFR</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> À cocher dans le cas d'une demande de repérage exhaustive de l'enveloppe (<i>Parois verticales intérieures et enduits / Plafonds et faux plafonds / Revêtements de sol et de murs / Conduits, canalisations et équipements</i>)</p>
Contact ; nom, prénom + N° de téléphone à 10 chiffres	Donneur d'ordre : GETTIAUX Sylvette Tel : 06.98.74.34.51 Accompagnateur : GETTIAUX Sylvette Tel : 06.98.74.34.51
Pièces à fournir	- Ce formulaire dûment complété - Plan de situation (cf. page suivante : si autre site l'ajouter) - Plan de masse - Photos

2 – Envoyer la demande de devis par mail à :

1- **Société AC Environnement ;** chu@ac-environnement.com

Si besoin, interlocuteur AC Environnement ; **M. Florent Keller 06 60 58 95 04**


2- **Société DEKRA ;** refamiante.fr@dekra.com

Possibilité de solliciter DEKRA, dans le cas où AC Environnement ne garantit pas le délai souhaité.

Si besoin, interlocuteur DEKRA ; **M. Guillaume Salafia 06 17 01 62 82**

3 - A la réception de l'offre/devis, passer la demande de bon de commande (DBC) sur CASPER
Plan de situation

FORMULAIRE Patrimoine Immobilier et Services Techniques	Page n°1 sur 1
DEMANDE de devis de REPERAGE AMIANTE avant intervention/travaux	Indexation : FO ACTI 005-2 Version : 4 Date d'application : 09/07/2020

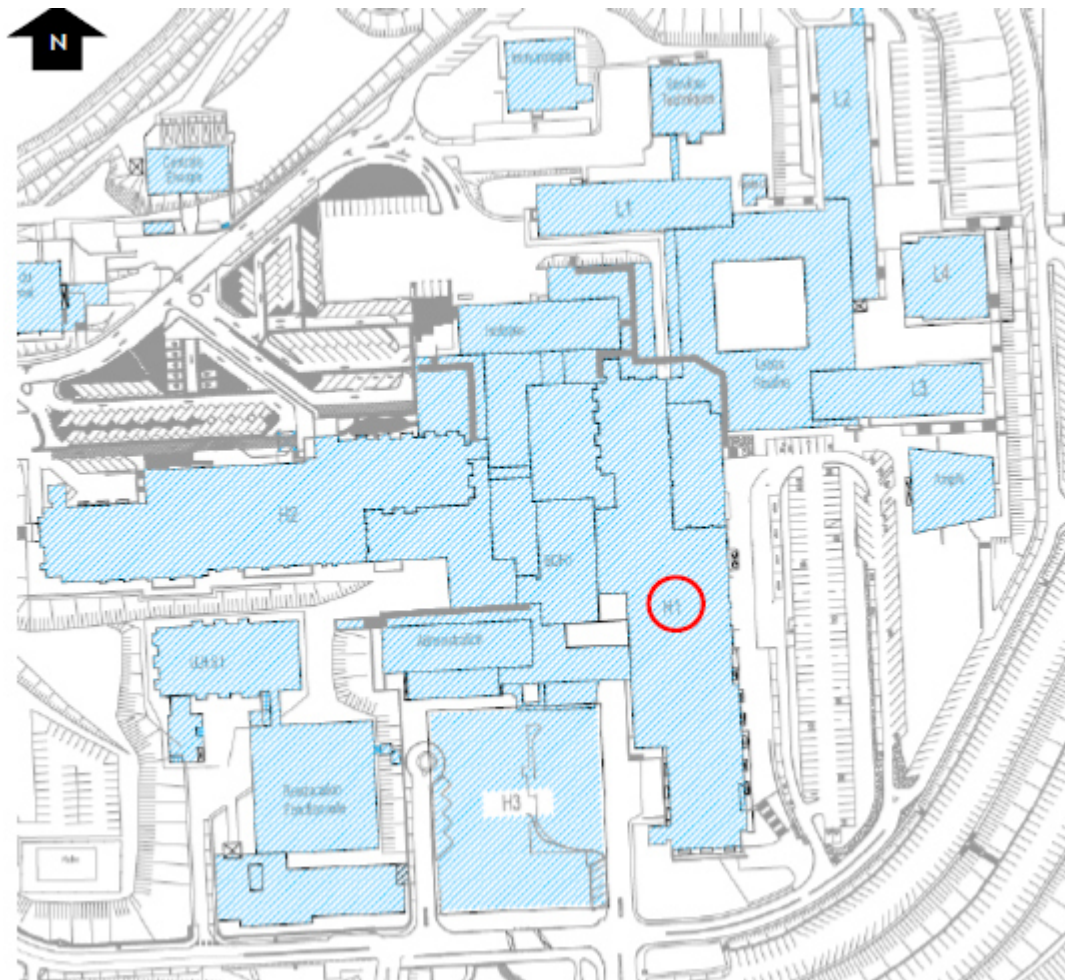

Annexe : plan EGIS analyse rapport amiante regroupement de l'imagerie + plans architecte SS1 et SS2 numéro de locaux
