



# ALPES CONTROLES

## Agence de Thonon

174, route du Crêt Gojon

ZAC des 5 Chemins

74200 MARGENCEL

☎ 04 50 64 26 52 📠 04 50 70 33 47

dim.annecy@alpes-contrôles.fr

**Références** : A06B163F/003/ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM/GEC

**Date d'édition** : 28/04/2017

## RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX

### DESIGNATION DU BATIMENT

**Dénomination du bâtiment:** ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM

**Fonction principale du bâtiment:**

**Date du Permis de Construire:** non communiqué

**Adresse:**

35 route du Bouchet  
74401 CHAMONIX

**Propriété de:**

ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM

### CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**Signature**

*Le diagnostiqueur*  
**Georges ECK**

**Date d'établissement du rapport:** 28/04/2017

Fait à MARGENCEL

Organisme: **BUREAU ALPES CONTRÔLES**

N° SIREN/SIRET: **351 812 698/00667**

Nom du diagnostiqueur: **Georges ECK**

**N° de certification: C2223**

**Organisme de certification: QUALIXPERT CERTIFICATION**

**Date d'obtention: 16/07/2014**

**Diffusion**

**Monsieur DUPUY Philippe**  
**Madame DAVY Karine**

philippe.dupuy@ensm.sports.gouv.fr

karine.davy@jeunesse-sports.gouv.fr

# SOMMAIRE

A. INFORMATIONS GENERALES.....	2
B. CONCLUSION.....	3
C. DESCRIPTION DE LA MISSION.....	5
ANNEXES.....	17

<b>A. INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>A.1 DESIGNATION DU BATIMENT</b>	
<b>Dénomination du bâtiment:</b> ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM <b>Fonction principale du bâtiment:</b> <b>Date du Permis de Construire:</b> non communiqué <b>Adresse:</b> 35 route du Bouchet 74401 CHAMONIX <b>Propriété de:</b> ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM	
<b>A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE</b>	
<b>Nom:</b> ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM <b>Adresse:</b> 35 route du Bouchet 74401 CHAMONIX <b>Qualité:</b> Propriétaire	<b>Documents remis:</b> Néant <b>Moyens mis à disposition:</b> Néant
<b>A.3 EXECUTION DE LA MISSION</b>	
<b>Rapport N°:</b> A06B163F/003/ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE ENSM/GEC <b>Le repérage a été réalisé le:</b> 27/03/2017 Correspondant: Monsieur Le Directeur	Date d'émission du rapport: 28/04/2017 Date de réception de la commande: 10/06/2016 Laboratoire d'Analyses : SURCOTEC 109A, ch. du Pont-du-Centenaire 1228 Plan-les-Ouates 42016 Geneva Switzerland
<b>A.4 REFERENCE REGLEMENTAIRE</b>	
- Art. R1334-14, R1334-19, R1334-22, et R1334-24 du Code de la Santé Publique - Décret 2004-802 du 29 juillet 2004 - Décret 2011-629 du 3 juin 2011 - Arrêté du 26 juin 2013	

## B. CONCLUSION

**Il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyses.**

### Descriptif des travaux

Travaux de rénovation, localisés dans : Salle de bains et douche, cuisine dans tous les appartements visités.

### Liste des locaux visités

Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°5 (Sdb.)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°5 (Cuisine.)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°4 (Sdb)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°4 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°4 (cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1E (WC/douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1E (Cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1F (WC/douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1F (Cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2E (WC/douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2E (Cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2F (WC/douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2F (Cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°3 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°3 (cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°6 (Sdb)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°6 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°6 (cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°7 (Sdb.)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°7 (Cuisine.)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°8 (Sdb)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°8 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°8 (cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°9 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1(douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°1 (cuisine)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2 (Sdb)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2 (douche)  
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°2 (cuisine)

### Réserves

#### **Compte tenu de l'inaccessibilité en l'état actuel de certains matériaux :**

- Equipements techniques,
- Réseaux enterrés,
- Réseaux emmurés

**Une visite complémentaire sera nécessaire en cours de travaux, si ces matériaux sont concernés ou touchés lors des opérations. Cette visite fera l'objet d'un avenant à notre intervention initiale et un rapport complémentaire sera rédigé.**



Liste des éléments non concernés	
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°9 (Sdb)	Matériaux postérieurs à 1997
Immeuble Apt. de fonction. / Apt N°9 (cuisine)	Matériaux postérieurs à 1997

**Liste des matériaux contenant de l'amiante:**

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement ou méthode
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier.	prélèvement 8
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement 10
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement 11
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement 12

**Liste des matériaux ne contenant pas d'amiante après analyses:**

Zone	Local	Element	Matériau	N° prélèvement
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Plancher	sol souple plastique en lais	1
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	plinthe carrelage collé	4
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	faïence collée	3
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	enduit lissé	2
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	5
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Divers	plaque amortissante sous évier.	6
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	7
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Paroi intérieure	plinthe plastique	9

## C. DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants:

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	

### 1 - Toiture, terrasse et étanchéité

Plaques ondulées et planes	plaques en fibres-ciment y compris les panneaux type "sous tuiles"	X								
	plaques en matériaux bitumineux	X								
	Autre	X								
Ardoises	Ardoises composites	X								
	Ardoises en fibres ciment	X								
	Autre	X								
Bardeaux bitumé (type "Shingle")	Bardeaux bitumé (type "Shingle")	X								
	Autre	X								
Eléments de sous-toiture	Pare-vapeur, pare-pluie et autres panneaux structurels isolants sous toiture	X								
	Flocage	X								
	Autre	X								
Complexe d'étanchéité pour toiture (y compris toiture-terrasse) pouvant être constitué d'une ou plusieurs couches	Bandes bitumineuses notamment renfort de cuvelage, produits d'accrochage et colles	X								
	Isolants Complexe asphalté	X								
	Autre	X								
Eléments ponctuels	Conduits de cheminée de ventilation, etc. Tout élément complémentaire à la toiture y compris les chéneaux	X								
	Conduits de ventilation, conduits eaux pluviales (voir article 6 « Conduits, canalisations et équipements »)	X								
	Autre	X								
Autre	Autre	X								

### 2 - Parois verticales extérieures

Panneaux sandwichs	Plaques Joints d'assemblage Joints d'étanchéité Tresses Mastics	X								
	Autre	X								
Bardages	Plaques et « bacs » en fibres ciment	X								
	Ardoises composites ou fibres ciment	X								



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
	Autre	X								
Bardages métalliques à simple ou double peau	Revêtement intérieur, peinture	X								
	Autre	X								
Isolants sous bardage	Flocage, carton	X								
	Autre	X								
Mur et cloisons « en dur »	Enduits projetés, revêtement plastique épais, lissés ou talochés	X								
	Colle de carrelage	X								
	Appui de fenêtre	X								
	Autre	X								

### 3 - Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons « en dur » (suite)	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Sdb.)/enduit lissé	X			X	prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Cuisine.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Sdb.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Cuisine.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8	X			X	idem prélèvement 2



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
					(Sdb)/enduit lissé					
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1(douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
	Joints (de dilatation, d'assemblage)			X						
	Autre			X						
Poteaux (périphériques et intérieurs)	Flocages			X						
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)			X						
	Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison avec la poutraison)			X						
	Entourage de poteaux (carton, fibres ciment, matériau sandwich, carton + plâtre) Coffrage perdu			X						
	Autre			X						
Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons			X						
	Isolant intérieur			X						
	Jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres ciment			X						
	Autre			X						
Gaines et coffres verticaux (vérification des intérieurs et des extérieurs)	Flocage			X						
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)			X						
	Panneaux			X						
	Jonctions entre panneaux			X						
	Autre			X						
Portes coupe-feu, Portes pare-flamme	Vantaux et joints (sur battants et dormants y compris oculus, etc.)			X						
	Autre			X						



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
Revêtement de murs, de poteaux, de cloisons légères ou préfabriquées, de gaines, de coffres et des portes coupe-feu et pare-flamme	Sous-couches des tissus muraux			X						
	Revêtements durs (plaques revêtues d'amiante-ciment, fibres-ciment)			X						
	Colles des carrelages		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Sdb.)/faïence collée	X			X	prélèvement 3
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Cuisine.)/faïence collée - crédence	X			X	prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (Sdb.)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (douche)/faïence collée	X			X	prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (WC/douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (Cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (WC/douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (Cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (WC/douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (Cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (WC/douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (Cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 3
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6	X			X	idem prélèvement 7



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
					(Sdb)/faïence collée					
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Sdb.)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 3
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Cuisine.)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (Sdb)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°9 (douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1(douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 3
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (Sdb)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (douche)/faïence collée	X			X	idem prélèvement 7
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (cuisine)/faïence collée - crédence	X			X	idem prélèvement 5
	Peintures (intumescents, bitumineuses, décoratives)			X						
	Autre		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Sdb.)/plinthe carrelage collé	X			X	prélèvement 4
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (douche)/toile verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (WC/douche)/toile de verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile de verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (WC/douche)/toile de verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile de verre)



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (WC/douche)/toile de verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile de verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (WC/douche)/toile de verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile de verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (douche)/plinthe bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (plinthe bois)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (douche)/toile verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Sdb.)/plinthe plastique	X			X	prélèvement 9
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (douche)/toile verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°9 (douche)/toile verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile verre)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (douche)/toile verre		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (toile verre)

4 - Plafonds et faux-plafonds										
Plafonds	Flocages,			X						
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés, lissés ou talochés notamment ceux ayant une fonction coupe-feu (principalement dans les IGH/ERP)		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Sdb.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Cuisine.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (WC/douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (WC/douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (WC/douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (WC/douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (Cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Sdb.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Cuisine.)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°9 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1(douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (Sdb)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (douche)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (cuisine)/enduit lissé	X			X	idem prélèvement 2

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
	Panneaux collés ou vissés Coffrages perdus (carton-amiante, fibres ciment, composite), Cales de ferrailage			X						
	Autre			X						
Poutres et charpentes (périphériques et intérieures)	Flocages			X						
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)			X						
	Joints (de dilatation, d'assemblage, de liaison) plaques de ripage			X						
	Entourage de poutres (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre) Coffrage perdu			X						
	Peintures intumescentes			X						
	Autre			X						
Interfaces entre structures	Rebouchage de trémies Jonctions avec la façade Calfeutrements Joints de dilatation			X						
	Autre			X						
Gaines et coffres horizontaux	Flocages			X						
	Enduits à base de plâtre ou ciment ou autres, projetés lissés ou talochés (notamment ceux ayant une fonction coupe-feu dans les IGH/ERP)			X						
	Panneaux, Jonction entre panneaux			X						
	Autre			X						
Faux plafonds	Panneaux et plaques			X						
	Jonctions entre faux-plafond et structure. Joints entre panneaux ou plaques			X						
	Cantonnements. Le cantonnement à rechercher est celui constitué dans le plenum en jonction entre les cloisons ou murs et le plancher haut supérieur			X						
	Autre			X						
Suspenes et contrevents	Flocages. Protections en plâtre. Peintures intumescentes			X						
	Autre			X						

## 5 - Planchers et planchers techniques



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
Revêtements de sol y compris revêtements de sols sportifs . NOTE : En cas de travaux, l'analyse concerne chacune des couches du revêtement	Dalles plastiques. Dalles moquettes avec entre-couche noire. Lés en matériau plastique et/ou moquette avec sous-couche. Nez de marche. Colles		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Sdb.)/sol souple plastique en lais	X			X	prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Cuisine.)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (Sdb)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (WC/douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1E (Cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (WC/douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1F (Cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (WC/douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2E (Cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (WC/douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2F (Cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°3 (cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (Sdb)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Sdb.)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Cuisine.)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (Sdb.)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°9 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1(douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1 (cuisine)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (Sdb)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (douche)/sol souple plastique en lais	X			X	idem prélèvement 1
	Autre		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (cuisine)/parquet bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (parquet bois)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°6 (cuisine)/parquet bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (parquet bois)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°8 (cuisine)/parquet bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (parquet bois)
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (cuisine)/parquet bois		X		X	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature (parquet bois)
Planchers. NOTE Lors de réhabilitation ou d'aménagement de certains types de construction à ossature bois, de l'isolant en vrac a pu être disposé entre les chevrons avant la pose d'un plancher	Etanchéité de cuvelages			X						
	Coffrage perdu			X						
	Chape maigre (base ciment) Ragréage			X						
	Rebouchage autour de conduits (principalement IGH et ERP)			X						
	Autre			X						

#### 6 - Conduits, canalisations et accessoires intérieurs et extérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur,	Calorifugeages, rubans adhésifs	X								
--	---------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
fumée, autres fluides). Conduits de vapeur, fumées, échappement	Enveloppe de calorifuge	X								
	Conduit Joints entre éléments Mastics Tresse Manchons	X								
	Autre	X								
Cables électriques	Câbles électriques (isolant souvent de couleur orange) d'alimentation de secours	X								
	Autre	X								
Clapets / volets coupe-feu	Clapet, volet, rebouchage, ossature	X								
	Etanchéité coupe-feu en traversée cloison ou plancher	X								
	Autre	X								
Vide-ordures	Conduit	X								
	Joint d'étanchéité des trappes	X								
	Autre	X								

#### 7 - Ascenseurs et monte-charges

Portes intérieurs et extérieurs de l'ascenseur et portes palières de l'étage	Portes et cloisons palières	X								
	Autre	X								
Machinerie	Frein	X								
	Autre	X								
Trémie Machinerie	entre mur/plancher (Joint, Bourre). Trappe. NOTE: Toutes les parois sont à examiner comme prévu aux chapitres précédents du présent tableau	X								
	Autre	X								

#### 8 - Equipements divers et accessoires

Chaudières Tuyauteries. Etuves. Groupes électrogènes Convecteurs et radiateurs Aérothermes	Bourres Tresses. Joints Calorifugeages Peintures anti-condensation Plaques isolantes (internes et externes) Tissus Revêtements de câbles métalliques	X								
	Autre	X								

#### 9 - Installations industrielles

Equipements et éléments spécifiques à vérifier en fonction du process industriel (fours, étuves, tuyauteries, racks)	Bourres Tresses Joints Calorifugeages Peinture anti-condensation Plaques isolantes Tissus	X								
	Autre	X								

#### 10 Voies et réseaux divers

Conduits	Fibres ciment	X								
----------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Composants de la construction	Partie des composants à sonder	Non concerné	Présent		Localisation	Prélèvement		Présence d'amiante		Justificatif
			Oui	Non		Oui	Non	Oui	Non	
	Autre	X								
Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	X								
	Autre	X								

#### 11 - Autres matériaux connus (hors norme et arrêté)

Fenêtre/verrière (bois, fer et aluminium)	Mastics			X						
	Autre			X						
Bac	Bac en fibres ciment			X						
	Autre			X						
Autre	Autre		X		Immeuble Apt. de fonction./Apt N°5 (Cuisine.)/plaque amortissante sous évier.	X			X	prélèvement 6
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°4 (cuisine)/plaque amortissante sous évier.	X		X		prélèvement 8
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°7 (Cuisine.)/plaque amortissante sous évier	X		X		prélèvement 10
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°1 (cuisine)/plaque amortissante sous évier	X		X		prélèvement 11
					Immeuble Apt. de fonction./Apt N°2 (cuisine)/plaque amortissante sous évier	X		X		prélèvement 12



## ANNEXES

ANNEXE 1 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS	5 pages
ANNEXE 2 - CROQUIS	8 pages
ANNEXE 3 - PHOTOS	1 page
ANNEXE 4 - PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES	5 pages
ANNEXE 5 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	2 pages
ANNEXE 6 - ANCIENS RAPPORTS	1 page
ANNEXE 7 - COPIE DU CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DE L'INTERVENANT	1 page
ANNEXE 8 - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE	2 pages



# ANNEXE 1 - RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif	Amiante
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Plancher	sol souple plastique en lais	prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	plinthe carrelage collé	prélèvement n°4	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	faïence collée	prélèvement n°3	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Paroi intérieure	enduit lissé	prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Sdb.)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°5 (Cuisine.)	Divers	plaque amortissante sous évier.	prélèvement n°6	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (Sdb)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (Sdb)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (Sdb)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (Sdb)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (douche)	Paroi intérieure	toile verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Plancher	parquet bois	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°4 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier.	prélèvement n°8	Oui
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (WC/douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (WC/douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (WC/douche)	Paroi intérieure	toile de verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non

Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif	Amiante
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (WC/douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (Cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (Cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (Cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1E (Cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (WC/douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (WC/douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (WC/douche)	Paroi intérieure	toile de verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (WC/douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (Cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (Cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (Cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1F (Cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (WC/douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (WC/douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (WC/douche)	Paroi intérieure	toile de verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (WC/douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (Cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (Cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (Cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2E (Cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (WC/douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (WC/douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (WC/douche)	Paroi intérieure	toile de verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (WC/douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (Cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (Cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (Cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement	Non



Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif	Amiante
fonction.				n°2	
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2F (Cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (douche)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (douche)	Paroi intérieure	plinthe bois	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°3	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°3 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (Sdb)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (Sdb)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (Sdb)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (Sdb)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (douche)	Paroi intérieure	toile verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (cuisine)	Plancher	parquet bois	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°6 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Paroi intérieure	plinthe plastique	prélèvement n°9	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°3	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Sdb.)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non



Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif	Amiante
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°7 (Cuisine.)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement n°10	Oui
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (Sdb)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (Sdb)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (Sdb)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (Sdb)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (douche)	Paroi intérieure	toile verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (cuisine)	Plancher	parquet bois	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°8 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°9 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°9 (douche)	Paroi intérieure	toile verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°9 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°9 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1(douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1(douche)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1(douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°3	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1(douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement	Non




Zone	Local	Element	Matériau	Justificatif	Amiante
fonction.				n°5	
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°1 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement n°11	Oui
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (Sdb)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (Sdb)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (Sdb)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (Sdb)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (douche)	Plancher	sol souple plastique en lais	idem prélèvement n°1	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (douche)	Paroi intérieure	toile verre	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (douche)	Paroi intérieure	faïence collée	idem prélèvement n°7	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (douche)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Plancher	parquet bois	Matériau ne contenant pas d'amiante par nature	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Paroi intérieure	faïence collée - crédence	idem prélèvement n°5	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Paroi intérieure	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Plafond	enduit lissé	idem prélèvement n°2	Non
Immeuble Apt. de fonction.	Apt N°2 (cuisine)	Divers	plaque amortissante sous évier	prélèvement n°12	Oui




## ANNEXE 2 - CROQUIS

Localisation prélèvements : Apt N°5 (Sdb) :

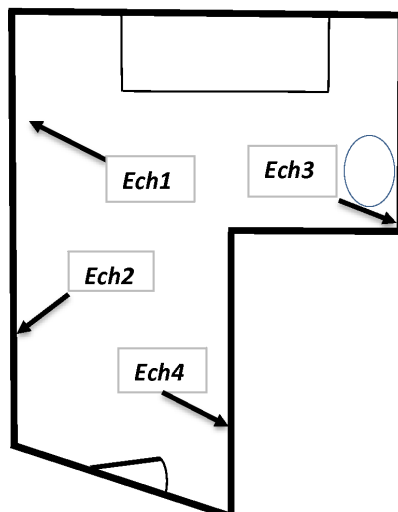


CROQUIS Sdb Apt N°5	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

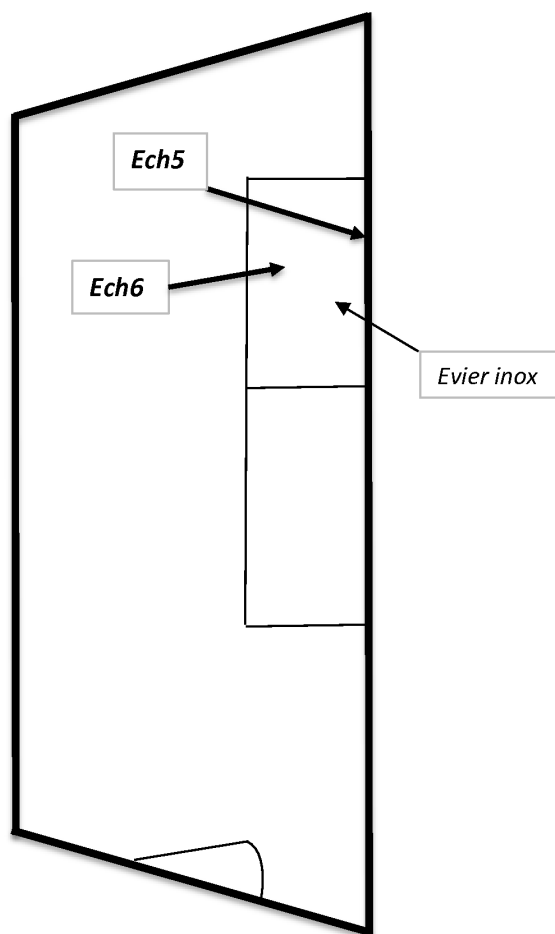


CROQUIS Cuisine Apt N°5	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	




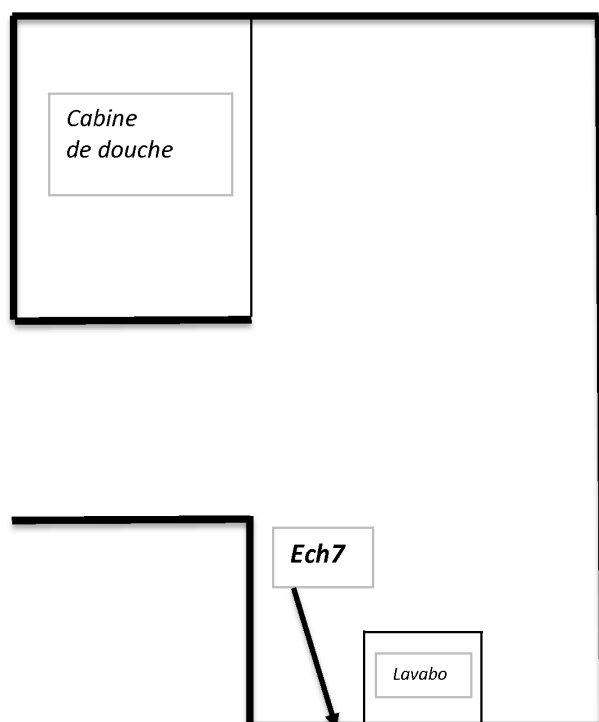


CROQUIS Douche Apt N°4	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

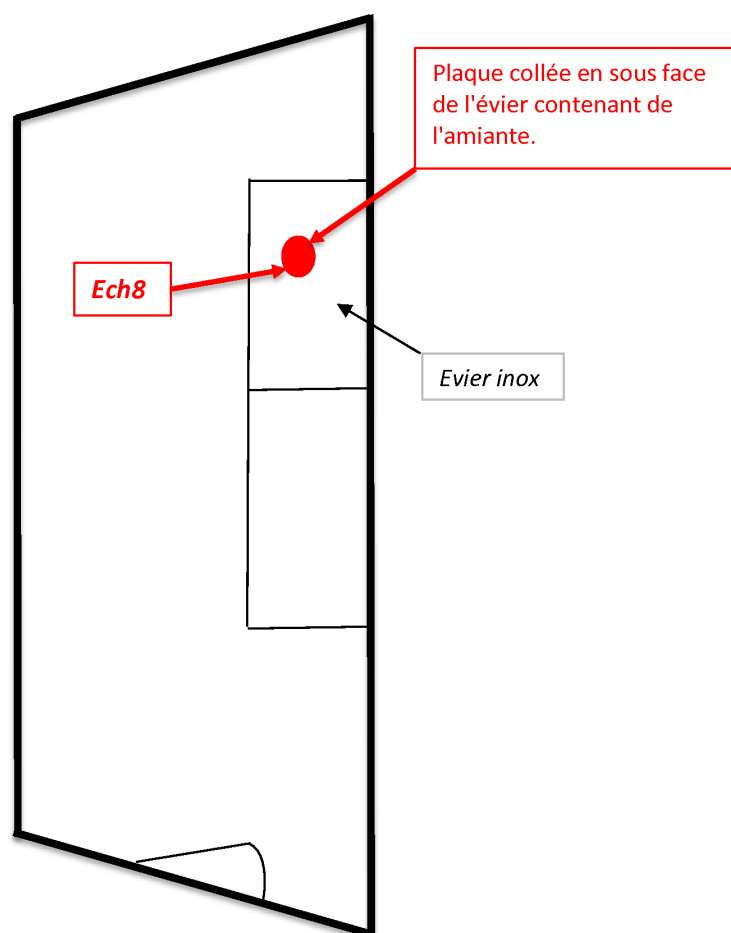


CROQUIS Cuisine Apt N°4	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

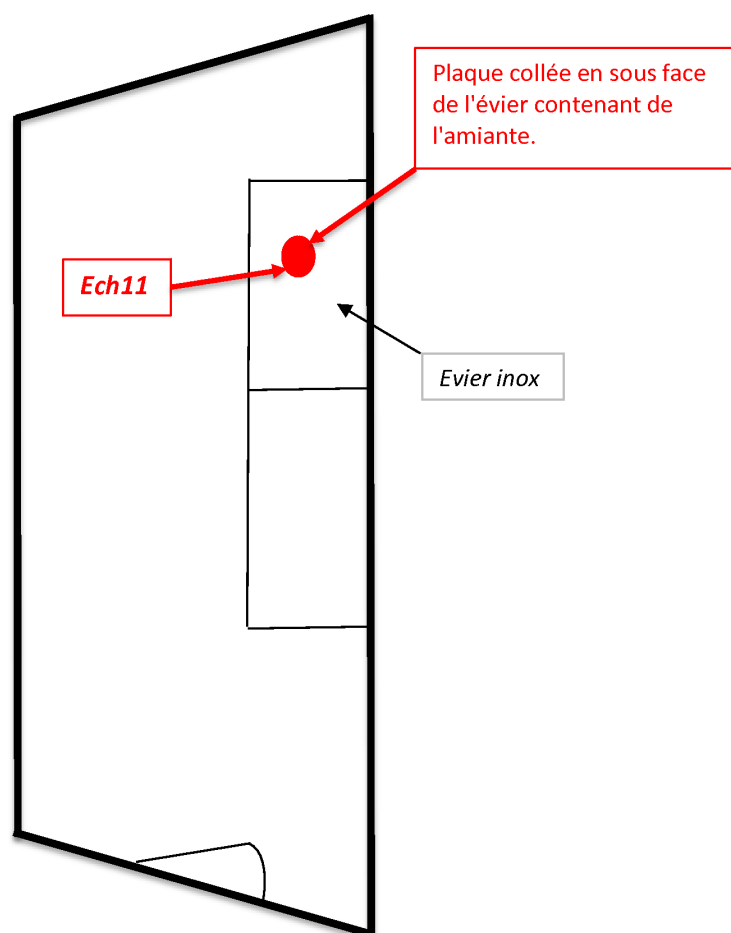


CROQUIS Cuisine Apt N°1	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

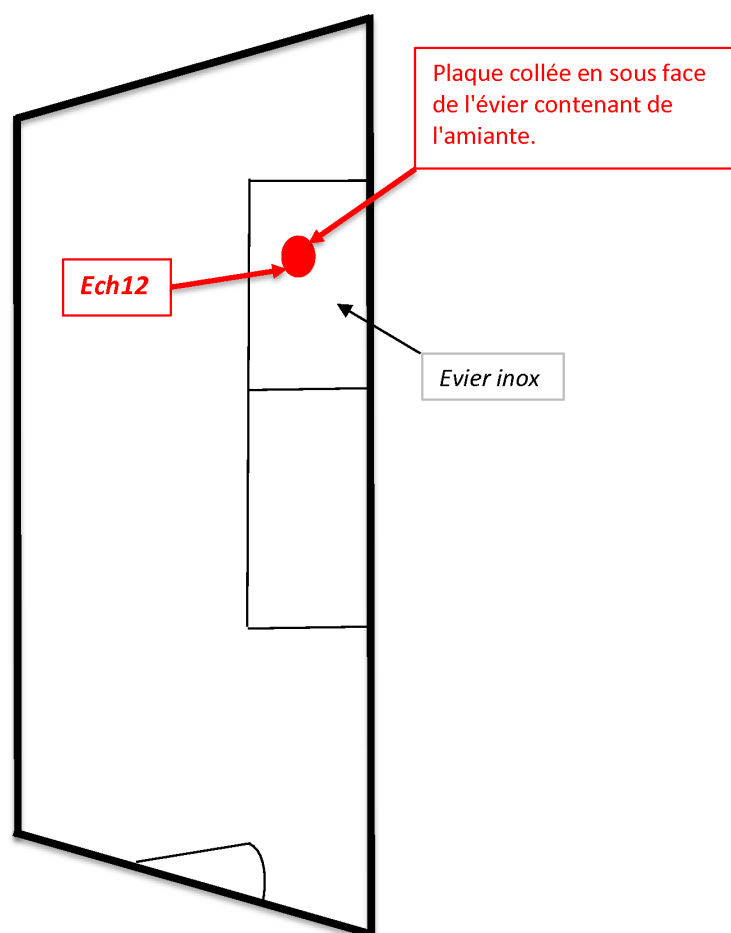

CROQUIS Cuisine Apt N°2	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

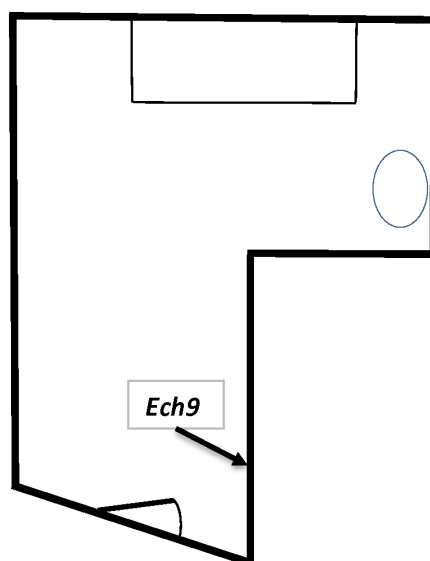

CROQUIS Sdb Apt N°7	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

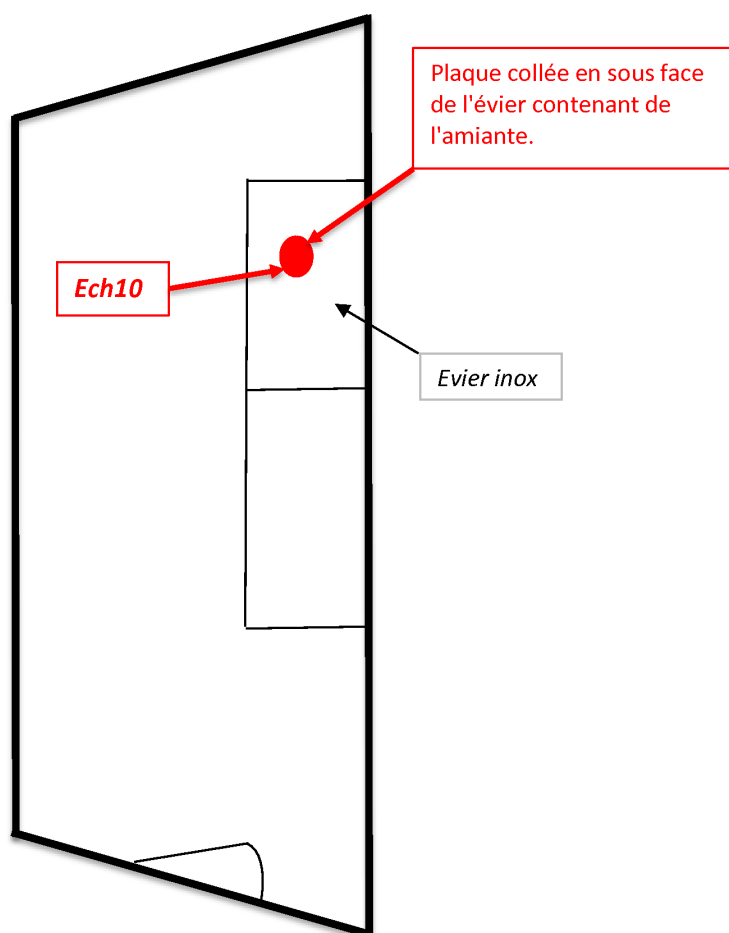

CROQUIS Cuisine Apt N°7	
28/04/2017	ENSA CHAMONIX
Localisation des prélèvements effectués le : 27/03/2017	

## ANNEXE 3 - PHOTOS



**Voir ci après**



# RAPPORT D'ANALYSE

## Recherche d'amiante dans un prélèvement de matériau

**No de rapport :** BUREA320170427A

**Client :**

Entreprise : BUREAU ALPES CONTROLES  
Contact : M. G. Eck  
Adresse : ZAC des 5 Chemins  
74200 MARGENCEL

**Prélèvement :**

Date de réception : 26.04.2017  
Référence client : A06B163F - CHAMONIX ENSM  
DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT  
TRAVAUX - ECOLE NATIONALE DES  
SPORTS DE MONTAGNE ENSM

## RESULTATS

Les échantillons ci-dessous ont été préparés selon la norme HSG 248 (ex-MDHS 77) et analysés selon les parties appropriées des normes VDI 3866 (part 5) / HSG 248 / VDI 3492 :

***Données du client (No référence, description, localisation, ...)***

1 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Sdb.) - Plancher - sol souple plastique en lais

***Examen visuel et microscopique***

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Dalle plastique	Mou	Beige	Calcination	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

***Données du client (No référence, description, localisation, ...)***

2 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Sdb.) - Paroi intérieure - enduit lissé

***Examen visuel et microscopique***

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Peinture	Friable	Bleu	Calcination	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

***Données du client (No référence, description, localisation, ...)***

3 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Sdb.) - Paroi intérieure - faïence collée

***Examen visuel et microscopique***

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Colle minérale	Friable	Blanc	Acidification	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

# RAPPORT D'ANALYSE

## Recherche d'amiante dans un prélèvement de matériau

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

4 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Sdb.) - Paroi intérieure - plinthe carrelage collé

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Colle minérale + peinture	Friable	Blanc Bleu	Calcination Acidification	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

5 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Cuisine.) - Paroi intérieure - faïence collée - crédence

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Colle minérale	Friable	Blanc	Acidification	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

6 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°5 (Cuisine.) - Divers - plaque amortissante sous évier.

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

7 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°4 (douche) - Paroi intérieure - faïence collée

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Colle minérale	Friable	Blanc	Acidification	2	MOLP puis MEB	<b>Amiante non détecté</b>

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

8 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°4 (cuisine) - Divers - plaque amortissante sous évier.

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP	<b>Amiante détecté (chrysotile*)</b>

# RAPPORT D'ANALYSE

## Recherche d'amiante dans un prélèvement de matériau

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

9 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°7 (Sdb.) - Paroi intérieure - plinthe plastique

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP puis MEB	Amiante non détecté

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

10 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°7 (Cuisine.) - Divers - plaque amortissante sous évier

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP	Amiante détecté (chrysotile*)

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

11 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°1 (cuisine) - Divers - plaque amortissante sous évier

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP	Amiante détecté (chrysotile*)

### Données du client (No référence, description, localisation, ...)

12 Immeuble Apt. de fonction. - Apt N°2 (cuisine) - Divers - plaque amortissante sous évier

### Examen visuel et microscopique

Description	Consistance	Couleur	Type de préparation	Nb de préparation	Techniques d'analyses	Résultat de l'analyse
Bitume	Mou	Noir	Calcination	2	MOLP	Amiante détecté (chrysotile*)

## RAPPORT D'ANALYSE

### Recherche d'amiante dans un prélèvement de matériau

## REMARQUES

Les données concernant la détection et le type d'amiante sont comprises dans le domaine d'accréditation, la quantité d'amiante est donnée à titre indicatif. La limite de détection est supérieure ou égale à 0.1%. Les autres indications figurant sur le rapport et concernant les échantillons proviennent de la fiche fournie par le client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

En restant à votre disposition en cas de question concernant nos documents qualifiés, nos méthodes d'analyses ou toutes autres informations.

Rédigé par : Laurie Berthollet

Validé par : Limat Dominique

*Responsable du laboratoire ou son remplaçant agréé*

Signature :



Signature :



Date	Version	Auteur	Commentaires
27.04.2017	Version 1		Rapport initial

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

#### a) Dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrément important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

#### b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr).

De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

#### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

##### a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

##### b. Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

##### c. Filières d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

##### d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

- de la mairie ;

- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

##### e. Traçabilité


Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA n° 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

## ANNEXE 6 - ANCIENS RAPPORTS


NUMERO DE REFERENCE du rapport de repérage	DATE DU RAPPORT	NOM DE LA SOCIETE et de l'opérateur de repérage	OBJET DU REPERAGE
Néant			



**Certificat N° C2223**  
**Monsieur Georges ECK**

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et/ou du processus de recertification PR11 consultables sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.

dans le(s) domaine(s) suivant(s) :



---

**Missions de repérage et de diagnostic de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante**


certificat valide du 16/07/2014

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.

---

au 15/07/2019

**Marjorie ALBERT**  
**Directrice Administrative**



---

Date d'établissement 28/07/2014

LCC 17, rue Borrel - 81100 CASTRES  
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
sarl au capital de 6500 euros - RCS 271258 - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018





Assurance des Ingénieurs et Architectes européens



2017

N° D'IDENTIFICATION :

7380137/N/22

Lettre n° 4665612

SAS BUREAU ALPES CONTROLES

PAE LES GLAISINS

3 bis Impasse DES PRAIRIES

74940 ANNECY LE VIEUX

Paris, le 1<sup>er</sup> janvier 2017**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**EUROMAF SA** atteste garantir l'adhérent ci-dessus désigné contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession dans le cadre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des ingénieurs et autres concepteurs de la construction n° 7006693/S pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2017.

Ce contrat, actuellement en vigueur, satisfait notamment à l'obligation d'assurance édictée par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Il est conforme aux clauses types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances.

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30.000.000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20.000.000,00 € hors taxes.

La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

ACTIVITES ASSUREES

B.6.2 Mission de coordination des systemes de securite incendie.

D Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle.

A.M.O Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.

AMO HQE missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre.

AMO HAN mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique.

B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge.

B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation.

Entreprise régie par le code des assurances  
Société anonyme au capital de 21 250 000 €  
R.C.S. Paris B 429 599 509

1/2

16, rue de l'Amiral Hamelin 75783 Paris Cedex 16  
Tél : 33(0)1 53 70 30 00 • Fax : 33(0)1 53 70 32 10 •  
euromaf@euromaf.fr • [www.euromaf.fr](http://www.euromaf.fr)



B.6.1 Missions de B.E.T. ou d'ingénieur-conseil pour les réseaux de détection et lutte contre l'incendie et l'intrusion, y compris coordination des systèmes de sécurité incendie (cssi), gestion technique centralisée (gtc) des bâtiments.

B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux.

B.5.5 Missions de diagnostic, d'évaluation, de repérage de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis et/ou chantiers de bâtiment prévues par les textes législatifs ou réglementaires.

B.5.8 Mission d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale.

B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique.

B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation).

b.5.11 Mission de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau.

B.5.13 Mission sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement.

B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation.

O26 Missions d'études d'impact.

ENQ TEC Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre.

EVEN Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles.

CON TE Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil

VEFA Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation

CONT PER Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention

SPS Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail.

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2017

EUROMAF
