


Pré-Rapport de mission de repérage du plomb avant travaux dans un immeuble bâti

(Selon Norme NF X 46-035 de Juin 2021)

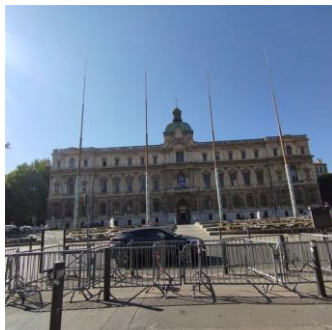

BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Propriétaire

PREFECTURE DE REGION PACA
PLACE FELIX BARRET CS80001
13282 MARSEILLE CEDEX 06

Demandeur

PREFECTURE DE REGION PACA
PLACE FELIX BARRET CS80001
13282 MARSEILLE CEDEX 06

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Programme des travaux : Voir chapitre I.3

Date du rapport : 31/07/2024

Date de visite : 18-19/07/2024

Nombre de pages : 80

Fait à : 13100 AIX-EN-PROVENCE

Référence du dossier : 2407CPAAI -
BI12220000001034

Le présent rapport est établi par :
RAPHAEL ANDRE

Contrat d'assurance :
AXA / n° 37503519275087 / échéance 31/12/2024

Révision	Date	Objet
Néant		

Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.

Sommaire

I.	CADRE DE LA MISSION	3
1.	Objet de la mission	3
2.	Références règlementaires et normatives.....	3
3.	Programme des travaux du donneur d'ordre.....	4
4.	Périmètre du repérage (locaux et parties de locaux concernés)	4
5.	Description du bien	6
II.	METHODOLOGIE EMPLOYEE	7
1.	Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb	7
2.	Stratégie de mesurage	7
3.	Présentation des résultats	8
III.	PROTOCOLE DU REPERAGE.....	8
1.	Identification des locaux	8
2.	Identification des zones	8
3.	Identification des revêtements	8
4.	Identification des unités de repérage et substrat.....	9
IV.	INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE.....	10
V.	DEROULEMENT DE LA MISSION	11
1.	Prestations réalisées :	11
2.	Personnes présentes lors de la visite :	11
3.	Informations complémentaires sur la visite	11
4.	Documents communiqués à Socotec dans le cadre de la présente mission	11
5.	Plans des parties d'immeuble concernées par la mission.....	11
VI.	RESULTATS DETAILLES	12
	Annexe 1 - REPERAGE DES LOCAUX.....	65
	Annexe 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE	75
	Annexe 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES	76
	Annexe 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE.....	77
	Annexe 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF	78
	Annexe 6 - NOTICE D'INFORMATION	79

I. CADRE DE LA MISSION

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits de construction contenant du plomb susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement, au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition définis préalablement à la mission, dans l'immeuble bâti considéré. L'altération de ces revêtements, matériaux et produits peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux.

La recherche se limite aux revêtements, matériaux et produits de construction impactés, directement ou indirectement, par les travaux.

Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux tels que:

- Peintures, enduits, vernis, papiers (comprenant une feuille de plomb entrecollée), tissus muraux peints, colle (surtout en utilisation au sein de monuments historiques pour des toiles marouflées)
- Feuilles de plomb laminé (couverture, accessoire de couverture ou d'étanchéité, isolation phonique), canalisations en plomb, sertissage de vitraux, câbles gainés de plomb, éléments décoratifs en plomb etc.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction.

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

2. REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

- > Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail
- > Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants
- > Norme NF X 46-031 d'avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
- > Norme NF X 46-035 de juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction

3. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Ce paragraphe est consacré à la description détaillée des travaux envisagés afin de permettre au diagnostiqueur de définir la stratégie de mesures la plus adaptée. En l'absence de programme détaillé fourni par le donneur d'ordre, notre responsabilité ne saurait être engagée sur la stratégie de mesure ou le périmètre de repérage établi.

PROGRAMME DE TRAVAUX TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE :

Remplacements de portes.
Création de portes.
Doublages de murs et plafond en sous-sol.

TABLEAU DE RECENSEMENT DES TRAVAUX ÉTABLI PAR LE DONNEUR D'ORDRE (si transmis au préalable)

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenant
Néant		

4. PERIMETRE DU REPERAGE (LOCAUX ET PARTIES DE LOCAUX CONCERNES)

Parties d'immeubles visitées :

Niveaux	Locaux
Sous-sol	Couloir 9
Sous-sol	Local VMC
Sous-sol	Local Matériel Electricité
Sous-sol	Couloir 10
Sous-sol	Serrurerie
Sous-sol	Jardinier
Sous-sol	Couloir 12
Sous-sol	Couloir 3
Sous-sol	Couloir 4
Sous-sol	Couloir 6
RDC	Entrée
RDC	Dégagement
RDC	SAS
RDC	Grand Hall
RDC	Accès Entresol (RDC-1er)
Entresol RDC-1er étage	Grand Escalier Rome
Entresol RDC-1er étage	Salle de Billard
Entresol RDC-1er étage	Couloir 1
Entresol RDC-1er étage	Couloir 3
1er étage	Couloir 1
1er étage	Escalier 1
1er étage	Hall
1er étage	Dégagement 1
1er étage	Couloir 2
1er étage	Couloir 3
1er étage	Couloir 4
1er étage	Palier
1er étage	Couloir 5
1er étage	Dégagement 2
1er étage	Dégagement 3
2ème étage	Couloir 1
2ème étage	Couloir 2
2ème étage	Escalier 2
2ème étage	Couloir 3
2ème étage	Couloir 4
2ème étage	Couloir 5
2ème étage	Escalier 1
2ème étage	Couloir 6
2ème étage	Couloir 7

2ème étage	SAS 1
2ème étage	Couloir 8
2ème étage	Cuisine
2ème étage	SAS 2
2ème étage	Palier
2ème étage	Dégagement 1
2ème étage	Grand Escalier Rome
2ème étage	Salle à Manger
2ème étage	Dégagement 2
2ème étage	Dégagement 3
3ème étage	Couloir 1
3ème étage	Escalier 2
3ème étage	Dégagement 1
3ème étage	Bureau Partage
3ème étage	Grand Escalier Rome
3ème étage	Palier
3ème étage	Couloir 2
3ème étage	Circulation
3ème étage	Couloir 3
3ème étage	Couloir 4
3ème étage	Hall d'Etage
3ème étage	Couloir 5
Entresol 3ème-4ème étage	Local SRDSIC 1
Entresol 3ème-4ème étage	Local SRDSIC 2
4ème étage	Escalier 2
4ème étage	Détente
4ème étage	Couloir 1
4ème étage	Escalier 1
4ème étage	Bureau 1
4ème étage	Hall
4ème étage	Couloir 2
4ème étage	Couloir 3
4ème étage	Couloir 4
4ème étage	Couloir 5
4ème étage	Couloir 6
4ème étage	Couloir 7
4ème étage	Couloir 8
4ème étage	Couloir 9
4ème étage	Dégagement
4ème étage	Couloir 10
4ème étage	Couloir 11
4ème étage	Couloir 12
4ème étage	Hall Etage 1
4ème étage	Grand Escalier Rome
4ème étage	Palier
4ème étage	Hall Etage 2
4ème étage	ESC
Combles	Archives
Combles	Combles 2
Combles	Pavillon 2
Combles	Comble 3
Combles	Comble 4
Combles	Comble 5
Combles	Pavillon 3
Combles	Comble 6
Combles	Pavillon 4
Combles	Comble 7
Combles	Comble 8
Combles	Comble 9
Combles	Pavillon 1

Parties d'immeubles non visitées :

Niveaux	Locaux
---------	--------

Sous-sol	Bureau Equipe Entretien
Sous-sol	Electricien
Sous-sol	Remise 8
Sous-sol	Remise 9
Sous-sol	Entreprise
Sous-sol	Remise 6

Eléments non contrôlables (le cas échéant) :

Local	Parties du local	Raisons
Sous-sol - Bureau Equipe Entretien	Localisation non Visitée	Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Electricien	Localisation non Visitée	Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Remise 8	Localisation non Visitée	Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Remise 9	Localisation non Visitée	Inaccessible: Fortement encombrée
Sous-sol - Entreprise	Localisation non Visitée	Absence de clés
Sous-sol - Remise 6	Localisation non Visitée	Absence de clés

5. DESCRIPTION DU BIEN

Activité principale de l'immeuble : Bureaux

Année de construction : < 1949

II. METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb ont été réalisées selon le cadre réglementaire défini précédemment, et selon les modalités de la norme NF X 46-035 de Juin 2021.

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux, produits et des unités de repérage sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de repérage qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de repérage impactées par les travaux font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil est réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

En cas d'impossibilité de mesure par fluorescence X sur le revêtement, matériau, produit visé, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb total.

En cas d'unité de repérage située à une hauteur supérieure à 3 mètres, il appartient au donneur d'ordre de prendre les dispositions nécessaires, en accord avec la réglementation du travail, pour permettre à l'opérateur de repérage de réaliser les mesures de concentration en plomb sur celle-ci, faute de quoi le constat n'aurait de valeur que pour les unités diagnostiquées.

Il appartient également au donneur d'ordre de procéder aux opérations de démontage des éléments masquant les revêtements ou matériaux concernés par le périmètre de repérage et de faire procéder au démontage nécessitant des outillages et / ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage.

1. VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB

En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Les valeurs mesurées renseignent aussi sur la nature des composés. Dans la pratique les valeurs élevées mettent en évidence la présence de céruse ou de minium de plomb. Les valeurs faibles ($< 1\text{mg/cm}^2$) peuvent révéler la présence de siccatif de plomb (colle papier peint, peinture) ou d'impuretés dans les matériaux (support métallique, parpaings,...).

2. STRATEGIE DE MESURAGE

Dans chaque local, toutes les unités de repérage identifiées au préalable dans les zones de repérage font l'objet de mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Le nombre de mesures est défini selon l'étendue de l'unité de repérage et de la nature des travaux.

Pour une unité de repérage définie, au moins deux mesures sont effectuées. Si les résultats sont cohérents, l'unité de repérage est validée. Si les résultats sont incohérents, l'unité de repérage définie initialement est décomposée en plusieurs unités de repérage distinctes et les mesures sont complétées jusqu'à obtenir des résultats cohérents pour la ou les unités de repérage définie(s).

Ces mesures sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...). Sur chaque unité de repérage, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte

Pour les unités de repérage qui ont des surfaces ou des longueurs importantes, il est procédé à des mesures complémentaires.

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire.

3. PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le(s) croquis et dans le(s) tableau(x) des mesures est la suivante :

- > La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le(s) croquis ; les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

Les unités de repérage (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet de mesures sont classées dans le(s) tableau(x) des mesures.

Nota : Une unité de repérage définit soit :

- un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement
- un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction.

III. PROTOCOLE DU REPERAGE

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

L'auteur du constat dresse la liste détaillée :

- des locaux ;
- des ouvrages extérieurs (façades, couvertures, clôtures etc.).

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- > chaque palier ;
- > chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers ;
- > gaine d'ascenseur.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

2. IDENTIFICATION DES ZONES

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local ou ouvrage extérieur en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de repérage (porte, fenêtre, ...) peut être associée à une « zone ».

3. IDENTIFICATION DES REVETEMENTS

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les PVC et les glaçages de faïences et de carrelages peuvent contenir du plomb. Cependant, au regard du faible potentiel d'émission de poussières de plomb de ces matériaux, compte-tenu de la nature des travaux généralement

effectuée, leur recherche n'a pas été incluse dans le domaine d'application de la norme NF X 46 035 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements, matériaux et produits de construction. Sauf demande du donneur d'ordre, il n'est pas réalisé de mesures sur ces matériaux.

4. IDENTIFICATION DES UNITES DE REPERAGE ET SUBSTRAT

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de repérage à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de repérage par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de repérage.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).

Une unité de repérage définit soit :

- Un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;
- Un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)

Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.

Une unité de repérage se définit a minima avec les critères suivants : le niveau, le local, la zone, le produit ou matériau, le substrat, le revêtement.

Peuvent constituer une seule et même unité de repérage :

- > l'ensemble des plinthes d'un même local ;
- > l'ensemble des boiseries, décorations d'un même local ;
- > une porte et son huisserie dans un même local ;
- > une fenêtre et son huisserie dans un même local ;
- > l'ensemble des modénatures d'une façade.

Constituent des unités de repérage distinctes :

- > les différents murs d'une même pièce ;
- > des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- > les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
- > des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte, d'une fenêtre, d'une cloison mobile... car elles ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
- > une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de repérage.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de repérage distinctes :

- > l'ensemble des marches ;
- > l'ensemble des contremarches ;
- > l'ensemble des balustres ;
- > le limon ;
- > la crémaillère ;
- > la main courante ;
- > le plafond.

IV. INFORMATIONS CONCERNANT LE SPECTROMETRE

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	FENX	
N° de série de l'appareil	2-0208	
Nature du radionucléide	Cd109	
Date du dernier chargement de la source	15/02/2021	Activité à cette date et durée de vie : 850 Mbq
Autorisation ASN (DGSNR) Remplacé par Déclaration au 1 ^{er} Janvier 2019	N° T131062_CODEP-MRS-2022-006870	Date de déclaration 07/02/2022 00:00:00
	Date de fin de validité de l'autorisation Déclaration ASN / māj 2022	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	DELATTRE Olivier	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	LAGARRIGUE Florian	

Étalon : NIST SRM2573 1.04mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Etalonnage entrée	1	18-19/07/2024	0,31 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	1991	18-19/07/2024	0,31 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Ces vérifications sont effectuées selon les modalités définies par le fabricant de l'appareil.

V. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des revêtements, matériaux, produits susceptibles de contenir du plomb concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Mesures, avec un appareil à fluorescence X, de la concentration en plomb des revêtements, matériaux, produits repérés.
- ☐ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d'analyse : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
- ☒ Enregistrement des données sur les revêtements, produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE :

Accompagnateur(s) :
> Mr BATTINI

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Etat d'occupation des locaux lors de notre visite :

Occupé

Autres informations sur le déroulement de la mission :

Néant

4. DOCUMENTS COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents remis
Plans

5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans/schémas des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants :

Etage	Intitulé du plan
Sous-sol	Sous-sol
RDC	RDC
Entresol RDC-1er étage	Entresol RDC-1er étage
1er étage	1er étage
2ème étage	2ème étage
3ème étage	3ème étage
Entresol 3ème-4ème étage	Entresol 3ème-4ème étage
4ème étage	4ème étage
Combles	Combles

VI. RESULTATS DETAILLES

Analyses par fluorescence X :

Sous-sol - Couloir 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
2	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
3					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
4	Porte	A	Aluminium	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	
5					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
6	Huisserie Porte	A	Aluminium	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,05	0,07	
7					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
8	Embrasure porte		Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,03	0,07	
9					Embrasure porte (mesure 2)	0,08	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 4

Sous-sol - Local VMC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
10	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
11					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
12	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	4,9	0,07	
13	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	3,38	0,07	
14	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	10,29	0,07	
15	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
16					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
17					Mur (au centre)	0,04	0,07	
18	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
19					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
20	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	16,75	0,07	
21	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	4,53	0,07	
22	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	6,56	0,07	
23	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	9,87	0,07	
24	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	6,49	0,07	
25	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	4,05	0,07	
26	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	4,78	0,07	
27	Porte 2	D	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,09	0,07	
28					Porte 2 (partie haute)	0,01	0,07	
29	Huisserie Porte 2	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,02	0,07	
30					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,08	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

Sous-sol - Local Matériel Electricité

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
31	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,07	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
32					Sol (mesure 2)	0	0,07	
33	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	2,46	0,07	
34	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
35					Mur (partie haute)	0	0,07	
36					Mur (au centre)	0,04	0,07	
37	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
38					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
39					Mur (au centre)	0,07	0,07	
40	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
41					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
42					Mur (au centre)	0,01	0,07	
43	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
44					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
45	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,03	0,07	
46					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
47	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
48					Huisserie Porte (partie haute)	0,09	0,07	
49	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	6,61	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Sous-sol - Couloir 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
50	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
51					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
52	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6,06	0,07	
53	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	3,19	0,07	
54	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	5,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

Sous-sol - Serrurerie

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
55	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
56					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
57	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
58					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
59					Mur (au centre)	0,05	0,07	
60	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
61					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
62					Mur (au centre)	0,03	0,07	
63	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
64					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
65					Mur (au centre)	0,05	0,07	
66	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
67					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
68					Mur (au centre)	0,01	0,07	
69	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
70					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
71	Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	6,73	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
72	Huisserie Fenêtre intérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	2,95	0,07	
73	Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	2,28	0,07	
74	Huisserie Fenêtre extérieure	C	Bois	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	2,52	0,07	
75	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6	0,07	
76	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,58	0,07	
77	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,06	0,07	
78					Embrasure porte (mesure 2)	0,05	0,07	
79	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	6,18	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

Sous-sol - Jardinier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations	
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation	
80	Mur	A	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07		
81					Mur (partie haute)	0,09	0,07		
82					Mur (au centre)	0	0,07		
83	Mur	B	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07		
84					Mur (partie haute)	0	0,07		
85					Mur (au centre)	0	0,07		
86	Mur	C	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07		
87					Mur (partie haute)	0,04	0,07		
88					Mur (au centre)	0	0,07		
89	Mur	D	Béton	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07		
90					Mur (partie haute)	0,09	0,07		
91					Mur (au centre)	0,02	0,07		
92	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07		
93					Plafond (mesure 2)	0,01	0,07		
94	Porte 1	A	Bois	Peinture	Porte 1 (partie basse)	4,84	0,07		
95	Huisserie Porte 1	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte 1 (partie basse)	3,13	0,07		
96	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	4,23	0,07		
97	Embrasure porte	A	Béton		Embrasure porte (mesure 1)	0,06	0,07		
98					Embrasure porte (mesure 2)	0,07	0,07		
99	Garde-corps		Métal	Peinture	Garde-corps (mesure 1)	3,86	0,07		
100	Main-courante		Bois	Vernis	Main-courante (mesure 1)	0,09	0,07		
101					Main-courante (mesure 2)	0,09	0,07		
102	Porte 2	B	Bois	Peinture	Porte 2 (partie basse)	0,04	0,07		
103					Porte 2 (partie haute)	0,02	0,07		
104	Huisserie Porte 2	B	Bois	Peinture	Huisserie Porte 2 (partie basse)	0,09	0,07		
105					Huisserie Porte 2 (partie haute)	0,07	0,07		
106	Porte 3	C	Bois	Peinture	Porte 3 (partie basse)	0,07	0,07		
107					Porte 3 (partie haute)	0,03	0,07		
108	Huisserie Porte 3	C	Bois	Peinture	Huisserie Porte 3 (partie basse)	0	0,07		
109					Huisserie Porte 3 (partie haute)	0,03	0,07		
110	Porte 4	D	Bois	Peinture	Porte 4 (partie basse)	0,07	0,07		
111					Porte 4 (partie haute)	0	0,07		
112	Huisserie Porte 4	D	Bois	Peinture	Huisserie Porte 4 (partie basse)	0,02	0,07		
113					Huisserie Porte 4 (partie haute)	0,05	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 18									

Sous-sol - Couloir 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
114	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
115					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
116					Mur (au centre)	0,02	0,07	
117	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
118					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
119					Mur (au centre)	0	0,07	
120	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
121					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
122					Mur (au centre)	0,07	0,07	
123	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
124					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
125					Mur (au centre)	0,02	0,07	
126	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
127					Plafond (mesure 2)	0,01	0,07	
128	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
129					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
130	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
131					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
132	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
133					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
134	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
135					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
136	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,07	
137					Porte (partie haute)	0,04	0,07	
138	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
139					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

Sous-sol - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
140	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
141					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
142					Mur (au centre)	0,06	0,07	
143	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
144					Mur (partie haute)	0	0,07	
145					Mur (au centre)	0,01	0,07	
146	Embrasure porte		Pierre		Embrasure porte (mesure 1)	0,06	0,07	
147					Embrasure porte (mesure 2)	0,05	0,07	
148	Huisserie	A	Bois	Vernis	Huisserie (mesure 1)	0,07	0,07	
149					Huisserie (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Sous-sol - Couloir 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
150	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
151					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
152					Mur (au centre)	0,07	0,07	
153	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
154					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
155					Mur (au centre)	0,02	0,07	
156	Embrasure porte		Pierre		Embrasure porte (mesure 1)	0,01	0,07	
157					Embrasure porte (mesure 2)	0,04	0,07	
158	Huisserie	A	Bois	Vernis	Huisserie (mesure 1)	0,01	0,07	
159					Huisserie (mesure 2)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Sous-sol - Couloir 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
160	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
161					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
162	Piliers	B	Béton	Peinture	Piliers (mesure 1)	0,04	0,07	
163					Piliers (mesure 2)	0,03	0,07	
164	Piliers	D	Béton	Peinture	Piliers (mesure 1)	0,03	0,07	
165					Piliers (mesure 2)	0	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 3								

RDC - Entrée

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
166	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
167					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
168					Mur (au centre)	0,07	0,07	
169	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
170					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
171					Mur (au centre)	0,06	0,07	
172	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
173					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
174					Mur (au centre)	0,09	0,07	
175	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
176					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
177					Mur (au centre)	0,09	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	B	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	C	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	D	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
178	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,07	
179					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
180	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,09	0,07	
181					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

RDC - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
182	Sol		Bois	Parquet	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
183					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
184	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
185					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
186					Mur (au centre)	0,07	0,07	
187	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
188					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
189					Mur (au centre)	0,04	0,07	
190	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
191					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
192					Mur (au centre)	0,09	0,07	
193	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
194					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
195					Mur (au centre)	0,06	0,07	
196	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
197					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
198	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
199					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
200	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
201					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
202	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
203					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
204	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
205					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
206	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0	0,07	
207					Porte (partie haute)	0	0,07	
208	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
209					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

RDC - SAS

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
210	Mur (haut)	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,02	0,07	
211					Mur (haut) (mesure 2)	0,05	0,07	
212	Mur (haut)	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,05	0,07	
213					Mur (haut) (mesure 2)	0,09	0,07	
214	Mur (haut)	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,03	0,07	
215					Mur (haut) (mesure 2)	0	0,07	
216	Mur (haut)	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,04	0,07	
217					Mur (haut) (mesure 2)	0,09	0,07	
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	B	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	C	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	D	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
218	Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,05	0,07	
219					Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,07	
220	Huisserie Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0,07	
221					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,06	0,07	
222	Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0	0,07	
223					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,07	
224	Huisserie Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0,07	
225					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,09	0,07	
226	Porte		Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,08	0,07	
227					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
228	Huisserie Porte		Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
229					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
-	Mur (Bas)		-	Faïence	Mur (Bas) (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation

Nombre d'unités de diagnostic : 16

RDC - Grand Hall

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
230	Mur (haut)	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,03	0,07	
231					Mur (haut) (mesure 2)	0,05	0,07	
232	Mur (haut)	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,04	0,07	
233					Mur (haut) (mesure 2)	0,01	0,07	
234	Mur (haut)	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,07	0,07	
235					Mur (haut) (mesure 2)	0,01	0,07	
236	Mur (haut)	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0	0,07	
237					Mur (haut) (mesure 2)	0,08	0,07	
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	B	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	C	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	D	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
238	Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,01	0,07	
239					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,07	0,07	
240	Huisserie Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,01	0,07	
241					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0	0,07	
242	Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0	0,07	
243					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,07	
244	Huisserie Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,03	0,07	
245					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,06	0,07	
246	Porte		Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,06	0,07	
247					Porte (partie haute)	0	0,07	
248	Huisserie Porte		Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
249					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
-	Mur (Bas)		-	Faïence	Mur (Bas) (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

RDC - Accès Entresol (RDC-1er)

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
250	Mur (haut)	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,07	0,07	
251					Mur (haut) (mesure 2)	0,06	0,07	
252	Mur (haut)	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,04	0,07	
253					Mur (haut) (mesure 2)	0,04	0,07	
254	Mur (haut)	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,02	0,07	
255					Mur (haut) (mesure 2)	0,06	0,07	
256	Mur (haut)	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (haut) (mesure 1)	0,03	0,07	
257					Mur (haut) (mesure 2)	0,05	0,07	
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	B	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	C	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	D	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
258	Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0	0,07	
259					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02	0,07	
260	Huisserie Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,06	0,07	
261					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0,07	
262	Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05	0,07	
263					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,08	0,07	
264	Huisserie Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,05	0,07	
265					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,07	0,07	
266	Porte		Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,04	0,07	
267					Porte (partie haute)	0	0,07	
268	Huisserie Porte		Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
269					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
-	Mur (Bas)		-	Faïence	Mur (Bas) (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

Entresol RDC-1er étage - Grand Escalier Rome

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Tomettes	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
270	Mur	A	Plâtre	Papier peint	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
271					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
272					Mur (au centre)	0,09	0,07	
273	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	3,25	0,07	
274	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,78	0,07	
275	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	6,97	0,07	
276	Moulure		Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	6,12	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

Entresol RDC-1er étage - Salle de Billard

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
277	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
278					Sol (mesure 2)	0	0,07	
279	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,75	0,07	
280	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,65	0,07	
281	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,21	0,07	
282	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	3,56	0,07	
283	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	8,07	0,07	
284	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,89	0,07	
285	Embrasure porte		Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	3,07	0,07	
286	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	5,51	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Entresol RDC-1er étage - Couloir 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
287	Mur	A	Plâtre/Pierres	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
288					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
289					Mur (au centre)	0,08	0,07	
290	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,07	
291					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
292	Plinthes	A	Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
293					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
294	Garde-corps passerelle		Métal	Peinture	Garde-corps passerelle (mesure 1)	6,79	0,07	
295	Main-courante passerelle		Bois	Vernis	Main-courante passerelle (mesure 1)	0,09	0,07	
296					Main-courante passerelle (mesure 2)	0,04	0,07	
297	Sol passerelle		-	Linoléum	Sol passerelle (mesure 1)	0,03	0,07	
298					Sol passerelle (mesure 2)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

Entresol RDC-1er étage - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
299	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
300					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
301	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
302					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
303					Mur (au centre)	0,04	0,07	
304	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
305					Mur (partie haute)	0	0,07	
306					Mur (au centre)	0,01	0,07	
307	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
308					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
309	Main-courante		Inox		Main-courante (mesure 1)	0,04	0,07	
310					Main-courante (mesure 2)	0	0,07	
-	Marches		Carrealage		Marches (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - Couloir 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
311	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
312					Sol (mesure 2)	0,01	0,07	
313	Mur		Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
314					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
315					Mur (au centre)	0,08	0,07	
316	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
317					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
318	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
319					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
320	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
321					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
322	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
323					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
324	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
325					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
326	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
327					Porte (partie haute)	0,07	0,07	
328	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
329					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
330	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
331					Sol (mesure 2)	0	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
332	Mur		Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
333					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
334					Mur (au centre)	0,01	0,07	
335	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
336					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
337	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
338					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
339	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
340					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
341	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
342					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
343	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
344					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
345	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0	0,07	
346					Porte (partie haute)	0,07	0,07	
347	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,09	0,07	
348					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

1er étage - Hall

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
349	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
350					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
351	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
352					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
353					Mur (au centre)	0,05	0,07	
354	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
355					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
356					Mur (au centre)	0	0,07	
357	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
358					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
359					Mur (au centre)	0,06	0,07	
360	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
361					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
362					Mur (au centre)	0,02	0,07	
363	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
364					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
365	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
366					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
367	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
368					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
369	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
370					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
371	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
372					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
373	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07	0,07	
374					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
375	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
376					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
377	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
378					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
379	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
380					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
381					Mur (au centre)	0,02	0,07	
382	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
383					Mur (partie haute)	0	0,07	
384					Mur (au centre)	0,09	0,07	
385	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
386					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
387					Mur (au centre)	0,07	0,07	
388	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
389					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
390					Mur (au centre)	0,08	0,07	
391	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
392					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
393	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
394					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
395	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
396					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
397	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
398					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
399	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
400					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
401	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
402					Porte (partie haute)	0,07	0,07	
403	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
404					Huisserie Porte (partie haute)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Couloir 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
405	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
406					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
407	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
408					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
409					Mur (au centre)	0,01	0,07	
410	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	8,19	0,07	
411	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
412					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
413					Mur (au centre)	0,02	0,07	
414	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
415					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
416					Mur (au centre)	0	0,07	
417	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
418					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
419	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
420					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
421	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
422					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
423	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
424					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
425	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
426					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
427	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09	0,07	
428					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
429	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0	0,07	
430					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
431	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
432					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
433	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	2,46	0,07	
434	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
435					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
436					Mur (au centre)	0,08	0,07	
437	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
438					Mur (partie haute)	0	0,07	
439					Mur (au centre)	0,03	0,07	
440	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
441					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
442					Mur (au centre)	0,09	0,07	
443	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
444					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
445	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
446					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
447	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
448					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
449	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
450					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
451	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
452					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
453	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
454					Porte (partie haute)	0,07	0,07	
455	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
456					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Couloir 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
457	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0	0,07	
458					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
459	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
460					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
461					Mur (au centre)	0,05	0,07	
462	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
463					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
464					Mur (au centre)	0,02	0,07	
465	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
466	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,01	0,07	
467					Mur (au centre)	0,03	0,07	
468					Mur (partie basse)	0,09	0,07	
469					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
470					Mur (au centre)	0,04	0,07	
471	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
472					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
473	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
474					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
475	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
476					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
477	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
478					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
479	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
480					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
481	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
482					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
483	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
484					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

1er étage - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
485	Sol		Carrelage	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
486					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
487	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
488					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
489					Mur (au centre)	0,04	0,07	
490	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,07	
491					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
492	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
493					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
494	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
495					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
496	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
497					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
498	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
499					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
500	Fenêtre intérieure	A	Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,05	0,07	
501					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,04	0,07	
502	Huisserie Fenêtre intérieure	A	Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0,07	
503					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,08	0,07	
504	Fenêtre extérieure	A	Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,01	0,07	
505					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,02	0,07	
506	Huisserie Fenêtre extérieure	A	Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,06	0,07	
507					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0	0,07	
508	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09	0,07	
509					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
510	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
511					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 13								

1er étage - Couloir 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
512	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
513					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
514	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
515					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
516	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
517					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
518	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
519					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
520	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
521					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
522	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
523					Embrasure porte (mesure 2)	0,01	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

1er étage - Dégagement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
524	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
525					Sol (mesure 2)	0	0,07	
526	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
527					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
528					Mur (au centre)	0,04	0,07	
529	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
530					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
531	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	7,95	0,07	
532	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	3,13	0,07	
533	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	4,17	0,07	
534	Embrasure porte		Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	3,56	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

1er étage - Dégagement 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
535	Sol		-	Tomettes	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
536					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
537	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
538					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
539					Mur (au centre)	0,07	0,07	
540	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
541					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
542	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
543					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
544	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
545					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
546	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
547					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
548	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
549					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
550	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07	0,07	
551		Porte (partie haute)			0,06	0,07		
552	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
553		Huisserie Porte (partie haute)			0,02	0,07		
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Couloir 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
554	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
555					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
556	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
557					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
558					Mur (au centre)	0,08	0,07	
559	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
560					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
561					Mur (au centre)	0	0,07	
562	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
563					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
564					Mur (au centre)	0,03	0,07	
565	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
566					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
567					Mur (au centre)	0,07	0,07	
568	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
569					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
570	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
571					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
572	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
573					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
574	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
575					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
576	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
577					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - Couloir 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
578	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
579					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
580	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
581					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
582					Mur (au centre)	0,09	0,07	
583	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
584					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
585					Mur (au centre)	0,08	0,07	
586	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
587					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
588					Mur (au centre)	0,08	0,07	
589	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
590					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
591					Mur (au centre)	0	0,07	
592	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,07	
593					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
594	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
595					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
596	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
597					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
598	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
599					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
600	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
601					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
602	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
603					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
604	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
605					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
606					Mur (au centre)	0,02	0,07	
607	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
608					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
609	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
610					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
611	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
612					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
613	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
614					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
615	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
616					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
617	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,02	0,07	
618					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
619	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
620					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
621	Huisserie		Métal	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,07	0,07	
622					Huisserie (mesure 2)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
623	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
624					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
625	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
626					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
627					Mur (au centre)	0,02	0,07	
628	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
629					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
630					Mur (au centre)	0,09	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
631	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
632					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
633					Mur (au centre)	0,09	0,07	
634	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
635					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
636					Mur (au centre)	0,07	0,07	
637	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
638					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
639	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
640					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
641	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
642					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
643	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
644					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
645	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
646					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - Couloir 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
647	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
648					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
649	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
650					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
651					Mur (au centre)	0,02	0,07	
652	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
653					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
654					Mur (au centre)	0,08	0,07	
655	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
656					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
657					Mur (au centre)	0,04	0,07	
658	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
659					Mur (partie haute)	0	0,07	
660					Mur (au centre)	0,08	0,07	
661	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
662					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
663	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
664					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
665	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
666					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
667	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
668					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
669	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
670					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - Couloir 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
671	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
672					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
673	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
674					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
675					Mur (au centre)	0,04	0,07	
676					Mur (partie basse)	0	0,07	
677	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,07	
678					Mur (au centre)	0,09	0,07	
679					Mur (partie basse)	0,03	0,07	
680	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,08	0,07	
681					Mur (au centre)	0,05	0,07	
682					Mur (partie basse)	0,01	0,07	
683	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,07	
684					Mur (au centre)	0,07	0,07	
685					Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
686	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,08	0,07	
687		Plinthes (mesure 1)			0,06	0,07		
688	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
689					Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
690	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
691					Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
692	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
693					Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
694					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
695	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
696					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
697	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
698					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

2ème étage - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
699	Sol		-	Dalles plastiques	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
700					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
701	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
702					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
703					Mur (au centre)	0,03	0,07	
704	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
705					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
706	Porte		Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,09	0,07	
707					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
708	Huisserie Porte		Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,05	0,07	
709					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
710	Huisserie	A	Métal	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,03	0,07	
711					Huisserie (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Couloir 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
712	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
713					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
714	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,63	0,07	
715	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,45	0,07	
716	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	3,19	0,07	
717	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	5,57	0,07	
718	Embrasure porte		Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	5,75	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Couloir 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
719	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
720					Sol (mesure 2)	0,02	0,07	
721	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	7,65	0,07	
722	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	2,52	0,07	
723	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	4,96	0,07	
724	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	6,36	0,07	
725	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
726					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
727	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
728					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
729	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
730					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
731	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
732					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
733	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
734					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
735	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	8,13	0,07	
736	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,16	0,07	
737	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	7,04	0,07	
738	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	7,65	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

2ème étage - SAS 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
739	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
740					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
741	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
742					Mur (partie haute)	0	0,07	
743					Mur (au centre)	0,01	0,07	
744					Mur	B	Plâtre	Peinture
745	Mur (partie haute)	0,07	0,07					
746	Mur (au centre)	0,04	0,07					
747	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
748					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
749					Mur (au centre)	0,02	0,07	
750	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
751					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
752					Mur (au centre)	0,02	0,07	
753	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
754					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
755	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
756					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
757	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
758					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
759	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,09	0,07	
760					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Couloir 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
761	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
762					Sol (mesure 2)	0,02	0,07	
763	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
764					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
765					Mur (au centre)	0,04	0,07	
766	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
767					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
768	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
769					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
770	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
771					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
772	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,05	0,07	
773					Embrasure porte (mesure 2)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Cuisine

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
774	Mur (Haut)	A	Plâtre	Peinture	Mur (Haut) (mesure 1)	0,05	0,07	
775					Mur (Haut) (mesure 2)	0,07	0,07	
776	Mur (Haut)	B	Plâtre	Peinture	Mur (Haut) (mesure 1)	0,05	0,07	
777					Mur (Haut) (mesure 2)	0,01	0,07	
778	Mur (Haut)	C	Plâtre	Peinture	Mur (Haut) (mesure 1)	0,03	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
779					Mur (Haut) (mesure 2)	0	0,07	
780	Mur (Haut)	D	Plâtre	Peinture	Mur (Haut) (mesure 1)	0,04	0,07	
781					Mur (Haut) (mesure 2)	0,09	0,07	
782	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
783					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
-	Plinthes		Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
784	Porte (monte-charge)	A	Inox		Porte (monte-charge) (partie basse)	0,05	0,07	
785					Porte (monte-charge) (partie haute)	0,02	0,07	
786	Huisserie Porte (monte-charge)	A	Inox		Huisserie Porte (monte-charge) (partie basse)	0,04	0,07	
787					Huisserie Porte (monte-charge) (partie haute)	0,08	0,07	
-	Mur (Bas)		Plâtre	Faïence	Mur (Bas) (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

2ème étage - SAS 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
788	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
789					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
790	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
791					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
792					Mur (au centre)	0,04	0,07	
793	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
794					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
795	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
796					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
797	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
798					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
799	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,05	0,07	
800					Embrasure porte (mesure 2)	0,06	0,07	
801	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07	0,07	
802					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
803	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0	0,07	
804					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

2ème étage - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
805	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
806	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0,05	0,07	
807					Mur (au centre)	0,01	0,07	
808					Mur (partie basse)	0	0,07	
809					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
810					Mur (au centre)	0,05	0,07	
811	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
812					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
813					Mur (au centre)	0,03	0,07	
814	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
815					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
816					Mur (au centre)	0,05	0,07	
817	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
818					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la règlementation
-	Plinthes	B	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la règlementation
-	Plinthes	C	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la règlementation
-	Plinthes	D	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la règlementation
819	Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,06	0,07	
820					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01	0,07	
821	Huisserie Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,07	0,07	
822					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,02	0,07	
823	Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,02	0,07	
824					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,07	0,07	
825	Huisserie Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0,07	0,07	
826					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,05	0,07	
827	Porte	A	Verre		Porte (partie basse)	0	0,07	
828					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
829	Huisserie Porte	A	Verre		Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
830					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 16								

2ème étage - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
831	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
832					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
833	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
834					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
835					Mur (au centre)	0,07	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
836	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
837					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
838					Mur (au centre)	0	0,07	
839	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
840					Mur (partie haute)	0	0,07	
841					Mur (au centre)	0,07	0,07	
842	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
843					Mur (partie haute)	0	0,07	
844					Mur (au centre)	0,03	0,07	
845	Plafond		Plâtre	Toile de verre/Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
846					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Grand Escalier Rome

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
847	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
848					Sol (mesure 2)	0,01	0,07	
849	Mur	A	Plâtre	Papier peint	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
850					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
851					Mur (au centre)	0,01	0,07	
852	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
853					Plafond (mesure 2)	0,08	0,07	
854	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,66	0,07	
855	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	8,01	0,07	
856	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	2,64	0,07	
857	Embrasure porte		Bois	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	8,01	0,07	
858	Moulure				Moulure (mesure 1)	4,78	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

2ème étage - Salle à Manger

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
859	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
860					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
861	Mur	A	Plâtre	Papier peint	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
862					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
863					Mur (au centre)	0,08	0,07	
864	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
865					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
866	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,47	0,07	
867	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	5,63	0,07	
868	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,95	0,07	
869	Embrasure porte		Bois	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	8,01	0,07	
870	Moulure				Moulure (mesure 1)	3,19	0,07	
871	Plafond		Plâtre	Peinture > 3m	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
872					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

2ème étage - Dégagement 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
873	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0	0,07	
874					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
875	Mur	A	Plâtre	Papier peint	Mur (partie basse)	7,28	0,07	
876	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
877					Plafond (mesure 2)	0,06	0,07	
878	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	4,66	0,07	
879	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	3,62	0,07	
880	Embrasure porte	A	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	7,89	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

2ème étage - Dégagement 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
881	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
882					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
883	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
884					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
885					Mur (au centre)	0,01	0,07	
886	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0	0,07	
887					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
888	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
889					Huisserie Porte (partie haute)	0,09	0,07	
890	Plafond		Plâtre	Peinture > 3m	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
891					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

3ème étage - Couloir 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
892	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
893					Sol (mesure 2)	0,01	0,07	
894	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
895					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
896	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
897					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
898	Porte	A	Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,08	0,07	
899					Porte (partie haute)	0,04	0,07	
900	Huisserie Porte	A	Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
901					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
902	Embrasure porte 1	B	Bois	Peinture	Embrasure porte 1 (mesure 1)	0,02	0,07	
903					Embrasure porte 1 (mesure 2)	0,02	0,07	
904	Embrasure porte 2	D	Bois	Peinture	Embrasure porte 2 (mesure 1)	0,09	0,07	
905					Embrasure porte 2 (mesure 2)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
906	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
907					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
908	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07	
909					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
910	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
911					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
912	Porte	A	Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,03	0,07	
913					Porte (partie haute)	0	0,07	
914	Huisserie Porte	A	Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
915					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
916	Embrasure porte 1	B	Bois	Peinture	Embrasure porte 1 (mesure 1)	0,05	0,07	
917					Embrasure porte 1 (mesure 2)	0,03	0,07	
918	Embrasure porte 2	D	Bois	Peinture	Embrasure porte 2 (mesure 1)	0,05	0,07	
919					Embrasure porte 2 (mesure 2)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Dégagement 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
920	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
921					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
922	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
923					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
924					Mur (au centre)	0	0,07	
925	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
926					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
927					Mur (au centre)	0,01	0,07	
928	Plinthes		Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
929					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 4								

3ème étage - Bureau Partage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
930	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
931					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
932	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
933					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
934					Mur (au centre)	0,06	0,07	
935	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
936					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
937	Plinthes	A	Bois	Vernis	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
938					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
939	Porte	A	Bois mélaminé		Porte (partie basse)	0,08	0,07	
940					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
941	Huisserie Porte	A	Bois mélaminé		Huisserie Porte (partie basse)	0,02	0,07	
942					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Nombre d'unités de diagnostic : 6								

3ème étage - Grand Escalier Rome

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
943	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
944					Sol (mesure 2)	0	0,07	
945	Mur	A	Plâtre	Papier peint	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
946					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
947					Mur (au centre)	0,01	0,07	
948	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
949					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
950	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	4,41	0,07	
951	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6,06	0,07	
952	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	5,27	0,07	
953	Moulure	A	Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	6	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
954	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
955					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
956					Mur (au centre)	0,09	0,07	
957	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
958					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
959	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
960					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
961	Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,07	
962					Fenêtre intérieure (partie haute)	0,05	0,07	
963	Huisserie Fenêtre intérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre intérieure (partie basse)	0,04	0,07	
964					Huisserie Fenêtre intérieure (partie haute)	0,01	0,07	
965	Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Fenêtre extérieure (partie basse)	0,04	0,07	
966					Fenêtre extérieure (partie haute)	0,01	0,07	
967	Huisserie Fenêtre extérieure		Aluminium	Peinture	Huisserie Fenêtre extérieure (partie basse)	0	0,07	
968					Huisserie Fenêtre extérieure (partie haute)	0,01	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

3ème étage - Couloir 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
969	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
970					Sol (mesure 2)	0,02	0,07	
971	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
972					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
973					Mur (au centre)	0,09	0,07	
974	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
975					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
976					Mur (au centre)	0,03	0,07	
977	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
978					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
979					Mur (au centre)	0,01	0,07	
980	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
981					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
982					Mur (au centre)	0,04	0,07	
983	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
984					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
985	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
986					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
987	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
988					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
989	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
990					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
991	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
992					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
993	Huisserie		Bois	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,07	0,07	
994					Huisserie (mesure 2)	0,07	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

3ème étage - Circulation

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
995	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0	0,07	
996					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
997	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
998					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
999					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1000	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1001					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1002					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1003	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1004					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1005					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1006	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1007					Mur (partie haute)	0	0,07	
1008					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1009	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
1010					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1011	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
1012					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1013	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1014					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1015	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1016					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1017	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1018					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1019	Huisserie		Bois	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,05	0,07	
1020					Huisserie (mesure 2)	0,04	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 11								

3ème étage - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1021	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
1022					Sol (mesure 2)	0,01	0,07	
1023	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1024					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1025					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1026	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1027					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1028					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1029	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1030					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1031					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1032	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1033					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1034					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1035	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
1036					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
1037	Huisserie	A	Métal	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,05	0,07	
1038					Huisserie (mesure 2)	0,04	0,07	
1039	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1040					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1041	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1042					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

3ème étage - Couloir 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1043	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
1044					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1045	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1046					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1047					Mur (au centre)	0	0,07	
1048	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1049					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1050					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1051	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1052				Toile de verre/Peinture	Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1053					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1054	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1055					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1056					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1057	Plafond		Plâtre	Toile de verre/Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07	
1058					Plafond (mesure 2)	0,08	0,07	
1059	Embrasure porte	D	Plâtre	Peinture	Embrasure porte (mesure 1)	0,01	0,07	
1060					Embrasure porte (mesure 2)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

3ème étage - Hall d'Etage

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1061	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1062					Sol (mesure 2)	0,05	0,07	
1063	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1064					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1065					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1066	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1067					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1068					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1069	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1070					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1071					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1072	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1073					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1074					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1075	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,07	
1076					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
1077	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1078					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
1079	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1080					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1081	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1082					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1083	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
1084					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
1085	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1086					Porte (partie haute)	0	0,07	
1087	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,02	0,07	
1088					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

3ème étage - Couloir 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1089	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0	0,07	
1090					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
1091	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1092					Mur (partie haute)	0,01	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1093					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1094	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1095					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1096					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1097	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1098					Mur (partie haute)	0	0,07	
1099					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1100	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1101					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1102					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1103	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
1104					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
1105	Huisserie	A	Métal	Peinture	Huisserie (mesure 1)	0,05	0,07	
1106					Huisserie (mesure 2)	0,08	0,07	
1107	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1108					Porte (partie haute)	0	0,07	
1109	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,09	0,07	
1110					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

Entresol 3ème-4ème étage - Local SRDSIC 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1111	Sol		Béton	Peinture	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
1112					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1113	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1114					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1115					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1116	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,06	0,07	
1117					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
1118	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1119					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1120	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1121					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

Entresol 3ème-4ème étage - Local SRDSIC 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1122	Sol		Béton	Peinture	Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
1123					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
1124	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1125					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1126					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1127	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07	
1128					Plafond (mesure 2)	0,01	0,07	
1129	Porte	A	Métal	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1130					Porte (partie haute)	0,01	0,07	
1131	Huisserie Porte	A	Métal	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1132					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 5								

4ème étage - Escalier 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1133	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
1134					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
1135	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1136					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1137					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1138	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1139					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1140					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1141	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1142					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1143					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1144	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1145					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1146					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1147	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07	
1148					Plafond (mesure 2)	0,06	0,07	
1149	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1150					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1151	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1152					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
1153	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1154					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
1155	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1156					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
1157	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1158					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1159	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1160					Huisserie Porte (partie haute)	0,01	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Détente

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1161	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,05	0,07	
1162					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1163	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1164					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1165					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1166	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1167					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1168					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1169	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1170					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1171					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1172	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1173					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1174					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1175	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
1176					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
1177	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1178					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1179	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
1180					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1181	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1182					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
1183	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
1184					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1185	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1186					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1187	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1188					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Couloir 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1189	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
1190					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
1191	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1192					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1193					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1194	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1195					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1196					Mur (au centre)	0	0,07	
1197	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1198					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1199					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1200	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1201					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1202					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1203	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,01	0,07	
1204					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
-	Plinthes	A	PVC		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	B	PVC		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	C	PVC		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
-	Plinthes	D	PVC		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
1205	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1206					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1207	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1208					Huisserie Porte (partie haute)	0,06	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Escalier 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1209	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
1210					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1211	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1212					Mur (partie haute)	0	0,07	
1213					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1214	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1215					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1216					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1217	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1218					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1219					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1220	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1221					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1222					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1223	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
1224					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
1225	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1226					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1227	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
1228					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1229	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1230					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1231	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1232					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1233	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1234					Porte (partie haute)	0,01	0,07	
1235	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1236					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Bureau 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1237	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1238					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1239	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1240					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1241					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1242	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1243					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1244					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1245	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1246					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1247					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1248	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1249					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1250					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1251	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
1252					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
1253	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1254					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1255	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
1256					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
1257	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1258					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1259	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1260					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1261	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1262					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1263	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1264					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Hall

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1265	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0	0,07	
1266					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1267	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1268					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1269					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1270	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1271					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1272					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1273	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1274					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1275					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1276	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1277					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1278					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1279	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
1280					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
1281	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
1282					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
1283	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1284					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1285	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1286					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1287	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1288					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1289	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1290					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1291	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0	0,07	
1292					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Couloir 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1293	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1294					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
1295	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1296				Toile de verre/Peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1297					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1298					Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1299	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1300					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1301					Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1302	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1303					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1304					Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1305	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1306					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1307					Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
1308	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 2)	0,06	0,07	
1309	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1310					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
1311	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1312					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1313	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1314					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1315	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1316					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1317	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1318					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1319	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1320					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4ème étage - Couloir 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1321	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
1322					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1323	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1324					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1325					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1326	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1327					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1328					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1329	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1330					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1331					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1332	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1333					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1334					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1335	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
1336					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
1337	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1338					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
1339	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
1340					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1341	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,09	0,07	
1342					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1343	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1344					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1345	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1346					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1347	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1348					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Couloir 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1349	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
1350					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
1351	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1352					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1353					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1354	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1355					Mur (partie haute)	0	0,07	
1356					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1357	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1358					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1359					Mur (au centre)	0	0,07	
1360	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1361					Mur (partie haute)	0	0,07	
1362					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1363	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,07	0,07	
1364					Plafond (mesure 2)	0	0,07	
1365	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1366					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1367	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1368					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1369	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1370					Plinthes (mesure 2)	0,04	0,07	
1371	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1372					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
1373	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,03	0,07	
1374					Soubassement (mesure 2)	0,03	0,07	
1375	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0	0,07	
1376					Soubassement (mesure 2)	0,07	0,07	
1377	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1378					Porte (partie haute)	0,04	0,07	
1379	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1380					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Couloir 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1381	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
1382					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1383	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1384					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1385					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1386	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1387	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie haute)	0	0,07	
1388					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1389					Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1390					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1391					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1392	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1393					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1394					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1395	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
1396					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
1397	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,03	0,07	
1398					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1399	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1400					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1401	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
1402					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1403	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1404					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
1405	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1406					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1407	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1408					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

4ème étage - Couloir 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1409	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1410					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
1411	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1412					Mur (partie haute)	0	0,07	
1413					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1414	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1415					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1416					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1417	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1418					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1419					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1420	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1421					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1422					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1423	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,08	0,07	
1424					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
1425	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1426					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1427	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1428					Plinthes (mesure 2)	0,05	0,07	
1429	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1430					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1431	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1432					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1433	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,09	0,07	
1434					Soubassement (mesure 2)	0,03	0,07	
1435	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,03	0,07	
1436					Soubassement (mesure 2)	0,06	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1437	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1438					Porte (partie haute)	0	0,07	
1439	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1440					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Couloir 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1441	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1442					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
1443	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1444					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1445					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1446	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1447					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1448					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1449	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1450					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1451					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1452	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1453					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1454					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1455	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
1456					Plafond (mesure 2)	0,08	0,07	
1457	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1458					Plinthes (mesure 2)	0,07	0,07	
1459	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1460					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1461	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,07	0,07	
1462					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1463	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1464					Plinthes (mesure 2)	0,08	0,07	
1465	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,01	0,07	
1466					Soubassement (mesure 2)	0,05	0,07	
1467	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0	0,07	
1468					Soubassement (mesure 2)	0,08	0,07	
1469	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1470					Porte (partie haute)	0	0,07	
1471	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1472					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Couloir 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1473	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
1474					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
1475	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1476					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1477					Mur (au centre)	0,05	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1478	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1479					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1480					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1481	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1482					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1483					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1484	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1485					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1486					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1487	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
1488					Plafond (mesure 2)	0,01	0,07	
1489	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1490					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1491	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
1492					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1493	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1494					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1495	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1496					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1497	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,04	0,07	
1498					Soubassement (mesure 2)	0,02	0,07	
1499	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,07	0,07	
1500					Soubassement (mesure 2)	0	0,07	
1501	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1502					Porte (partie haute)	0,01	0,07	
1503	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1504					Huisserie Porte (partie haute)	0,02	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Couloir 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1505	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,09	0,07	
1506					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
1507	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1508					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1509					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1510	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1511					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1512					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1513	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1514					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1515					Mur (au centre)	0	0,07	
1516	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1517					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1518					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1519	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
1520					Plafond (mesure 2)	0,08	0,07	
1521	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1522					Porte (partie haute)	0	0,07	
1523	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1524					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
1525	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,08	0,07	
1526					Soubassement (mesure 2)	0,01	0,07	
1527	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,06	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1528					Soubassement (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Dégagement

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1529	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
1530					Sol (mesure 2)	0,02	0,07	
1531	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1532					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1533					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1534	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1535					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1536					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1537	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1538					Mur (partie haute)	0	0,07	
1539					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1540	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1541					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1542					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1543	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
1544					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
1545	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1546					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1547	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1548					Huisserie Porte (partie haute)	0,01	0,07	
1549	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1550					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1551	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1552					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1553	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1554					Plinthes (mesure 2)	0,01	0,07	
1555	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1556					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1557	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,07	0,07	
1558					Soubassement (mesure 2)	0,05	0,07	
1559	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,08	0,07	
1560					Soubassement (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 14								

4ème étage - Couloir 10

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1561	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
1562					Sol (mesure 2)	0,02	0,07	
1563	Mur	A	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1564					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1565					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1566	Mur	B	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1567					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1568					Mur (au centre)	0,02	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1569	Mur	C	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1570					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1571					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1572	Mur	D	Plâtre	Toile de verre/Peinture	Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1573					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1574					Mur (au centre)	0	0,07	
1575	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
1576					Plafond (mesure 2)	0,04	0,07	
1577	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1578					Porte (partie haute)	0,09	0,07	
1579	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1580					Huisserie Porte (partie haute)	0,09	0,07	
1581	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,07	0,07	
1582					Soubassement (mesure 2)	0,02	0,07	
1583	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,04	0,07	
1584					Soubassement (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Couloir 11

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1585	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
1586					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1587	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1588					Mur (partie haute)	0	0,07	
1589					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1590	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1591					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1592					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1593	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1594					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1595					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1596	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1597					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1598					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1599	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
1600					Plafond (mesure 2)	0,06	0,07	
1601	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,02	0,07	
1602					Porte (partie haute)	0	0,07	
1603	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1604					Huisserie Porte (partie haute)	0,01	0,07	
1605	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,09	0,07	
1606					Soubassement (mesure 2)	0,08	0,07	
1607	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0	0,07	
1608					Soubassement (mesure 2)	0,04	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - Couloir 12

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1609	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1610					Sol (mesure 2)	0,01	0,07	
1611	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1612					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1613					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1614	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1615					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1616					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1617	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1618					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1619					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1620	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1621					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1622					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1623	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,05	0,07	
1624					Plafond (mesure 2)	0,09	0,07	
1625	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1626					Porte (partie haute)	0,09	0,07	
1627	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1628					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
1629	Soubassement	B	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,06	0,07	
1630					Soubassement (mesure 2)	0,06	0,07	
1631	Soubassement	D	Bois	Peinture	Soubassement (mesure 1)	0,01	0,07	
1632					Soubassement (mesure 2)	0,04	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

4ème étage - Hall Etage 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1633	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
1634					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
1635	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1636					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1637					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1638	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1639					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1640					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1641	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1642					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1643					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1644	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1645					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1646					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1647	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0	0,07	
1648					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
1649	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1650					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1651	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,01	0,07	
1652					Plinthes (mesure 2)	0,09	0,07	
1653	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,06	0,07	
1654					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1655	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,08	0,07	
1656					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1657	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1658					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
1659	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1660					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 12								

4ème étage - Grand Escalier Rome

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1661	Sol		Parquet	Vernis	Sol (mesure 1)	0,04	0,07	
1662					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
1663	Mur	A	Plâtre	Tapisserie	Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1664					Mur (partie haute)	0	0,07	
1665					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1666	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,03	0,07	
1667					Plafond (mesure 2)	0,07	0,07	
1668	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	6,12	0,07	
1669	Moulure		Bois	Peinture	Moulure (mesure 1)	5,75	0,07	
1670	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	6	0,07	
1671	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	7,83	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 7								

4ème étage - Palier

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
-	Sol		-	Carrelage	Sol (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
1672	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1673					Mur (partie haute)	0	0,07	
1674					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1675	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1676					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1677					Mur (au centre)	0	0,07	
1678	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0	0,07	
1679					Mur (partie haute)	0	0,07	
1680					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1681	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1682					Mur (partie haute)	0	0,07	
1683					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1684	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,04	0,07	
1685					Plafond (mesure 2)	0,05	0,07	
-	Plinthes	A	Carrelage		Plinthes (mesure 1)			Partie non visée par la réglementation
1686	Porte		Aluminium	Peinture	Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1687					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1688	Huisserie Porte		Aluminium	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1689					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 9								

4ème étage - Hall Etage 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1690	Sol		-	Linoléum	Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
1691					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1692	Mur		Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1693					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1694					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1695	Plafond		Plâtre	Peinture	Plafond (mesure 1)	0,02	0,07	
1696					Plafond (mesure 2)	0,02	0,07	
1697	Plinthes	A	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,04	0,07	
1698					Plinthes (mesure 2)	0,06	0,07	
1699	Plinthes	B	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,05	0,07	
1700					Plinthes (mesure 2)	0,03	0,07	
1701	Plinthes	C	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0	0,07	
1702					Plinthes (mesure 2)	0	0,07	
1703	Plinthes	D	Bois	Peinture	Plinthes (mesure 1)	0,02	0,07	
1704					Plinthes (mesure 2)	0,02	0,07	
1705	Châssis plénum		Bois	Peinture	Châssis plénum (mesure 1)	0,06	0,07	
1706					Châssis plénum (mesure 2)	0,04	0,07	
1707	Porte		Aluminium	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1708					Porte (partie haute)	0	0,07	
1709	Huisserie Porte		Aluminium	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1710					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 10								

4ème étage - ESC

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1711	Sol		Béton		Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
1712					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1713	Mur	A	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1714					Mur (partie haute)	0	0,07	
1715					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1716	Mur	B	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1717					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1718					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1719	Mur	C	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1720					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1721					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1722	Mur	D	Plâtre	Peinture	Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1723					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1724					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1725	Plafond		Plâtre		Plafond (mesure 1)	0,09	0,07	
1726					Plafond (mesure 2)	0,03	0,07	
1727	Porte	A	Bois	Peinture	Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1728					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1729	Huisserie Porte	A	Bois	Peinture	Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1730					Huisserie Porte (partie haute)	0,01	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Archives

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1731	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
1732					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1733	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1734					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1735					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1736	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1737					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1738					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1739	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1740					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1741					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1742	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1743					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1744					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1745	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,09	0,07	
1746					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1747	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0	0,07	
1748					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1749	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,03	0,07	
1750					Embrasure porte (mesure 2)	0	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Combles 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1751	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
1752					Sol (mesure 2)	0,07	0,07	
1753	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1754					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1755					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1756	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1757					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1758					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1759	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1760					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1761					Mur (au centre)	0	0,07	
1762	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1763					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1764					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1765	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0	0,07	
1766					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1767	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,06	0,07	
1768					Huisserie Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1769	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,03	0,07	
1770					Embrasure porte (mesure 2)	0,02	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Pavillon 2

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1771	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,08	0,07	
1772					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
1773	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1774					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1775					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1776	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1777					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1778					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1779	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1780					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1781					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1782	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1783					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1784					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1785	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0	0,07	
1786					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1787	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1788					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
1789	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
1790					Embrasure porte (mesure 2)	0,03	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Comble 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1791	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
1792					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
1793	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1794					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1795					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1796	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1797					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1798					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1799	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1800					Mur (partie haute)	0	0,07	
1801					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1802	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1803					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1804					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1805	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1806					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1807	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1808					Huisserie Porte (partie haute)	0,05	0,07	
1809	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
1810					Embrasure porte (mesure 2)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Comble 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1811	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
1812					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1813	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1814					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1815					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1816	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1817					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1818					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1819	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1820					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1821					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1822	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1823					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1824					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1825	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1826					Porte (partie haute)	0,06	0,07	
1827	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1828					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	
1829	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,05	0,07	
1830					Embrasure porte (mesure 2)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Comble 5

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1831	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
1832					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1833	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1834					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1835					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1836	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1837					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1838					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1839	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1840					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1841					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1842	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1843					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1844					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1845	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,02	0,07	
1846					Porte (partie haute)	0,07	0,07	
1847	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1848					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	
1849	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,03	0,07	
1850					Embrasure porte (mesure 2)	0,09	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Pavillon 3

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1851	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
1852					Sol (mesure 2)	0	0,07	
1853	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1854					Mur (partie haute)	0,07	0,07	
1855					Mur (au centre)	0	0,07	
1856	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1857					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1858					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1859	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1860					Mur (partie haute)	0	0,07	
1861					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1862	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1863					Mur (partie haute)	0	0,07	
1864					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1865	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1866					Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1867	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,02	0,07	
1868					Huisserie Porte (partie haute)	0	0,07	
1869	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,02	0,07	
1870					Embrasure porte (mesure 2)	0,04	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 6

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1871	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,02	0,07	
1872					Sol (mesure 2)	0,06	0,07	
1873	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1874					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1875					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1876	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1877					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1878					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1879	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1880					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1881					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1882	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1883					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1884					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1885	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1886					Porte (partie haute)	0,04	0,07	
1887	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0	0,07	
1888					Huisserie Porte (partie haute)	0,04	0,07	
1889	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
1890					Embrasure porte (mesure 2)	0,09	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Pavillon 4

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1891	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,03	0,07	
1892					Sol (mesure 2)	0,08	0,07	
1893	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,08	0,07	
1894					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1895					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1896	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1897					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1898					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1899	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1900					Mur (partie haute)	0,03	0,07	
1901					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1902	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,03	0,07	
1903					Mur (partie haute)	0,04	0,07	
1904					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1905	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1906					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1907	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,08	0,07	
1908					Huisserie Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1909	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,05	0,07	
1910					Embrasure porte (mesure 2)	0,02	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 7

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1911	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
1912					Sol (mesure 2)	0,09	0,07	
1913	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1914					Mur (partie haute)	0	0,07	
1915					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1916	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1917					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1918					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1919	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1920					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1921					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1922	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,06	0,07	
1923					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1924					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1925	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,05	0,07	
1926					Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1927	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1928					Huisserie Porte (partie haute)	0,07	0,07	
1929	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
1930					Embrasure porte (mesure 2)	0,08	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Combles - Comble 8

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1931	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,06	0,07	
1932					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1933	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1934					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1935					Mur (au centre)	0,02	0,07	
1936	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,09	0,07	
1937					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1938					Mur (au centre)	0,08	0,07	
1939	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,02	0,07	
1940					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1941					Mur (au centre)	0,07	0,07	
1942	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1943					Mur (partie haute)	0,01	0,07	
1944					Mur (au centre)	0,04	0,07	
1945	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,03	0,07	
1946					Porte (partie haute)	0,08	0,07	
1947	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,07	0,07	
1948					Huisserie Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1949	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,09	0,07	
1950					Embrasure porte (mesure 2)	0,05	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Comble 9

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1951	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,01	0,07	
1952					Sol (mesure 2)	0,04	0,07	
1953	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1954					Mur (partie haute)	0,05	0,07	
1955					Mur (au centre)	0,01	0,07	
1956	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1957					Mur (partie haute)	0,02	0,07	
1958					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1959	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,07	0,07	
1960					Mur (partie haute)	0,09	0,07	
1961					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1962	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1963					Mur (partie haute)	0	0,07	
1964					Mur (au centre)	0,03	0,07	
1965	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,01	0,07	
1966					Porte (partie haute)	0,05	0,07	
1967	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1968					Huisserie Porte (partie haute)	0,02	0,07	
1969	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,04	0,07	
1970					Embrasure porte (mesure 2)	0,08	0,07	
Nombre d'unités de diagnostic : 8								

Combles - Pavillon 1

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/cm²)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
1971	Sol		Bois Brut		Sol (mesure 1)	0,07	0,07	
1972					Sol (mesure 2)	0,03	0,07	
1973	Mur	A	Plâtre		Mur (partie basse)	0,01	0,07	
1974					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1975					Mur (au centre)	0,05	0,07	
1976	Mur	B	Plâtre		Mur (partie basse)	0	0,07	
1977					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1978					Mur (au centre)	0,06	0,07	
1979	Mur	C	Plâtre		Mur (partie basse)	0,05	0,07	
1980					Mur (partie haute)	0,06	0,07	
1981					Mur (au centre)	0,09	0,07	
1982	Mur	D	Plâtre		Mur (partie basse)	0,04	0,07	
1983					Mur (partie haute)	0,08	0,07	
1984					Mur (au centre)	0	0,07	
1985	Porte	A	Bois brut		Porte (partie basse)	0,02	0,07	
1986					Porte (partie haute)	0,09	0,07	
1987	Huisserie Porte	A	Bois brut		Huisserie Porte (partie basse)	0,04	0,07	
1988					Huisserie Porte (partie haute)	0,03	0,07	
1989	Embrasure porte	A	Plâtre		Embrasure porte (mesure 1)	0,08	0,07	
1990					Embrasure porte (mesure 2)	0,09	0,07	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

Analyses chimiques en laboratoire :

N°	Unité repérage	Zone	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Teneur en plomb (mg/g)	Incertitude de la mesure (+/-, en mg/cm²)	Observations
Néant								

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Commentaires relatifs aux mesures incohérentes (le cas échéant) : /

ANNEXE 1 - REPERAGE DES LOCAUX

Planche de repérage technique

N° planche: 1/9

Nom du plan:

Sous-sol

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE


Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

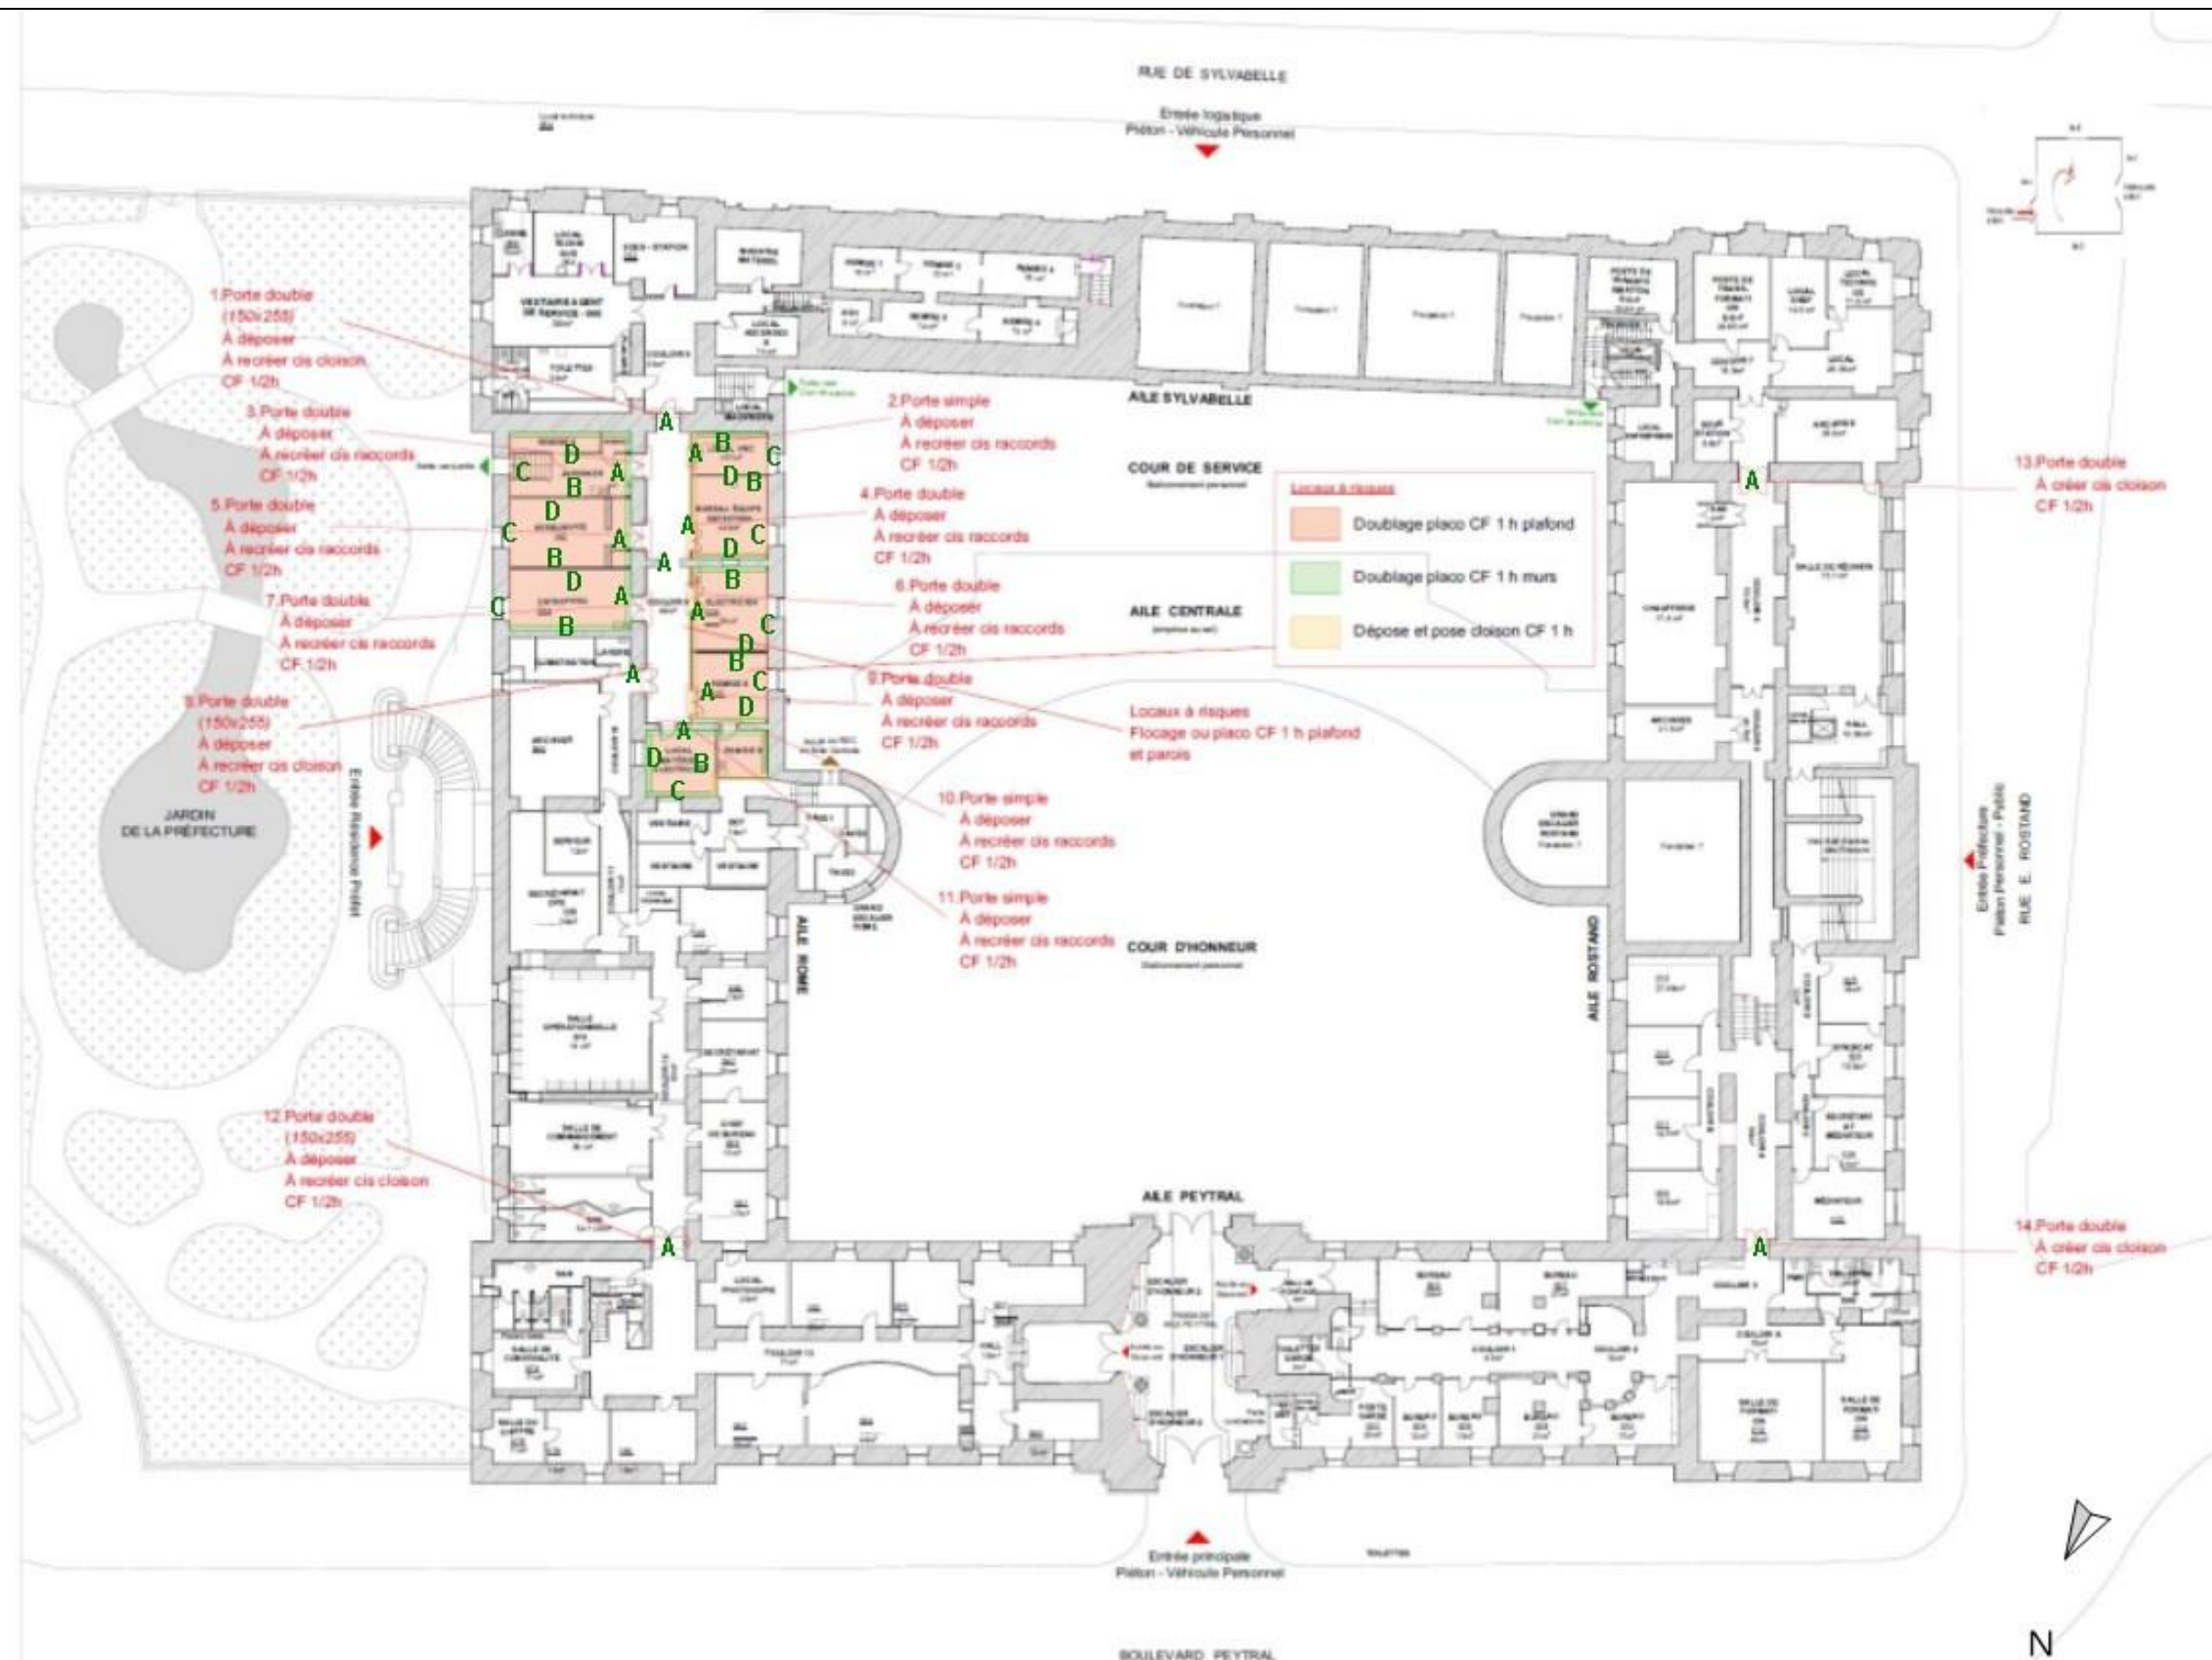

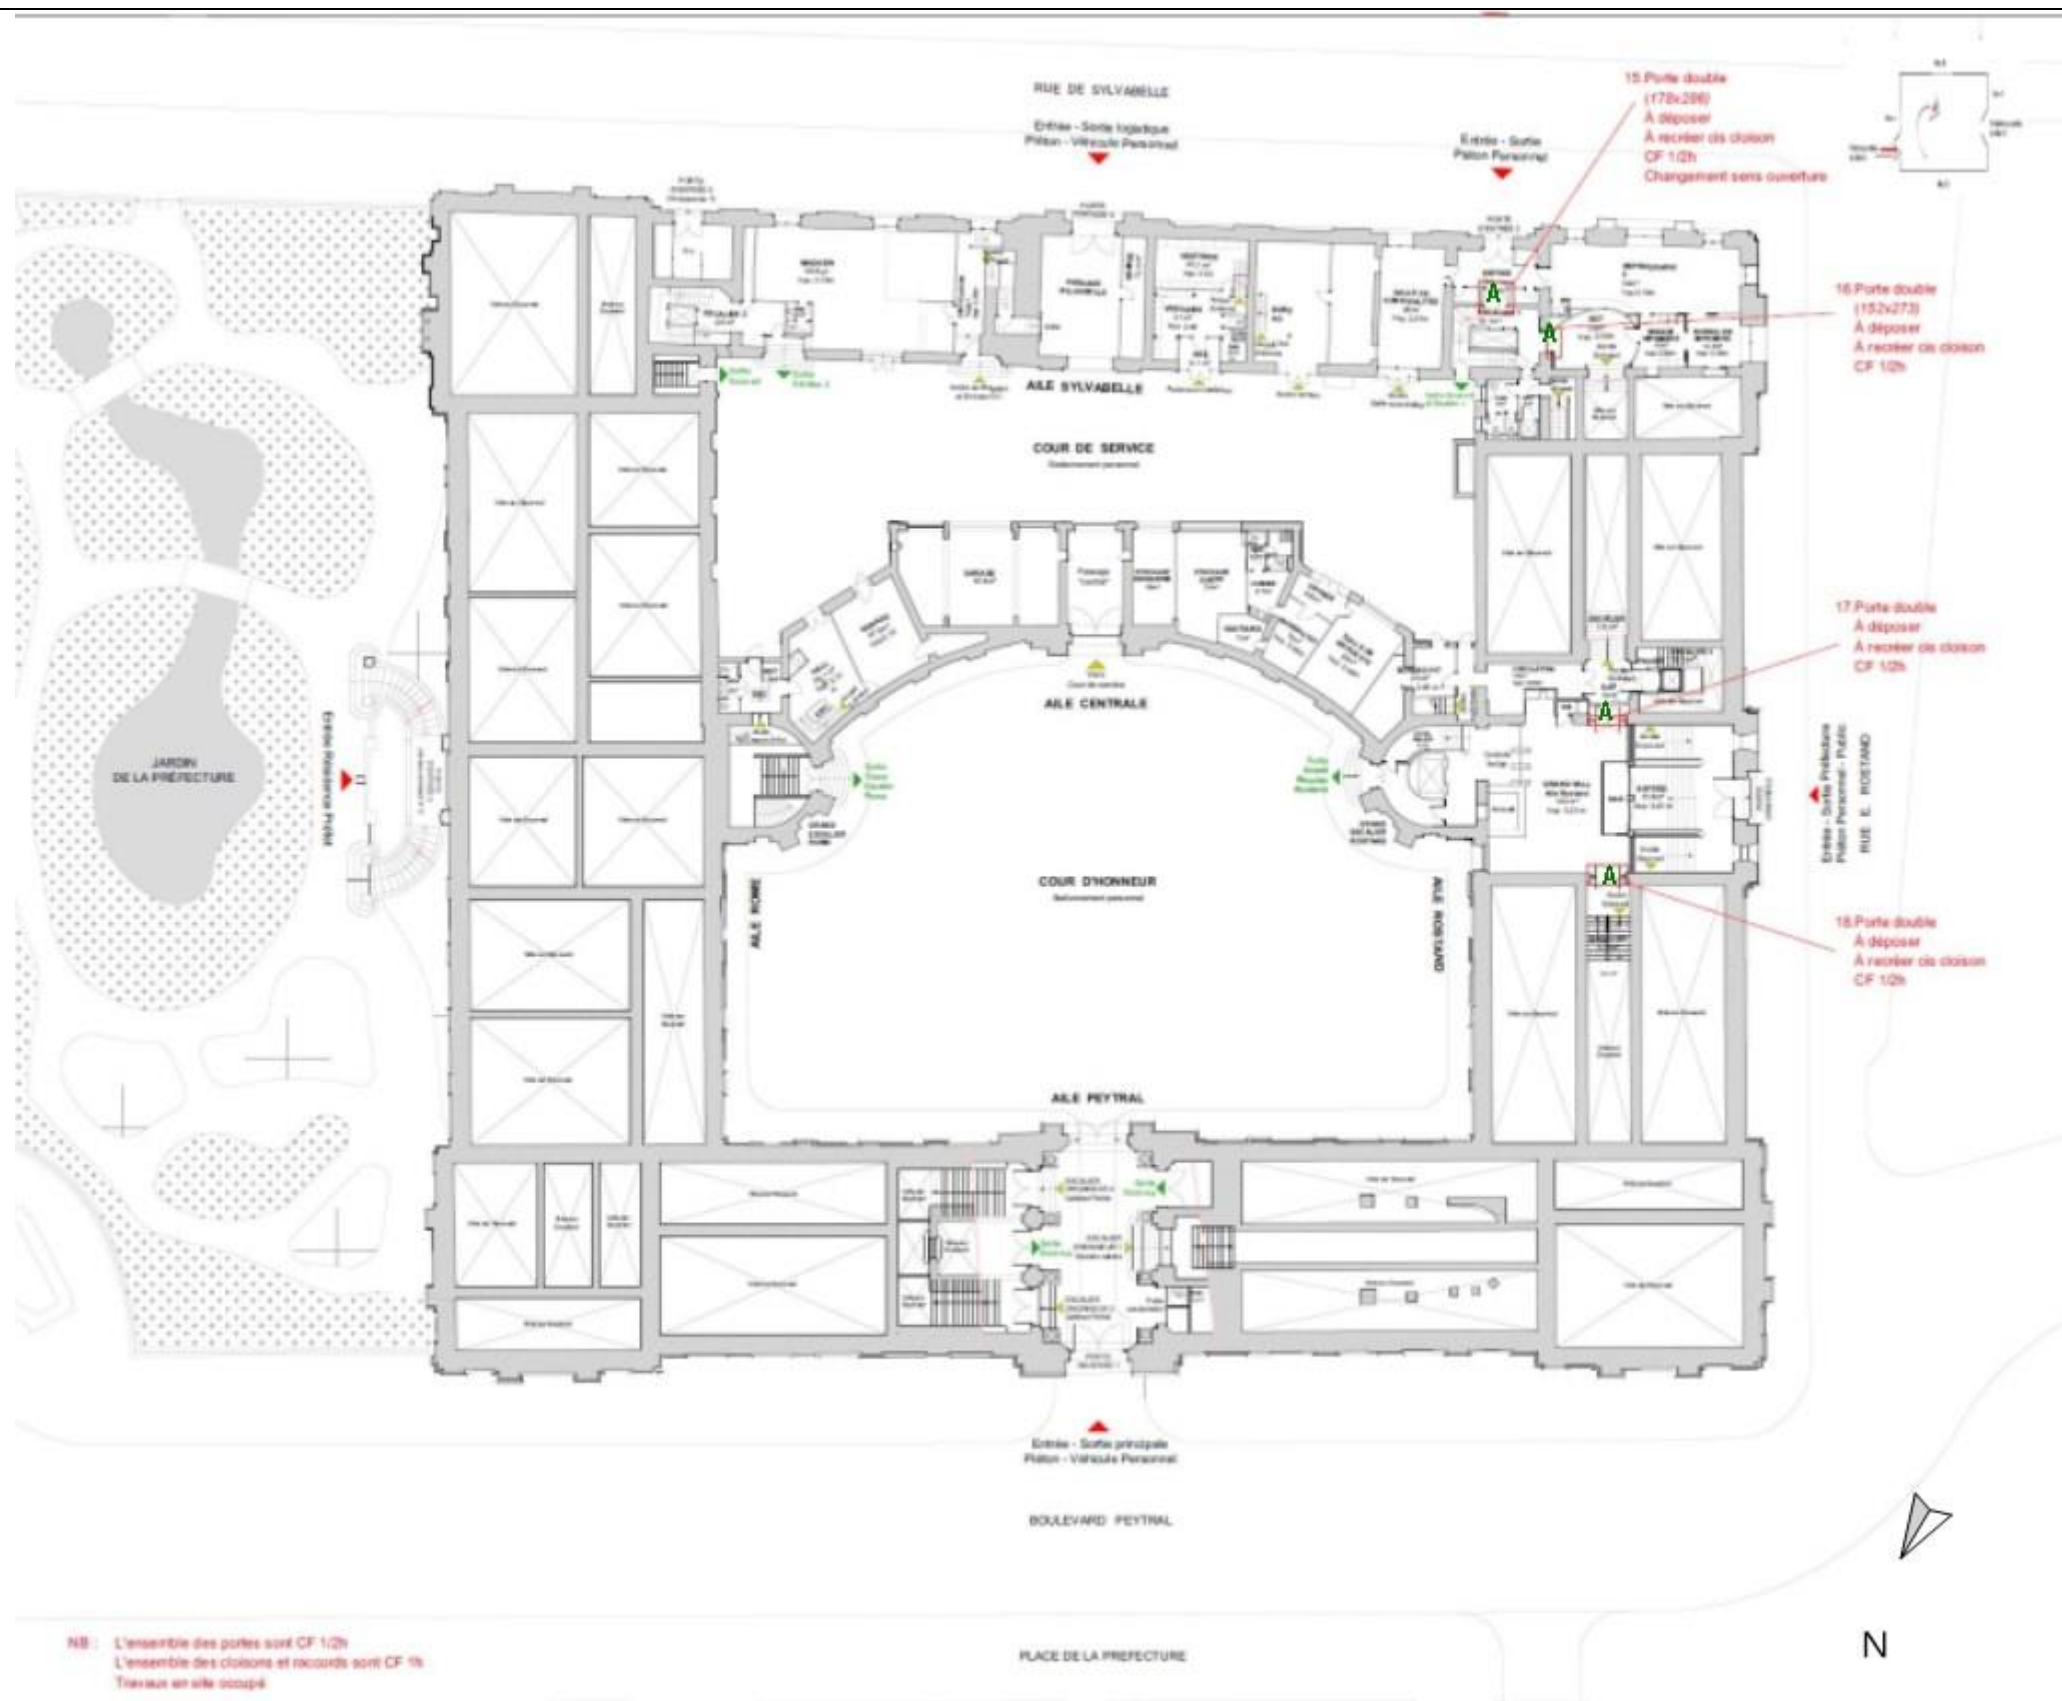


Planche de repérage technique

N° planche: 2/9

Nom du plan:
RDC

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

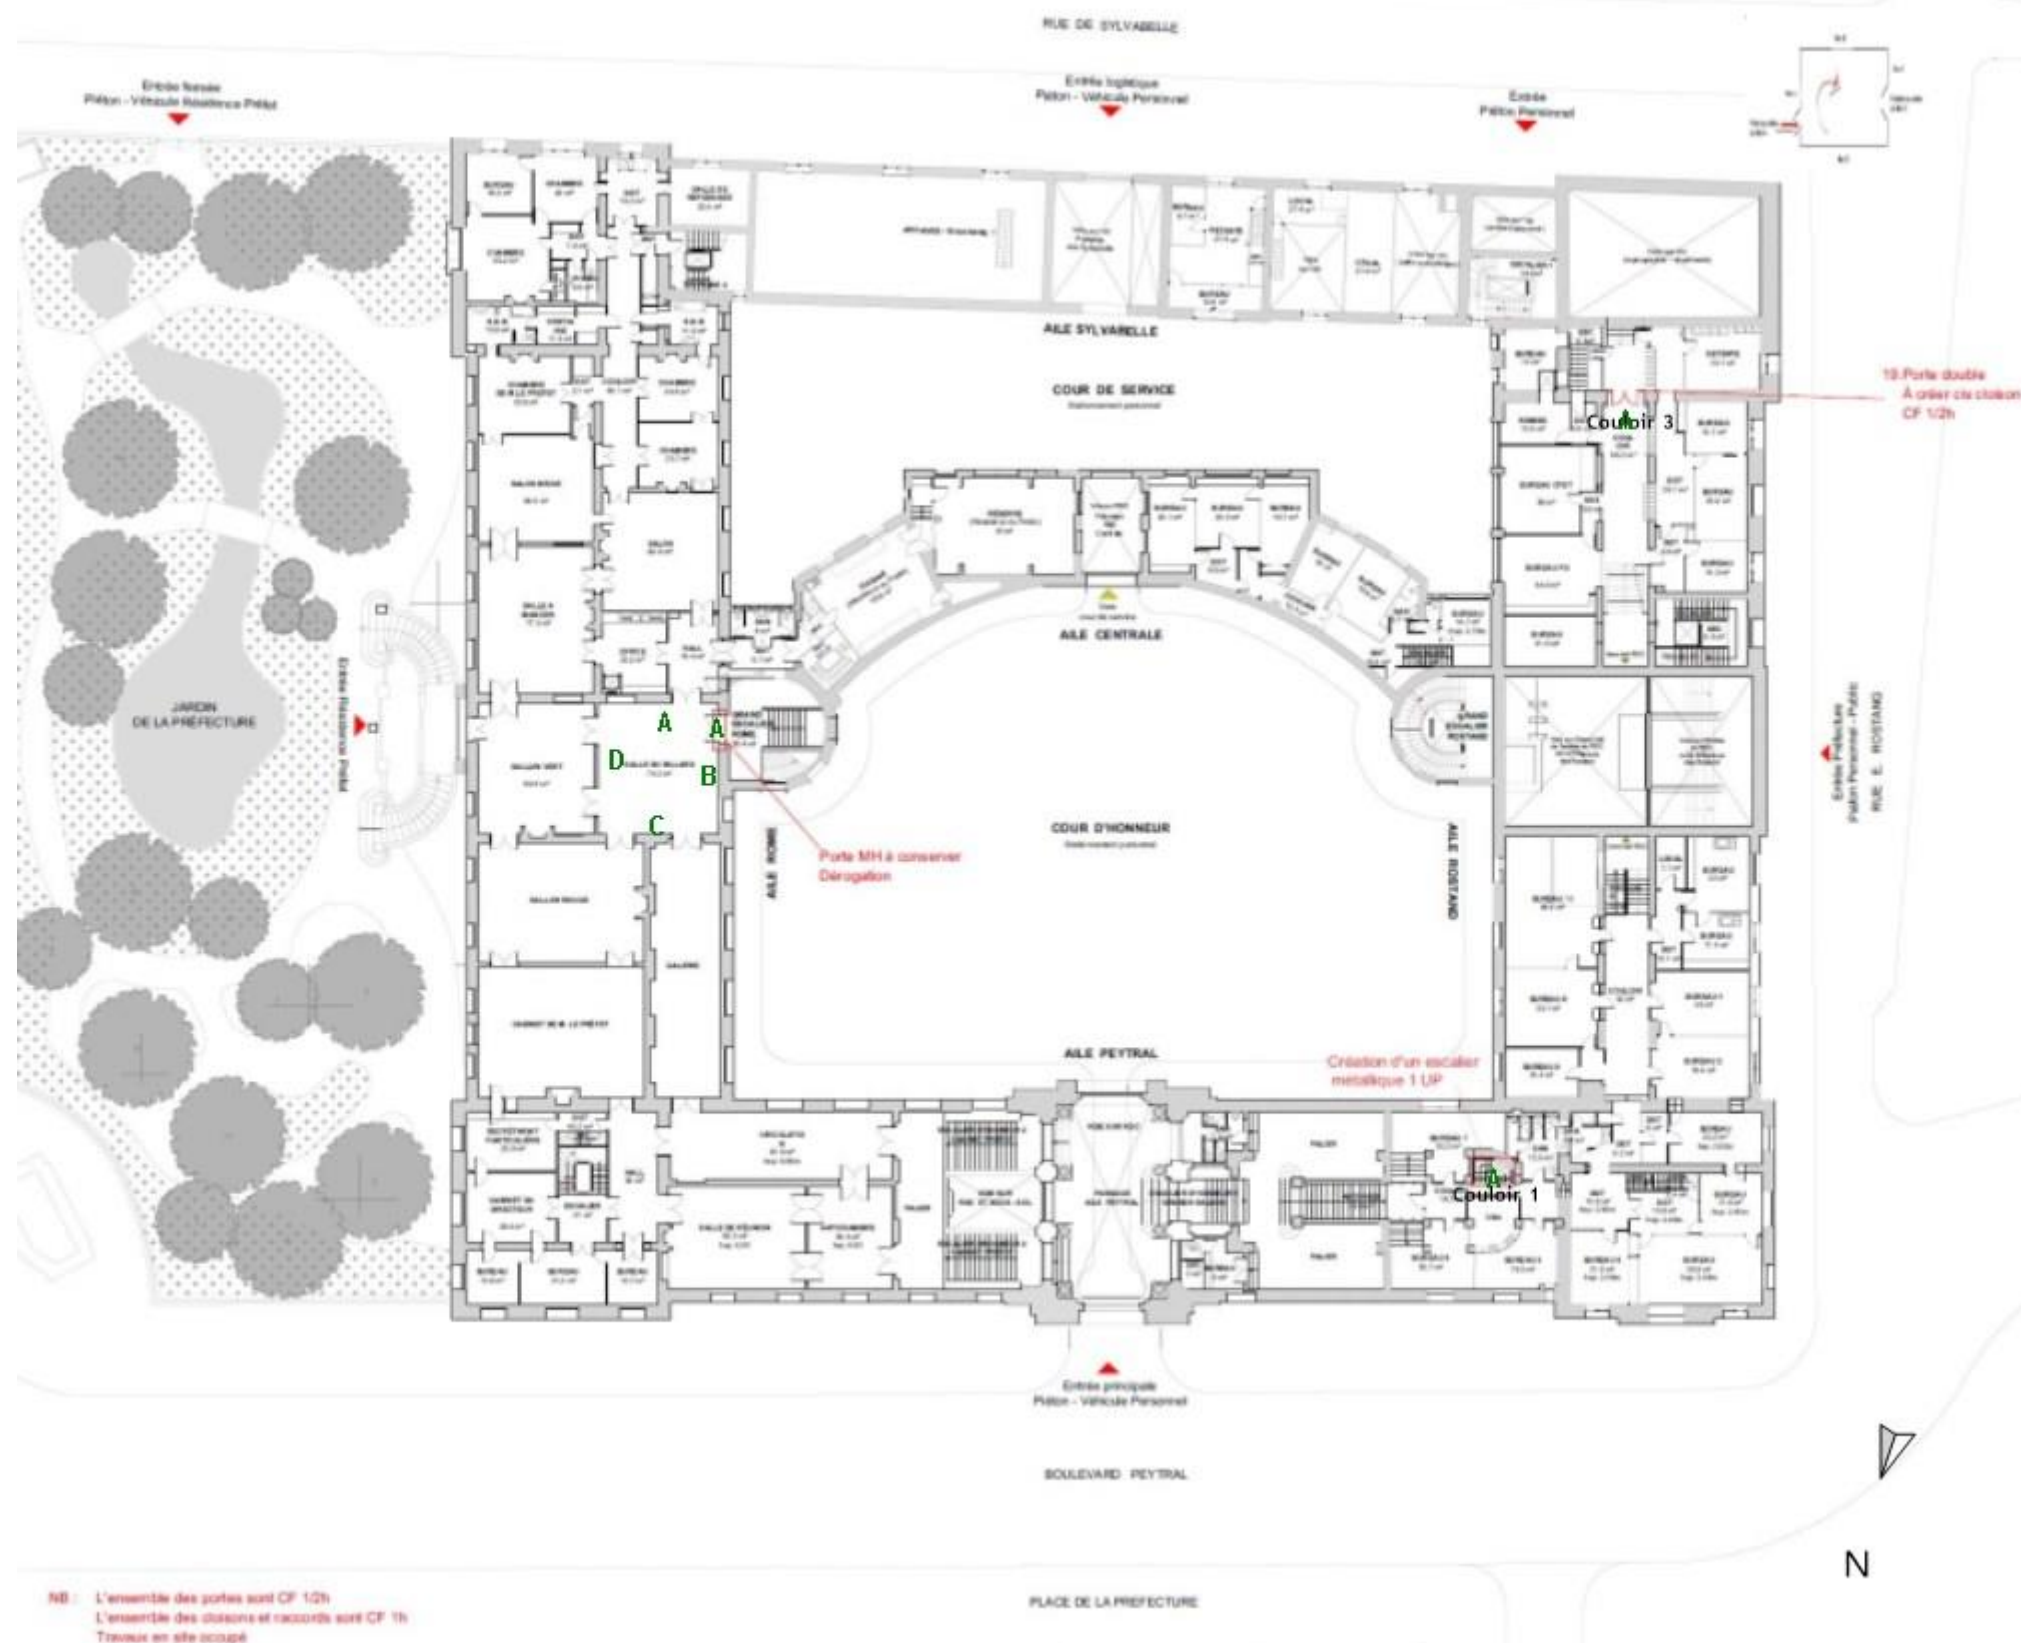


Planche de repérage technique

N° planche: 3/9

Nom du plan:
Entresol RDC-1er étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

Planche de repérage technique

N° planche: 4/9

Nom du plan:
1er étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE


Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

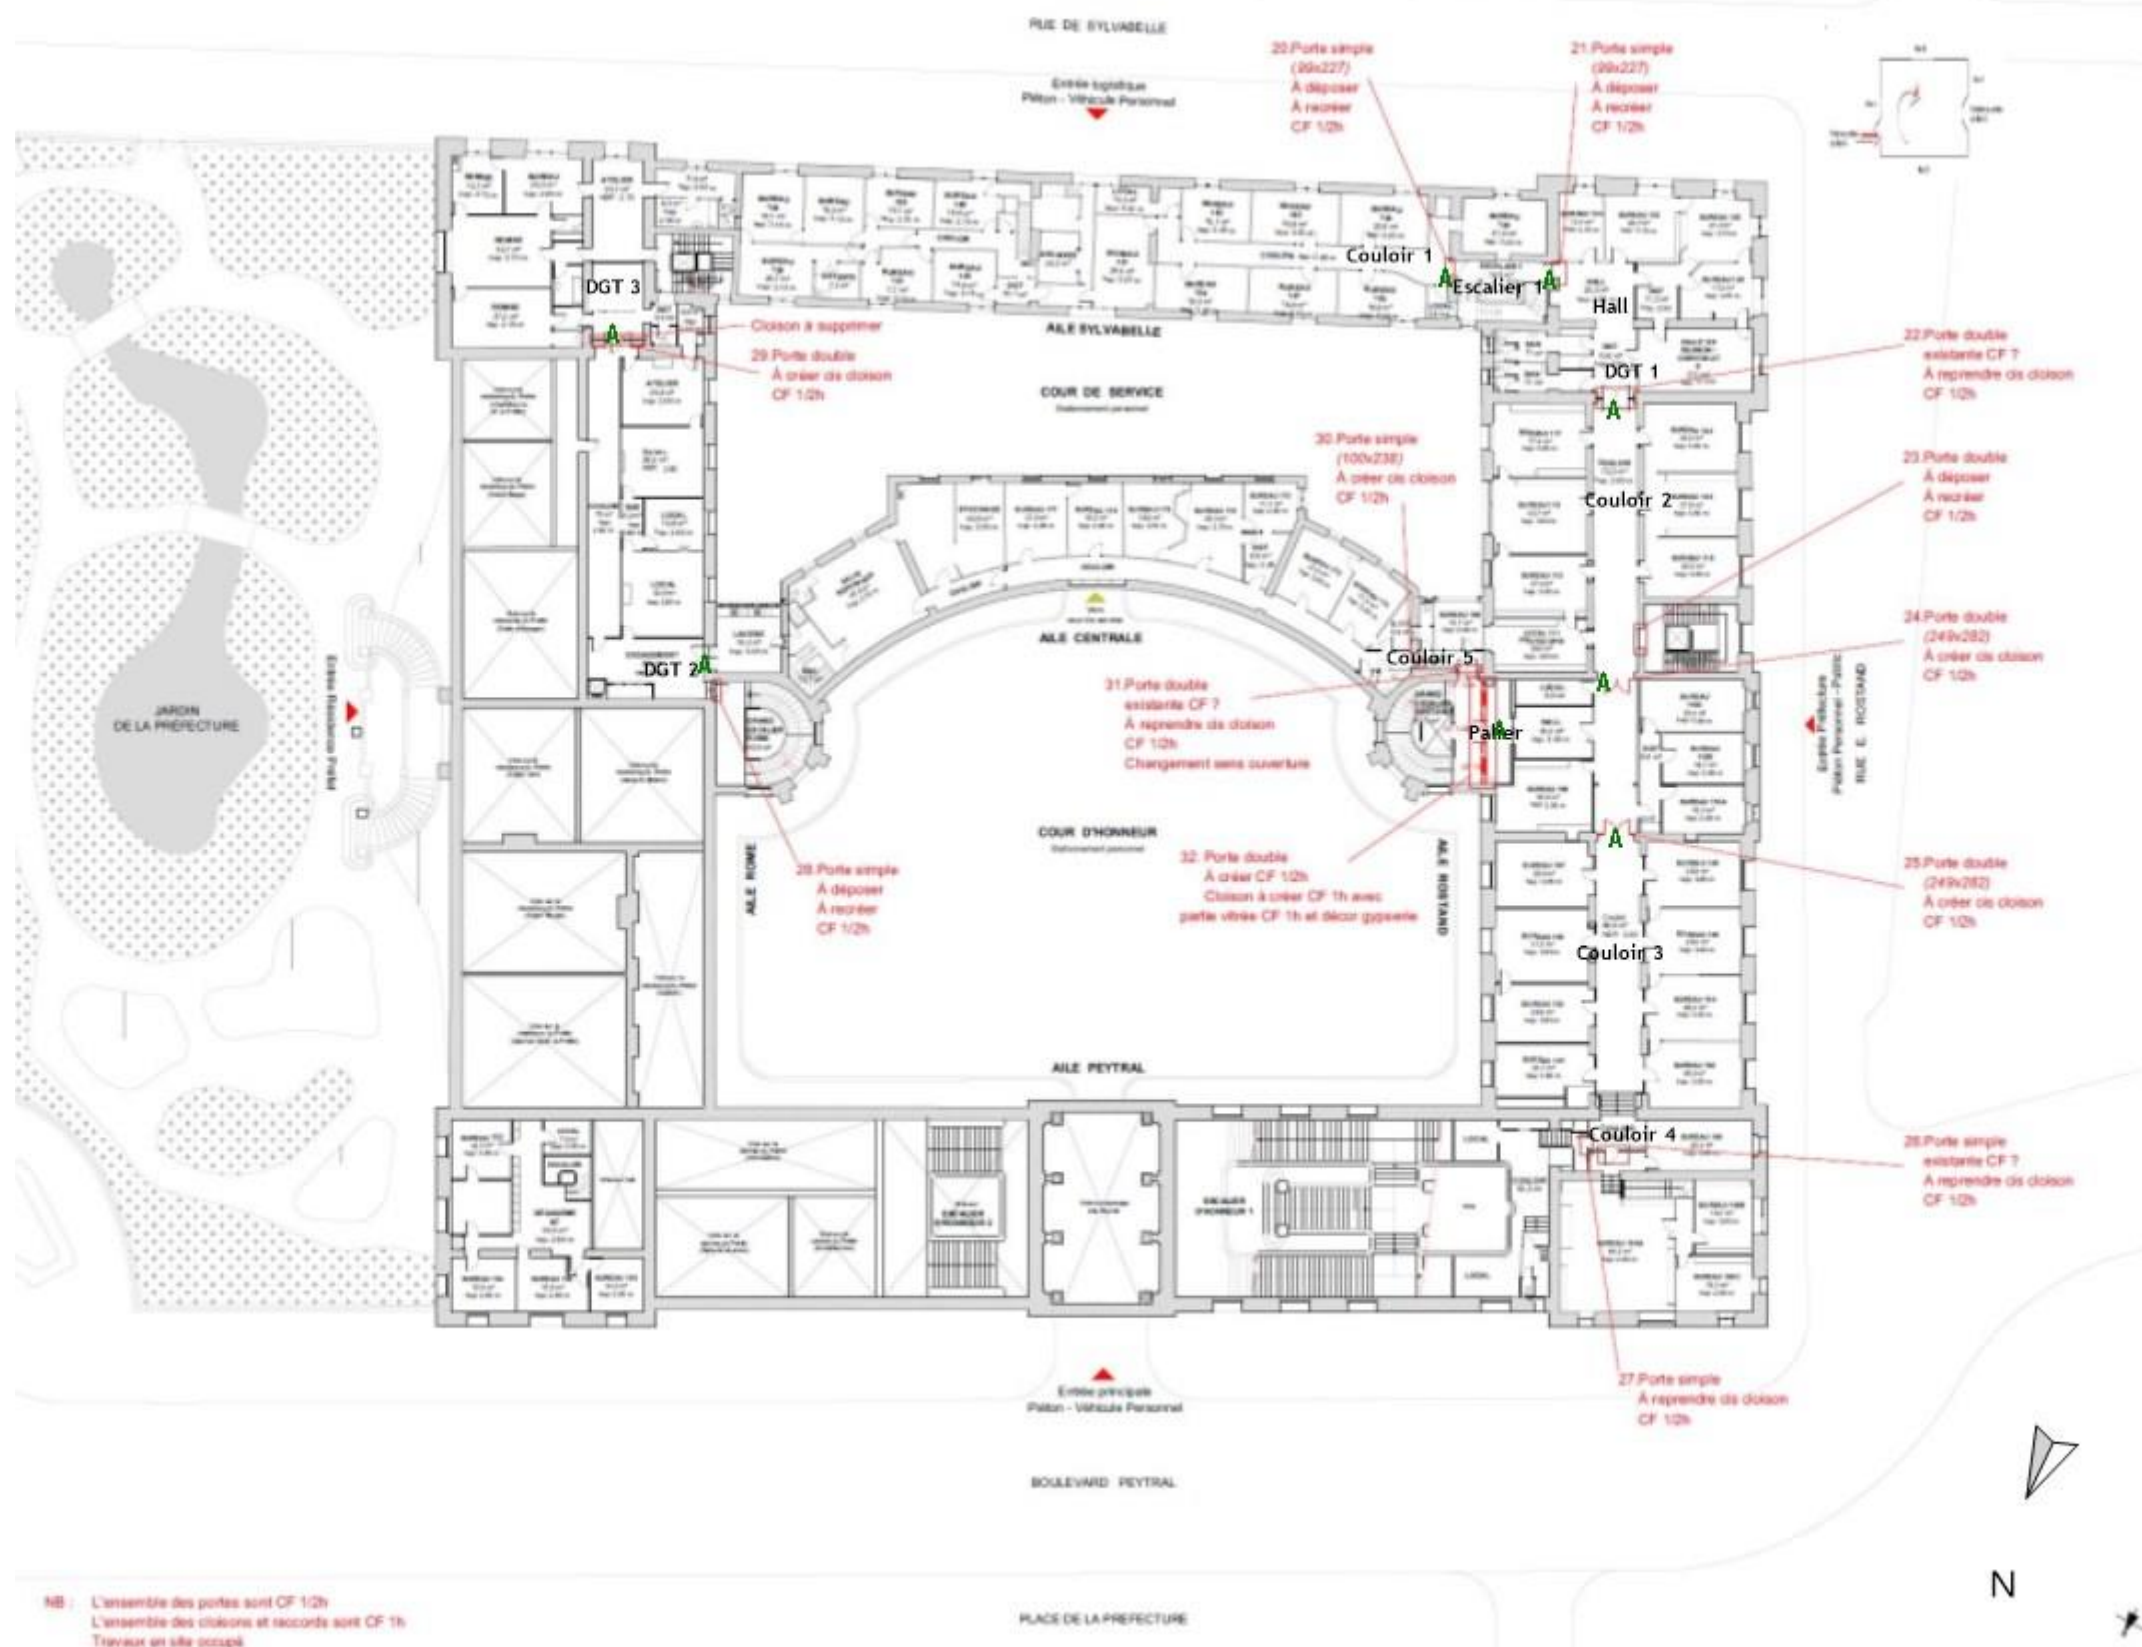

	<div> <div>Planche de repérage technique</div> <div>N° planche: 5/9</div> <div>Nom du plan: 2ème étage</div> <div> Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Aix Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin 13100 AIX-EN-PROVENCE </div> <div> Adresse du bien : Bâtiment Peytral, Place Félix Baret 13006 MARSEILLE (France) </div> <div> Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2407CPAAI - BI12220000001034 Rédacteur : RAPHAEL ANDRE Date : 31/07/2024 </div> <div>Commentaires :</div> </div>
--	---

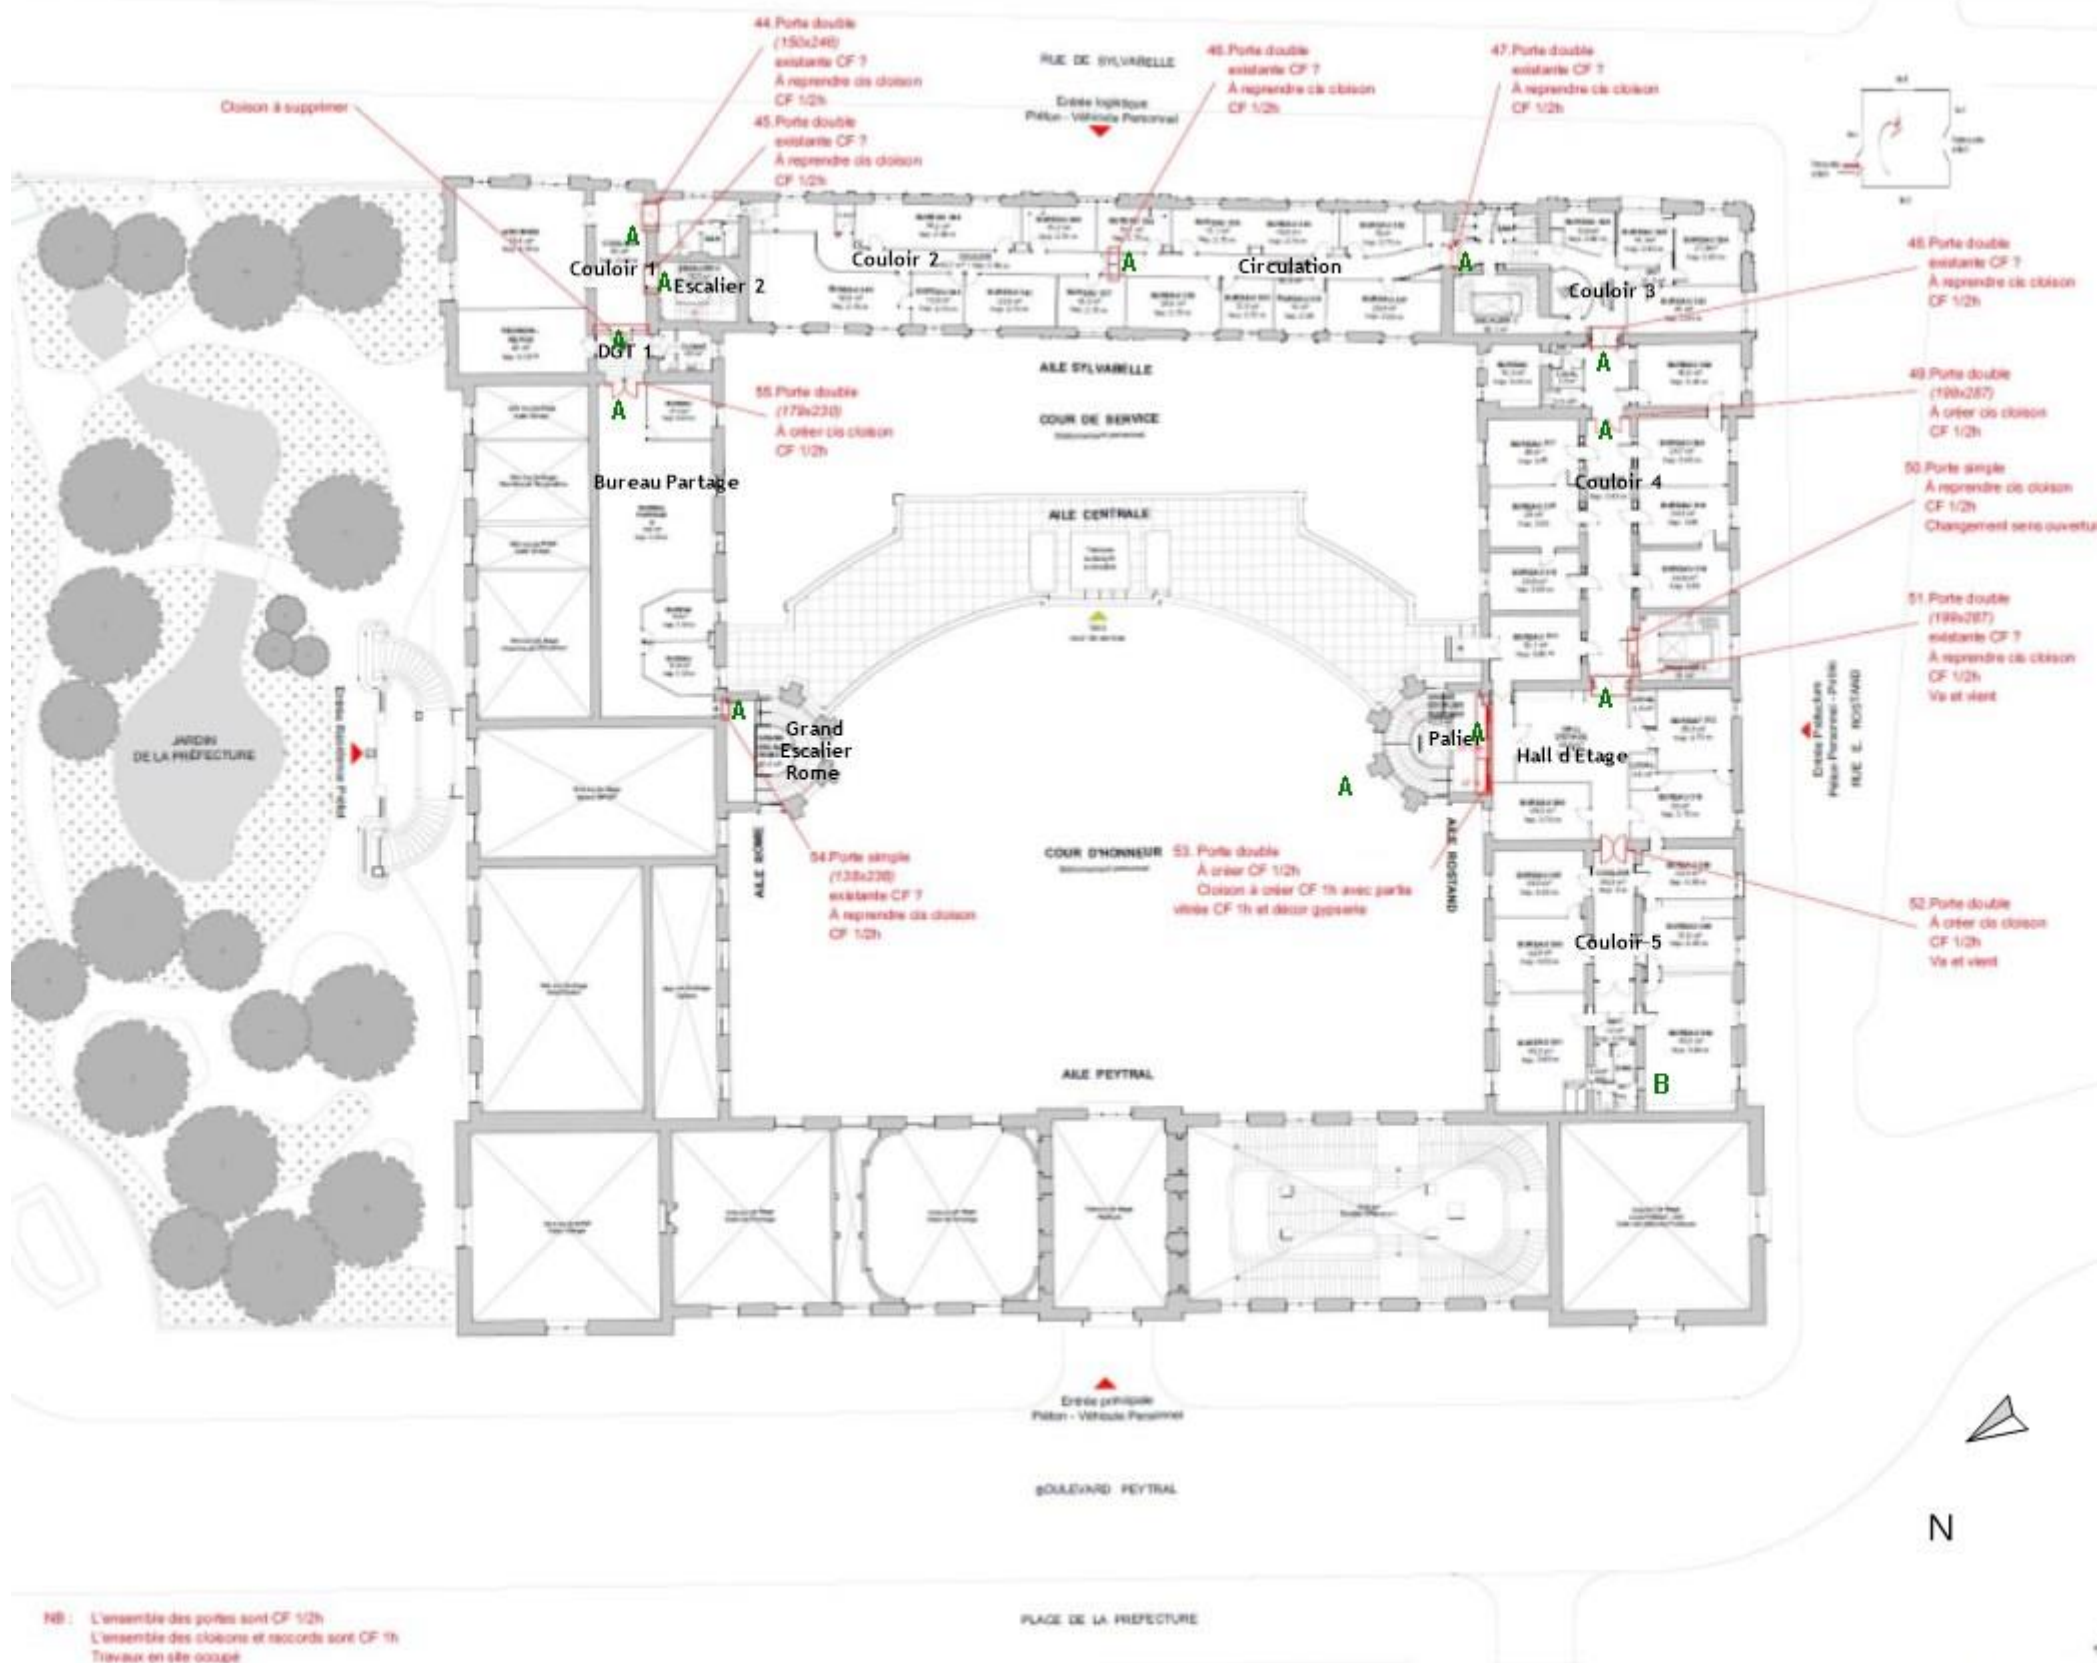


Planche de repérage technique

N° planche: 6/9

Nom du plan:

3ème étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

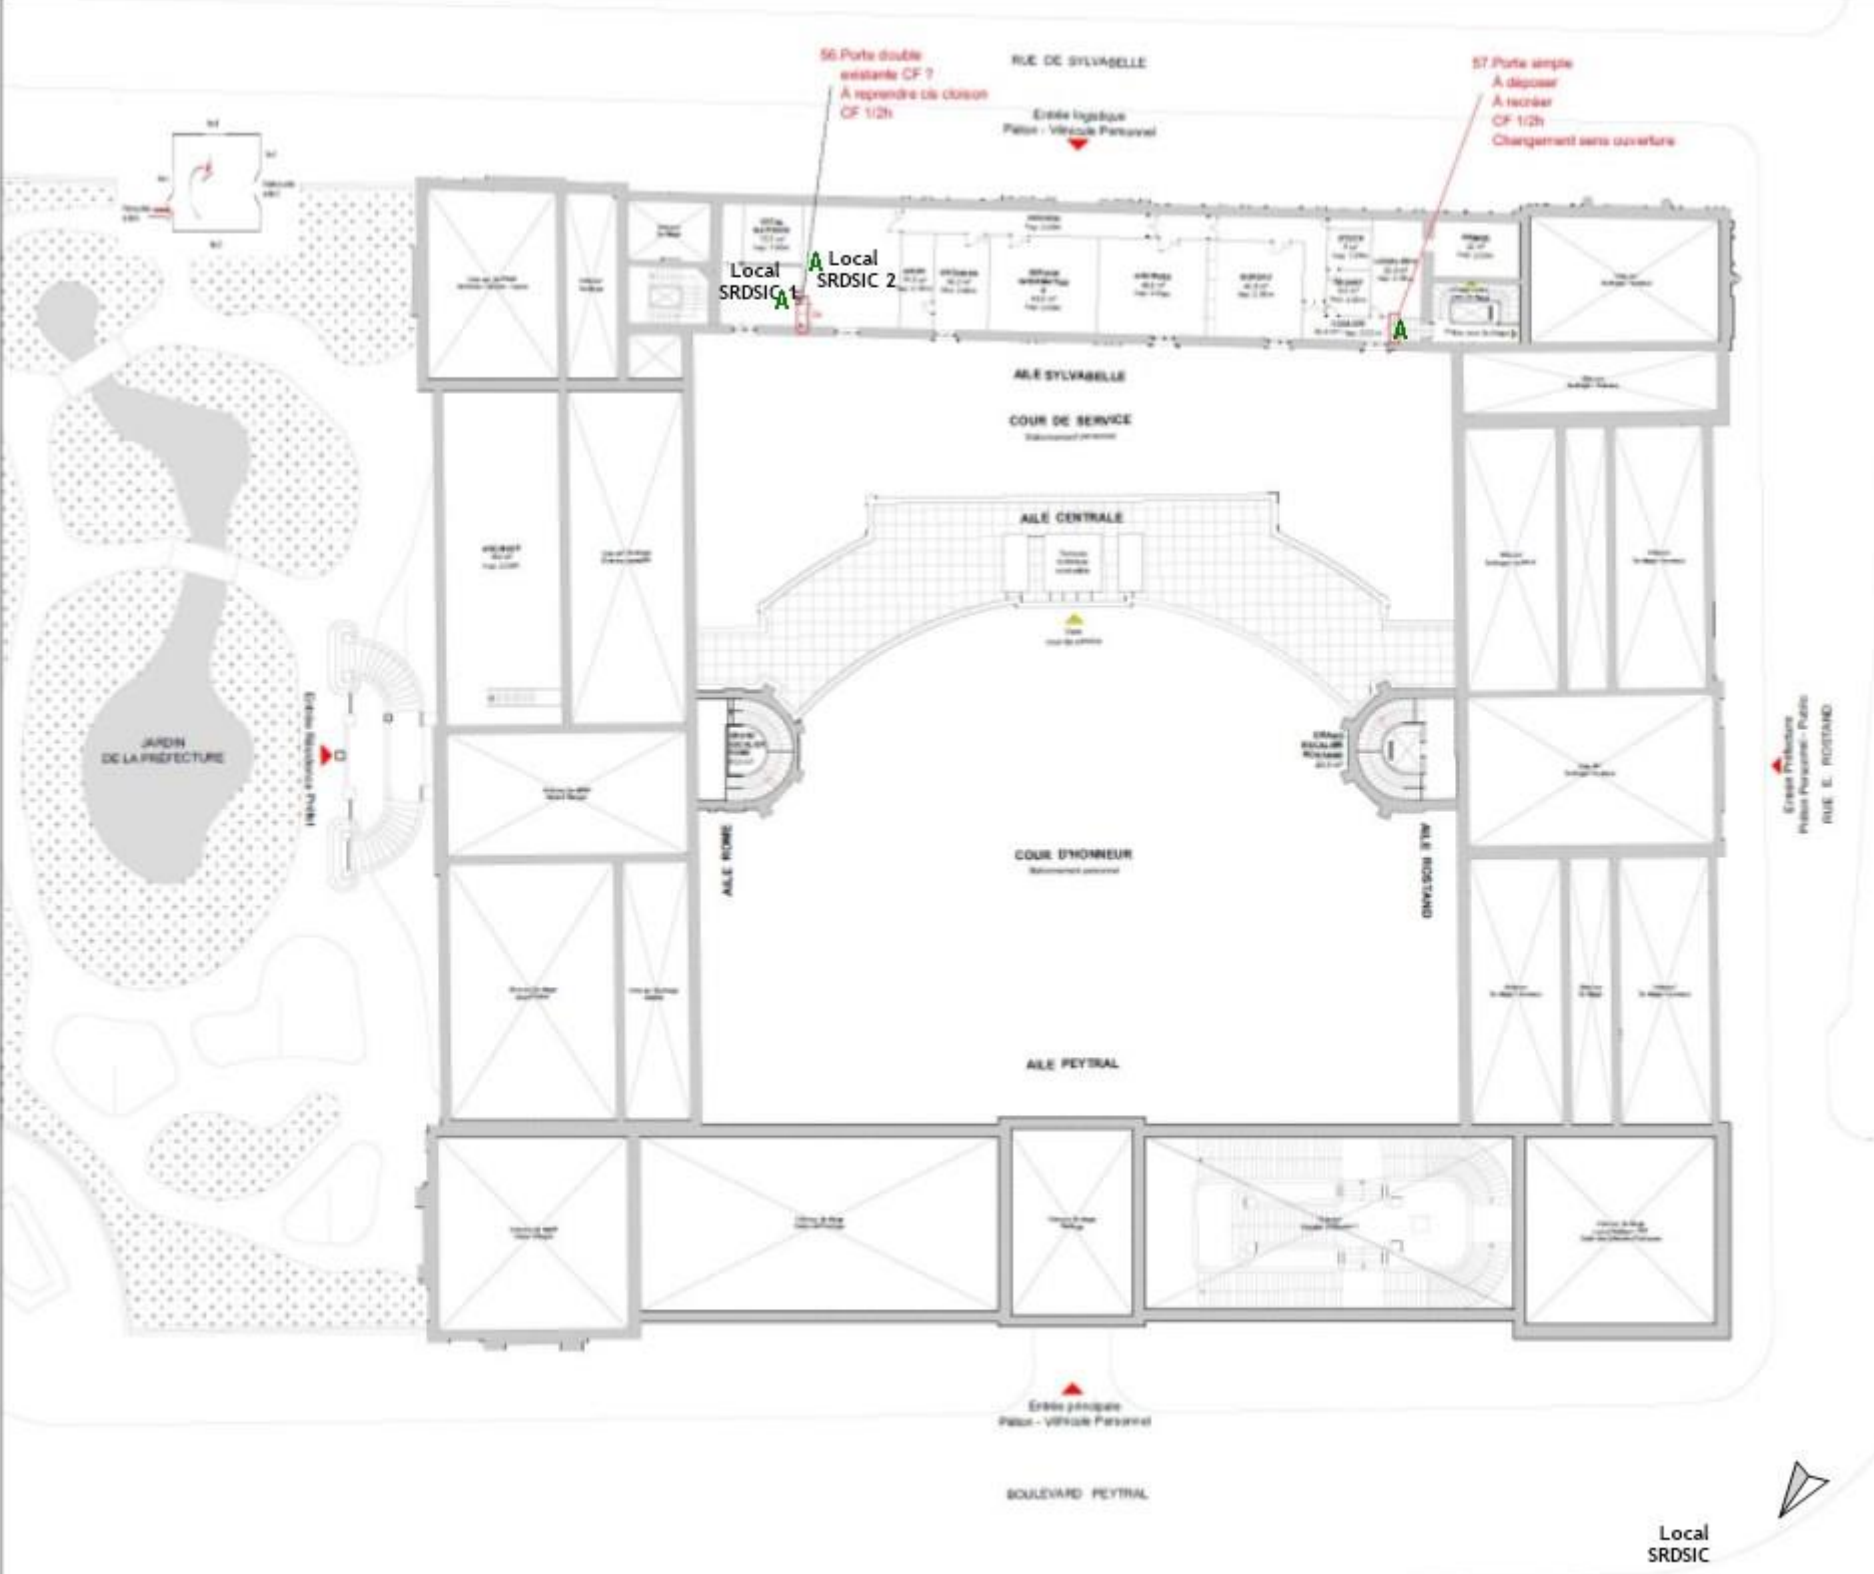
	<div> <div> Planche de repérage technique </div> <div> N° planche: 7/9 </div> <div> Nom du plan: Entresol 3ème-4ème étage </div> <div> Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Aix Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois - Immeuble Rifkin 13100 AIX-EN-PROVENCE </div> <div> Adresse du bien : Bâtiment Peytral, Place Félix Baret 13006 MARSEILLE (France) </div> <div> Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2407CPAAI - BI12220000001034 Rédacteur : RAPHAEL ANDRE Date : 31/07/2024 </div> <div> Commentaires : </div> </div>
---	---

Planche de repérage technique

N° planche: 8/9

Nom du plan:
4ème étage

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE


Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

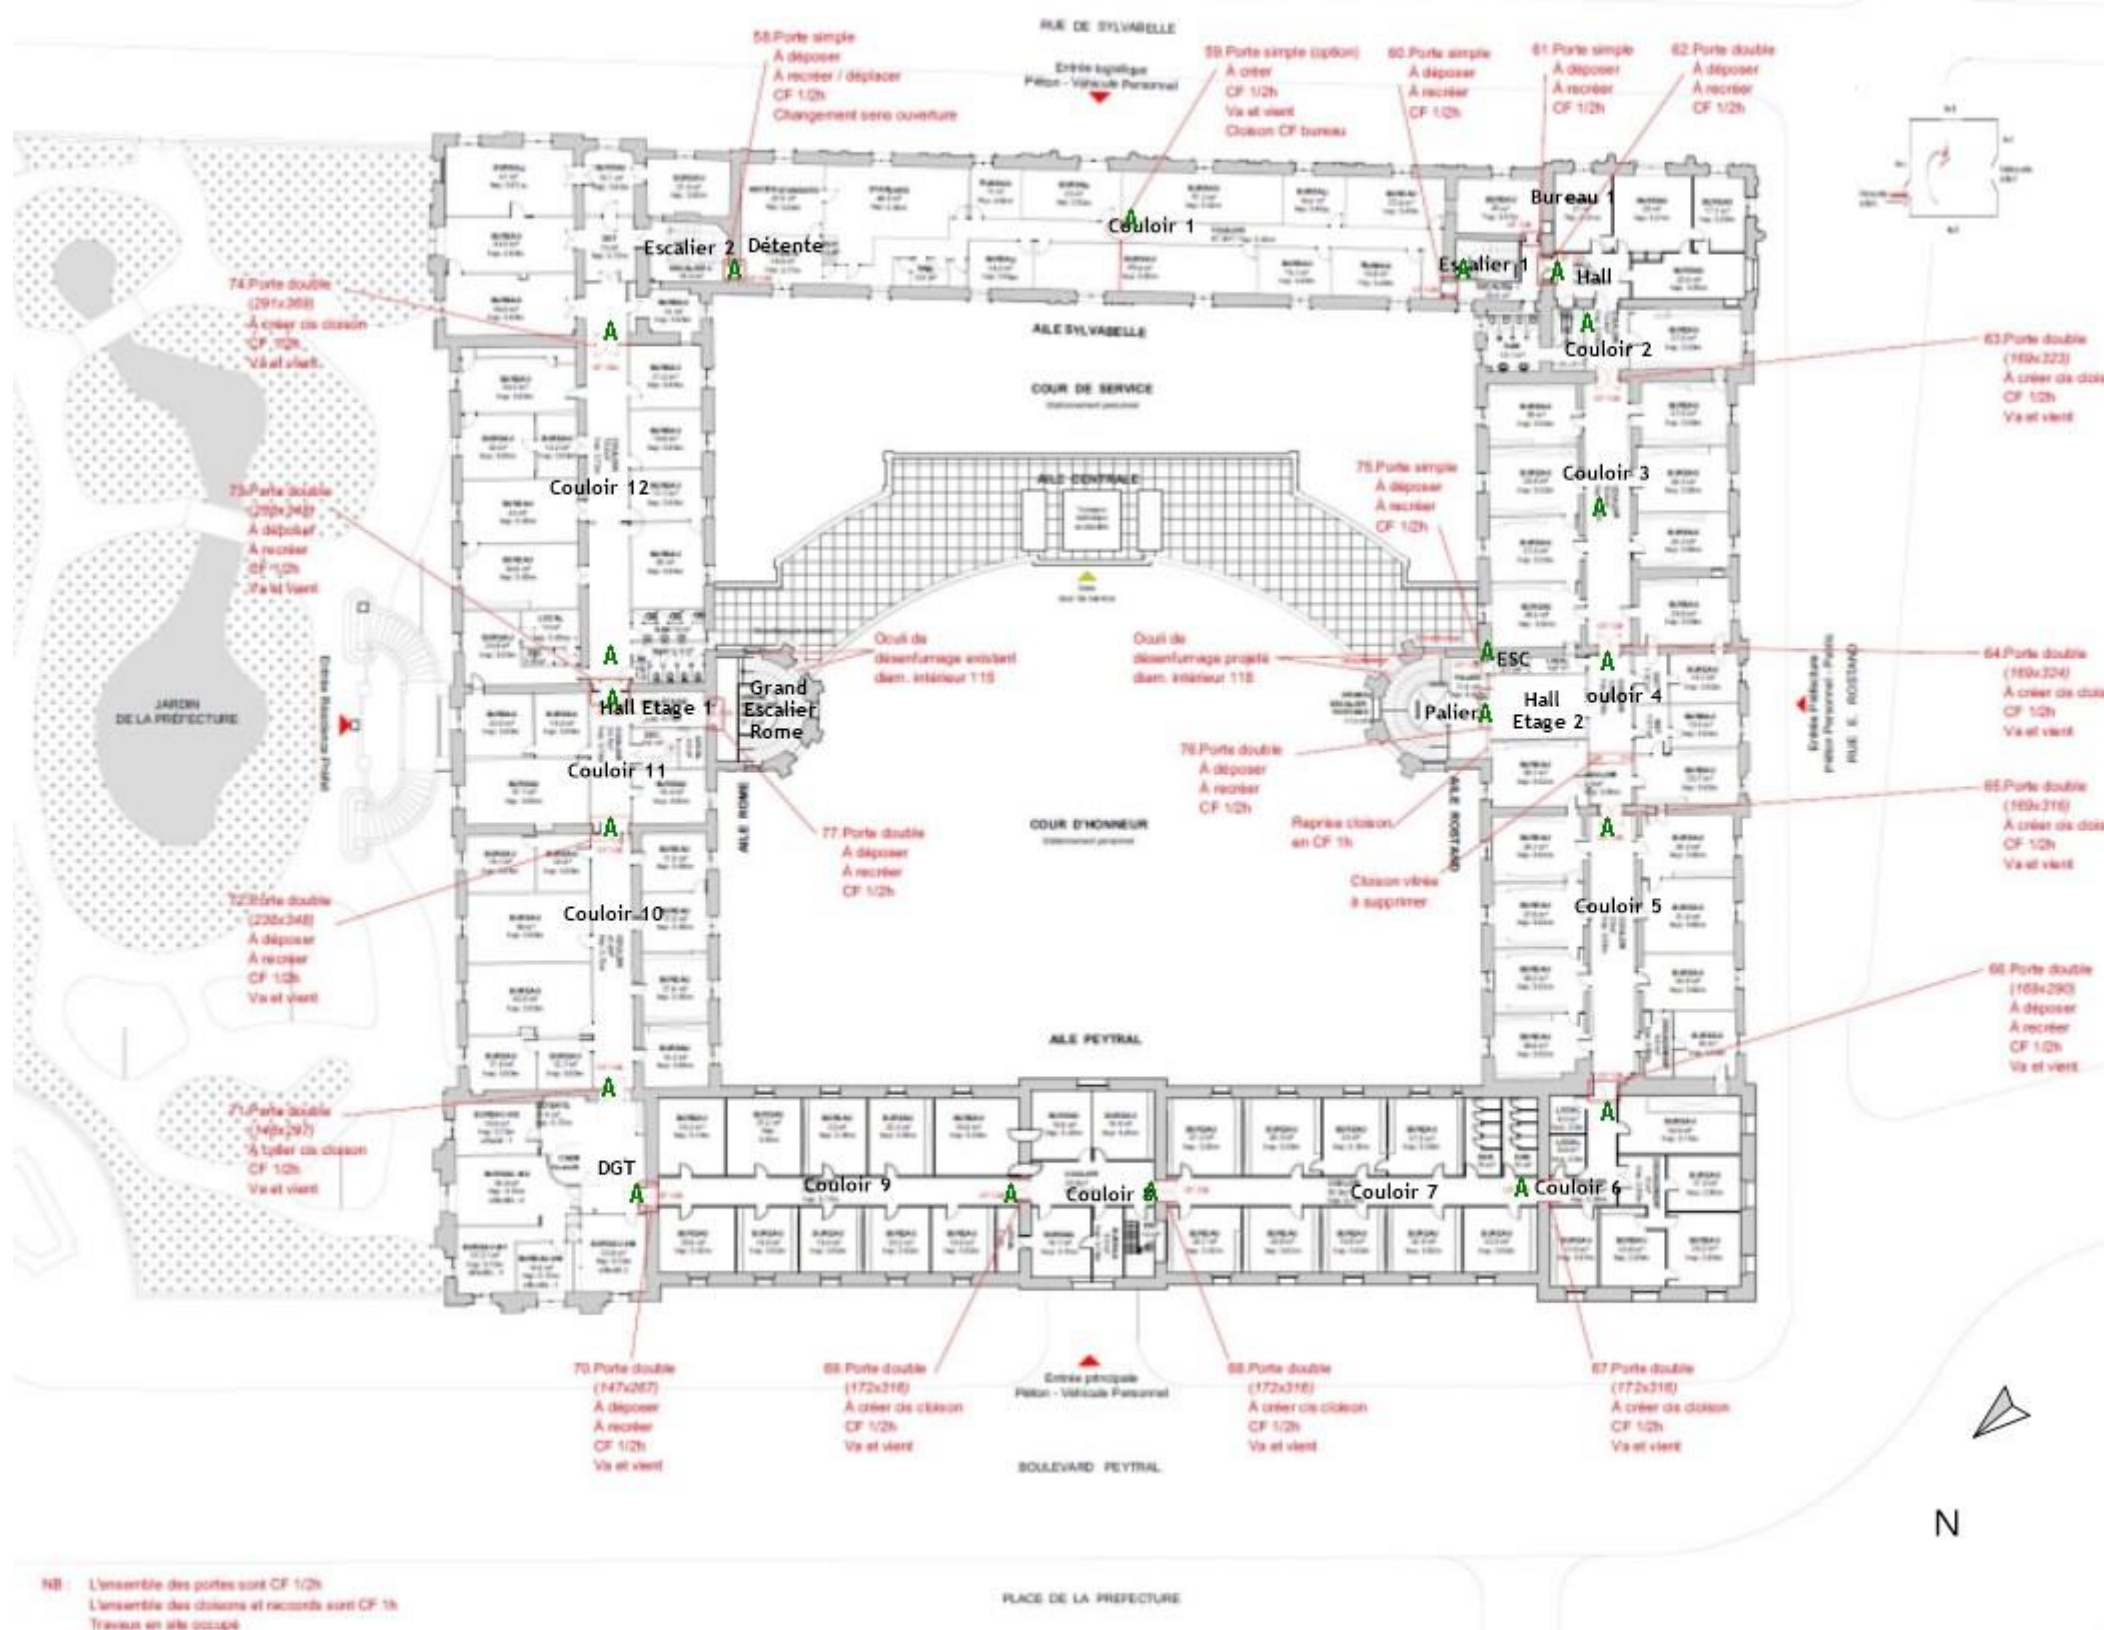

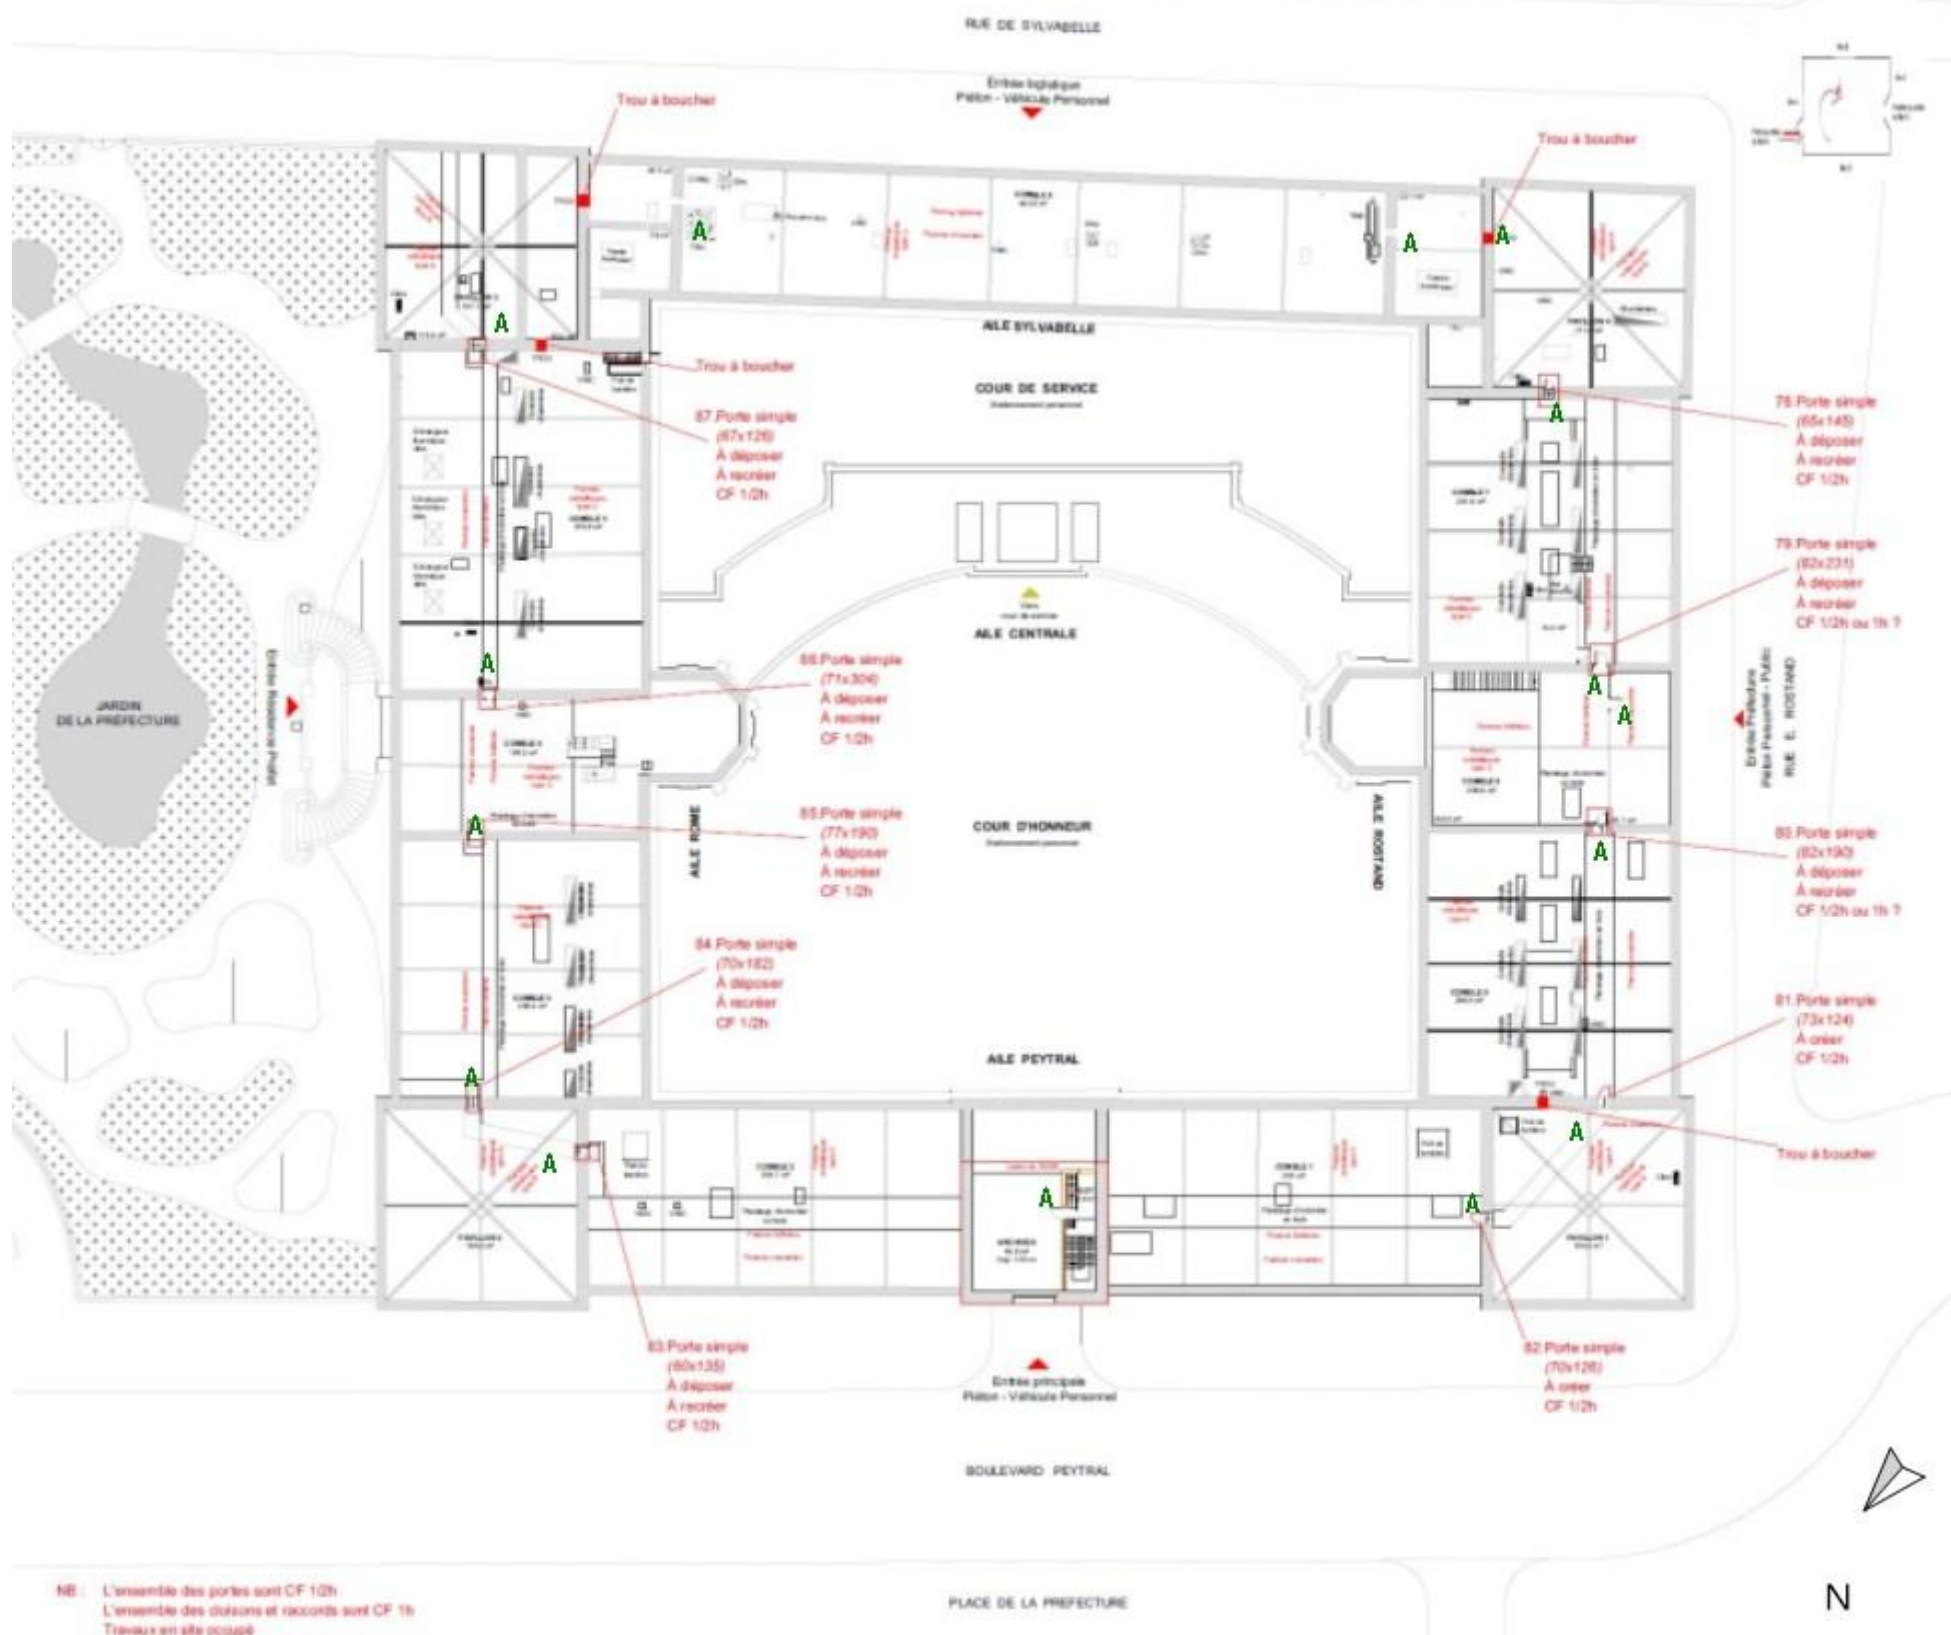


Planche de repérage technique

N° planche: 9/9

Nom du plan:
Combles

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Aix
Avenue Louis Philibert - ZAC du petit Arbois
- Immeuble Rifkin
13100 AIX-EN-PROVENCE

Adresse du bien :

Bâtiment Peytral,
Place Félix Baret
13006 MARSEILLE (France)

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport : 2407CPAAI -
BI12220000001034
Rédacteur : RAPHAEL ANDRE
Date : 31/07/2024

Commentaires :

ANNEXE 2 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

ANNEXE 3 - AUTRES DOCUMENTS / PV ANALYSES

Néant

ANNEXE 4 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ 01 41 34 50 00

📠 01 41 34 55 00

N°ORIAS 07 001 037
Site ORIAS www.orias.fr

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : **37503519275087**
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME

ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Nanterre le 27/11/2023


POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. **Juridica** - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

ANNEXE 5 - ATTESTATION DU FABRICANT DE L'ANALYSEUR XRF



Fabrication, Distribution
Assistance technique
Maintenance d'équipements
scientifiques

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 850 MBq cette valeur limite est atteinte après 60 mois.**
- **Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de 370 MBq cette valeur limite est atteinte après 36 mois.**

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée maximale d'utilisation avant un remplacement nécessaire de la source est simplement basée sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : SOCOTEC

Modèle de l'analyseur :	FEnX
Numéro de série analyseur :	2-0208
Numéro de série de la source :	V7-404
Activité de la source (MBq) :	850
Date d'origine de la source :	15/02/2023
Date de fin de validité de la source :	15/02/2028



Fondis Electronic
26, avenue Duguay Trouin,
entrée D – CS 60507
78961 Voisins-le-Bretonneux Cedex

Tél. : +33 (0)1 34 52 10 30
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25
E-mail : info@fondiselectronic.com
Site : <https://www.physitek.fr>



SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 – APE 4652Z – N° TVA : FR 15 428 583 637 – Lieu de juridiction : Versailles.

ANNEXE 6 - NOTICE D'INFORMATION

1. LES EFFETS DU PLOMB SUR LA SANTE

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

2. COMMENT SE CONTAMINE-T-ON ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- > en travaillant sans protection,
- > en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- > en se rongant les ongles,
- > en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

3. QUE FAIRE EN CAS DE RISQUE POTENTIEL SUR UN CHANTIER ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- > Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation/réhabilitation et démolition
- > Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- > Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- > Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- > Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- > Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- > Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- > Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- > Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- > des conseils dans le choix des protections,
- > une aide à l'information et à la formation,
- > une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

CARSAT du Centre
www.carsat-centre.fr
 Tél 02 38 81 50 00
 prev@carsat-centre.fr



OPPBTP Centre
www.preventionbtp.fr
 Tél 02 38 83 60 21
 orleans@oppbtp.fr



RSI région Centre
<http://www.rsi.fr/centre>
 Tél 08 20 20 96 26



Les coordonnées des services de santé au travail sont disponibles sur le site de la DIRECCTE Centre :
www.centre.direccte.gouv.fr/les-services-de-sante-au-travail-en-region-centre

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- > le rapport de repérage plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- > la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- > Les guides de prévention :
 - Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr)
 - Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 6374 (téléchargeable sur www.inrs.fr)
