


UP8-PAS - Rénovation de la passerelle extérieure

PLANNING PREVISIONNEL


DCE
Ind B
27/05/2025

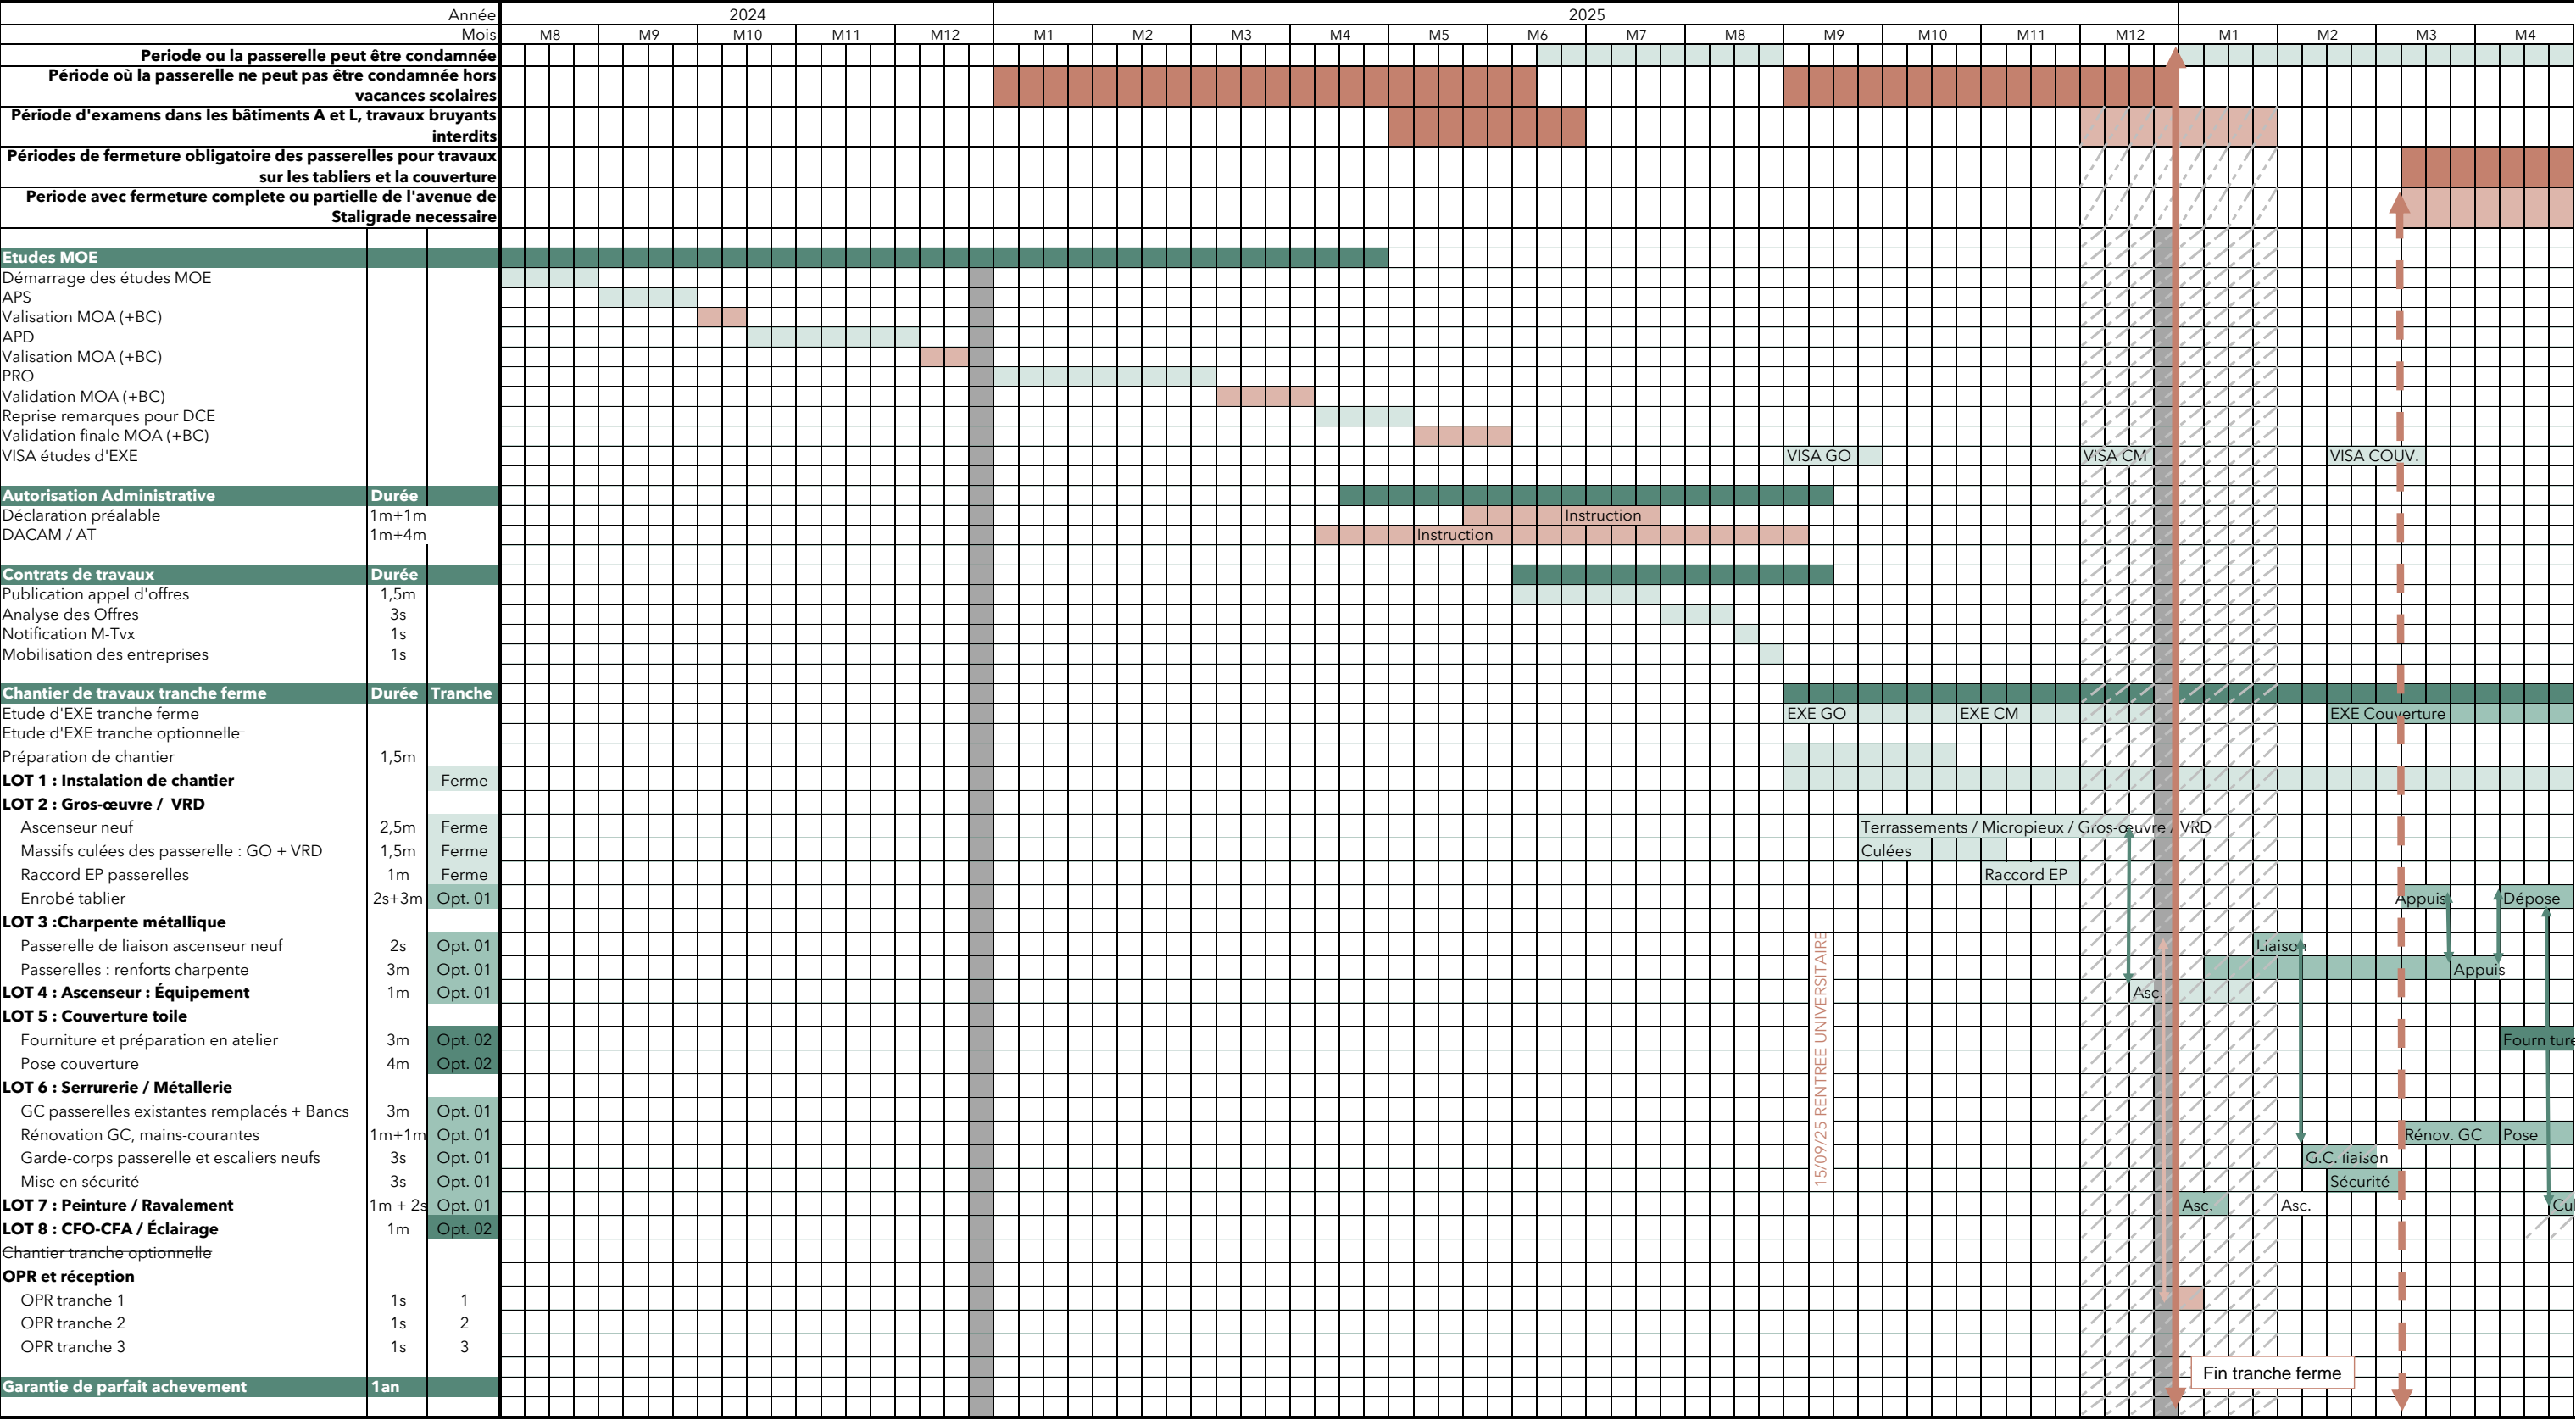

UP8-PAS - Rénovation de la passerelle extérieure

PLANNING PREVISIONNEL

DCE
Ind B
27/05/2025

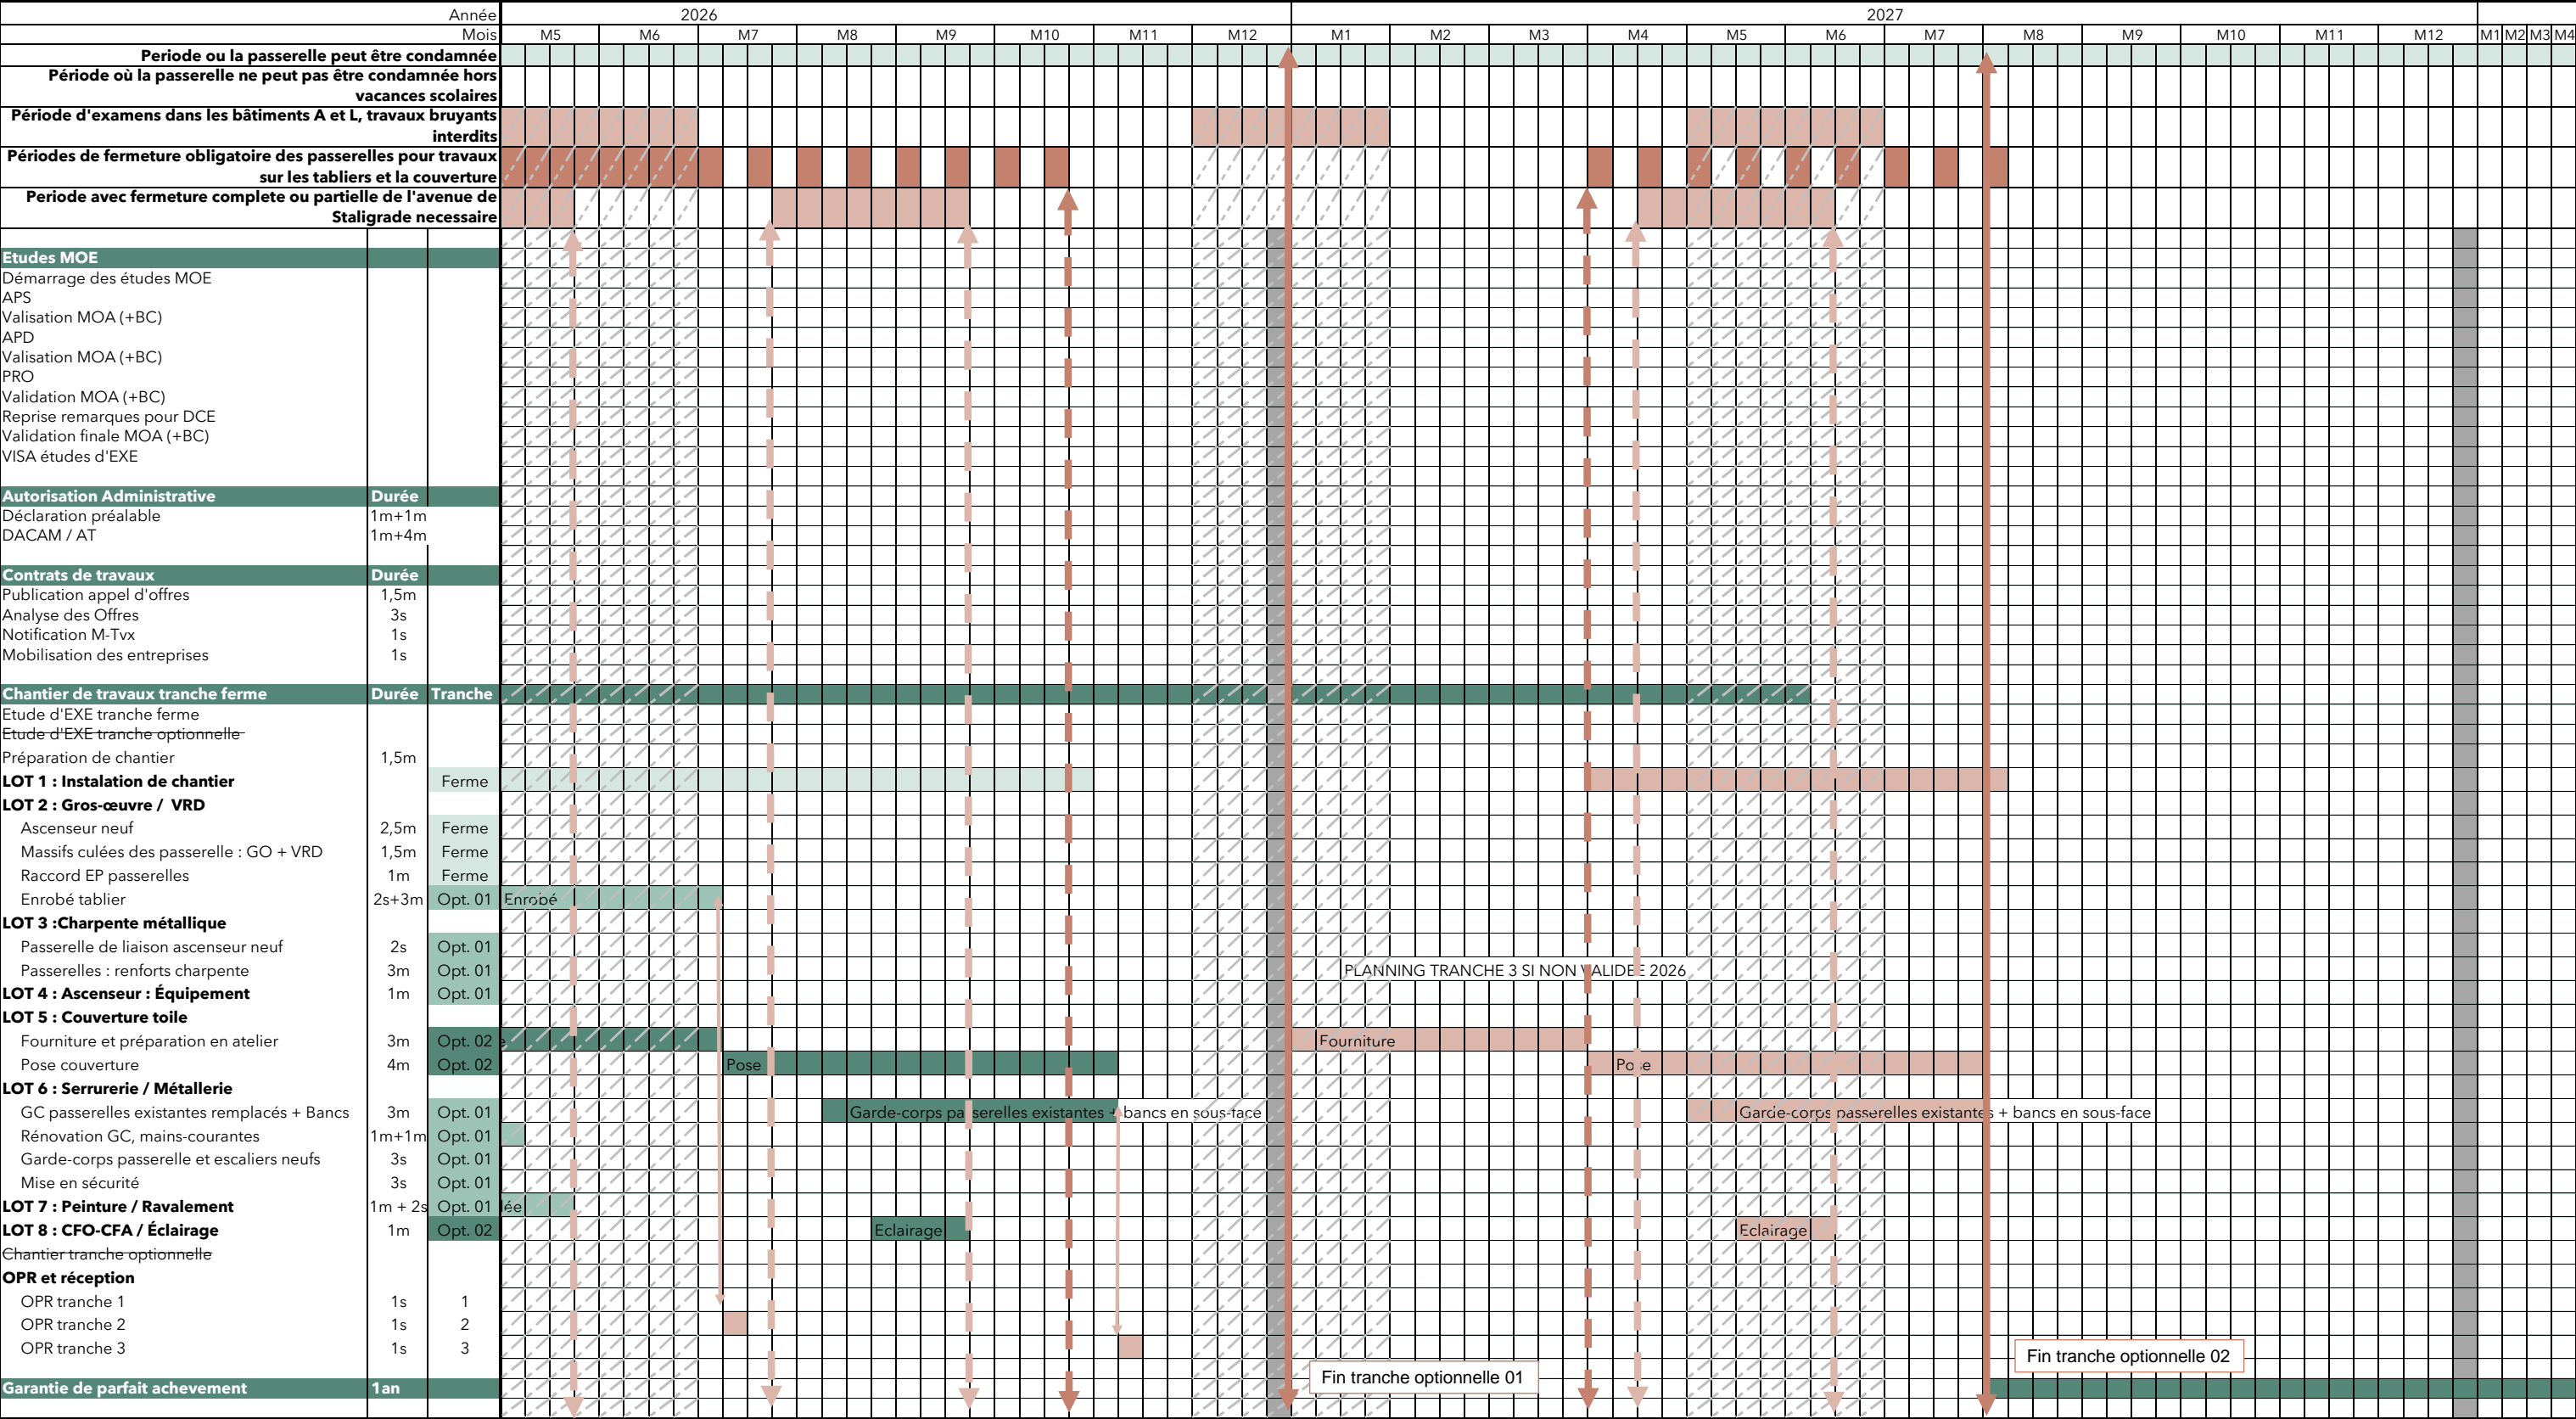

KAIRN

UP8-PAS - Rénovation de la passerelle extérieure

PLANNING PREVISIONNEL

DCE

Ind B

27/05/2025

Année			2028											
Mois			M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
Période ou la passerelle peut être condamnée														
Période où la passerelle ne peut pas être condamnée hors vacances scolaires														
Période d'examens dans les bâtiments A et L, travaux bruyants interdits														
Périodes de fermeture obligatoire des passerelles pour travaux sur les tabliers et la couverture														
Période avec fermeture complète ou partielle de l'avenue de Staligrade nécessaire														
Etudes MOE														
Démarrage des études MOE														
APS														
Valisation MOA (+BC)														
APD														
Valisation MOA (+BC)														
PRO														
Validation MOA (+BC)														
Reprise remarques pour DCE														
Validation finale MOA (+BC)														
VISA études d'EXE														
Autorisation Administrative			Durée											
Déclaration préalable			1m+1m											
DACAM / AT			1m+4m											
Contrats de travaux			Durée											
Publication appel d'offres			1,5m											
Analyse des Offres			3s											
Notification M-Tvx			1s											
Mobilisation des entreprises			1s											
Chantier de travaux tranche ferme			Durée	Tranche										
Etude d'EXE tranche ferme														
Etude d'EXE tranche optionnelle														
Préparation de chantier			1,5m											
LOT 1 : Instalation de chantier				Ferme										
LOT 2 : Gros-œuvre / VRD														
Ascenseur neuf			2,5m	Ferme										
Massifs culées des passerelle : GO + VRD			1,5m	Ferme										
Raccord EP passerelles			1m	Ferme										
Enrobé tablier			2s+3m	Opt. 01										
LOT 3 :Charpente métallique														
Passerelle de liaison ascenseur neuf			2s	Opt. 01										
Passerelles : renforts charpente			3m	Opt. 01										
LOT 4 : Ascenseur : Équipement			1m	Opt. 01										
LOT 5 : Couverture toile														
Fourniture et préparation en atelier			3m	Opt. 02										
Pose couverture			4m	Opt. 02										
LOT 6 : Serrurerie / Métallerie														
GC passerelles existantes remplacés + Bancs			3m	Opt. 01										
Rénovation GC, mains-courantes			1m+1m	Opt. 01										
Garde-corps passerelle et escaliers neufs			3s	Opt. 01										
Mise en sécurité			3s	Opt. 01										
LOT 7 : Peinture / Ravalement			1m + 2s	Opt. 01										
LOT 8 : CFO-CFA / Éclairage			1m	Opt. 02										
Chantier tranche optionnelle														
OPR et réception														
OPR tranche 1			1s	1										
OPR tranche 2			1s	2										
OPR tranche 3			1s	3										
Garantie de parfait achèvement			1 an											
