

# REHABILITATION DE LA 120<sup>eme</sup> ANTENNE MEDICALE

## Caserne Saint Martin des Palliées

### CHAMPAGNE ( 72470)



MAITRISE D'OUVRAGE :		 <b>MINISTÈRE DES ARMÉES</b> <small>Direction générale des armées Zone Industrielle de la Défense</small>
	ESID de RENNES Pôle Conduite d'Opération d'Angers 5 rue des Petites Mussés, BP 14114 49041 ANGERS Cedex 01 Tél : 02.41.68.80.12 @ : anthony.godmer@intradef.gouv.fr	
MAITRISE D'ŒUVRE :		 <b>ARCHITECTES</b> <small>PRECONCEPT</small>
- Architecte	PRECONCEPT Architectes - 8 rue des Vaux Parés 35510 CESSON-SEVIGNE Tél : 01 46 59 39 50 @ : buret@preconcept.fr	
- Bureau d'étude Fluides	BETOM INGENIERIE - 11, allée du bâtiment - 35000 RENNES Tél : 02 99 27 50 42 @ : accueil-rennes@betom.fr	
- Bureau d'étude Environnementale	CAP TERRE - 11, allée du bâtiment - 35000 RENNES Tél : 02 99 27 65 19 @ : accueil-rennes@cap-terre.com	
AUTRES INTERVENANTS :		
- Bureau de contrôle	VERITAS - 7, av. René Laënnec 72000 LE MANS Tél : 02 43 39 96 25 @ : vincent.labbetoul@bureauveritas.com	 <b>BUREAU VERITAS</b> <small>Shaping a World of Trust</small>
- Coordonnateur SPS		

NOTICE CHANTIER			PHASE	LBRE 22011
Indice 0	12/12/2024	Emission initiale		
Validé par :	Valérie VIGNAUD		Cheffe de Projets	02/04/2025

## Table des matières

1.	Note planification .....	2
2.	Note organisation de chantier .....	3
2.1.	PHASE 1 : TERRASSEMENT DE LA ZONE BUNGALOWS .....	3
2.2.	PHASE 2 : Réhabilitation du Bâtiment 056.....	3



## 2. NOTE ORGANISATION DE CHANTIER

### 2.1. PHASE 1 : TERRASSEMENT DE LA ZONE BUNGALOWS

Pas d'installation de chantier à prévoir pour cette phase où les terrassiers viennent avec leur roulotte de chantier.

Des souches seront à enlever.


Cinq arbres devront être supprimés pour la mise en œuvre du terrassement de la zone bungalows et des futurs emplacements de places de stationnement. Certains arbres nouvellement plantés seront mis de côté pour replantation ultérieure.

### 2.2. PHASE 2 : Réhabilitation du Bâtiment 056

Le chantier se situant en zone protégée, nous proposons une simple clôture grillagée pour délimiter la zone. La base vie sera positionné à droite de l'actuel garage ambulance. Les évacuations et alimentations seront pris dans le bâtiment 56.

Les deux abris à munitions restent accessibles.

Les bennes de Tri seront situées à l'ouest du Bâtiment. La cour élargie à cet endroit permettra les manœuvres des camions pendant la neutralisation de la zone Est lors de la construction de l'extension et de la rampe d'accès ambulance.

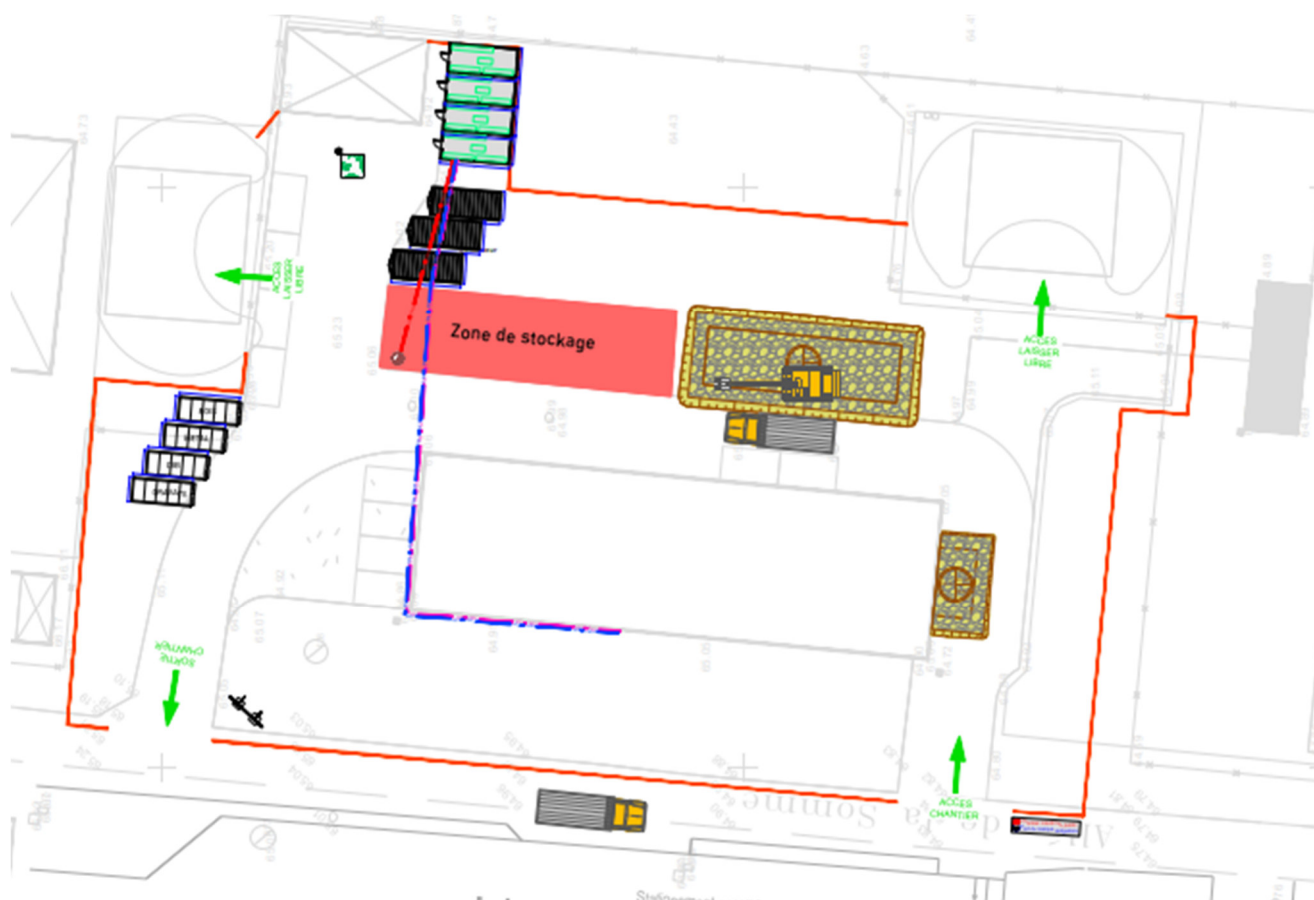

### **Le désamiantage et curage du bâtiment**

la maitrise d'œuvre propose :

- d'identifier une zone complète à l'étage pour désamianter les parties concernées afin de ne subir qu'une étape de mesures pour l'ensemble.
- les fenêtres dont le mastic est amianté seront déposées soigneusement et ensachées pour évacuation spécifique.

**\* Pour mémoire : l'accès au bâtiment 128 par la voirie Sud devra être possible à tout moment.**

### **L'installation de la base vie :**


Voir dossier SPS



# ANNEXE V

## PLAN DE CIRCULATION DU SITE DU 2<sup>e</sup>RIMa

SUR L'ENSEMBLE DU SITE :

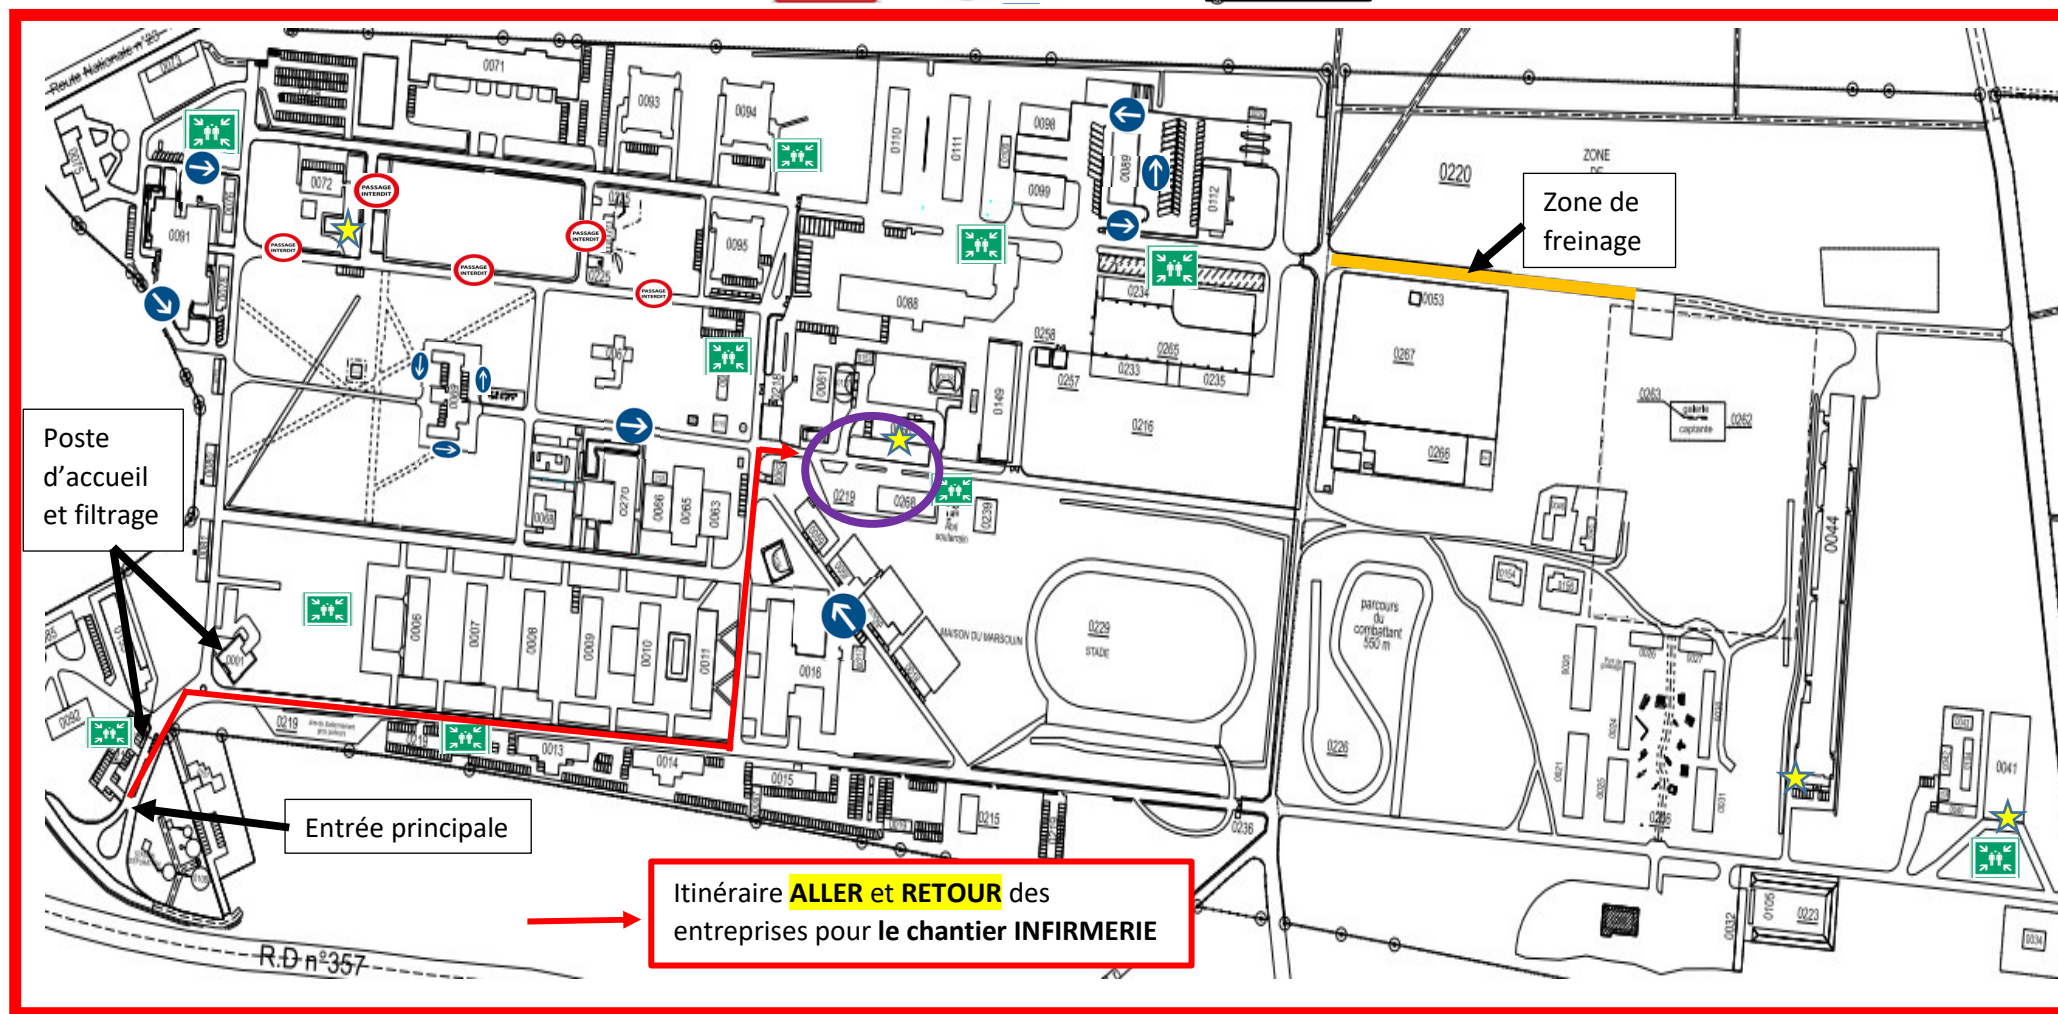

Point de regroupement



Défibrillateurs



Sens unique



Passage interdit  
au véhicule **CIVIL**

