
	TGBT		INDICE A
	ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ARMOIRES DE DISTRIBUTIONS FORCE /ECLAIRAGE DU BATIMENT		RELEVÉ Juin 2020

RENSEIGNEMENT DE L'ARMOIRE					
Armoire	TGBT	Niveau	R de C	Amont	TRANSFORMATEUR
IG / DG				Câbles d'alimentation	
Etat visuel de l'armoire		<input type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Passable	<input checked="" type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Très Bon
Taux de remplissage	60%	Repérage de l'armoire, filerie, équipements etc...		<input checked="" type="checkbox"/> Complète	<input type="checkbox"/> Incomplète




Observations :
Départ bâtiments 049/050/054/055


Travaux préconisés :

	TABLEAU BATIMENT 055		INDICE A
	ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ARMOIRES DE DISTRIBUTIONS FORCE /ECLAIRAGE DU BATIMENT		RELEVÉ Juin 2020


RENSEIGNEMENT DE L'ARMOIRE					
Armoire	TD055	Niveau	R de C	Amont	TGBT
IG / DG	4x250A			Câbles d'alimentation	
Etat visuel de l'armoire		<input type="checkbox"/> Mauvais	<input checked="" type="checkbox"/> Passable	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Très Bon
Taux de remplissage	60%	Repérage de l'armoire, filerie, équipements etc...		<input checked="" type="checkbox"/> Complète	<input type="checkbox"/> Incomplète

PHOTOS DE L'ARMOIRE



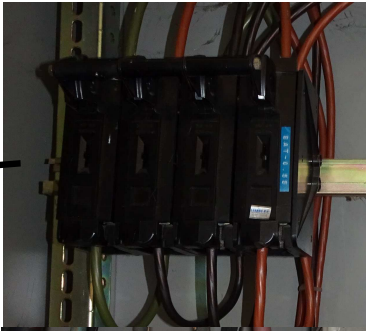


1

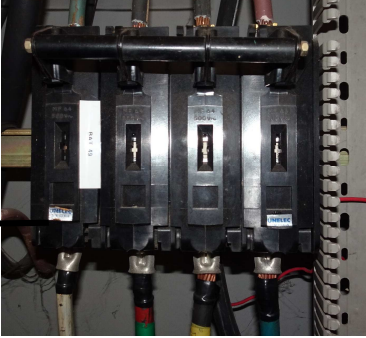

2



3

Observations :


1 : Départ bâtiment 055

2 : Départ bâtiment 049

3 : Départ bâtiment 054


Câble d'alimentation entre TGBT et tableau du bâtiment 055 non connu

Travaux préconisés :

	TABLEAU BATIMENT 049		INDICE A
	ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ARMOIRES DE DISTRIBUTIONS FORCE /ECLAIRAGE DU BATIMENT		RELEVÉ Juin 2020


RENSEIGNEMENT DE L'ARMOIRE					
Armoire	TD049	Niveau	R de C	Amont	TD055
IG / DG	4x63A			Câbles d'alimentation	
Etat visuel de l'armoire		<input checked="" type="checkbox"/> Mauvais	<input type="checkbox"/> Passable	<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Très Bon
Taux de remplissage	80%	Repérage de l'armoire, filerie, équipements etc...		<input type="checkbox"/> Complète	<input checked="" type="checkbox"/> Incomplète

PHOTOS DE L'ARMOIRE

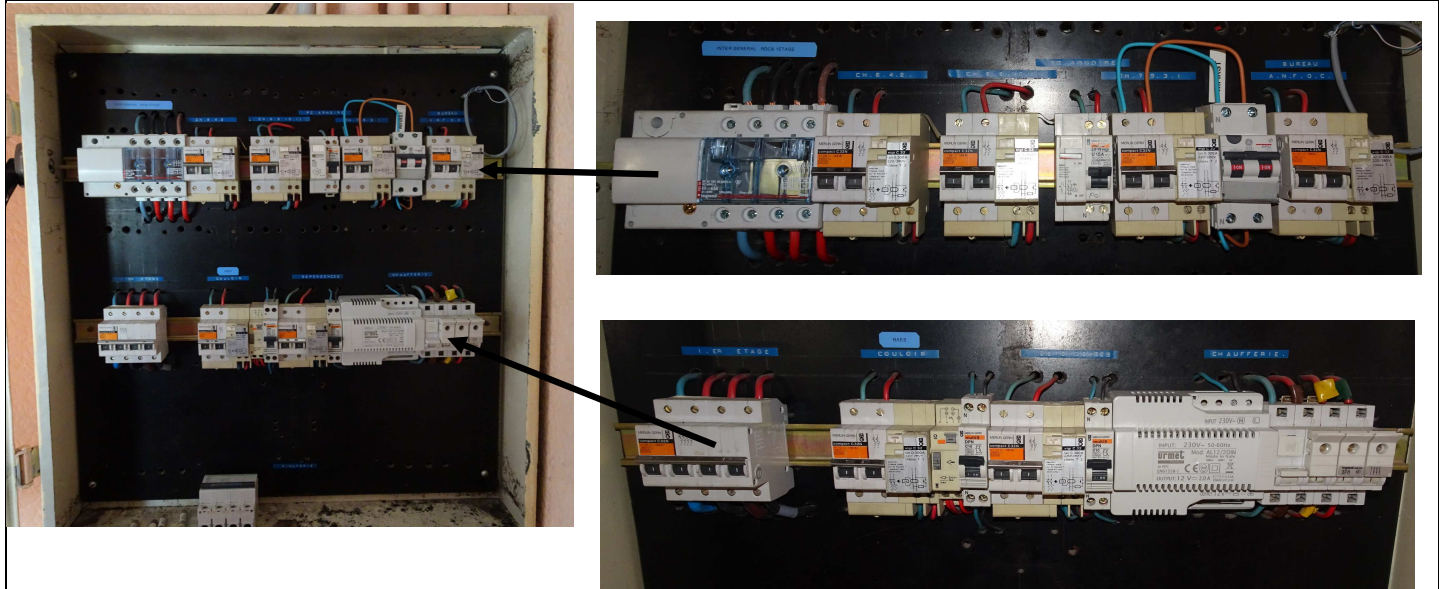


Observations :
 Tableau à refaire
 Câble d'alimentation correct par rapport aux calculs CANECO

Travaux préconisés :

	TABLEAU BATIMENT 054		INDICE A
	ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ARMOIRES DE DISTRIBUTIONS FORCE /ECLAIRAGE DU BATIMENT		RELEVÉ Juin 2020

RENSEIGNEMENT DE L'ARMOIRE							
Armoire	TD049	Niveau	R de C	Amont	TD055	4x125A	
IG / DG				Câbles d'alimentation		4G120 mm²	
Etat visuel de l'armoire		<input checked="" type="checkbox"/> Mauvais		<input type="checkbox"/> Passable		<input type="checkbox"/> Bon	<input type="checkbox"/> Très Bon
Taux de remplissage		80%		Repérage de l'armoire, filerie, équipements etc...		<input type="checkbox"/> Complète	<input checked="" type="checkbox"/> Incomplète
PHOTOS DE L'ARMOIRE							

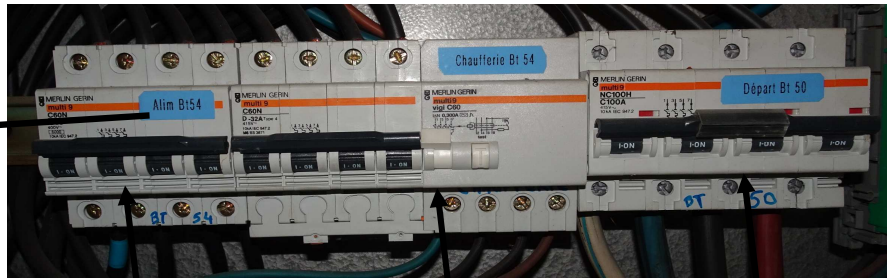


1

2




3

Observations :
 Tableau à refaire
 1 : Départ bâtiment 054
 2 : Départ chaufferie bâtiment 054
 3 : Départ bâtiment 050
 Câble d'alimentation incorrect par rapport aux calculs CANECO

Travaux préconisés :

	TABLEAU BATIMENT 050		INDICE A
	ETAT DES LIEUX CONCERNANT LES ARMOIRES DE DISTRIBUTIONS FORCE /ECLAIRAGE DU BATIMENT		RELEVÉ Juin 2020

RENSEIGNEMENT DE L'ARMOIRE						
Armoire	TD050	Niveau	R de C	Amont	TD054	4x100A
IG / DG	4x100A			Câbles d'alimentation		4G70 mm²
Etat visuel de l'armoire		<input checked="" type="checkbox"/> Mauvais		<input type="checkbox"/> Passable		<input type="checkbox"/> Bon
Taux de remplissage		80%		Repérage de l'armoire, filerie, équipements etc...		<input type="checkbox"/> Complète
						<input checked="" type="checkbox"/> Incomplète
PHOTOS DE L'ARMOIRE						

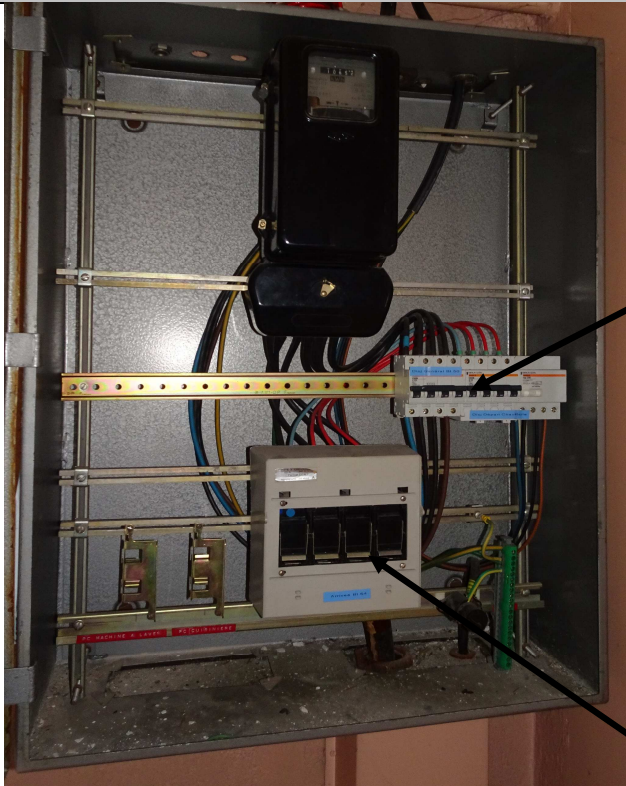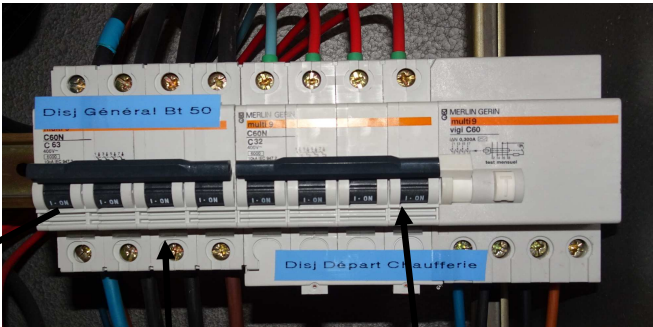2

3

1

Observations :

Tableau à refaire

1 : Arrivée du bâtiment 054

2 : Départ général bâtiment 054

2 : Départ chaufferie bâtiment 050

Câble d'alimentation incorrect par rapport aux calculs CANECO

Travaux préconisés :
