

BAS-RHIN - RÉGION GRAND-EST

NATZWILLER


Ancien Camp de Natzweiler Struthof
Route Départementale 130
67130 Natzwiller

RESTAURATION DE LA BARAQUE CUISINE
DE L’ANCIEN CAMP DE CONCENTRATION DE NATZWEILER-STRUTHOF

C.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
FÉVRIER 2025

Architecte en Chef des Monuments Historiques PIERRE DUFOUR	18, rue du sentier 75002 PARIS	T 06 48 08 91 90 M pdufouracmh@antoine-dufour.com
Economiste sous-traitant CABINET FRANCOIS	14, rue de Queuleu 57070 METZ	T 03 87 36 82 75 M pfrancois@cabinetvmh.com
BET Structure EQUILIBRE STRUCTURES	10, rue Saint-Nicolas 75012 PARIS	T 01 47 42 04 87 M c.millon@equilibre-structures.fr
BET Electrique B3E	38, rue Paul Diacre 57000 METZ	T 03 87 75 02 19 M b3elorrain@aol.com

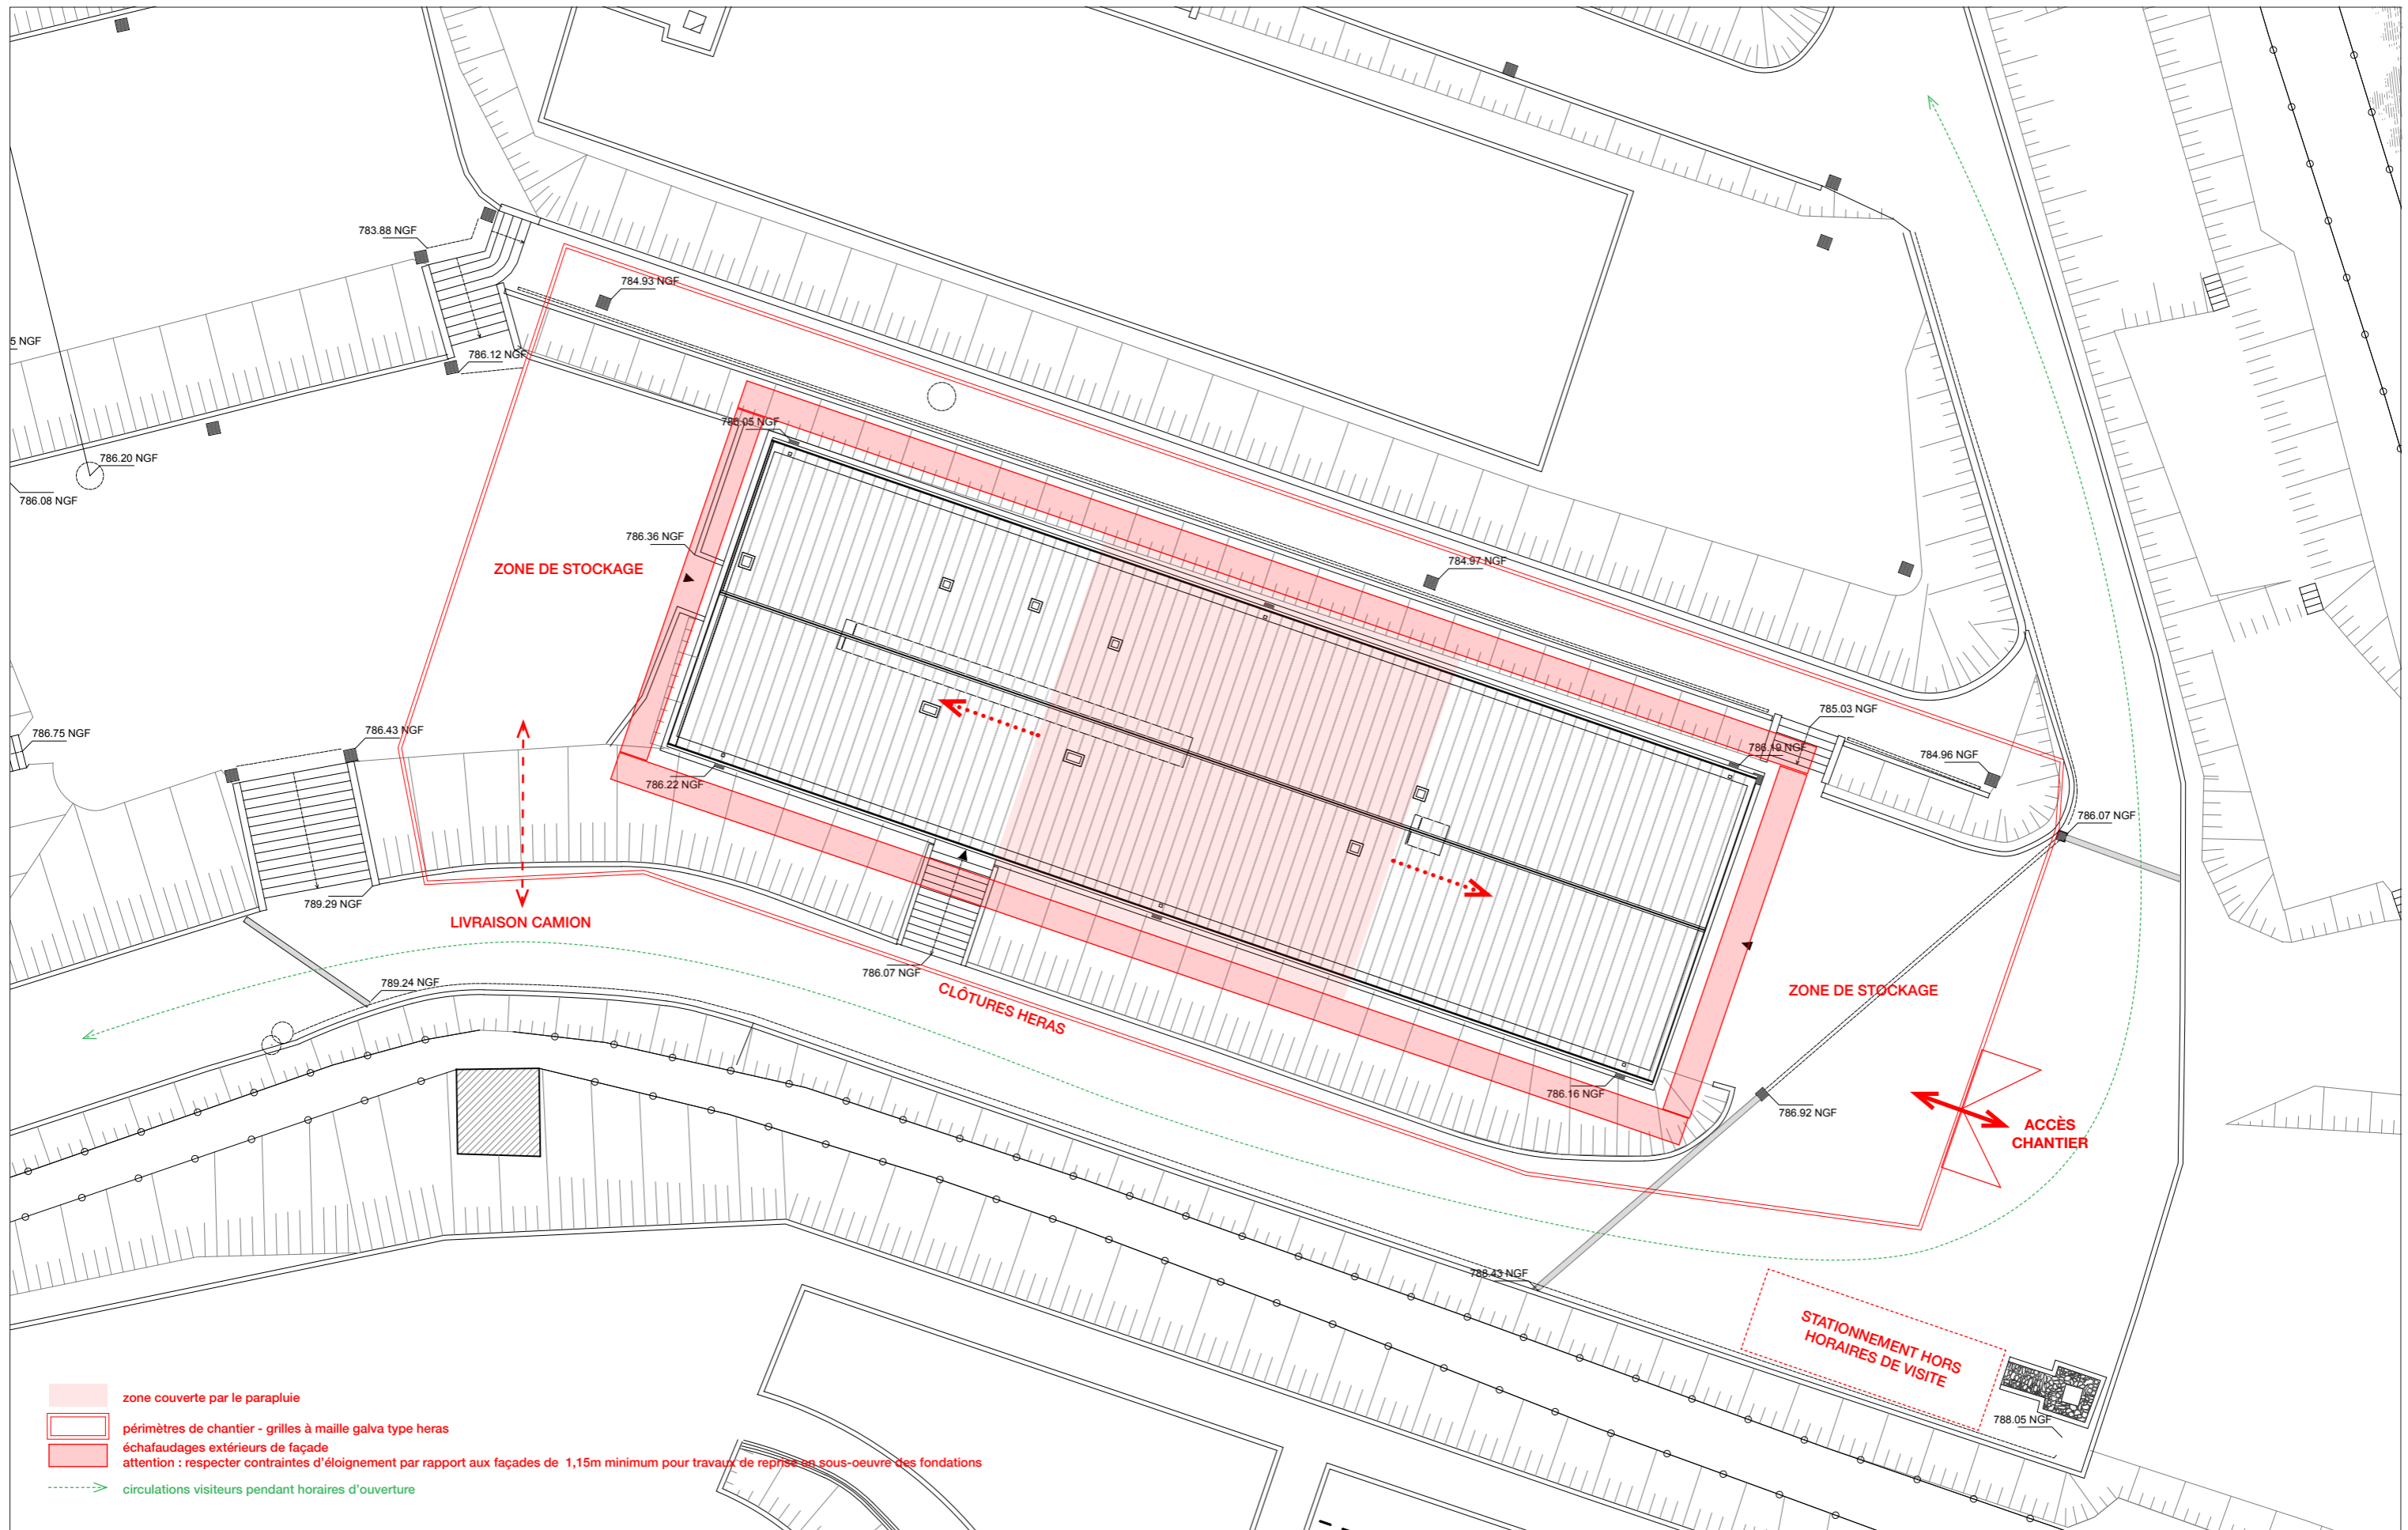

Ancien camp de Natzweiler - Struthof / Restauration de la baraque cuisine					0007- PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER																											
ONaCVG Hôtel National des Invalides 129, rue de Grenelle 75700 Paris Cedex 07	PIERRE DUFOURACMH 13, rue des Chenebrières 63200 Prompsat	EQUILIBRE STRUCTURE 10, rue saint-nicolas 750102 Paris	B3E 38, rue Paul Diacre 57000 METZ	CABINET FRANÇOIS 14, rue de Queuleu 57070 METZ	-	-	DCE			1	7	0	2	2	5	-	-	-	-	-	1	2	5	0	-	-	0	0	5	3	-	-
maîtrise d'ouvrage	acmh mandataire	BET Structure sous-traitant	BET Electricité - CVC sous-traitant	Economiste sous-traitant	coordination SPS	bureau de contrôle	phase			date				modifié le			échelle			numéro folio			indice									

PHASE 1

- mise en place du parapluie sur 1/3 de la surface, puis ajustement au droit des zones découvertes à l'avancement

- mise en place des tours d'étalement intérieures

- dépose couvertures et voliges

- dépose des façades et menuiseries extérieures

- dépose des cloisons et menuiseries intérieures

PHASE 2

- reprises en sous-oeuvre

- reprises et consolidations de charpente

- reprises des maçonneries des conduits de cheminée

- mise en oeuvre du drainage

PHASE 3

- réfection de la couverture

- repose des façades et des menuiseries extérieures

- mise sous étanchéité à l'eau de l'édifice

PHASE 4

- dépose des échafaudages extérieurs

- travaux intérieurs : cloisons, menuiseries intérieures, électricité, équipements

- travaux sur abords : dallages des caniveaux au dessus du drainage périphérique ; reprofilage des talus
