



Monchy le preux, le 22 octobre 2024

RAPPORT FIN DE TRAVAUX (RFT)

Valant DOE (dossier ouvrage exécuté)

Valant PV de réception

Chantier n° : 3D24-135

1. IDENTIFICATION DU BATIMENT

1.1 Adresse de l'établissement :

Route de l'Aéroport, 59814 LESQUIN

1.2 Locaux concernés :

G19 (salle Groupes) - G15 (Magasin 1)



2. TRAVAUX DE RETRAIT DE MCA (matériaux contenant amiante)

DGAC – SNA-NORD agissant en tant que Maître d'ouvrage, nous a missionné pour le retrait des MCA de cet ouvrage selon le(s) diagnostic(s) référencé(s) ci-dessous.

Nom	Date / ref	Type
INGEO	16.05.2022 / DG22.0257	Avant travaux

Ces travaux ont fait l'objet d'autocontrôles par l'entreprise 3D NORD, et d'analyses au cours du chantier.

Les analyses libératoires réalisées avant de replier attestent une présence résiduelle de fibres d'amiante inférieure à 5 fibres/Litre dans les zones traitées.

3. MATERIAUX (MCA) TRAITES ET NON TRAITÉS

Nous avons traité une partie seulement des matériaux repérés dans le(s) rapport(s) de repérage fourni(s) par le maître d'ouvrage (répertorié ci-dessus) :

Liste des matériaux à traiter (vendu dans le marché)

Attention, il s'agit uniquement des matériaux qui sont à traités dans le cadre du marché signé, s'il y a d'autres matériaux amiantés, non vendu dans le marché, ils ne figurent pas dans ce document.



MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE :

Numéro Porte Partie Privative	Etag e	Local (voir liste)	N° Prélèvement	Type Composant	Composant	Elément	Matériaux (CODIF)	Zone concernée	List e	Résultat d'analyse	Quantité Estimée	Unité Quantit é	ZPS O
AL/1	0	Tgbt	DG22.0257_P001	Planchers et planchers techniques	Revêtement s de sols	Sol	Dalle Plastique + Colle Bitumineuse + Ràgrèage	tout	C	A	14,25	m²	ZPS O1
AL/1	0	Magasin 1	DG22.0257_P001	Planchers et planchers techniques	Revêtement s de sols	Sol	Dalle Plastique + Colle Bitumineuse + Ràgrèage	tout	C	A	2,25	m²	ZPS O1
AL/1	0	Onduleur bleu	DG22.0257_P007	Murs et cloisons, parois verticales intérieures	Revêtement s	Mur	Colle de Plinthe	ABCD	C	A	12	ml	ZPS O7
AL/1	0	Salle groupe	DG22.0257_P007	Murs et cloisons, parois verticales intérieures	Revêtement s	Mur	Colle de Plinthe	CF	C	A	16,82	ml	ZPS O7
AL/1	0	Onduleur Vert	DG22.0257_P007	Murs et cloisons, parois verticales intérieures	Revêtement s	Mur	Colle de Plinthe	AB	C	A	1,9	ml	ZPS O7

À la demande du client, nous ne traitons pas l'intégralité des matériaux référencés dans le(s) rapport(s) de repérage référencé(s).

L'analyse des rapports de repérage fournis nous permet de rédiger le plan de retrait sans réserve.

Documents fournis à l'appui du dossier par le client :

Documents fournis	Prestataire, date et référence
Diagnostic avant travaux	<p>INGEO</p> <p>16/05/2022</p> <p>Rapport : DG22.0257</p>



4. LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS

- Le(s) analyse(s).


Mesures initiales	3
Mesures pendant les travaux	12
Mesures libératoires	4
Tests lingettes plomb	0

- Le croquis ou schéma issu du diagnostic amiante avec la localisation des matériaux amiantés que nous avons traité. Si nécessaire, localisation des matériaux amiantés NON traités.
- Les CAP et BSDA relatifs au chantier, signés par l'ensemble des parties.

PLAN

INTERIEUR


Phase 1

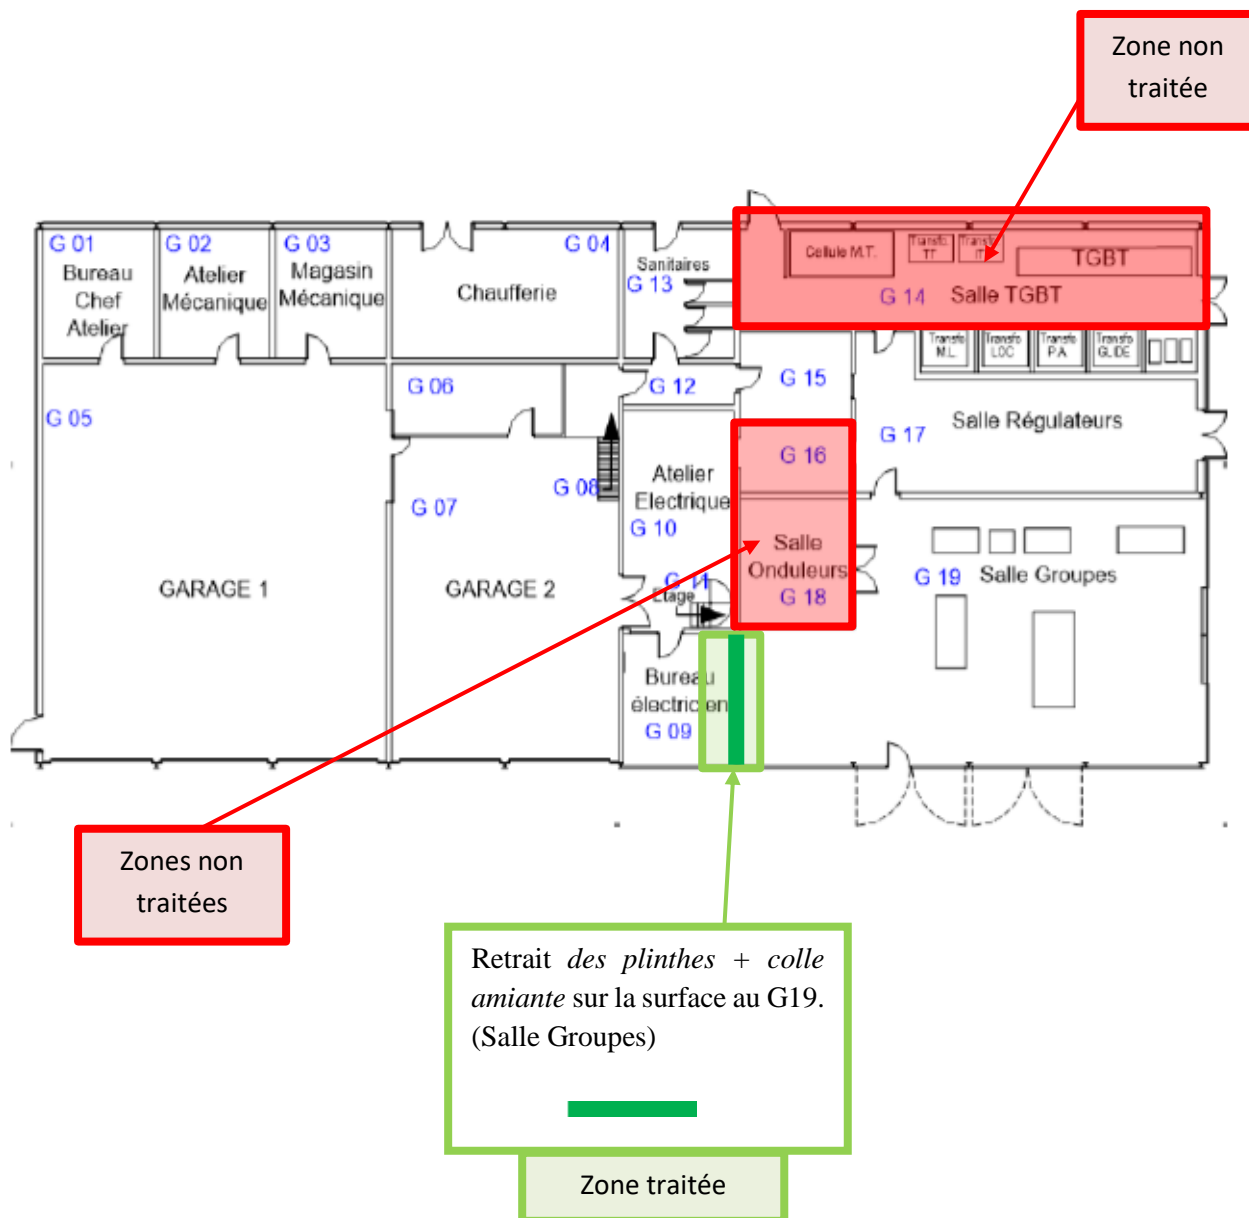

PLAN

INTERIEUR

Phase 2

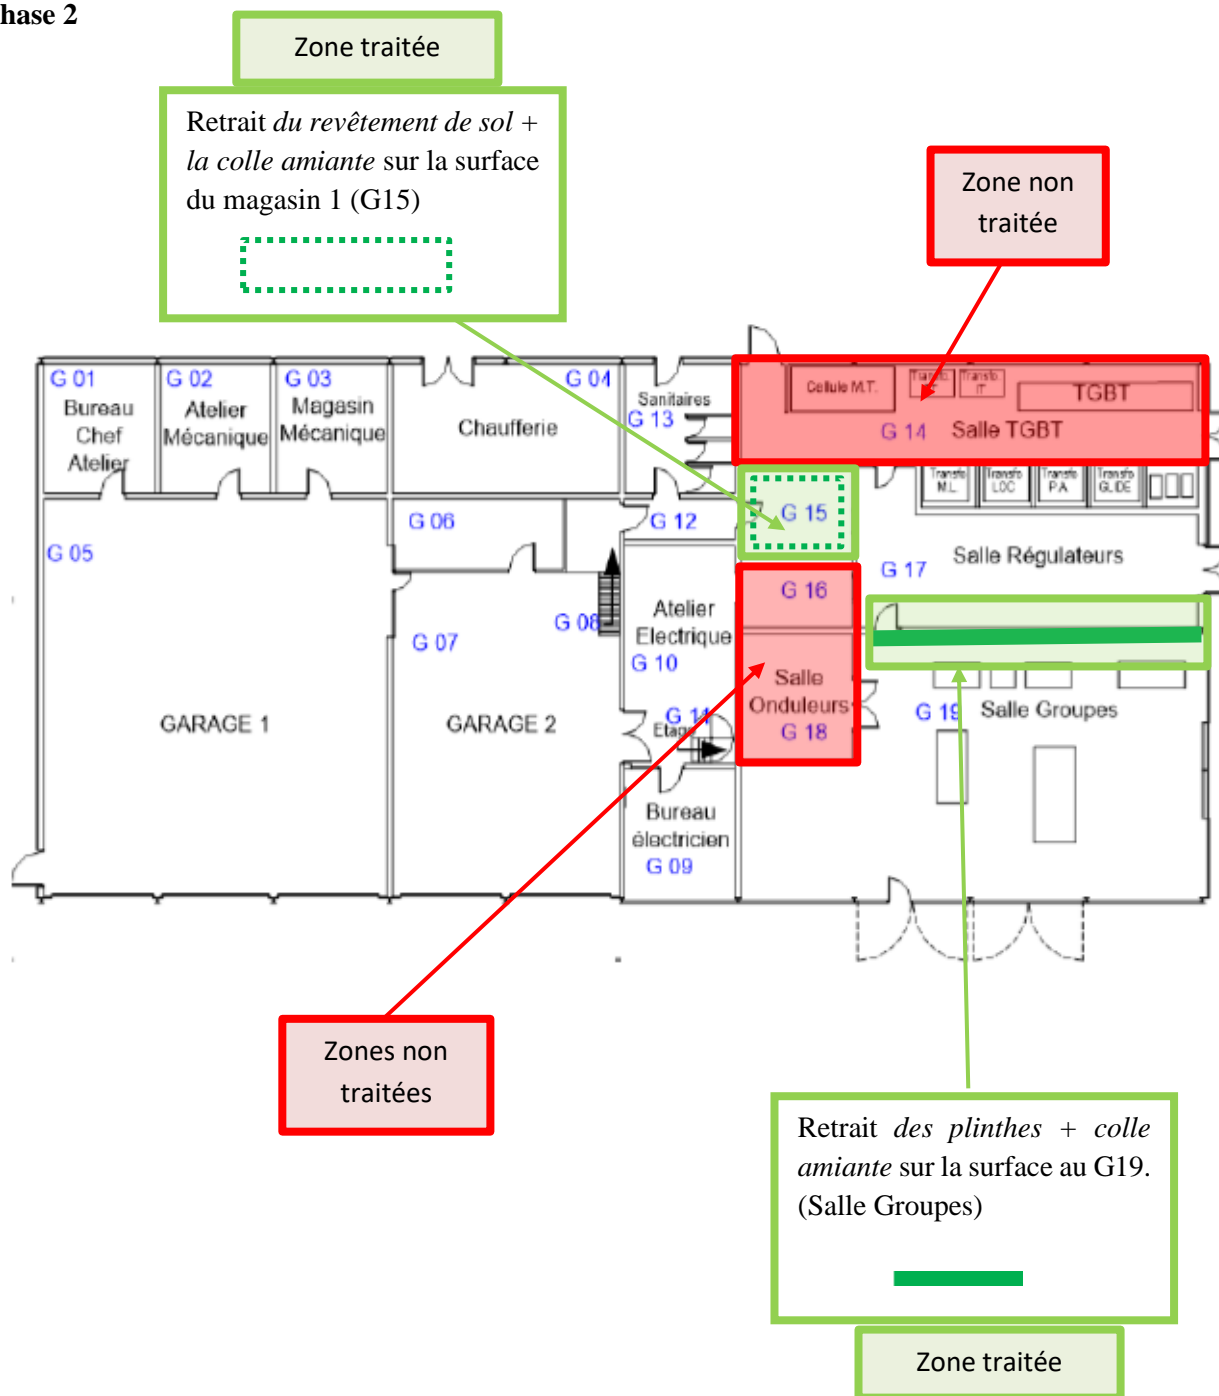



5. DESTINATION

Ce document délivré en un seul original, est destiné au Maitre d'Ouvrage uniquement ;

Il doit être conservé sans limitation de durée dans les archives du bâtiment concerné et intégré au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il doit être présenté lors de la mise à jour du DTA (dossier technique amiante) du bâtiment. Ce dernier étant consultable dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

Sans contestation dans un délai d'un mois à réception de ce dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci vaut PV de livraison définitif et engage son destinataire au complet paiement des prestations et acceptation du dossier définitif.

Le bureau d'études 3D NORD

Le 22 octobre 2024

Mme LEFEBVRE.

Signature

3D NORD
71 rue de Wancourt
62118 MONCHY-LE-PREUX
Siret 844 506 857 00011
Tél. 03 21 22 14 45 / Fax 01 55 04 94 22

LEFEBVRE
