

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence : 50057-106644

Le 29/08/2022



<u>Bien</u> :	Ouvrage d'art
<u>Adresse</u> :	4058 déchargeoir de Tronchoy
	89700 CHENEY
<u>Numéro de lot</u> :	Non communiqué
<u>Référence Cadastre</u> :	Non communiqué
<u>Référence externe</u> :	4058 déchargeoir de Tronchoy

PROPRIETAIRE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5
CENTRE BOURGOGNE
1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229
21062 DIJON CEDEX

DONNEUR D'ORDRE

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5
CENTRE BOURGOGNE
1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229
21062 DIJON CEDEX

Date de visite : 06/07/2022

Opérateur de repérage : BENYAICHE Abdellah

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux


Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



Numéro de rapport	50057-106644 A
Propriétaire	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE 1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX
Donneur d'ordre	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE 1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX
Nom et adresse du site	4058 déchargeoir de Tronchoy 89700 CHENEY
Date de la commande	Coordonnées GPS : / 15/02/2022
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	06/07/2022
Date d'émission du rapport de repérage	29/08/2022
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Non communiqué

Signataire du rapport

Signature et Visa




ADIAQ
30 Bd Maurice Pourchon
63100 CLERMONT FERRAND
Siret : 483 336 319 00213
Tél : 04 81 91 31 22 - clermont-ferrand@adiag.apave.com

Opérateur de repérage :
BENYAICHE Abdellah
ADIAQ

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **ne contenant pas d'amiante** :

Elément	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Vanne	Toutes zones	Vanne	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001
Garde corps	Toutes zones	Garde corps n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002
	Toutes zones	Garde corps n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z002
	Toutes zones	Garde corps n°3	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z002
Maçonnerie	Toutes zones	Mur 1	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
	Toutes zones	Mur 3	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
	Toutes zones	Mur 2	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Commentaires :

Néant

Légende :

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE :	4
PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	6
ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE	7
ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES.....	8
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	10
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	12
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	14
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	15

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.

Référence de l'ordre de mission : 50057-106644	Référence du donneur d'ordre : 4058	déchargeoir de Tronchoy
---	--	--------------------------------

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE
Adresse du propriétaire :	1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX
Représenté par :	
Donneur d'ordre :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE
Accompagnateur :	Aucun
Opérateur ayant réalisé le repérage :	BENYAICHE Abdellah
N° de certification de l'opérateur :	CPDI4180
Organisme :	I.Cert
Nom et adresse de l'entreprise :	ADIAG - 30 boulevard Maurice Pourchon - 63100 CLERMONT-FERRAND
N° de Siret :	48333631900213
RCP-compagnie-n° de police :	AXA IARD - RC 5271124804

1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	4058 déchargeoir de Tronchoy - 89700 CHENEY
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :	

1.4 Identification du laboratoire :

Nom :	Agence ITGA St Etienne	N° d'accréditation :	1-1761
Adresse complète :	44 rue Jean Huss 42000 SAINT-ÉTIENNE		

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Remise en peinture, plus travaux de la maçonnerie.

2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des éléments / Parties d'éléments visités

Eléments et parties d'éléments
Vanne
Garde corps
Maçonnerie

➤ **Liste des éléments non accessibles :**

Néant

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

Néant

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Néant

3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

➤ **Ecart, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :**

Sans objet

➤ **Dates et nature des visites sur site :**

Date	Objet
06/07/2022	Repérage amiante et plomb avant travaux

➤ **Analyse documentaire :**

Auteur / Société	Titre	Référence	Date	Objet
VNF	Bon de commande	2022-05	01/03/2020	Repérage amiante et plomb avant travaux

➤ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :

Néant

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➤ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré

➤ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Vanne	Toutes zones	Vanne	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001
Garde corps	Toutes zones	Garde corps n°1	Métal - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002
	Toutes zones	Garde corps n°2	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z002
	Toutes zones	Garde corps n°3	Métal - Peinture	Résultat d'analyse	Z002
Maçonnerie	Toutes zones	Mur 1	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
	Toutes zones	Mur 3	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	
	Toutes zones	Mur 2	Pierres - Brut	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante	

Légende :


ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage


CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante

Néant

ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

ELEMENT : Mur 1		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 50057-106644	Elément – Ouvrage Maçonnerie - Mur 1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur BENYAICHE Abdellah	Date de prélèvement	Partie d'ouvrage Pierres - Brut
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001		
Emplacement : 		
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 50057-106644	Elément – Ouvrage Vanne - Vanne - Toutes zones
Nom de l'opérateur BENYAICHE Abdellah	Date de prélèvement 06/07/2022	Partie d'ouvrage Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :	
Objet : Métal / Peinture Planche de croquis n° :	

PRELEVEMENT : P002


Emplacement :



Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 50057-106644	Élément – Ouvrage Garde corps - Garde corps n°1 - Toutes zones
Nom de l'opérateur BENYAICHE Abdellah	Date de prélèvement 06/07/2022	Partie d'ouvrage Métal - Peinture
Résultat amiante : Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet	Planche de croquis n :	
Métal / Peinture		

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°2	N° planche : 1/1	N° dossier : 50057-106644	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT	Version : 0	Adresse : 4058 déchargeoir de Tronchoy 89700 CHENEY	
Intervenant : BENYAICHE Abdellah	Date : 29/08/2022		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics			
Commentaire :		Localisation :	Lieu / Zone : Déchargeoir

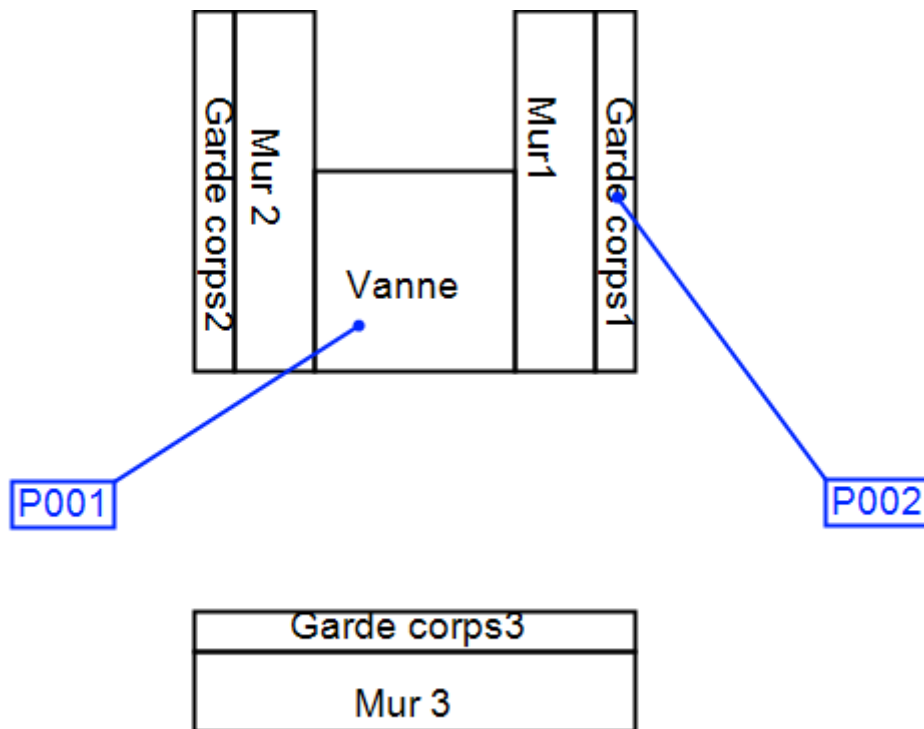

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

Document 1



44 rue Jean Huss
42000 SAINT ETIENNE
Tel : 04.77.79.52.80
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-15476 EN DATE DU 20/07/2022 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : ADIAG CLERMONT- FERRAND ADIAG chez APAVE 30 boulevard Maurice Pourchon 63100 Clermont-Ferrand	Réf. Commande ITGA : IT1122-15476 Réf. Commande Client : 50057-106644--1875--3026--529-163927594
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 15/07/2022

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE + - 4058 déchargeoir de Tronchoy - 89700 - CHENEY		Réf échantillon ITGA : IT112207-12859	
Réf échantillon client : P001 - Métal - Peinture - Vanne - Toutes zones - Vanne		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 20/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KAZ (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1122-15476 EN DATE DU 20/07/2022 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE + - 4058 déchargeoir de Tronchoy - 89700 - CHENEY		Réf échantillon ITGA : IT112207-12860	
Réf échantillon client : P002 - Métal - Peinture - Vanne - Toutes zones - Garde corps		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 20/07/2022 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : MZH (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Arnaud VARILLON Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 16

Page 2/2

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnostic Immobilier

N° CPDI 4180 Version 008

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BENYAICHE Abdellah

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/12/2021 - Date d'expiration : 19/12/2028
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 26/11/2020 - Date d'expiration : 25/11/2027
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 26/11/2020 - Date d'expiration : 25/11/2027
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 21/11/2021 - Date d'expiration : 20/11/2028
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 21/11/2021 - Date d'expiration : 20/11/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 11/01/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2019 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes
Diagnostic Immobilier
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE : Attestation d'assurance



Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE DEVELOPPEMENT et de sa filiale ADIAG SA**

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° **10800807204**, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Contrat RC n° 10800807204 2/2

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du **01/01/2022 au 31/12/2022** inclus sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 30/12/2021

Par délégation

POUR L'ASSUREUR :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
