

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante Avant réalisation de travaux

Ecluse Ile Brûlée

Articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issus du décret 2017-899 du 9 mai 2017 – Norme NF X46-102 novembre 2020



Numéro de rapport	83770-170045 A
Propriétaire	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE 1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX
Donneur d'ordre	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE 1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX
Nom et adresse du site	Barrage de l'Ile Brûlée 13 Rue Colonel Rozanoff 89000 Auxerre
Date de la commande	17/01/2025
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	22/05/2025
Date d'émission du rapport de repérage	25/06/2025
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Se référer au §2 du présent rapport

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
10, place Fulgence Bienvenüe
77600 BUSSY-ST-GEORGES
Tél. : 33 (0)1 82 83 68 82
bussy@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00080

Opérateur de repérage :
GOUILLARDON Alban
Apave Diagnostics

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l'accord écrit de son signataire.

- Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits **ne contenant pas d'amiante** :

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Passerelle	Extérieur	Extérieur	Poteau	Peinture vert clair	Résultat d'analyse (P001)	//
		Extérieur	Poteau	Peinture orange	Résultat d'analyse (P002)	//
		Extérieur	Main-courante	Peinture vert clair	Résultat d'analyse (P003)	//
		Extérieur	Main-courante	Peinture orange	Résultat d'analyse (P004)	//

Commentaires :

Néant

Légende :

ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage

CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	4
OBJET DE LA MISSION :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	4
IDENTIFICATION COMPLETE DU SITE CONCERNE :	4
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE :	4
PROGRAMME DETAILLE DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE	4
PERIMETRE DU REPERAGE : ELEMENTS ET PARTIES D'ELEMENTS CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	5
RESULTATS DU REPERAGE - LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES.....	6
ANNEXE - TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES D'AMIANTE	6
ANNEXE : FICHES DESCRIPTIVES DES ELEMENTS ET COMPOSANTS REPERES.....	7
ANNEXE : PLANS / CROQUIS.....	9
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE.....	11
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE.....	13
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	14

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers.

Référence de l'ordre de mission : **83770-170045**

Référence du donneur d'ordre : **Ecluse Ile Brûlée**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire du site : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE**

Adresse du propriétaire : **1 Chemin Jacques de Baerze - CS 36229 21062 DIJON CEDEX**

Représenté par :

Donneur d'ordre : **VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE**

Accompagnateur : **Aucun**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **GOUILLARDON Alban**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI5286**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES**

N° de Siret : **48333631900080**

RCP-compagnie-n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète du site concerné :

Dénomination : **Barrage**

Adresse complète : **13 Rue Colonel Rozanoff - 89000 Auxerre**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le site concerné :

1.4 Identification du laboratoire :

Nom : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

N° d'accréditation : **1-1593**

Adresse complète : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

2 Programme détaillé de Travaux du donneur d'ordre

Programme détaillé de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, éléments et parties d'éléments à inspecter :

Sécurisation des barrages

2.1 Périmètre du repérage : éléments et parties d'éléments concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des éléments / Parties d'éléments visités

Eléments et parties d'éléments

Passerelle

➤ Liste des éléments non accessibles :

Néant

Rapport n° : 83770-170045 A / Référence du donneur d'ordre : Ecluse Ile Brûlée

Apave Diagnostics - 10 Place Fulgence Bienvenue - 77600 - BUSSY-SAINT-GEORGES

SIRET : 48333631900080 Tél : 01 82 83 68 82 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

Néant

➤ **Liste des parties d'éléments non accessibles :**

(Impossibilité technique d'effectuer un prélèvement et/ou un sondage)

Néant

3 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers., susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de travaux.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers, objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique ou contre-indication) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche descriptive des équipements et composants en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

➤ **Ecart, adjonctions ou suppression par rapport à la norme NF X 42-102 et justification de cet écart :**

Les sondages ne sont pas représentés sur la cartographie

➤ **Dates et nature des visites sur site :**

Date	Objet
22/05/2025	Repérage amiante avant-travaux

➤ **Analyse documentaire :**

Aucun documents remis.

➤ **Rapports précédemment réalisés :**

Néant

Information relative aux conditions spécifique du repérage :

Néant

4 Résultats du repérage - Liste des matériaux et produits repérés

➤ **Matériaux et produits contenant de l'amiante :**

Aucun matériaux et produits contenant de l'amiante a été repéré

➤ **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante :**

Elément	Etage	Zone	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Critère de décision	Référence ZPSO/CPSM
Passerelle	Exterieur	Extérieur	Poteau	Peinture vert clair	Résultat d'analyse (P001)	//
		Extérieur	Poteau	Peinture orange	Résultat d'analyse (P002)	//
		Extérieur	Main-courante	Peinture vert clair	Résultat d'analyse (P003)	//
		Extérieur	Main-courante	Peinture orange	Résultat d'analyse (P004)	//

Légende :


ZPSO : Zone présentant des similitudes d'ouvrage


CPSM : Couche présentant des similitudes de matériaux

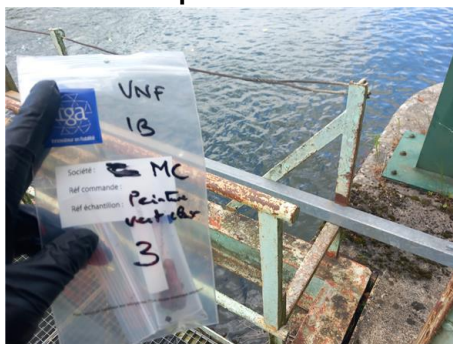
ANNEXE - Tableau estimatif des quantités d'amiante

Néant

ANNEXE : Fiches descriptives des éléments et composants repérés

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 83770-170045	Elément – Ouvrage Extérieur - Passerelle - Poteau - Extérieur	
Nom de l'opérateur GOUILLARDON Alban	Date de prélèvement 22/05/2025	Partie d'ouvrage Peinture vert clair	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Peinture vert clair		Planche de croquis n :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche J01-COUCHE	Description visuelle Matériau de type peinture (vert) + (orange)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 83770-170045	Elément – Ouvrage Extérieur - Passerelle - Poteau - Extérieur	
Nom de l'opérateur GOUILLARDON Alban	Date de prélèvement 22/05/2025	Partie d'ouvrage Peinture orange	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet Peinture orange		Planche de croquis n :	
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche J01-COUCHE	Description visuelle Matériau de type peinture (vert) + (orange)	Epaisseur (cm) 0	Conclusion amiante Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003
Emplacement :


Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 83770-170045	Elément – Ouvrage Exterieur - Passerelle - Main- courante - Extérieur
Nom de l'opérateur GOUILLARDON Alban	Date de prélèvement 22/05/2025	Partie d'ouvrage Peinture vert clair

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Peinture vert clair	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) + (orange) ; matériau semi-dur (gris)	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE	Numéro de dossier 83770-170045	Elément – Ouvrage Exterieur - Passerelle - Main- courante - Extérieur
Nom de l'opérateur GOUILLARDON Alban	Date de prélèvement 22/05/2025	Partie d'ouvrage Peinture orange

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n :
Peinture orange	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
J01-COUCHE	Matériau de type peinture (vert) + (orange)	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Photographie des prélèvements		N° planche : 1/1	N° dossier : 83770-170045	Type : Croquis
Client : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT		Version : 0	Adresse : Barrage 13 Rue Colonel Rozanoff 89000 Auxerre	
Intervenant : GOUILLARDON Alban		Date : 25/06/2025		
Origine du plan : Cabinet de diagnostics				
Commentaire : //			Localisation :	Lieu / Zone :



ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

PV_00720250601584036



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord SAS

APAVE DIAGNOSTICS
Monsieur Alban GOUILLARDON
Chez Apave - 10 Place Fulgence Bienvenue
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-065667-01 Date d'émission de rapport : 14/06/2025 0:30 Page1/2
Dossier N° : 25N026641 Date de réception : 11/06/2025 Date d'analyse : 12/06/2025
Référence dossier Client:
83770-170045 A - 13 Rue Colonel Rozanoff 89000 Auxerre - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE
BOURGOGNE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-Exterieur - Passerelle - Extérieur - Poteau - Peinture vert clair	Matériau de type peinture (vert) + (orange)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-Exterieur - Passerelle - Extérieur - Poteau - Peinture orange	Matériau de type peinture (vert) + (orange)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-Exterieur - Passerelle - Extérieur - Main-courante - Peinture vert clair	Matériau de type peinture (vert) + (orange) ; matériau semi-dur (gris)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-Exterieur - Passerelle - Extérieur - Main-courante - Peinture orange	Matériau de type peinture (vert) + (orange)	MET * / M2RG	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS
557, route de Noyelles, PA du Pommier
F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE
Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1593
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-HB-065667-01

Date d'émission de rapport : 14/06/2025 0:30

Page 2/2

Dossier N° : 25N026641

Date de réception : 11/06/2025

Date d'analyse : 12/06/2025

Référence dossier Client:

83770-170045 A - 13 Rue Colonel Rozanoff 89000 Auxerre - VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LOT 5 CENTRE BOURGOGNE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables" inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Laurie Wasielewski
Technicien Analyste

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

557, route de Noyelles, PA du Pommier

F-62110 Henin-Beaumont, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 294 035 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1593

Portée disponible sur

www.cofrac.fr

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI5286 Version 007

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GOUILLARDON Alban

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/03/2020 - Date d'expiration : 15/03/2027
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 01/12/2022 - Date d'expiration : 30/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/09/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DIFR 11 rev19

ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ **03 89 61 64 64**
📠 **08 20 20 26 32**

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **09 janvier 2025**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport
