

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 25462494/S1/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 29/04/2025

Référence au programme de travaux :

N°Code RAP : M62B001 réalisé le 01/07/2024 par CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OPALE

DONNEUR D'ORDRE

CPAM de CALAIS

GREGORY MALAHIEUDE

35 RUE DESCARTES

62100 CALAIS

SITE D'INTERVENTION

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OPALE

35 RUE DESCARTES

62100 CALAIS

C.P.A.M de CALAIS (Siège)

Code site : M62B001A

Latitude : 50.950700 / Longitude : 1.862100




SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Julien BECART	Diagnosticteur	CPDI 3551	Julien BECART
David SAMPE	CHARGE D AFFAIRES	15032549	

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	7
2.2. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	16
7. ANNEXES	16
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	16
7.2. Photos prélèvements	17
7.3. Photos sondages	22
7.4. Photos inaccessibilités	24
7.5. Attestation d'assurance	26
7.6. Certificat de compétence	28
7.7. Croquis de repérage	29
7.8. Rapport d'analyse du laboratoire	34

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<p>Les travaux d'aménagements intérieurs envisagés sont les suivants (liste non exhaustive et non limitative) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de démolitions - Travaux de cloisonnements - Travaux de chauffage / ventilation / plomberie - Travaux de revêtements de sols - Travaux d'électricité : courants forts et faibles - Travaux d'adaptations du système de sécurité incendie - Travaux de compartimentage et de désenfumage - Travaux de plafonds suspendus / isolation et correction acoustiques - Travaux de revêtements muraux / peintures

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescents, Primaire d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement , Isolants, Joints d'écrans de cantonnement , Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gaines et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescents, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutremments, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entrecouche noire, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Peintures de sol, Sols coulés à base ciment
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutremments, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutremments, Ossature, Rebouchages, Volets
08 - Equipements divers et accessoires	
Equipements	Amortisseurs acoustiques, Bourre, Calorifugeages, Dispositifs anti condensation, Embrayage, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Freins d'ascenseurs, Joints, Joints d'étanchéité, Joints plats prédécoupés pour brides, Mastics, Peintures, Plaques isolantes externes, Plaques isolantes internes, Soufflets, Tissus, Tresses

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

Le présent programme concerne la mise en conformité incendie du site (tous niveaux concernés), ainsi que la restructuration des locaux repérés sur les plans de macro-zoning fournis ci-dessous.

Les niveaux concernés par les travaux de réaménagement sont ;

- Le niveau res-de-jardin (ERT),
- Le niveau rez-de-chaussée (ERP partiel et ERT),

La surface totale concernée par les travaux est d'environ 3 788 m² à laquelle s'ajoute la surface de l'espace de restauration d'environ 190 m².

Sont exclus au présent repérage (déjà réalisés via autres diagnostics)

- Blocs sanitaires.
- Cages d'escalier.
- Revêtement de sols type linoléum (RAAT effectué)

Tous les éléments amiantés trouvés dans les autres rapports ne font pas partie de la présente mission. La colle de brique se trouvant sur les sanitaires du niveau 1 , niveau 2, niveau 3, niveau 4 sont hors périmètre car déjà cités dans les rapports précédents

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
C.P.A.M de CALAIS - > REZ-DE-JARDIN (IA 2)	4- Plafonds et faux-plafonds - Ensemble des pléniums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du pléniums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds.	Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum	Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4
C.P.A.M de CALAIS - > REZ-DE-JARDIN -> Pléniums (IA 1)	4- Plafonds et faux-plafonds - Ensemble des pléniums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du pléniums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds.	Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum	Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4
C.P.A.M de CALAIS - > REZ-DE- CHAUSSEE (IA 3)	4- Plafonds et faux-plafonds - Ensemble des pléniums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du pléniums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds.	Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum	Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4
C.P.A.M de CALAIS - > REZ-DE- CHAUSSEE (IA 8)	6- Conduits et accessoires intérieurs - Volets de désenfumage	Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu	Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE.
35 RUE DESCARTES
62100 CALAIS

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE.	Etablissement sociaux	ERP de la 5ème catégorie	02/01/1977	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
GREGORY MALAHIEUDE	Donneur d'ordre	CPAM de CALAIS	35 RUE DESCARTES 62100 CALAIS	03 21 46 84 57
CPAM de la Côte d'Opale	Propriétaire	/	/	/
Grégory MALAHIEUDE	Accompagnateur	CPAM de la Côte d'Opale	Responsable Service Patrimoine	+33 6 01 71 94 30 - gregory.malahieude@assurance-maladie.fr

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 04/03/2025
Le 14/04/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité
- Les dossiers amiante réglementaires
- Les conditions de sécurité et des règles de sécurité

5.3. Conditions spécifiques

- Occupants ou exploitants nécessaires à certains accès non informés de l'intervention ou non présents
- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Moyens nécessaires pour accéder à certains matériaux non mis en oeuvre (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Avant projet détaillé / RESTRUCTURATION DU SITE DE CALAIS / MISE EN CONFORMITE INCENDIE	CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OPALE	01/07/2024	Code RAP : M62B001	/
Avant projet détaillé / Restructuration du site et mise en conformité incendie – CPAM côte d'Opale	/	02/02/2025	DIAGNOSTIC & ESQUISSE – NOTICE DESCRIPTIVE	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
 Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
 Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
 xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
 Sxx = Sondage n°xx
 xx* = élément témoin de la ZPSO
 Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
 AN = Analyse
 DC = Document consulté
 MA = Marquage
 PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P7* N	/	AN	Poutres	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	8	P8* N	/	AN	Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Faux plafonds	Plaques	Composite, Fibreux	/	9	P9* N	/	AN	Faux-Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Plafonds	Joints de dilatation	Fibreux	Marron	10	P10* N	/	AN	Joint de dilatation	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment	Gris	3	P3* N	/	AN	Colle de carrelage	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	Enduit ciment mur	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Dur	Gris	4	P4* N	/	AN	Colle de plinthe	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	5	P5* N	/	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P6* N	/	AN	Poteau	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Conduits	Calorifugeages	Feutre, Fibreux	/	2	P2* N	/	AN	Calorifuge Pléniums	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	Equipements	Joints	Compact, Fibreux	Marron, Blanc	11	P11* N	/	AN	Joint équipement ventilation	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Atelier	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	5	/	S8	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	7	P15 N	/	AN	Poutres	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	8	P16 N	/	AN	Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Faux plafonds	Plaques	Composite, Fibreux	/	15	P18* N	/	AN	Faux-Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Ciment	/	12	P12* N	/	AN	Base ciment	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	13	P13* N	/	AN	Enduit ciment mur	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	P14 N	/	AN	Poteau	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Equipements	Joints	Compact, Fibreux	Marron	14	P17* N	/	AN	Joint équipement ventilation	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	16	/	S1	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	16	/	S1	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	6	/	S3	AN	Poteau	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	13	/	S7	AN	Enduit ciment mur	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	16	/	S2	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	16	/	S2	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Chape, Ciment	/	12	/	S6	AN	Base ciment	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	8	/	S4	AN	Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Faux plafonds	Plaques	Composite, Fibreux	/	9	/	S5	AN	Faux-Plafond	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	5	P19 N	/	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Faux plafonds	Plaques	Composite, Fibreux	/	19	P22* N	/	AN	Faux-Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	20	P23* N	/	AN	Poutres	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	21	P24* N	/	AN	Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Faux plafonds	Plaques	Composite, Fibreux	/	19	P28 N	/	AN	Faux-Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	20	P29 N	/	AN	Poutres	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment	Gris	21	P30 N	/	AN	Plafond	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	17	P20* N	/	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	18	P21* N	/	AN	Poteau	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	17	P26 N	/	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment	Gris	18	P27 N	/	AN	Poteau	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Equipements	Joints	Compact, Fibreux	Marron, Blanc	22	P25* N	/	AN	Joint équipement ventilation	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Panneaux de cloisons	Carton, Plaque de plâtre	/	17	/	S12	AN	BA13	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	16	/	S9	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	16	/	S9	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	16	/	S10	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	16	/	S10	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Sous-couches des revêtements souples	Lé	/	16	/	S11	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	/	16	/	S11	DC	Rénovation des sols en 2012 (Diag RAAT effectués)	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
C.P.A.M de CALAIS	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Atelier	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Plénums	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Ensembles des bureaux	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Openspace	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Service médicale	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Ensemble des bureaux	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Plénums	/
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE -> Circulation	/

7.2. Photos prélèvements

P7	ZPSO 7
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 8
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P10	ZPSO 10
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Plafonds -> Joints de dilatation	


P3	ZPSO 3
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P1	ZPSO 1
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P4	ZPSO 4
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P5	ZPSO 5
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	


P6	ZPSO 6
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P2	ZPSO 2
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Conduits -> Calorifugeages (Liste A)	

P11	ZPSO 11
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de Restauration	
	
Equipements -> Joints	


P15	ZPSO 7
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P16	ZPSO 8
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P18	ZPSO 15
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P12	ZPSO 12
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


P13	ZPSO 13
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P14	ZPSO 6
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

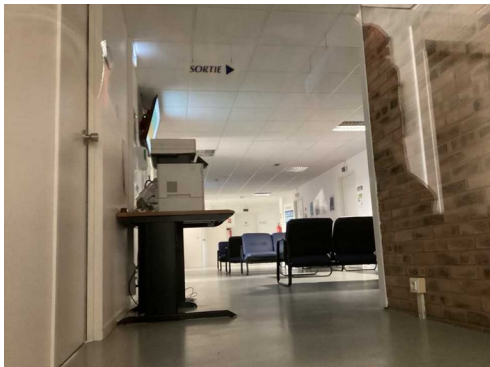
P17	ZPSO 14
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Equipements -> Joints	


P19	ZPSO 5
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

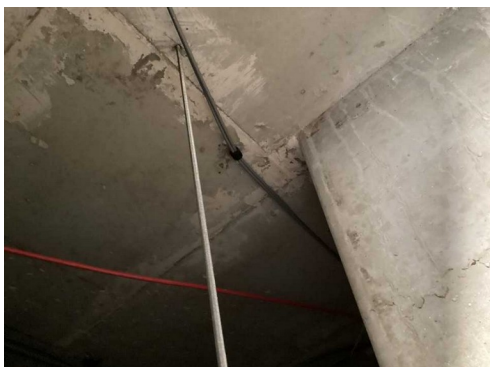
P22	ZPSO 19
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P23	ZPSO 20
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P24	ZPSO 21
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P28	ZPSO 19
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


P29	ZPSO 20
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Poutres -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P30	ZPSO 21
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P20	ZPSO 17
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P21	ZPSO 18
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P26	ZPSO 17
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Panneaux de cloisons (Liste B)	

P27	ZPSO 18
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 22
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Equipements -> Joints	


7.3. Photos sondages

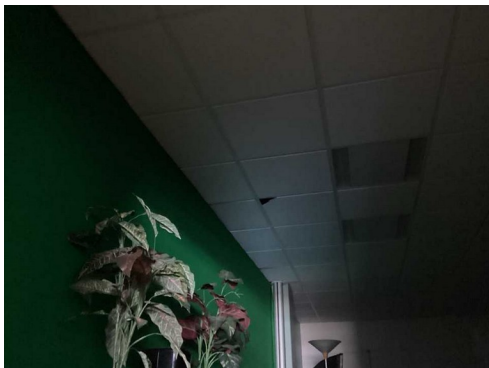
S1	ZPSO 16
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Imprimerie	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages	

S3	ZPSO 6
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S2	ZPSO 16
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages	

S6	ZPSO 12
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	


S4	ZPSO 8
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	


S5	ZPSO 9
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Salle de reunion / Stockage	
	
Faux plafonds -> Plaques (Liste A)	


S9	ZPSO 16
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages	


S10	ZPSO 16
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages	

S11	ZPSO 16
C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE	
	
Revêtements de sol -> Sous-couches des revêtements souples Ragréages	

C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN		IA 2
4- Plafonds et faux-plafonds		
Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des plénums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du plénums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds. Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-JARDIN -> Plénums		IA 1
4- Plafonds et faux-plafonds		
Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des plénums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du plénums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds. Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE		IA 3
4- Plafonds et faux-plafonds		
Présence d'équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) dans le plenum		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	<p>Ensemble des plénums, visibilité réduite sur l'ensemble des niveaux. Inspections total du plénums à réaliser après dépose des dalles de faux-plafonds. Déposer les équipement(s)/câblage(s)/conduit(s) par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>	

C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE		IA 8
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Volets de désenfumage Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront

C.P.A.M de CALAIS -> REZ-DE-CHAUSSEE		IA 8
6- Conduits et accessoires intérieurs		
Investigations destructives susceptibles d'altérer la fonction coupe-feu		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Volets de désenfumage Faire réaliser les investigations destructives par une entreprise qualifiée et compétente SS4 lorsque les conditions d'utilisation le permettront

7.5. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mэрule

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne

www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.140

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhofendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com

7.6. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 3551 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BECART Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 16/06/2022 - Date d'expiration : 15/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 16/12/2020 - Date d'expiration : 15/12/2027

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 15/06/2022.



Année du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Année du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Année du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amianté dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Année du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0523
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev18

7.7. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE. 35 RUE DESCARTES 62100 CALAIS	
Localisation C.P.A.M de CALAIS	Date visite	Le 04/03/2025
	Auteur	Julien BECART
	N° dossier	25462494/S1/1
	Planche	1 / 4
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE. 35 RUE DESCARTES 62100 CALAIS	
Localisation C.P.A.M de CALAIS > REZ- DE-JARDIN	Date visite	Le 04/03/2025
	Auteur	Julien BECART
	N° dossier	25462494/S1/I
	Planche	2 / 4
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

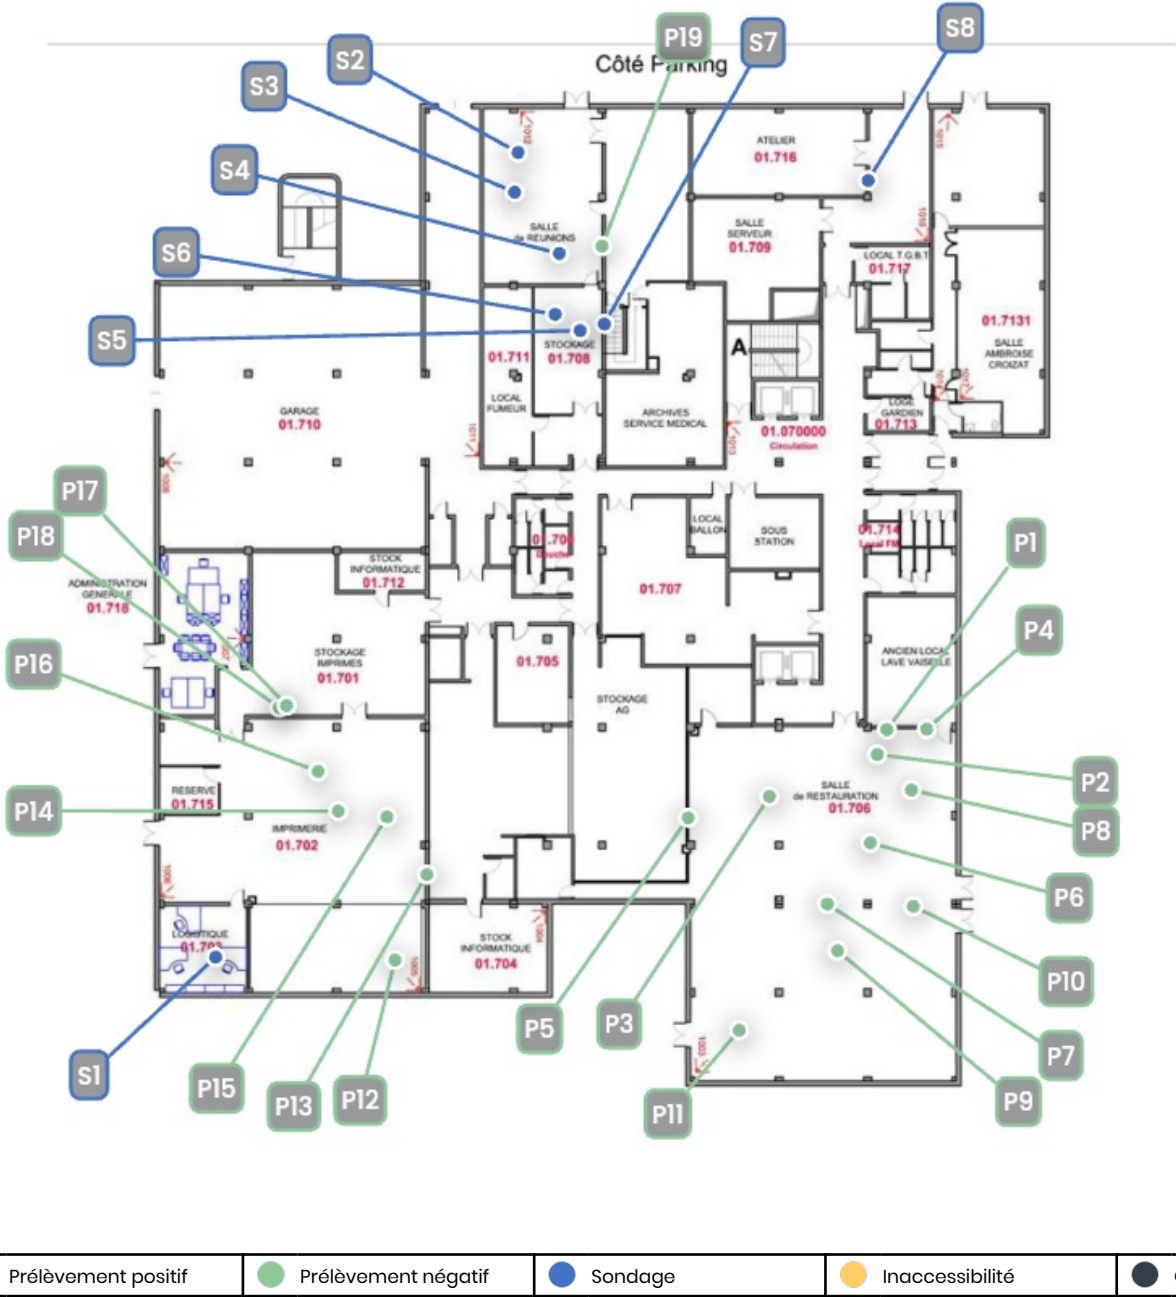


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE

La planche de repérage est indissociable du rapport

ADRESSE	CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE. 35 RUE DESCARTES 62100 CALAIS	
Localisation C.P.A.M de CALAIS > REZ- DE-JARDIN > Plénums	Date visite	Le 04/03/2025
	Auteur	Julien BECART
	N° dossier	25462494/S1/1
	Planche	3 / 4
	Indice	1

Vue utilisée :

Matériaux et produits contenant de l'amiante :




LEGENDE ● Prélèvement positif

LEGENDE ● Prélèvement positif

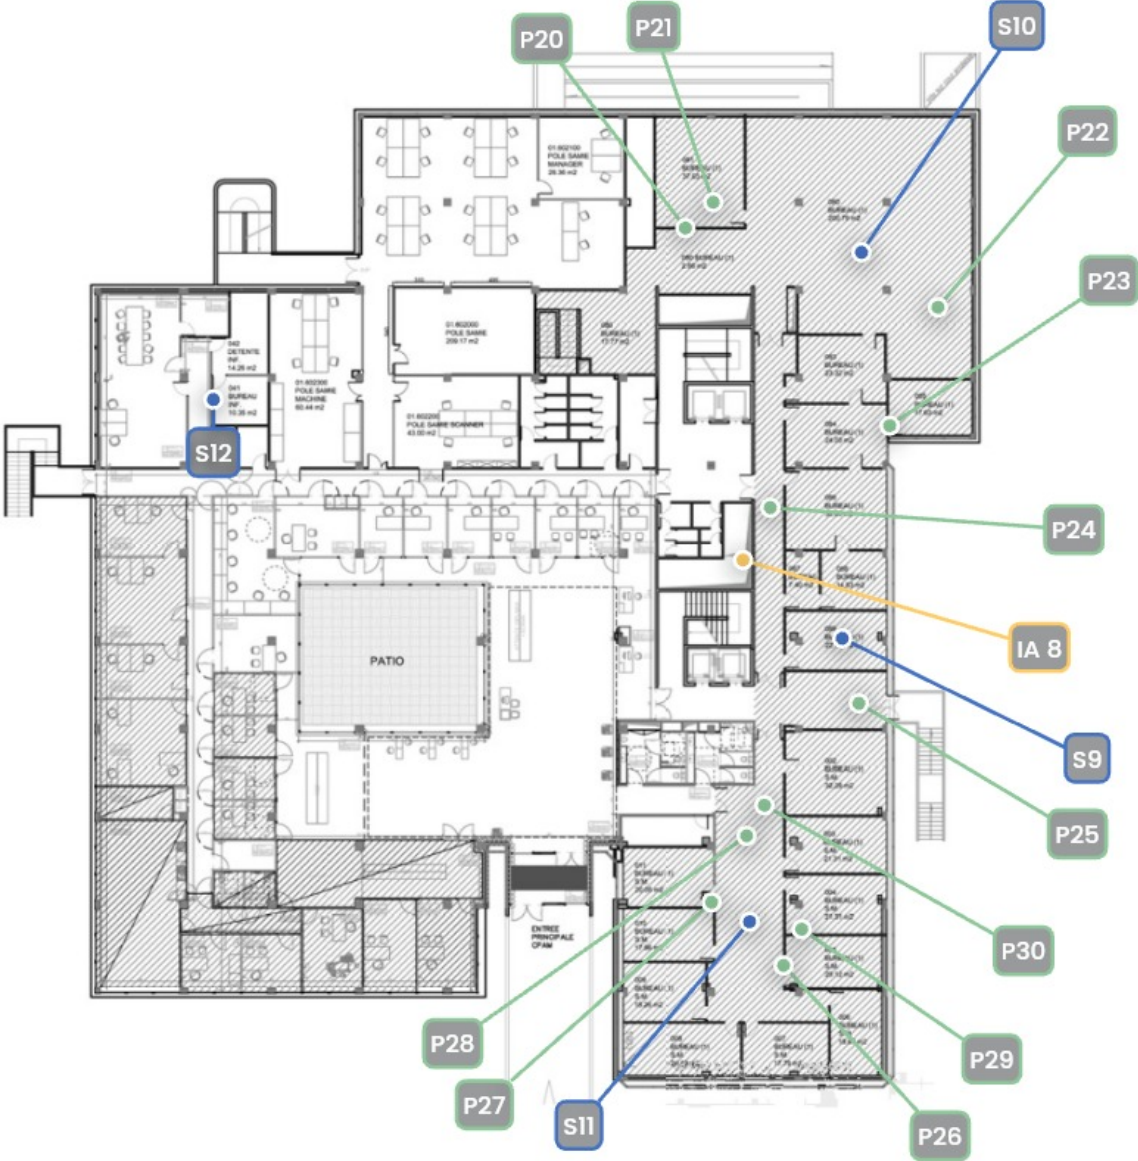
● Prélèvement négatif

 Sondage

 Inaccessibilité

● Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D OPALE. 35 RUE DESCARTES 62100 CALAIS	
Localisation C.P.A.M de CALAIS > REZ- DE-CHAUSSEE	Date visite	Le 04/03/2025
	Auteur	Julien BECART
	N° dossier	25462494/S1/1
	Planche	4 / 4
Indice 1		
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

7.8. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Julien BECART

11 Rue Léon Blum

62800 LIEVIN

Notre référence : AR-25-HB-029411-01

Numéro de dossier : 25N009818**Référence de dossier : 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25N009818-001 - Référence *BV3JQ4598 Réf. Prel : P1 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-002 - Référence *BV3JQ4599 Réf. Prel : P2 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Conduits - (Fibreux, Feutre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-003 - Référence *BV3JQ4600 Réf. Prel : P3 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-004 - Référence *BV3JQ4601 Réf. Prel : P4 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-005 - Référence *BV3JQ4602 Réf. Prel : P5 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-006 - Référence *BV3JQ4603 Réf. Prel : P6 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Poteaux - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-007 - Référence BV3JQ4604 Réf. Prel : P7 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-008 - Référence BV3JQ4605 Réf. Prel : P8 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Plafonds - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-009 - Référence BV3JQ4606 Réf. Prel : P9 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-010 - Référence BV3JQ4607 Réf. Prel : P10 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Plafonds - (Fibreux/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-011 - Référence BV3JQ4608 Réf. Prel : P11 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Equipements - (Compact, Fibreux/Marron, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-012 - Référence BV3JQ4609 Réf. Prel : P12 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Revêtements de sol - (Ciment, Chape/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-013 - Référence BV3JQ4610 Réf. Prel : P13 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-014 - Référence BV3JQ4611 Réf. Prel : P14 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-015 - Référence BV3JQ4612 Réf. Prel : P15 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-016 - Référence BV3JQ4613 Réf. Prel : P16 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Plafonds - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-017 - Référence BV3JQ4614 Réf. Prel : P17 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Equipements - (Compact, Fibreux/Marron), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-018 - Référence BV3JQ4615 Réf. Prel : P18 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-019 - Référence BV3JQ4616 Réf. Prel : P19 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de reunion / Stockage/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-020 - Référence BV3JQ4617 Réf. Prel : P20 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-021 - Référence BV3JQ4618 Réf. Prel : P21 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-022 - Référence BV3JQ4619 Réf. Prel : P22 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-023 - Référence BV3JQ4620 Réf. Prel : P23 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-024 - Référence BV3JQ4621 Réf. Prel : P24 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Plafonds - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-025 - Référence BV3JQ4622 Réf. Prel : P25 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Equipements - (Compact, Fibreux/Marron, Blanc), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-026 - Référence BV3JQ4623 Réf. Prel : P26 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-027 - Référence BV3JQ4624 Réf. Prel : P27 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Poteaux - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-028 - Référence BV3JQ4625 Réf. Prel : P28 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-029 - Référence BV3JQ4626 Réf. Prel : P29 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Poutres - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 25N009818-030 - Référence BV3JQ4627 Réf. Prel : P30 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/Plafonds - (Ciment/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord SAS

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS**
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01

Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16

Page1/11

Référence laboratoire N° : 25RI015618

Référence de suivi du dossier N° : 25N009818

Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Date de réception :06/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client:25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25N009818-001 - BV3JQ4598 Réf. Prel : P1 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	25N009818-002 - BV3JQ4599 Réf. Prel : P2 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Conduits - (Fibreux, Feutre/)	Matériau fibreux de type isolant (orange) ; matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LMA9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01

Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16

Page 2/11

Référence laboratoire N° : 25RI015618

Référence de suivi du dossier N° : 25N009818

Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Date de réception : 06/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
003	25N009818-003 - BV3JQ4600 Réf. Prel : P3 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Revêtements de sol - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	25N009818-004 - BV3JQ4601 Réf. Prel : P4 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Dur/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	25N009818-005 - BV3JQ4602 Réf. Prel : P5 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LMA9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 3/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	25N009818-006 - BV3JQ4603 Réf. Prel : P6 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	25N009818-007 - BV3JQ4604 Réf. Prel : P7 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	25N009818-008 - BV3JQ4605 Réf. Prel : P8 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 4/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
009	25N009818-009 - BV3JQ4606 Réf. Prel : P9 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/)	Matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010	25N009818-010 - BV3JQ4607 Réf. Prel : P10 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Plafonds - (Fibreux/Marron)	Matériau (fibreux) (marron) ; matériau (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	25N009818-011 - BV3JQ4608 Réf. Prel : P11 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de Restauration/Equipements - (Compact, Fibreux/Marron, Blanc)	Matériau semi-dur (jaune) ; matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau (noir) en traces	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01

Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16

Page 5/11

Référence laboratoire N° : 25RI015618

Référence de suivi du dossier N° : 25N009818

Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Date de réception : 06/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	25N009818-012 - BV3JQ4609 Réf. Prel : P12 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Revêtements de sol - (Ciment, Chape/)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	25N009818-013 - BV3JQ4610 Réf. Prel : P13 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	25N009818-014 - BV3JQ4611 Réf. Prel : P14 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	25N009818-015 - BV3JQ4612 Réf. Prel : P15 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 6/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25N009818-016 - BV3JQ4613 Réf. Prel : P16 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QVA5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	25N009818-017 - BV3JQ4614 Réf. Prel : P17 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Equipements - (Compact, Fibreux/Marron)	Matériau semi-dur (marron)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	25N009818-018 - BV3JQ4615 Réf. Prel : P18 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Imprimerie/Faux plafonds - (Fibreux, Composite/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 7/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	25N009818-019 - BV3JQ4616 Réf. Prel : P19 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-JARDIN - Salle de reunion / Stockage/Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/)	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	25N009818-020 - BV3JQ4617 Réf. Prel : P20 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/)	Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LMA9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
021	25N009818-021 - BV3JQ4618 Réf. Prel : P21 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 8/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	25N009818-022 - BV3JQ4619 Réf. Prel : P22 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Faux plafonds - (Fibreux, Composite/)	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	25N009818-023 - BV3JQ4620 Réf. Prel : P23 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	25N009818-024 - BV3JQ4621 Réf. Prel : P24 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	25N009818-025 - BV3JQ4622 Réf. Prel : P25 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Equipements - (Compact, Fibreux/Marron, Blanc)	Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01	Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16	Page 9/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618	Référence de suivi du dossier N° : 25N009818	
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025	Date de réception : 06/03/2025	
Date d'analyse : 11/03/2025		
Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	25N009818-026 - BV3JQ4623 Réf. Prel : P26 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Cloisons (légères et préfabriquées) - (Carton, Plaque de plâtre/)	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / LMA9	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	25N009818-027 - BV3JQ4624 Réf. Prel : P27 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Poteaux - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	25N009818-028 - BV3JQ4625 Réf. Prel : P28 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Faux plafonds - (Fibreux, Composite/)	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreux) (gris)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	25N009818-029 - BV3JQ4626 Réf. Prel : P29 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Poutres - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01 Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16 Page10/11
Référence laboratoire N° : 25RI015618 Référence de suivi du dossier N° : 25N009818
Reçu au laboratoire le : 07/03/2025 Date de réception :06/03/2025
Date d'analyse : 11/03/2025
Référence dossier Client:25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	25N009818-030 - BV3JQ4627 Réf. Prel : P30 C.P.A.M de CALAIS - REZ-DE-CHAUSSEE/ Plafonds - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / C4HS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapr en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique qu les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Dé. ° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18) modifié par l'Arrêté du 26 décembre 2019, Arrêté d juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérér ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-RI-013174-01

Date d'émission de rapport : 11/03/2025 22:16

Page 11/11

Référence laboratoire N° : 25RI015618

Référence de suivi du dossier N° : 25N009818

Reçu au laboratoire le : 07/03/2025

Date de réception : 06/03/2025

Date d'analyse : 11/03/2025

Référence dossier Client: 25N009818 - 1510797287/25462494/S1/1/1_25462494/1/1

Validé et approuvé par :



Pawel Tokarski
Assistant chef d'équipe
