



RAPPORT D'INTERVENTION

Référence: CR-2506-1236

ADRESSE INTERVENTION	DATE	26/08/2025
Tribunal D'instance - 5 Rue Jules Ferry, 95110 SANNOS, France	ARRIVÉE À	08:30
	DÉPART À	10:30
TECHNICIEN	Mara Sylla	
CONTACT SUR PLACE	HAROLD MILLAN	

TYPE INTERVENTION	Dégorgement <input type="checkbox"/> Curage ou Détartrage <input checked="" type="checkbox"/> Inspection Télévisée <input type="checkbox"/> Pompage <input type="checkbox"/> Pose d'une pompe de relevage <input type="checkbox"/> Nettoyage/Désinfection <input type="checkbox"/> Fraisage <input type="checkbox"/> Vérification pompe de relevage <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>
TYPE D'OUVRAGE	Colonne <input checked="" type="checkbox"/> Collecteur <input type="checkbox"/> Fosse de relevage <input type="checkbox"/> Siphon <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Si autre type d'ouvrage, veuillez préciser ... -
DIAMETRE DE LA CANALISATION	100
MATERIAU DE LA CANALISATION	Fonte
LIEU OU POSTE DE TRAVAIL	Parking
Localisation de l'anomalie	Collectif <input checked="" type="checkbox"/> Privatif <input type="checkbox"/> Collectif et Privatif <input type="checkbox"/>
Localisation du problème (étage, N°appt)	-


TRAVAUX RÉALISÉS
1- Intervention svp pour curage des colonnes en fonte diamètre 100 2- Écoulement OK

Devis	Oui
Infos Complémentaires devis (accès différent, cave spécifique, etc.)	
-	

Signé le 26/08/2025 17:29

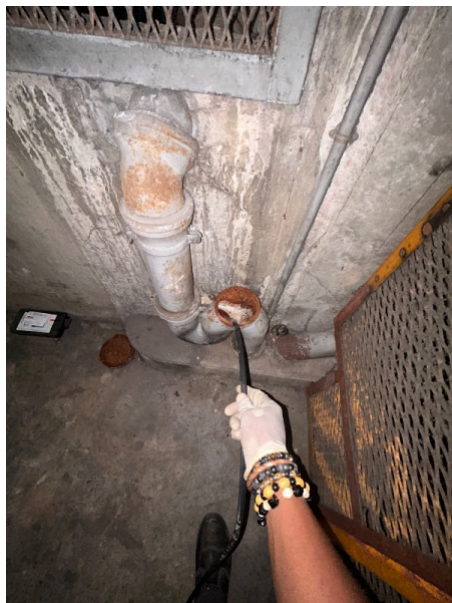
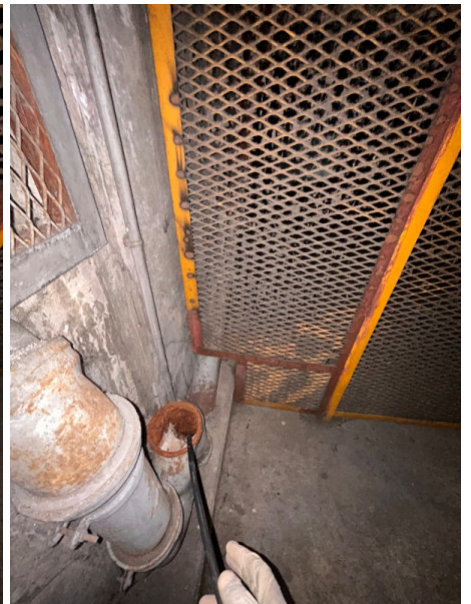
ANNEXE: PHOTOS INTERVENTION





Signé le **26/08/2025 17:29**

AI5 - 93 Rue Senouque, 78530 Buc, France - Tél. 01 39 56 73 75 - Fax: 01 39 56 31 17 - Email: contact@ais-abi.fr
SAS - Capital de 15 000 € - SIRET: 482 001 716 00026 - R.C.S. R.C.S VERSAILLES 482 001 716 - Code APE: 8129B - TVA
Intracommunautaire FR67482001716

Page 2/4
Référence N° CR-2506-1236






Signé le **26/08/2025 17:29**

RAPPORT D'INTERVENTION

Pour toute demande d'intervention ou de dépannage, conta

CHUBB FRANCE
UM NORD IDF VILLEPINTE
22 AVENUE DES NATIONS IMMEUBLE REMBRANDT
PARIS NORD 2
93420 VILLEPINTE
Tél : +33(0)1.41.85.42.00

Bon de Travail N° 21357514

(N° à rappeler pour toute corresponda

IDEX ENERGIES

18-20 QUAI DU POINT DU JOUR

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Technicien intervenant : Kazmierczak Sophie

Commercial : Bendarsa Sanaa
N° de téléphone : 06.35.15.29.46
Email : sanaa.bendarsa@Chubbfs.com

Nature de la prestation : Vérification programmée
N° de contrat : 890353/CC/1.000/004

N° équipement : 1771601
Activité : Extincteur

ADRESSE D'INTERVENTION

TRIBUNAL D'INSTANCE SANNOIS
5 SQUARE JULES FERRY

95110 SANNOIS

Contact : FONTAINE
Fonction : Responsable
Email : mathieu.fontaine@idex.fr
Certifie l'exactitude des renseignements donnés
Le jeudi 19 décembre 2024 SIGNATURE

Pas de signature

Motif de non signature :
Signataire Absent

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514
(N° à rappeler pour toute corresp

Synthèse de l'intervention

Bon état	17
Révision décennale non effectuée (remplacement proposé)	1

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514

(N° à rappeler pour toute corresp

Opérations réalisées en préventif

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P02737	Etiquette adhésive - Révision décennale	1	RET101
P0N914	Etiquette adhésive - Maintenance add. approfondie	9	RET101
P0U003	Kit sécurité règlementaire 3	6	R0U002
P0U051	Kit sécurité règlementaire 51	10	R0U001
P0U073	Kit sécurité règlementaire 73	1	R0U001
P0U078	Kit sécurité règlementaire 78	1	R0U001
W00020	Déplacement technicien de vérification extincteur	1	W00020
W00049	Frais de gestion extincteur	1	W00049
W02727	Essai de pression décennal eau	1	R04932
W04390	Charge 6L 90ML SC6 / MO	8	RCH003
W05031	Maintenance add. approf. Eau	9	R04919
W0X089	Traitement déchets additif	8	W0X089
W0X090	Traitement déchets sparklet	1	W0X090
W10037	Frais de suivi de parc EXT	18	W10037
W1Z955	Opération remplacement bague de tête	9	W1Z955
WCH165	Charge 6L 90ml BSX233	1	RCH003
WEXT01	Vérif. extincteur portable PA	12	REXT01
WEXT02	Vérif. extincteur portable PP	6	REXT02

Ventes

Article	Description	Quantité	Code Facturation
P04001	Panneau PVC 120x120 - Classe de feux B	1	P04001
W05870	Pose de signalétique	1	W05870

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514
(N° à rappeler pour toute corresp

Renseignements sur les appareils

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2024792505		Bon état	Etage: s/sol archives INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/08/2024	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2016266098	07	Bon état	Bat: Tribunal Etage: RDC Couloir Accueil INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2026443623	07bis	Bon état	Bat: Tribunal Etage: RDC Petit-Accueil IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	23/06/2021	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2016266099	09	Bon état	Bat: Tribunal Etage: RDC Couloir Cabinet-B INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2016266091	10	Bon état	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Escalier Archives IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	23/03/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2016266097	11	Bon état	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Escalier Archives INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514

(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2016266092	12	Bon état	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Local-Electrique IN CO2 5KG TOP Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	23/03/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2026443622	14	Bon état	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Archives INSTINCT E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	17/06/2022	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
2026443624	15	Bon état	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Archives IN CO2 5KG TOP Agent : CO2 Capacité : 5 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	13/06/2021	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2024792506		Bon état	Etage: rdc local serveur IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	06/08/2024	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
					19/12/2024	Pose de signalétique	Oui	
2073383478	16	Révision décennale non effectuée (remplacement proposé)	Bat: Tribunal Etage: S.Sol Sas issue-secours Archives ANDRIEU A6PR 6L AFFF <2017 Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : 32 - ANDRIEU	07/04/2013	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Essai de pression décennal eau	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	
2016266095	01	Bon état	Bat: Tribunal Etage: 1er Couloir INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514


(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2016266096	02	Bon état	Bat: Tribunal Etage: 1er Couloir INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2016266090	03	Bon état	Bat: Tribunal Etage: 1er Salle-Pause IN CO2 2KG Agent : CO2 Capacité : 2 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	23/03/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PP	Oui	
2016266914	03bis	Bon état	Bat: Tribunal Etage: 1er Mezzanine Salle-Pause INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	19/05/2021	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
2016266093	04	Bon état	Bat: Tribunal Etage: 1er Palier Escalier INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
2016266094	05	Bon état	Bat: Tribunal Etage: RDC Couloir Local-Stockage.9 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	

RAPPORT D'INTERVENTION

Bon de Travail N° 21357514
(N° à rappeler pour toute corresp

N° Code Barre	n° apparei	Conclusion de notre technicien	Emplacement	Date de mise en	Date de prestation	Description des prestations réalisées	Fait	Motif
2016266100	06	Bon état	Bat: Tribunal Etage: RDC Couloir côté Porte-2 INTEGRAL E6 AFFF Agent : EAU Capacité : 6 Fabricant : CHUBB FRANCE (31,106,146)	29/06/2020	19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Vérif. extincteur portable PA	Oui	
					19/12/2024	Charge extincteur 6 L	Oui	Date erronée (Parc)
					19/12/2024	Opération remplacement bague	Oui	
					19/12/2024	Main. Add. Approfondie eau	Oui	Date erronée (Parc)



S É C U R I T É
du Désenfumage



Assuré MAAF depuis
plus de 10 ans sans sinistre
déclaré en garantie décennale.

FICHE D'INTERVENTION

- . Protection incendie . Vente matériel
- . Sécurité . Installation
- . Désenfumage . Maintenance

3 ROUTE DE LA FERRIERE SUR RISLE
Domaine de LA CROIX SAINT GILLES
27330 CHAMPIGNOLLE

Tél : 06 12 69 15 37

Mail : sp.sndd27@gmail.com

CLIENT : IDEX

ADRESSE : T.I. SAVOIS ST

GRUE JULIA FERRY

Personne à contacter : _____

Téléphone : _____

AGENT : PIPART

DATE : 13/5/2025

Lieu d'intervention : T.I. SAVOIS

TRAVAUX A EFFECTUER : essais et duplication des systèmes
de Renforcement

SALLE D'AUDIENCE

à l'heure SI autorisation d'un technicien - RAS

SIGNATURE

IDEX 17/0



CIRTECH

CONTRÔLE INFRAROUGE TECHNOLOGIE



RAPPORT DE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE



TI SANNOIS

Date du contrôle

Lundi 25 août 2025

Lieu du contrôle

5 Rue Jules Ferry, 95110 Sannois

Entreprise utilisatrice



Entreprise
utilisatrice

Q19

Compte rendu de contrôle
d'une installation électrique
par thermographie infrarouge



Nom ou raison

sociale : **T I de SANNOIS**

☒ **5 Rue Jules Ferry, 95110 Sannois**

Nature de l'activité exercée **Bureaux et locaux techniques**

Date ou période du contrôle **lundi 25 août 2025**

Premier contrôle par thermographie infrarouge ☒ oui ☐ non *

* Si non, le dossier correspondant au précédent contrôle a-t-il été fourni ? ☐ oui ☒ non

Préciser la date du contrôle précédent **première visite CIRTECH**

Opérateur

Je soussigné **Jérôme MOREAU**

opérateur titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée par CNPP

☒ de l'entreprise intervenante **CIRTECH SASU**

☒ **4 rue Anatole France 44550 MONTOIR DE BRETAGNE**

☐ de l'entreprise utilisatrice

déclare avoir procédé au contrôle conformément aux exigences du référentiel APSAD D19.

Synthèse du contrôle

Lorsqu'il y a plusieurs bâtiments, préciser les bâtiments concernés par le compte rendu :

.....

.....

Pour le ou les bâtiments concernés :

- La liste des matériels et/ou ensembles d'appareillage déclarés correspond-elle à l'intégralité des entités et/ou ensembles d'installations ? ☐ oui ☒ non *

* Si non, celles ne figurant pas dans la liste sont indiquées ci-dessous :

.....

Sous responsabilité IDEX uniquement

.....

- L'intégralité des matériels et/ou ensembles d'appareillage déclarés a-t-elle été contrôlée ? ☐ oui ☒ non

- La présence d'une installation électrique n'appartenant pas à l'entreprise utilisatrice a-t-elle été constatée ? ☐ oui * ☒ non

* Si oui, préciser le type d'installation (installation photovoltaïque, antenne relais, etc.) :

.....

.....

.....

Nombre d'anomalies :

→ de priorité 1 0

→ de priorité 2 0

→ de priorité 3 0

La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu de contrôle Q19.

Liste récapitulative des anomalies constatées



Sur l'installation électrique de l'entreprise utilisatrice **T I DE SANNOIS**

Site de **5 Rue Jules Ferry, 95110 Sannois**

Emplacement / Matériel	Fiche d'anomalie n° _____ (1)	Degré de priorité (2)			Défaut déjà signalé	
		1	2	3	Présentant toujours un défaut (3)	Ne pouvant être contrôlé (3)

En cas de report, d'anomalie issue d'un précédent contrôle (ne pouvant être contrôlé l'année N), préciser la référence ou du rapport.
Mettre une croix dans la case de la priorité demandée.
Si oui, mettre une croix dans la case.


Avis et améliorations proposés

Aucune anomalie décelée. / très faible charge des installations électriques.

.....

À MONTOIR DE BRETAGNE, le mardi 26 août 2025.....

Signature de l'opérateur



Cachet de l'entreprise de l'opérateur

CIRTECH

4 rue Anatole France 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SASU au capital social de 5000 €
SIRET : 822 166 823 00028
APE : 7120 B
TVA intracommunautaire : FR01 822 166 823

INFORMATIONS ENTREPRISES			
Entreprise (EU)	MULTIDEX	Site contrôlé	TI de SANNOIS
Adresse	Immeuble L'Européen 4 rue Joseph Monier - CS 80101	Adresse	5 Rue Jules Ferry
CP / Ville	92859 RUEIL MALMAISON	CP ville	95110 Sannois
Tél. standard	01.40.51.40.77	Tél : du site	
interlocuteur		Contact site	Stéphane JESIORSKI
① interlocuteur		① contact	06 47 53 26 41
@ interlocuteur		@ contact	stephane.jesiorski@idex.fr
Entreprise (EU)			
Date du contrôle	Lundi 25 août 2025		
Date du dernier contrôle	Première visite CIRTECH		
MODELE ET CARACTERISTIQUE DE LA CAMERA ET LOGICIEL UTILISE			
Caméra	FLIR T 1020	Ordinateur	MSI
N° de série	72501021	Traitement	WINDOWS 10
Date de mise en service	Novembre 2018	Logiciel traitement texte	WORD 19
Caméra vérifiée par CNPP	Octobre 2024	Logiciel infrarouge	FLIRTOOLS +
Gamme de température	-40°C – 2000°C	Imprimantes	XEROX
Objectif champ optique	45°	Photos visibles	IPHONE 15 pro max
IFOV	0,75 mrd	Pince ampèremétriques	FLIR CM85
Bande spectrale	7,5 à 14 µm	Chaîne d'acquisition et de traitement d'image thermique par le logiciel FLIRTOOLS+ L'émissivité de la caméra a été réglée sur 0,85. Le traitement informatique des thermogrammes permet éventuellement de modifier cette émissivité si les besoins s'en faisaient sentir. Vous trouverez ci-joint une copie de l'attestation initiale correspondant au modèle de caméra.	
Résolution thermique	0,1°C		
Distance de focalisation min.	0,30 m		
Détecteur micro bolométrique	1024 x 768		
Stockage numérique	Carte SD		
NOM ET QUALIFICATION DE L'OPERATEUR			
Nom de l'opérateur / rédacteur	Jérôme MOREAU	Copie de l'attestation a jour dans ce rapport	
Accompagnateur	Harold MILLAN	Fonction	Accompagnateur IDEX
Accompagnateur		Fonction	
Accompagnateur		Fonction	
Accompagnateur			
OBJECTIF INFORMATION Q19 URGENCE			
<p>L'objectif de CIRTECH est de rechercher et déceler des températures anormales et/ou les variations excessives de celle-ci, de localiser et quantifier ces anomalies et apporter les éléments de décision permettant une intervention corrective et/ou préventive.</p> <p>Le document technique APSAD D19 s'applique au contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge réalisé pour les activités présentant des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ou lorsque le matériel électrique constitue un élément essentiel de l'outil de production. Ce contrôle est complémentaire aux vérifications réglementaires, et permet d'apporter des éléments de décision en vue d'une intervention préventive ou corrective adaptée. Ce référentiel peut servir de base à l'établissement d'un document contractuel entre l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice et ainsi définir les obligations respectives. Il précise également le contenu du dossier à fournir après l'intervention (rapport de contrôle et compte-rendu de contrôle Q19). L'opérateur intervenant doit être titulaire d'une attestation de compétence en cours de validité. Ce document a été élaboré en liaison avec les instances Prévention de la Fédération française des sociétés d'assurances.</p> <p>CIRTECH vous invite à consulter ce document technique et à mettre en place les moyens indispensables pour la bonne réalisation du contrôle et ce, tant sur le plan de l'organisation de la mission, que sur le temps de réalisation et l'application du bon fonctionnement et de la mesure d'intensité des organes contrôlés. Cependant, nous nous adaptons aux exigences de l'entreprise utilisatrice, et aux conditions d'exploitations et de sécurité d'accès. Nous nous efforçons tant que possible de respecter le cahier des charges D19 de l'APSAD mais déclinons toute responsabilité quant aux appareils non contrôlés, notamment pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Non fonctionnement simple, (pas de production possible) ○ Non fonctionnement par logique de production (ex : PV, GV marche Av. marche Ar.) ○ Non accessibilité (palette, accès par serrures, sécurité de porte sectionneur...) ○ Sous tension uniquement (seuls les appareils en débit électrique sont contrôlés correctement % charge) Zones inconnues (l'entreprise utilisatrice se doit d'établir la liste la plus exhaustive possible de ses installations, et de faire évoluer si nécessaire cette liste d'une année sur l'autre) <p>3 niveaux d'urgence d'intervention sont utilisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> ① URGENT (CIRTECH s'assure que le service maintenance est averti sur le champ) ② A RECEPTION DE RAPPORT (maintenance à prévoir à réception du rapport) ③ PLANIFICATION (maintenance à planifier dans les semaines suivantes) <p>○ Hormis les températures excessives risquant des départs de feux, les niveaux d'urgence ne correspondent pas obligatoirement à des températures ou des deltas de températures importants. En effet en fonction de l'usage, de la situation, de l'usure et de l'importance de la fonction de l'appareil en défaut, seule une estimation du technicien et de l'accompagnateur apporte une réponse précise à cette évaluation d'urgence.</p>			



CONCLUSION & INFORMATION DU RAPPORT

RAS

Page 6 de 8


Attestation de vérification périodique

N° : AVP2025000009

Cette attestation a été établie sur la base de la spécification technique ST LPMES DEC 18.004 A du 31/03/2022 pour la vérification périodique annuelle des caméras de mesures thermographiques utilisées pour le contrôle d'installations électriques et la délivrance de compte rendu de vérification Q19.

Dénomination du produit : **Caméra de mesure thermographique**
Référence commerciale : **Flir T1020-45°**
Numéro de série : **72501021**
Numéro d'inventaire :
Demandeur : *Cirtech*
4 rue Anatole France
44550 Montoir De Bretagne

Mesures et résultats :

Vérification préliminaire d'étalonnage	Uniformité de la réponse thermique
Exigence :	Exigence :
$68.0^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{mesurée}} \leq 72.0^{\circ}\text{C}$	$68.0^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{mesurée}} \leq 72.0^{\circ}\text{C}$
Température retenue (point central) :	Températures retenues (moyennes sur zones colorées) :
70.4 °C	<div><div>70.7 °C</div><div>70.0 °C</div><div>70.3 °C</div><div>70.3 °C</div><div>69.7 °C</div></div> 
Résultat :	Résultat :
Conforme à l'exigence	Conforme à l'exigence

Le corps thermo-rayonnant utilisé pour la vérification est un HGH - DCN1000 N7 - étalonné le 22/07/2024 - Certificat d'étalonnage n° 24-0202 - Correction appliquée à la température centrale 70°C : -0.1°C - Dispersion : 0.4°C

Vérifié le : **21 janvier 2025**
Attestation établie le **21 janvier 2025** par Vincent Tran
Valable jusqu'en **janvier 2026**

testoon SAS
97/99 rue Béranger
92320 Chatillon
491 847 711 RCS Nanterre
03 (0)1 71 16 17 00
contact@testoon.com

Responsable du laboratoire
Jean-Michel Catherin

ATTESTATION DE COMPETENCE

pour le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge

N°01.031

Date de fin de validité 10-04-2029

Décernée à Monsieur Jérôme MOREAU

Fait à Saint-Marcel

Le 10 Avril 2025

Cette attestation de compétence permet de réaliser les contrôles par thermographie infrarouge conformément au document technique APSAD D19 et de délivrer des compte-rendus de contrôle Q19.

Recyclage obligatoire tous les 4 ans.


Amaury LEQUETTE
Directeur
CNPP Conseil & Formation


CNPP
CNPP Entreprise SARL

Formation



Attestation de réalisation de maintenance périodique réglementaire

PORTE COUPE FEU / ASSERVISSEMENT

SITE : TI Sannois

Libellé de prescriptions permanentes :

Lot Technique	Type équipement	Périodicité	Texte de référence
Moyen de secours	Porte Coupe-feu / Asservissement*	Annuelle	Règlement de Sécurité ERP IT 247 – Section VII – APSAD R16

*Si présence sur le site

Ces maintenances portent notamment sur le contrôle, entretien et bon fonctionnement de : (Liste non exhaustive)

- Etat de conservation du bâti, joints, étanchéité, ferme porte, ...
- Ventouse électromagnétique, ...
- **La partie asservissement ne concerne plus le contrat de maintenance IDEX**

Document en annexe : ☒ OUI ☐ NON

Commentaire :

L'intervenant atteste avoir réalisé la maintenance de l'équipement, remplacé les pièces d'usures et avoir procédé aux essais conclusifs de bon fonctionnement.

Nom du technicien **MILLAN H**

Date signature : 09/07/2024

Tampon société :





RAPPORT D'INTERVENTION N° RI-MPE01134

Tél. : 01 56 45 19 00 - Fax : 01 56 45 19 20 - E-mail : visiom@visiom.com

Type d'Intervention : Visite Maintenance Préventive

Date de Début : 03/06/2025 09:00

Date de Fin : 03/06/2025 09:30

Client : IDEXENERGIES

Site : TGI de Sannois

Adresse : 5, rue Jules Ferry

Ville : SANNOIS

Demandeur :

Heure d'Appel : 03/06/2025 08:00

Type de Matériel : Portique HIPE

Type de Contrat :

N° de Série : 21506023176

Code erreur :

Code Panne :

Code Solution :

Défaut Constaté par le Client :

Visite de maintenance préventive

Défaut Constaté par Visiom :

VMP

Pièces Remplacées

Code	Nouvelle(s) Pièce(s)	Qté	N° de Série
------	----------------------	-----	-------------

Description de l'intervention et commentaires

Nettoyage et dépoussiérage complet du portique
Contrôle des paramètres OK
Contrôle du bon fonctionnement OK
Remise en service OK

Commentaires Client :

Technicien Visiom : Mathieu PEGE

Client

Signature :

Nom :

Signature :



Opération de maintenance



Site : TRIBUNAUX OUEST FRANCILIEN
Adresse : 5 SQ JULES FERRY
Ville : SANNOIS
Code Postal : 95110
Contrat de maintenance : 42505735
Type de Contrat: KONE Care Minimal
Date de la visite : 18/3/2025
Réalisée par: CARETTI Johann

Détail visites

Numéro d'intervention : 845049820
Type d'équipement : Porte
N° de l'installation : 45770647
Votre référence équipement :
Localisation : RIDEAU JNC34
Opérations de maintenance effectuées : Module « inspection »

Lors de cette visite inspection ont été vérifiés (si les éléments étaient accessibles) :
-Motorisation
-Transmission et guidage
-Equilibrage
-Tablier ou partie mobile (vantaux, sections, lames)
-Armoire et logique de commande
-Organes de commande
-Organes de sécurité
-Fixations
-Fonctionnement

Commentaires : rideau métallique
5 rideaux métalliques sur place en plus
Maintenance réalisée
débrayage introuvable ???

Numéro d'intervention : 845049779
Type d'équipement : Porte
N° de l'installation : 45770646
Votre référence équipement :
Localisation : RIDEAU JNC33
Opérations de maintenance effectuées : Module « inspection »

Lors de cette visite inspection ont été vérifiés (si les éléments étaient accessibles) :
-Motorisation
-Transmission et guidage
-Equilibrage
-Tablier ou partie mobile (vantaux, sections, lames)
-Armoire et logique de commande
-Organes de commande
-Organes de sécurité
-Fixations
-Fonctionnement

Commentaires :

C4L
pose étiquette et fourniture carnet
batterie hs stm17
sandow bleu hs
courroie usée
faire devis batterie + sandow
Maintenance réalisée

Signature client :



par :

20250218-100026-SFAS-067375
Mr Harold



Votre Centre de Relation Client KONE Tél : **0 970 80 80 80**

NOTICE : Les informations contenues dans ce message sont à l'attention exclusive des personnes désignées. Elles peuvent contenir des informations confidentielles. Si vous n'en êtes pas le destinataire, toute utilisation, copie, diffusion ou toute forme de divulgation sont strictement interdites. Si vous recevez ce message par erreur, veuillez le détruire et en informer sans délai l'expéditeur. Merci.

Attestation de réalisation de maintenance périodique Ventilation Confort

SITE TI Sannois

Nom contrôle: Contrôle VMC

Prescription N° :

Libellé de prescription :

Société intervenante en charge de l'action corrective et/ou essais conclusifs : **IDEX**

Nom du technicien :
MILLAN H

Date de réalisation :
25/07/2024

Document en annexe :

OUI

NON

Type de document produit :

Commentaire :

L'intervenant atteste avoir levé les observations et procédé aux essais conclusifs de bon fonctionnement sur les équipements visés. Dans le respect de ou des articles du Règlement de Sécurité contre l'Incendie des Etablissements Recevant du Public, du Code de la Construction et de l'Habitat.

Cachet et signature :


PO **IDEX**
VALORISER LES ÉNERGIES
IDEX ENERGIES
4 rue Joseph Monier - CS 80101 - 92859 Rueil-Malmaison Cedex
RCS NANTERRE 315 871 640

**Attestation de réalisation de
maintenance périodique CTA**

SITE - TI Sannois

Nom contrôle: Contrôle CTA

Prescription N° :

Libellé de prescription :

Société intervenante en charge de l'action corrective et/ou essais conclusifs : **IDEX**

Nom du technicien :
MILLAN H

Date de réalisation :
27/08/2024

Document en annexe :

OUI



NON

Type de document produit :

Commentaire :

L'intervenant atteste avoir levé les observations et procédé aux essais conclusifs de bon fonctionnement sur les équipements visés. Dans le respect de ou des articles du Règlement de Sécurité contre l'Incendie des Etablissements Recevant du Public, du Code de la Construction et de l'Habitat.

Cachet et signature :



PO
VALORISER LES ÉNERGIES
IDEX ENERGIES
4 rue Joseph Monier - CS 80101 - 92859 Rueil-Malmaison Cedex
RCS NANTERRE 315 871 640
