

DIM R426/Version 20240701

Références : A23B242I/002-1/STATION DE PRIMATOLOGIE/PBAVTD/EHE-AR1

Date d'édition : 09/08/2024

Contrat N° : A23-B-2024-003J/0

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION MISSION REALISEE LE 19/07/2024

CONCLUSION

Dans le cadre de notre mission, il a été détecté des revêtements contenant plomb avec des seuils de
2.6mg/cm² à 0.05mg/cm²

Il appartiendra aux acteurs de l'opération de respecter leurs obligations réglementaires respectives lors des phases de conception et de réalisation des travaux.

Les résultats du repérage sont destinés à évaluer les risques d'exposition professionnelle au plomb, de contamination du voisinage du chantier et de l'environnement.

L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptées.

Il n'existe pas de valeur de seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtements contenant du plomb.

Le présent rapport annule et remplace le rapport n°A23B242I/002-1/STATION DE PRIMATOLOGIE/PBAVTD/EHE

Désignation - Adresse du bien

STATION DE PRIMATOLOGIE

- D56

13756 ROUSSET

Propriétaire

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Donneur d'ordre

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

3 RUE MICHEL ANGE

PARIS 16

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT



Signature

Le diagnostiqueur
Emmanuel HERNANDEZ

Réalisation du diagnostic

Diagnosticteur : HERNANDEZ Emmanuel

Chargé d'affaire : HERNANDEZ Emmanuel

Organisme d'assurance EUROMAF Police 7006693/S

Hernandez

TABLE DES MATIERES

RAPPEL DE LA COMMANDE.....	3
DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION.....	3
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	4
LISTE DES LOCAUX.....	5
METHODOLOGIE EMPLOYEE.....	8
RESULTATS DES MESURES.....	10
PRESENTATION DES RESULTATS.....	10
RESUME.....	73
ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION.....	74
ANNEXE - CROQUIS.....	75
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	91

RAPPEL DE LA COMMANDE

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants.
Etabli conformément à la norme Norme NF X 46 035 de juin 2021.

Descriptif exhaustif de la mission et périmètre des travaux

Documents transmis par le donneur d'ordre

Plan des locaux : Oui
Historique : DTA DEKRA

DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION

Dénomination du bâtiment	STATION DE PRIMATOLOGIE
Fonction principale du bâtiment	CENTRE DE RECHERCHE
Type d'ouvrage	Bâtiment
Date du permis de construire	NC
Année de construction	NC
Nombre de bâtiments	13
Nombre de niveaux	1
Occupation du bien	Propriétaire
Adresse	- D56 13756 ROUSSET
Propriétaire	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Présence d'un accompagnateur	non

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Numéro du dossier SIGIS : T940926
Date de déclaration : 2021-11-29
Nom du titulaire : Alpes Contrôles
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : ALLIZARD Franck

Informations de l'appareil

Fabricant de l'appareil : FONDIS Electronic	Nature du radionucléaire : Cd-109
Modèle de l'appareil : FENX2	Date du dernier chargement de la source : 2023-02-20
N° de série : 23-1025	Activité de la source à cette date : 370Mbq

Zone 1 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2574
Fabricant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.71 mg/cm² +/-0.08 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	1	2024-07-26	0.7
Fin de mission	3	2024-07-26	0.7
Remise sous tension	5	2024-07-26	0.3

Zone 2 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2575
Fabricant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.31 mg/cm² +/-0.02 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	2	2024-07-26	0.3
Fin de mission	4	2024-07-26	0.3

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

LISTE DES LOCAUX

Locaux visités

Niveau	Local
Niv 00 / ROU190	19-001
Niv 00 / ROU190	19-002
Niv 00 / ROU190	19-003
Niv 00 / ROU120	12-001
Niv 00 / ROU120	12-002
Niv 00 / ROU120	12-003
Niv 00 / ROU120	12-004
Niv 00 / ROU120	12-005
Niv 00 / ROU120	12-006
Niv 00 / ROU120	12-007
Niv 00 / ROU120	12-008
Niv 00 / ROU120	12-009
Niv 00 / ROU120	12-010
Niv 00 / ROU120	12-011
Niv 00 / ROU120	12-012
Niv 00 / ROU120	12-013
Niv 00 / ROU120	12-014
Niv 00 / ROU120	12-015
Niv 00 / ROU120	12-016
Niv 00 / ROU120	12-017
Niv 00 / ROU120	12-017 WC
Niv 00 / ROU120	12-017 CUMULUS
Niv 00 / ROU120	12-017 SD
Niv 00 / ROU020	020-001
Niv 00 / ROU020	020-002
Niv 00 / ROU020	020-003
Niv 00 / ROU020	020-004
Niv 00 / ROU020	020-005
Niv 00 / ROU020	020-006
Niv 00 / ROU020	020-007
Niv 00 / ROU020	020-008
Niv 00 / ROU020	020-009
Niv 00 / ROU020	EXTERIEUR
Niv 00 / ROU021	021-001
Niv 00 / ROU021	021-003
Niv 00 / ROU021	021-002
Niv 00 / ROU021	021-004
Niv 00 / ROU021	021-005
Niv 00 / ROU021	021-006
Niv 00 / ROU021	021-007
Niv 00 / ROU021	021-008
Niv 00 / ROU021	EXTERIEUR
Niv 00 / ROU110	11-001

Niv 00 / ROU110	11-002
Niv 00 / ROU110	11-003
Niv 00 / ROU110	11-004
Niv 00 / ROU110	11-005
Niv 00 / ROU110	11-006
Niv 00 / ROU110	11-007
Niv 00 / ROU110	EXTERIEUR
Niv 00 / ROU040	04-001/04-002/04-005/04-007/04-008/04-009
Niv 00 / ROU040	04-004
Niv 00 / ROU040	04-003
Niv 00 / ROU040	04-006
Niv 00 / ROU050	05-001
Niv 00 / ROU050	05-002
Niv 00 / ROU050	05-003
Niv 00 / ROU050	05-004
Niv 00 / ROU050	05-005
Niv 00 / ROU050	05-006
Niv 00 / ROU050	05-007
Niv 00 / ROU050	05-008
Niv 00 / ROU050	05-009
Niv 00 / ROU050	05-010
Niv 00 / ROU050	05-011
Niv 00 / ROU050	05-012
Niv 00 / ROU050	05-013
Niv 00 / ROU050	05-014
Niv 00 / ROU050	05-015
Niv 00 / ROU050	05-016
Niv 00 / ROU050	05-017
Niv 00 / ROU050	05-018
Niv 00 / ROU050	05-019
Niv 00 / ROU060	06-001
Niv 00 / ROU060	06-002
Niv 00 / ROU060	06-003
Niv 00 / ROU060	06-004
Niv 00 / ROU060	06-005
Niv 00 / ROU060	06-006
Niv 00 / ROU060	06-007
Niv 00 / ROU060	06-008
Niv 00 / ROU060	06-009
Niv 00 / ROU060	06-010
Niv 00 / ROU090	09-001
Niv 00 / ROU090	09-002
Niv 00 / ROU090	09-004
Niv 00 / ROU070	07-001
Niv 00 / ROU070	07-002
Niv 00 / ROU080	08-001
Niv 00 / ROU080	08-002
Niv 00 / ROU100	10-001

Niv 00 / ROU100	10-002
Niv 00 / ROU030	03-001
Niv 00 / ROU030	03-002
Niv 00 / ROU030	03-005
Niv 00 / ROU030	03-006
Niv 00 / ROU030	03-007
Niv 00 / ROU030	03-008
Niv 00 / ROU030	03-009
Niv 00 / ROU030	03-010
Niv 00 / ROU030	03-011
Niv 00 / ROU030	03-012
Niv 00 / ROU030	03-013
Niv 00 / ROU030	03-014
Niv 00 / ROU030	03-015
Niv 00 / ROU030	EXTERIEUR
Niv 00 / ROU170	17-001
Niv 00 / ROU170	17-002
Niv 00 / ROU170	17-003
Niv 00 / ROU180	18-001
Niv 00 / ROU180	18-002
Niv 00 / ROU180	18-003
Niv 00 / ROU180	18-004
Niv 00 / ROU180	18-005
Niv 00 / ROU180	18-006
Niv 00 / ROU180	18-007
Niv 00 / ROU180	18-008
Niv 00 / ROU180	18-009
Niv 00 / ROU180	18-010

Locaux non visités

Niveau	Local
Aucun local non visité	

Locaux non concernés

Niveau	Local
Aucun local non concerné	

METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil à source sont d'une précision égale à $\pm 0,05 \text{ mg/cm}^2$. Le seuil de détection limite est de $0,3 \text{ mg}$ de plomb/ cm^2 et le seuil haut est de 80 mg/cm^2 .

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes...) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. La zone « plafond » est indiquée en clair.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.

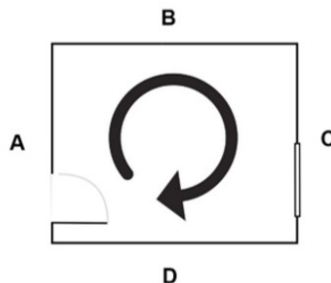

Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage et PVC ne sont pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale...), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal...) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient)
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes)
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local
- une porte et son huisserie dans un même local
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches
- l'ensemble des contremarches
- l'ensemble des balustres
- le limon
- la crémaillère
- la main courante
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux des pages suivantes.

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative (ex : 13,4) et l'écart relatif (ex : +/- 0,05).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

RESULTATS DES MESURES

PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite précédemment.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Niv 00 / ROU190 / 19-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
9	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
10					0.11	0.06		
6	Toute Zone	Mur	Béton	Non peint	Non mesuré		Aucun	
7	Toute Zone	Charpente	Métal	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
8					0.26	0.08		
11	Toute Zone	Fenêtre	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
12					0.22	0.07		

Niv 00 / ROU190 / 19-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
13	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
14					0.12	0.06		
15	Toute Zone	Mur	Béton	Non peint	Non mesuré		Aucun	
16	Toute Zone	Charpente	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
17					0.17	0.09		
18	Toute Zone	Fenêtre	Métal	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
19					0.20	0.1		

Niv 00 / ROU190 / 19-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
20	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
21					0.25	0.08		
22	Toute Zone	Mur	Béton	Non peint	Non mesuré		Aucun	
23	Toute Zone	Charpente	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
24					0.14	0.07		
25	Toute Zone	Fenêtre	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
26					0.16	0.08		

Niv 00 / ROU120 / 12-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
28	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
27	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
29	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
30	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
31	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
32	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
33	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
34	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
35	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
36	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
37	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
38	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
39	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
40	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
41	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
42	Zone Plafond	Grille	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
43	Toute Zone	Mur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	
44	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
45	Zone Plafond	Mur	Brique	Non peint	Non mesuré		Aucun	
46	Toute Zone	Panneau	Polystyrène	Non peint	Non mesuré		Aucun	
47	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur	Métal	Peinture	Non mesuré	0.09	Aucun	
48					0.29			

Niv 00 / ROU120 / 12-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
49	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
50	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
51	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
52	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
53	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
54	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
55	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
56	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
57	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-011

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
58	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
59	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
60	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-012

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
61	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
62	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
63	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-013

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incerti tude	Prélèvement	Observations
125	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
126	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
127	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-014

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incerti tude	Prélèvement	Observations
128	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
129	Toute Zone	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
130	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur		Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-015

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incerti tude	Prélèvement	Observations
64	Zone A	Mur	Brique	Non peint	Non mesuré		Aucun	
69 70	Zone A	Porte	Métal	Peinture	0.25 0.24	0.08 0.08	Aucun	
65	Zone B	Mur	Brique	Non peint	Non mesuré		Aucun	
66	Zone C	Mur	Brique	Non peint	Non mesuré		Aucun	
67	Zone D	Mur	Brique	Non peint	Non mesuré		Aucun	
68	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Non peint	Non mesuré		Aucun	
71 72	Toute Zone	Fenêtre	Métal	Peinture	0.06 0.17	0.06 0.09	Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-016

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
73	Zone Plafond	Panneau	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
74	Toute Zone	Mur		Non peint	Non mesuré		Aucun	
75	Toute Zone	Porte Ouvrant intérieur	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
76	Toute Zone	Fenêtre	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU120 / 12-017

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
77	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
78					0.17	0.09		
91	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
92					0.20	0.1		
79	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
80					0.26	0.08		
81	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
82					0.22	0.07		
83	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
84					0.12	0.06		
93	Zone D	Fenêtre	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
94					0.20	0.1		
85	Zone E	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
86					0.23	0.07		
87	Zone F	Mur	Enduit	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
88					0.11	0.06		
89	Zone Plafond	Plafond	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
90					0.10	0.10		

Niv 00 / ROU120 / 12-017 WC

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
95	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
96					0.10	0.10		
103	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
104					0.25	0.08		
97	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
98					0.12	0.06		
99	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
100					0.23	0.07		
101	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
102					0.12	0.06		

Niv 00 / ROU120 / 12-017 CUMULUS

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
105	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
106					0.08	0.08		
107	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
108					0.29	0.09		
109	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
110					0.22	0.07		
111	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
112					0.24	0.08		
113	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
114					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU120 / 12-017 SD

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
115	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
116					0.25	0.08		
117	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
118					0.25	0.08		
119	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
120					0.23	0.07		
121	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
122					0.25	0.08		
123	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
124					0.08	0.08		

Niv 00 / ROU020 / 020-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
131	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
132					0.21	0.07		
151	Zone A	Porte	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
133	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
134					0.21	0.07		
135	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
136					0.14	0.07		
137	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
138					0.21	0.07		
139	Zone E	Panneau	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
140					0.10	0.10		
141	Zone F	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
142					0.06	0.06		
143	Zone G	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
144					0.17	0.09		
145	Zone H	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
146					0.23	0.07		
149	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
150					0.14	0.07		
147	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
148					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU020 / 020-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
152	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
153					0.12	0.06		
154	Zone B	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
155					0.15	0.08		
156	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
157					0.14	0.07		
162	Zone C	Fenêtre	PVC	Non peint	Non mesuré		Aucun	
158	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
159					0.22	0.07		
160	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
161					0.17	0.09		

Niv 00 / ROU020 / 020-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
163	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
164					0.12	0.06		
171	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
172					0.08	0.08		
165	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
166					0.29	0.09		
167	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
168					0.24	0.08		
169	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
170					0.15	0.08		
175	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
173	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
174					0.13	0.07		

Niv 00 / ROU020 / 020-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
176	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
177					0.21	0.07		
178	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
179					0.08	0.08		
180	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
181					0.26	0.08		
182	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
183					0.21	0.07		
189	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
184	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
185					0.22	0.07		
186	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
187	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
188					0.10	0.10		

Niv 00 / ROU020 / 020-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
190	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
191					0.28	0.09		
192	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
193					0.30	0.09		
194	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
195					0.10	0.10		
196	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
197					0.26	0.08		
198	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
199	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
200					0.09	0.09		
201	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
202	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
203					0.11	0.06		

Niv 00 / ROU020 / 020-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
204	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
205					0.07	0.07		
206	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
207					0.08	0.08		
208	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
209					0.09	0.09		
210	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
211					0.09	0.09		
212	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
213	Zone D	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
214					0.23	0.07		
215	Zone Sol	Plinthes	Bois	Peinture	Non mesuré		Aucun	
218					0.13	0.07		
216	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
217					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU020 / 020-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
219	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
220					0.23	0.07		
221	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
222					0.16	0.08		
223	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
224					0.10	0.10		
225	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
226					0.06	0.06		
227	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
228	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
229					0.11	0.06		
230	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
231	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
232					0.06	0.06		

Niv 00 / ROU020 / 020-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
233	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
234					0.05	0.05		
235	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
236					0.05	0.05		
237	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
238					0.29	0.09		
239	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
240					0.06	0.06		
241	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
242	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
243					0.07	0.07		
244	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
245	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
246					0.16	0.08		

Niv 00 / ROU020 / 020-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
247	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
248					0.12	0.06		
249	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
250					0.24	0.08		
251	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
252					0.10	0.10		
253	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
254					0.06	0.06		
255	Zone C	Fenêtre 1	PVC		Non mesuré		Aucun	
261	Zone C	Fenêtre 2	PVC		Non mesuré		Aucun	
256	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
257					0.06	0.06		
258	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
259	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
260					0.08	0.08		

Niv 00 / ROU020 / EXTERIEUR

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
278	Zone Plafond	Toiture	Métal	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
279					0.26	0.08		
262	Toute Zone	Poteau 1 IPN	Métal	Peinture	2.6	0.14	Aucun	
264	Toute Zone	Poteau 2 IPN	Métal	Peinture	1.9	0.1	Aucun	
266	Toute Zone	Poteau 3 IPN	Métal	Peinture	2.1	0.11	Aucun	
268	Toute Zone	Poteau 4 IPN	Métal	Peinture	2.3	0.12	Aucun	
270	Toute Zone	Poteau 5 IPN	Métal	Peinture	1.7	0.09	Aucun	
272	Toute Zone	Poteau 6 IPN	Métal	Peinture	2.6	0.14	Aucun	
274	Toute Zone	Poteau 7 IPN	Métal	Peinture	2.3	0.12	Aucun	
276	Toute Zone	Poteau 8 IPN	Métal	Peinture	1.95	0.1	Aucun	

Niv 00 / ROU021 / 021-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
282	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
283					0.28	0.09		
284	Zone A	Porte	Bois	Peinture	Non mesuré		Aucun	
303					0.13	0.07		
285	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
286					0.22	0.07		
287	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
288					0.12	0.06		
289	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
290					0.07	0.07		
291	Zone E	Panneau	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
292					0.11	0.06		
293	Zone F	Panneau	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
294					0.18	0.09		
295	Zone G	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
296					0.29	0.09		
297	Zone H	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
298					0.21	0.07		
299	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
300					0.28	0.09		
301	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
302					0.22	0.07		

Niv 00 / ROU021 / 021-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
327	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
328					0.16	0.08		
329	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
330					0.22	0.07		
331	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
332					0.17	0.09		
333	Zone D	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
334					0.25	0.08		
335	Zone E	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
336					0.24	0.08		
337	Zone E	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
338	Zone F	Panneau	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
339					0.26	0.08		
340	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
341					0.14	0.07		

Niv 00 / ROU021 / 021-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
342	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
343					0.08	0.08		
344	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
345					0.17	0.09		
346	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
347					0.14	0.07		
348	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
349					0.15	0.08		

Niv 00 / ROU021 / 021-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
304	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
305					0.07	0.07		
306	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
307					0.20	0.1		
308	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
309					0.15	0.08		
310	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
311					0.10	0.10		
312	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
313	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
314					0.07	0.07		
315	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
316	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
317					0.22	0.07		

Niv 00 / ROU021 / 021-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
318	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
319					0.27	0.09		
320	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
321					0.12	0.06		
322	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
323					0.25	0.08		
324	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
325					0.10	0.10		
326	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
350					0.25	0.08		
351	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
352	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
353					0.21	0.07		

Niv 00 / ROU021 / 021-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
354	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
355					0.21	0.07		
356	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
357					0.15	0.08		
358	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
359					0.30	0.09		
360	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
361					0.21	0.07		
362	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
363	Zone D	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
364					0.05	0.05		
365	Zone Sol	Plinthes	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
366					0.15	0.08		
367	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
368					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU021 / 021-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
369	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
370					0.22	0.07		
371	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
372					0.17	0.09		
373	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
374					0.14	0.07		
375	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
376					0.28	0.09		
377	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
378	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
379					0.13	0.07		
380	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
381	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
382					0.20	0.1		

Niv 00 / ROU021 / 021-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
383 384	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.17 0.08	0.09 0.08	Aucun	
385 386	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.26 0.19	0.08 0.1	Aucun	
387 388	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.17 0.12	0.09 0.06	Aucun	
389 390	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.12 0.23	0.06 0.07	Aucun	
391	Zone C	Fenêtre 1	PVC		Non mesuré		Aucun	
392	Zone C	Fenêtre 2	PVC		Non mesuré		Aucun	
393 394	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.06 0.16	0.06 0.08	Aucun	
395	Zone Sol	Plinthes		Non peint	Non mesuré		Aucun	
396 397	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.25 0.13	0.08 0.07	Aucun	

Niv 00 / ROU021 / EXTERIEUR

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
280 281	Zone Plafond	Toiture	Métal	Peinture	0.14 0.30	0.07 0.09	Aucun	
263	Toute Zone	Poteau 1 IPN	Métal	Peinture	1.7	0.09	Aucun	
265	Toute Zone	Poteau 2 IPN	Métal	Peinture	2	0.11	Aucun	
267	Toute Zone	Poteau 3 IPN	Métal	Peinture	1.9	0.1	Aucun	
269	Toute Zone	Poteau 4 IPN	Métal	Peinture	2.2	0.12	Aucun	
271	Toute Zone	Poteau 5 IPN	Métal	Peinture	2.4	0.13	Aucun	
273	Toute Zone	Poteau 6 IPN	Métal	Peinture	2.6	0.14	Aucun	
275	Toute Zone	Poteau 7 IPN	Métal	Peinture	2.1	0.11	Aucun	
277	Toute Zone	Poteau 8 IPN	Métal	Peinture	2.6	0.14	Aucun	

Niv 00 / ROU110 / 11-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
398	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
399					0.09	0.09		
407	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
408					0.21	0.07		
400	Zone B	Panneau	Plâtre	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
401					0.24	0.08		
402	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
403					0.13	0.07		
404	Zone D	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
405					0.08	0.08		
406	Zone Plafond	Panneau	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU110 / 11-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
409	Zone A	Panneau	Bois	Non peint	Non mesuré		Aucun	
416	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
417					0.15	0.08		
410	Zone B	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
411					0.27	0.09		
419	Zone B	Fenêtre	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
420					0.11	0.06		
412	Zone C	Panneau	Bois	Non peint	Non mesuré		Aucun	
418	Zone C	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
413	Zone D	Panneau	Bois	Non peint	Non mesuré		Aucun	
414	Zone Plafond	Panneau	Placoplâtre	Peinture	Non mesuré		Aucun	
415					0.24	0.08		

Niv 00 / ROU110 / 11-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
421	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
422					0.07	0.07		
429	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
430					0.10	0.10		
423	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
424					0.07	0.07		
427	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
428					0.23	0.07		
431	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
432					0.13	0.07		
425	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
426					0.30	0.09		
433	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
434					0.05	0.05		

Niv 00 / ROU110 / 11-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
435	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
436					0.22	0.07		
437	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
438					0.24	0.08		
439	Zone B	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
440					0.17	0.09		
443	Zone B	Fenêtre	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
444					0.23	0.07		
441	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
442					0.05	0.05		
449	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
450					0.17	0.09		
445	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
446					0.18	0.09		
447	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
448					0.12	0.06		

Niv 00 / ROU110 / 11-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
451	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
452					0.20	0.1		
453	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
454					0.08	0.08		
455	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
456					0.23	0.07		
457	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
458					0.19	0.1		
459	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
460					0.25	0.08		
461	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
462					0.28	0.09		
463	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
464					0.26	0.08		

Niv 00 / ROU110 / 11-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
465	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
466					0.23	0.07		
467	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
468					0.14	0.07		
469	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
470					0.30	0.09		
471	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
472					0.16	0.08		
475	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
476					0.17	0.09		
477	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
478					0.21	0.07		

Niv 00 / ROU110 / 11-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
473	Zone A	Panneau	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
474					0.18	0.09		
489	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
490					0.14	0.07		
479	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
480					0.23	0.07		
481	Zone C	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
482					0.15	0.08		
483	Zone D	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
484					0.20	0.1		
485	Zone E	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
486					0.28	0.09		
487	Zone F	Panneau	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
488					0.17	0.09		

Niv 00 / ROU110 / EXTERIEUR

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
491	Zone Plafond	Toiture	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
492					0.29	0.09		
493	Toute Zone	Poteau 1 IPN	Métal	Peinture	1.6	0.08	Aucun	
494	Toute Zone	Poteau 2 IPN	Métal	Peinture	1.9	0.1	Aucun	
495	Toute Zone	Poteau 3 IPN	Métal	Peinture	2.3	0.12	Aucun	
496	Toute Zone	Poteau 4 IPN	Métal	Peinture	2.5	0.13	Aucun	
497	Toute Zone	Poteau 5 IPN	Métal	Peinture	2	0.11	Aucun	
498	Toute Zone	Poteau 6 IPN	Métal	Peinture	2.4	0.13	Aucun	

Niv 00 / ROU040 / 04-001/04-002/04-005/04-007/04-008/04-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
499	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
500					0.19	0.1		
507	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
501	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
502					0.14	0.07		
503	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
504					0.20	0.1		
505	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
506					0.06	0.06		
508	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
509	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU040 / 04-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
534	Zone A	Mur		Brut	Non mesuré		Aucun	
536	Zone A	Porte	PVC	Peinture	Non mesuré		Aucun	
538	Zone B	Mur		Brut	Non mesuré		Aucun	
540	Zone C	Mur		Brut	Non mesuré		Aucun	
542	Zone D	Mur		Brut	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU040 / 04-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
510	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
511					0.11	0.06		
518	Zone A	Porte	Métal	Peinture	1.3	0.07	Aucun	
512	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
513					0.18	0.09		
514	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
515					0.14	0.07		
516	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
517					0.08	0.08		
520	Zone Plafond	Panneau	Fibro ciment		0.14	0.07	Aucun	
521					0.06	0.06		

Niv 00 / ROU040 / 04-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
522	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
523					0.22	0.07		
524	Zone A	Porte	Métal	Peinture	1.5	0.08	Aucun	
526	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
527					0.08	0.08		
528	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
529					0.07	0.07		
530	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
531					0.22	0.07		
532	Zone Plafond	Panneau	Fibro ciment		0.24	0.08	Aucun	
533					0.14	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
639	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
640	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
641	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
642	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
643	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
644	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
645					0.17	0.09		

Niv 00 / ROU050 / 05-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
646	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
647	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
648	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
649	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
650	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
651	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
652					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
653	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
654	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
655	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
656	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
657	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
658	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
659					0.05	0.05		

Niv 00 / ROU050 / 05-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
660	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
661	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
662	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
663	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
664	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
665	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
666					0.29	0.09		

Niv 00 / ROU050 / 05-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
578	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
579					0.12	0.06		
580	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
581	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
582					0.11	0.06		
583	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
584					0.14	0.07		
585	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
586					0.24	0.08		
587	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
588					0.26	0.08		

Niv 00 / ROU050 / 05-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
560	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
561					0.26	0.08		
562	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
563	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
564					0.18	0.09		
565	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
566					0.10	0.10		
567	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
568					0.11	0.06		
569	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
570					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
549	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
550					0.18	0.09		
557	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
551	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
552					0.26	0.08		
553	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
554					0.06	0.06		
555	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
556					0.11	0.06		
558	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
559					0.21	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
535	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
525	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
537	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
519	Toute Zone	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU050 / 05-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
539	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
541	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
543	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
544	Toute Zone	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU050 / 05-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
545	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
546	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
547	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
548	Toute Zone	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU050 / 05-011

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
631	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
632	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
633	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
634	Toute Zone	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU050 / 05-012

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
635	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
636	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
637	Zone Plafond	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	
638	Toute Zone	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU050 / 05-013

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
571	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
572	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
573	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
574	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
575	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
576	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
577					0.19	0.1		

Niv 00 / ROU050 / 05-014

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
589	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
590	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
591	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
592	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
593	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
594	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
595					0.23	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-015

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
596	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
597	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
598	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
599	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
600	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
601	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
602					0.26	0.08		

Niv 00 / ROU050 / 05-016

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
603	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
604	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
605	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
606	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
607	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
608	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
609					0.07	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-017

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
610	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
611	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
612	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
613	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
614	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
615	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
616					0.21	0.07		

Niv 00 / ROU050 / 05-018

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
617	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
618	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
619	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
620	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
621	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
622	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
623					0.06	0.06		

Niv 00 / ROU050 / 05-019

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
624	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
625	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
626	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
627	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
628	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
629	Toute Zone	Fenêtre	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
630					0.24	0.08		

Niv 00 / ROU060 / 06-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
667	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
668					0.14	0.07		
676	Zone A	Porte	Métal	Peinture	1.1	0.06	Aucun	
669	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
670					0.29	0.09		
671	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
672					0.27	0.09		
673	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
674					0.17	0.09		
675	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
681	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
682	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
683	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
684	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
685	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
686	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
677	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
687	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
688	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
680	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
679	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
678	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
689	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
690	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
691	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
692	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
693	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
694	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
695	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
696	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
697	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
698	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
699	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
700	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU060 / 06-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
701	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
702	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
703	Toute Zone	Mur		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU090 / 09-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
704	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
709	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
705	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
706	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
707	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
708	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU090 / 09-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
710	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
711	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
712	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
713	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
714	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
715	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU090 / 09-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
717	Zone A	Porte	Métal	Peinture	1.5	0.08	Aucun	
716	Toute Zone	Murs		Brut	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU070 / 07-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
718	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
719	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
720	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
721	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
722	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
723	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU070 / 07-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
724	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
725	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
726	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
727	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
728	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
729	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU080 / 08-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
730	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
731	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
732	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
733	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
734	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
735	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU080 / 08-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
736	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
737	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
738	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
739	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
740	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
741	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU100 / 10-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
742	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
743	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
744	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
745	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
746	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
747	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU100 / 10-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
748	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
749	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
750	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
751	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
752	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
753	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU030 / 03-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
866	Zone A	Mur	Bois	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
867					0.17	0.09		
868	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
869					0.26	0.08		
870	Zone B	Mur	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
871					0.11	0.06		
872	Zone C	Mur	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
873					0.20	0.1		
876	Zone D	Mur	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
877					0.16	0.08		
878	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
879					0.05	0.05		
874	Toute Zone	Fenêtre	PVC	Peinture	Non mesuré		Aucun	
875	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
880	Zone A	Mur	Fibro ciment	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
881					0.26	0.08		
882	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
883					0.18	0.09		
894	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
884	Zone B	Mur	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
885					0.25	0.08		
886	Zone C	Mur	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
887					0.07	0.07		
888	Zone D	Mur	Fibro ciment	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
889					0.29	0.09		
890	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
891					0.16	0.08		
892	Toute Zone	Fenêtre	PVC	Peinture	Non mesuré		Aucun	
893	Toute Zone	Plinthes		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU030 / 03-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
895	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
896					0.24	0.08		
900	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
899					0.20	0.1		
901	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
902					0.11	0.06		
903	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
904					0.25	0.08		
905	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
906					0.15	0.08		
907	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
897	Toute Zone	Cloisons	Placoplâtre	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
898					0.14	0.07		

Niv 00 / ROU030 / 03-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
909	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
910					0.28	0.09		
911	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
912					0.21	0.07		
913	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
914					0.07	0.07		
915	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
916					0.15	0.08		
917	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
918					0.08	0.08		
919	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
921	Toute Zone	Cloisons	Placoplâtre	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
922					0.11	0.06		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
908	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
920					0.16	0.08		
923	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
924					0.23	0.07		
925	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
926					0.15	0.08		
927	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
928					0.06	0.06		
929	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
930					0.07	0.07		
931	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Non peint	Non mesuré		Aucun	
932	Toute Zone	Cloisons	Placoplâtre	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
933					0.09	0.09		

Niv 00 / ROU030 / 03-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
796	Zone A	Mur	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
797					0.21	0.07		
804	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
805					0.20	0.1		
798	Zone B	Mur	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
799					0.29	0.09		
800	Zone C	Mur	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
801					0.24	0.08		
808	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
809					0.09	0.09		
802	Zone D	Mur	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
803					0.16	0.08		
806	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
807					0.24	0.08		

Niv 00 / ROU030 / 03-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
810	Zone A	Mur	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
811					0.28	0.09		
812	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
813					0.25	0.08		
814	Zone B	Mur	Bois	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
815					0.22	0.07		
816	Zone C	Mur	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
817					0.14	0.07		
818	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
819					0.10	0.10		
820	Zone D	Mur	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
821					0.10	0.10		
822	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
823					0.11	0.06		

Niv 00 / ROU030 / 03-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
768	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
769					0.13	0.07		
770	Zone A	Fenêtres	PVC		Non mesuré		Aucun	
771	Zone A	Fenêtres Barreaux	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
772					0.09	0.09		
773	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
774	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
775					0.06	0.06		
776	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
777					0.06	0.06		
778	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
779					0.17	0.09		
780	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
781					0.09	0.09		

Niv 00 / ROU030 / 03-011

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
852	Zone A	Mur	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
853					0.05	0.05		
854	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
855					0.26	0.08		
856	Zone B	Mur	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
857					0.28	0.09		
858	Zone C	Mur	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
859					0.11	0.06		
860	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
861					0.09	0.09		
862	Zone D	Mur	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
863					0.23	0.07		
864	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
865					0.07	0.07		

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
754	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
755					0.06	0.06		
762	Zone A	Fenêtres	PVC		Non mesuré		Aucun	
763	Zone A	Fenêtres Barreaux	Métal	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
764					0.14	0.07		
765	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
756	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
757					0.23	0.07		
758	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
759					0.17	0.09		
760	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
761					0.06	0.06		
766	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
767					0.06	0.06		

Niv 00 / ROU030 / 03-013

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
782	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
783					0.28	0.09		
784	Zone A	Fenêtres	PVC		Non mesuré		Aucun	
785	Zone A	Fenêtres Barreaux	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
786					0.24	0.08		
787	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
788	Zone B	Panneau	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
789					0.26	0.08		
790	Zone C	Panneau	Bois	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
791					0.14	0.07		
792	Zone D	Panneau	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
793					0.15	0.08		
794	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
795					0.16	0.08		

Niv 00 / ROU030 / 03-014

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
824	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
825	Zone A	Panneau	Fibro ciment	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
826					0.06	0.06		
835	Zone A	Fenêtres	PVC		Non mesuré		Aucun	
827	Zone B	Panneau	Placoplâtre	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
828					0.28	0.09		
829	Zone C	Panneau	Placoplâtre	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
830					0.06	0.06		
831	Zone D	Panneau	Placoplâtre	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
832					0.28	0.09		
833	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
834					0.18	0.09		

Niv 00 / ROU030 / 03-015

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
836	Zone A	Mur	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
837					0.11	0.06		
838	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
839					0.22	0.07		
840	Zone B	Mur	Fibro ciment	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
841					0.30	0.09		
842	Zone C	Mur	Fibro ciment	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
843					0.05	0.05		
844	Zone C	Fenêtre	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
845					0.23	0.07		
846	Zone D	Mur	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
847					0.27	0.09		
848	Zone Plafond	Plafond	Dalles de faux plafond	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
849					0.23	0.07		
850	Toute Zone	Cloisons Préfabriquée	Placoplâtre	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
851					0.06	0.06		

Niv 00 / ROU030 / EXTERIEUR

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
934	Zone Plafond	Toiture	Métal	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
935					0.22	0.07		
936	Toute Zone	Poteau 1 IPN	Métal	Peinture	1.6	0.08	Aucun	
937	Toute Zone	Poteau 2 IPN	Métal	Peinture	2	0.11	Aucun	
938	Toute Zone	Poteau 3 IPN	Métal	Peinture	1.5	0.08	Aucun	
939	Toute Zone	Poteau 4 IPN	Métal	Peinture	2.3	0.12	Aucun	
940	Toute Zone	Poteau 5 IPN	Métal	Peinture	1.8	0.09	Aucun	
941	Toute Zone	Poteau 6 IPN	Métal	Peinture	1.6	0.08	Aucun	
942	Toute Zone	Poteau 7 IPN	Métal	Peinture	1.3	0.07	Aucun	
943	Toute Zone	Poteau 8 IPN	Métal	Peinture	1.7	0.09	Aucun	

Niv 00 / ROU170 / 17-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
944	Zone A	Porte	Métal	Peinture	1.1	0.06	Aucun	

Niv 00 / ROU170 / 17-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
945	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
949	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
946	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
947	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
948	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
951	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
950	Toute Zone	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU170 / 17-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
952	Zone A	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
953	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
954	Zone B	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
955	Zone C	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
956	Zone D	Mur	Enduit	Carrelage	Non mesuré		Aucun	
957	Zone Plafond	Panneau	PVC		Non mesuré		Aucun	
958	Toute Zone	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-001

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
985	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
984	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
983	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
971	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
972					0.06	0.06		
973	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
974	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
975					0.14	0.07		
976	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
977					0.12	0.06		
978	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
979					0.20	0.1		
980	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
981					0.07	0.07		
982	Toute Zone	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
959	Zone A	Mur	Enduit	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
960					0.08	0.08		
969	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
961	Zone B	Mur	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
962					0.07	0.07		
963	Zone C	Mur	Enduit	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
964					0.13	0.07		
965	Zone D	Mur	Enduit	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
966					0.14	0.07		
967	Zone Plafond	Plafond	Placoplâtre	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
968					0.21	0.07		
970	Toute Zone	Fenêtre	PVC		Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
986	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
987	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
988	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
989	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
990	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
991	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
992	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
993	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
994	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
995	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
996	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
997	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
998	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
999	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
1000	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-009

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
1001	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
1002	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
1003	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

Niv 00 / ROU180 / 18-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
1004	Zone A	Porte	PVC		Non mesuré		Aucun	
1005	Zone Plafond	Plafond	PVC		Non mesuré		Aucun	
1006	Toute Zone	Panneaux		Carrelage	Non mesuré		Aucun	

RESUME

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	670	308

ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION




Les effets du plomb sur la santé


L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions.

Planche de repérage usuel	
Type: Plan	Croquis: 1/16
Auteur: HERNANDEZ Emmanuel / Alpes Contrôles	
- D56	
13756 ROUSSET	




 Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT Saimiris Haut			ECHELLE GRAPHIQUE 	Indice A	Date 31/07/2016	Désignation de la modification / mise à jour Plan d'origine	Dessiné par S ROUX et J M GARCON
	DATE 05/04/2022	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 00	ECHELLE Echelle: 1/4000m	Fichier : ROU12000 A			LOGICIEL AutoCAD 2009			

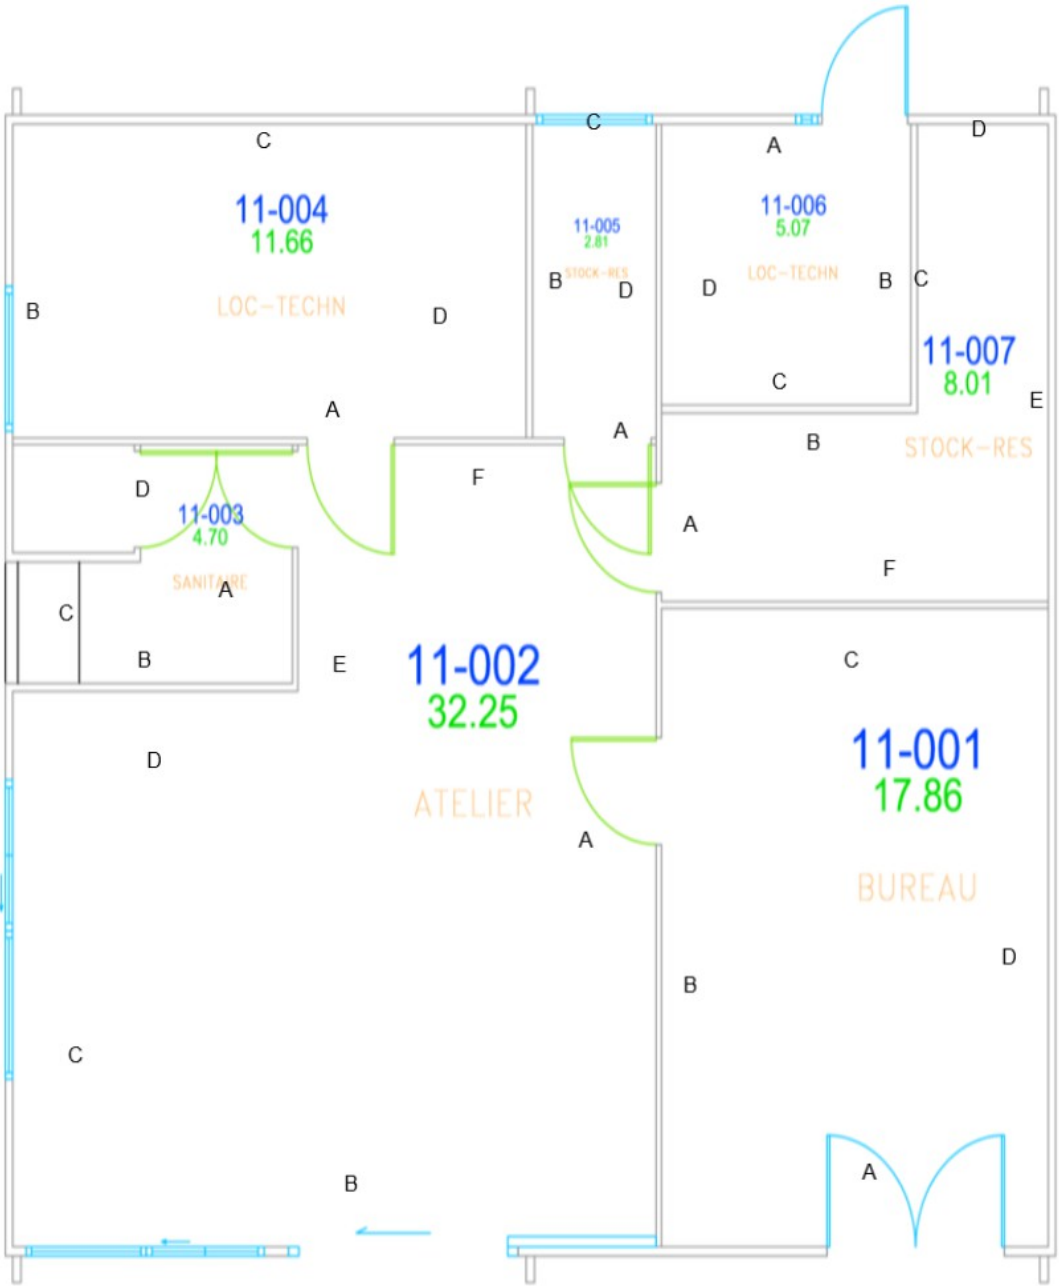

Adresse du bâtiment : ROUSSET - Atelier - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.


 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	<div>SITE</div> <div>ROUSSET</div>		<div>NOM USUEL DU BATIMENT</div> <div>Atelier</div>				<div>ECHELLE GRAPHIQUE</div> 	Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	<div>DATE</div> <div>15/11/2021</div>	<div>NIVEAU/COUPE/FACADES</div> <div>NIVEAU 00</div>	<div>ECHELLE</div> <div>Echelle : 1/50ème</div>					A	31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J-M GARCON
	Fichier : ROU11000 A									<div>LOGICIEL</div> <div>Autocad 2020</div>	

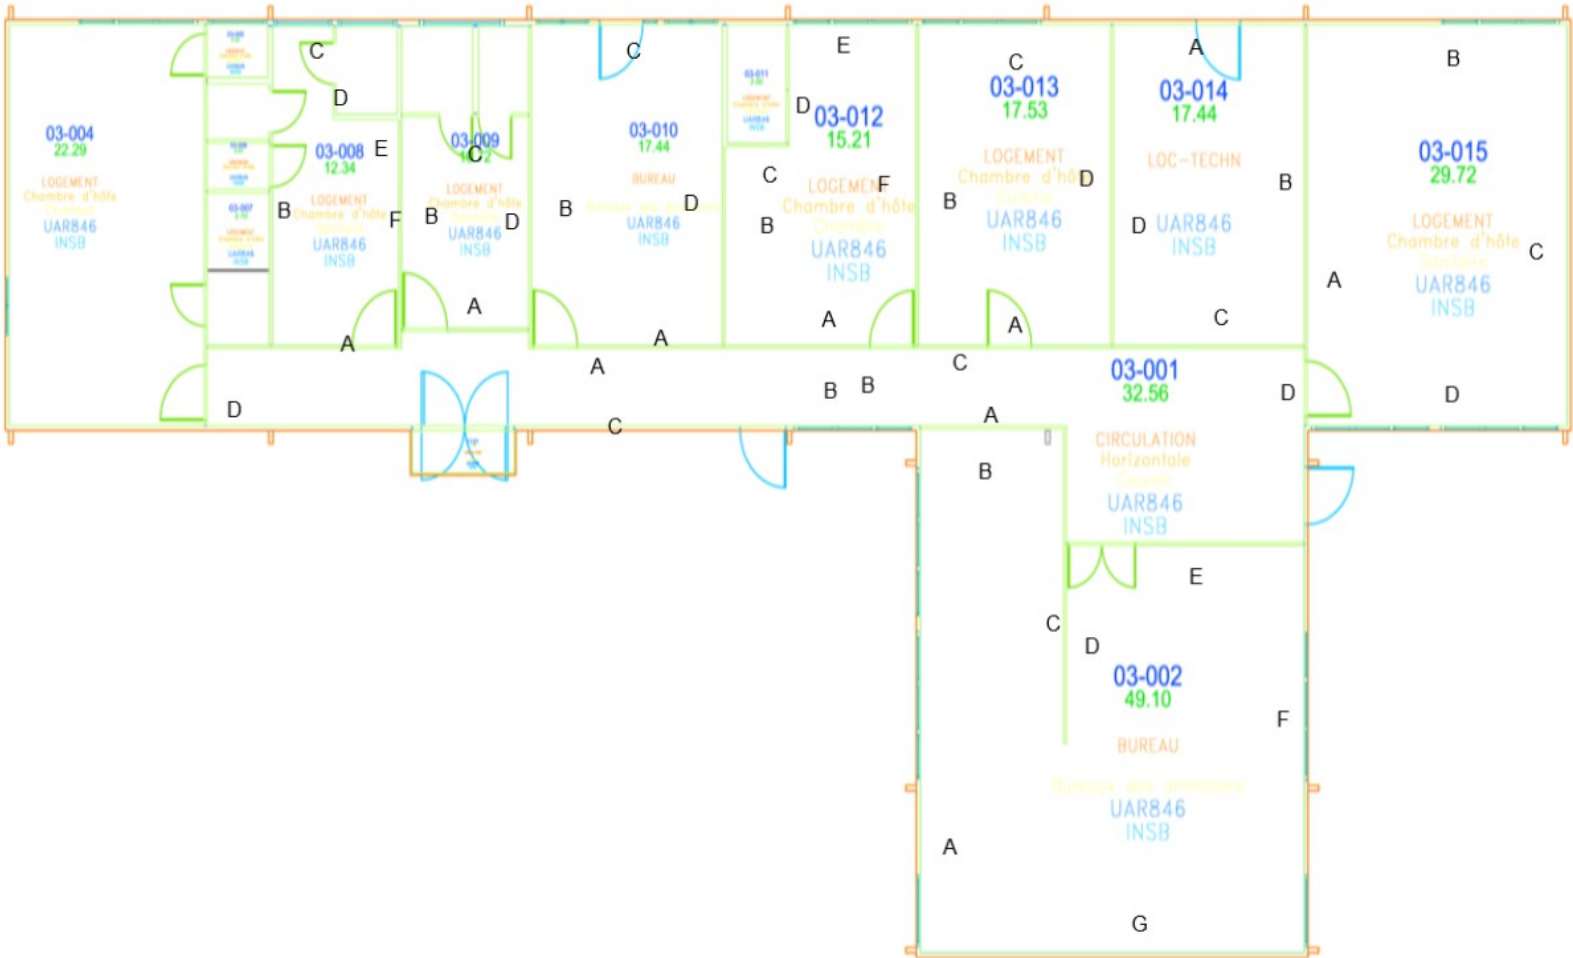


Adresse du bâtiment : ROUSSET - Bâtiment Administratif des Animaliers - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.

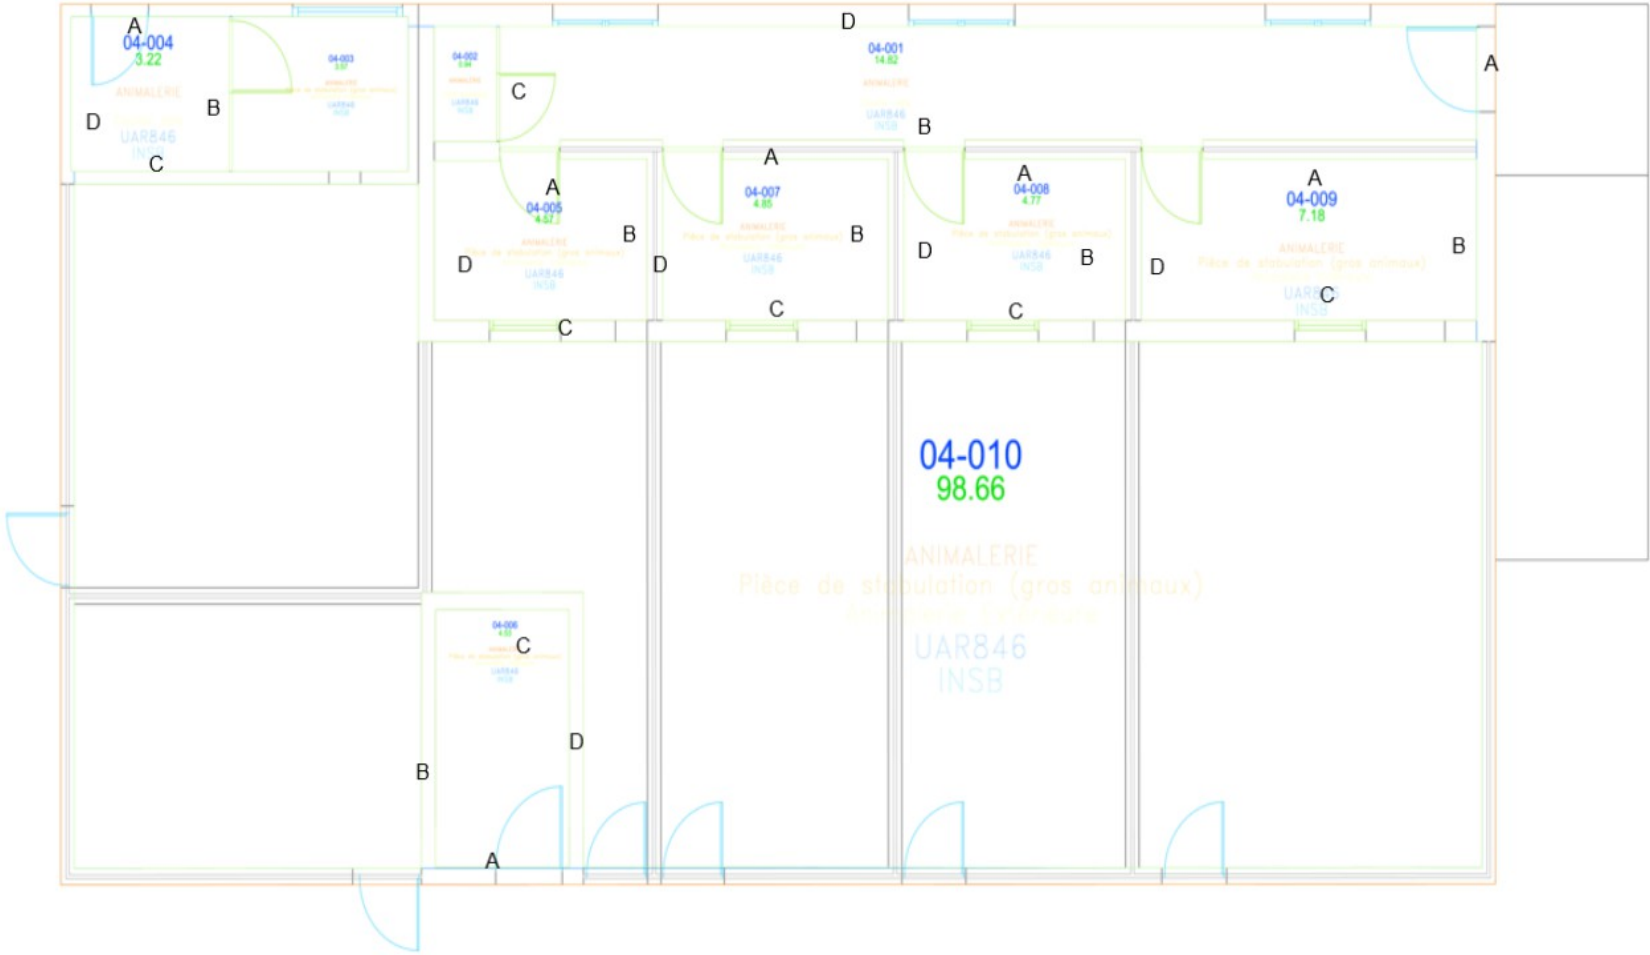



 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	<div>SITE</div> <div>ROUSSET</div>		<div>NOM USUEL DU BATIMENT</div> <div>Bâtiment Administratif des Animaliers</div>				<div>ECHELLE GRAPHIQUE</div> <div></div>		Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	<div>DATE</div> <div>15/11/2021</div>	<div>NIVEAU/COUPE/FACADES</div> <div>NIVEAU 00</div>	<div>ECHELLE</div> <div>Echelle : 1/100ème</div>	A			31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J M GARCON			
	Fichier : <div>ROU03000</div> A							LOGICIEL	Autocad 2020			

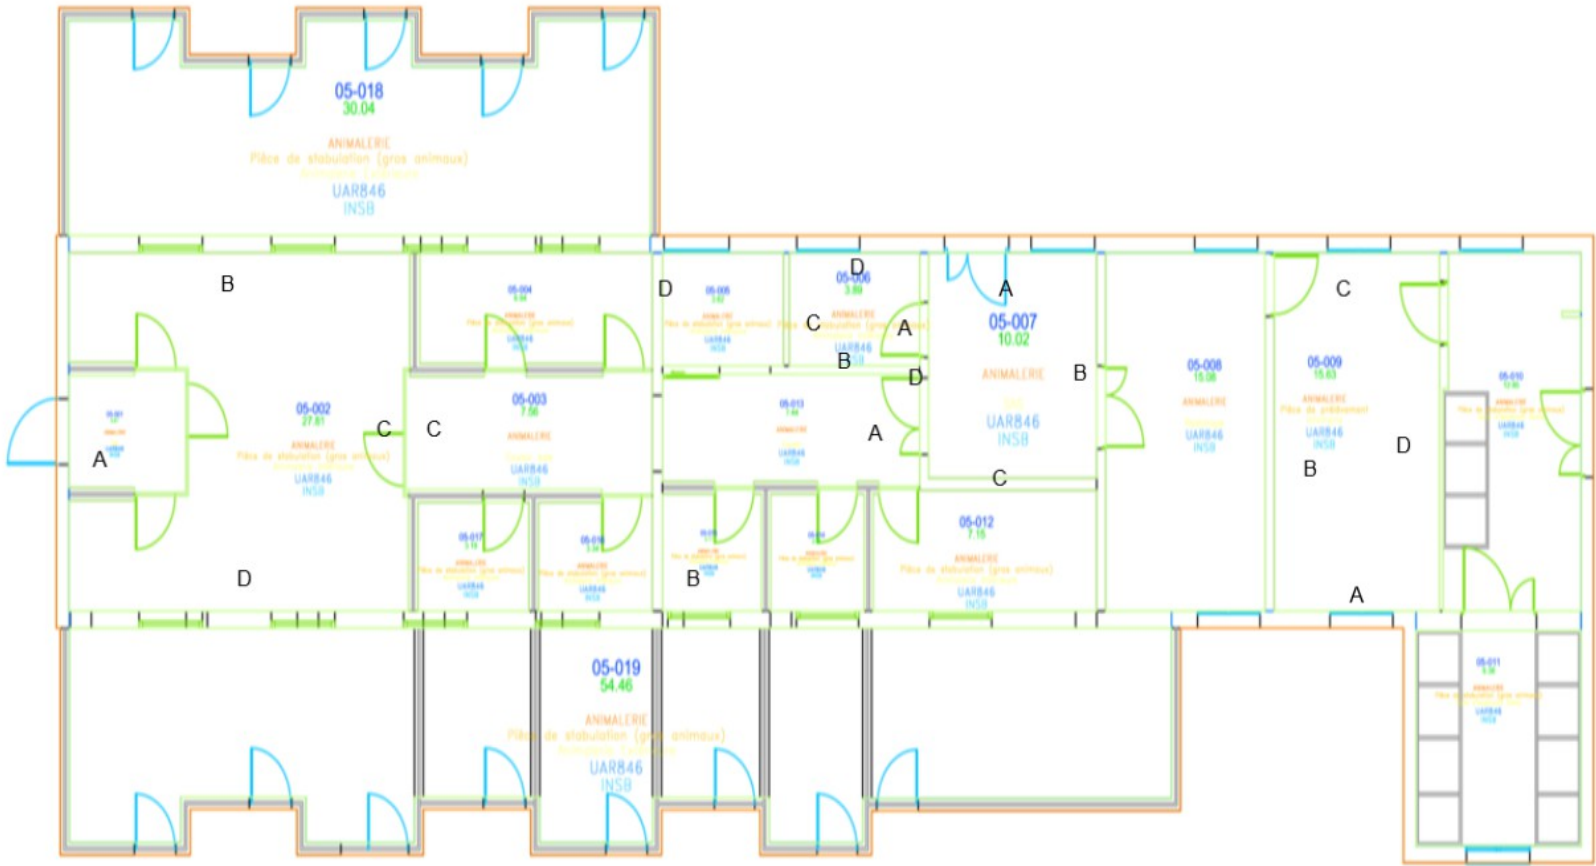




Adresse du bâtiment : ROUSSET - Animalerie B2 (Babouins) - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.

 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT Animalerie B2 (Babouins)				ECHELLE GRAPHIQUE 	Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	DATE 15/11/2021	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 00	ECHELLE Echelle : 1/100ème					A	31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J M GARCIN
	Fichier : R O U 0 5 0 0 0 A							LOGICIEL Autocad 2020			



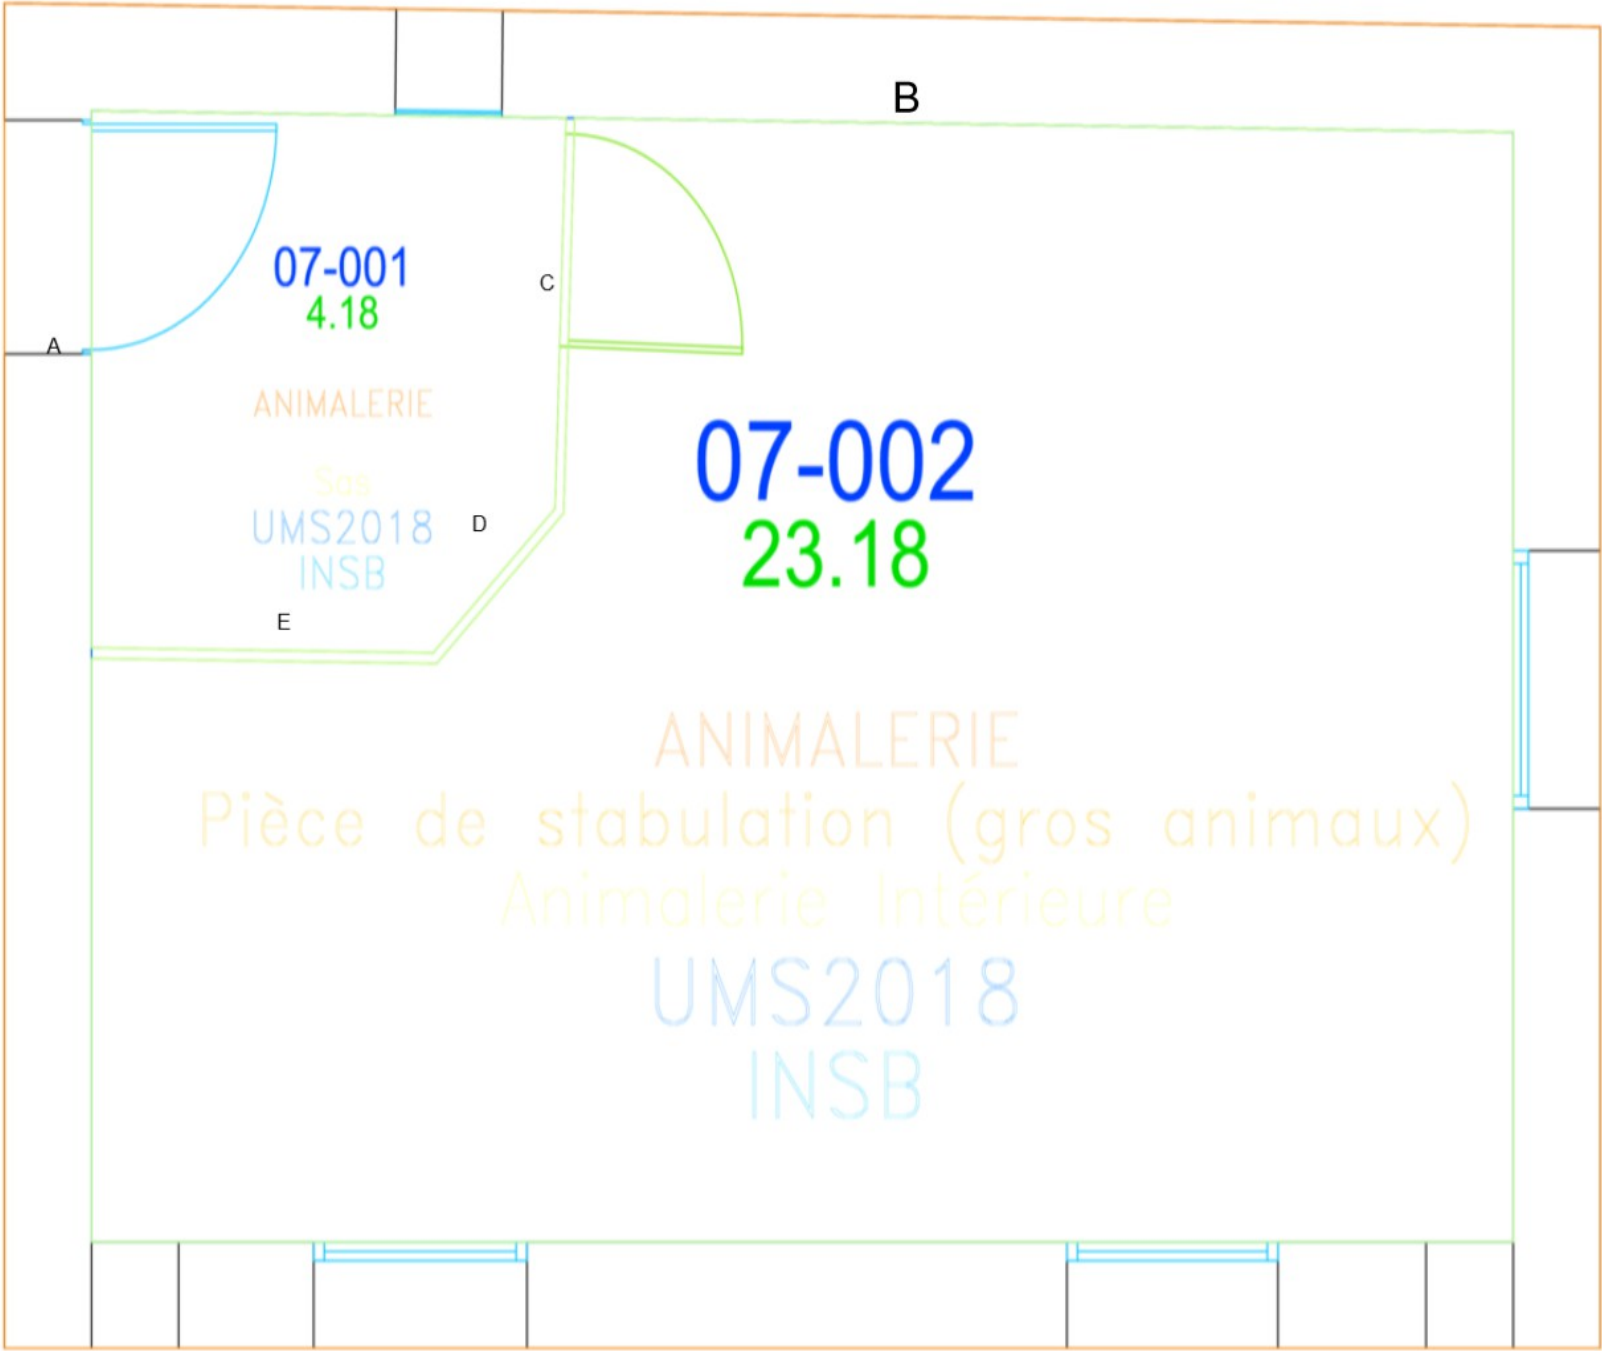

Adresse du bâtiment : ROUSSET - Animalerie B5 - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset



Délégation Provence-Corse - DR12


Service Technique et Logistique

31 chemin Joseph Aiguier


13402 Marseille cedex 20

SITE		NOM USUEL DU BATIMENT
ROUSSET		Animalerie B5
DATE	NIVEAU/COUPE/FACADES	ECHELLE






Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
A	31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J M GARCON
Fichier : ROU07000A			LOGICIEL

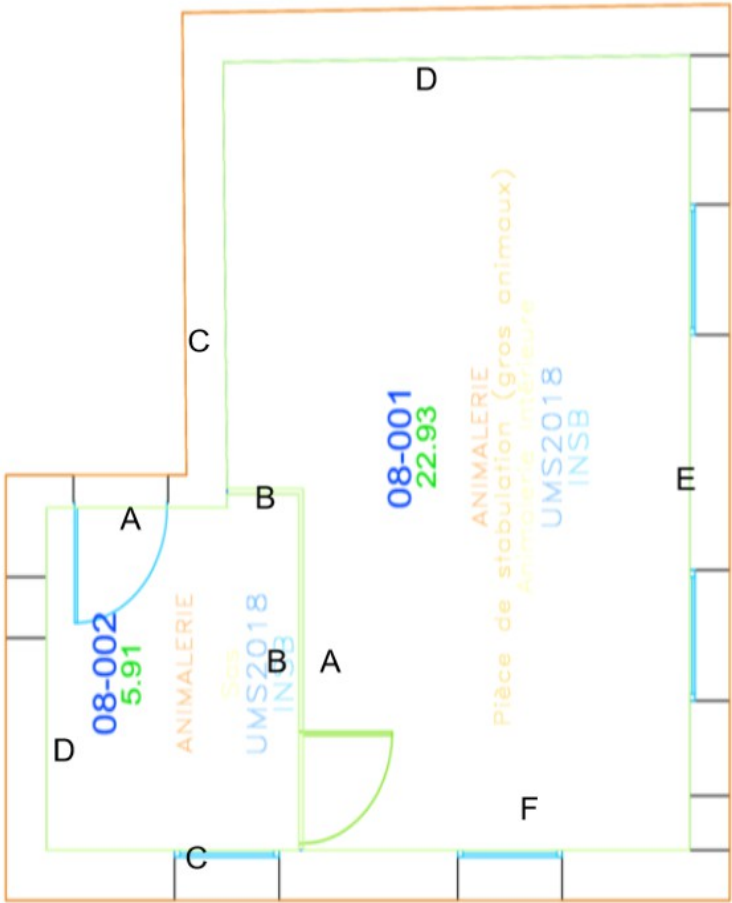

Adresse du bâtiment : ROUSSET - Hangar Congélateurs - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset


 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	<div>SITE</div> <div>ROUSSET</div>		<div>NOM USUEL DU BATIMENT</div> <div>Hangar Congélateurs</div>				<div>ECHELLE GRAPHIQUE</div> <div></div>	Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	<div>Dessiné par</div> <div>S ROUX et JM GARCON</div>
	<div>DATE</div> <div>18/11/2020</div>	<div>NIVEAU/COUPE/FACADES</div> <div>NIVEAU 00</div>	<div>ECHELLE</div> <div>Echelle : 1/50ème</div>	A				31/07/2016	Plan d'origine	<div>LOGICIEL</div> <div>Autocad 2015</div>	
	Fichier : ROU08000 A										

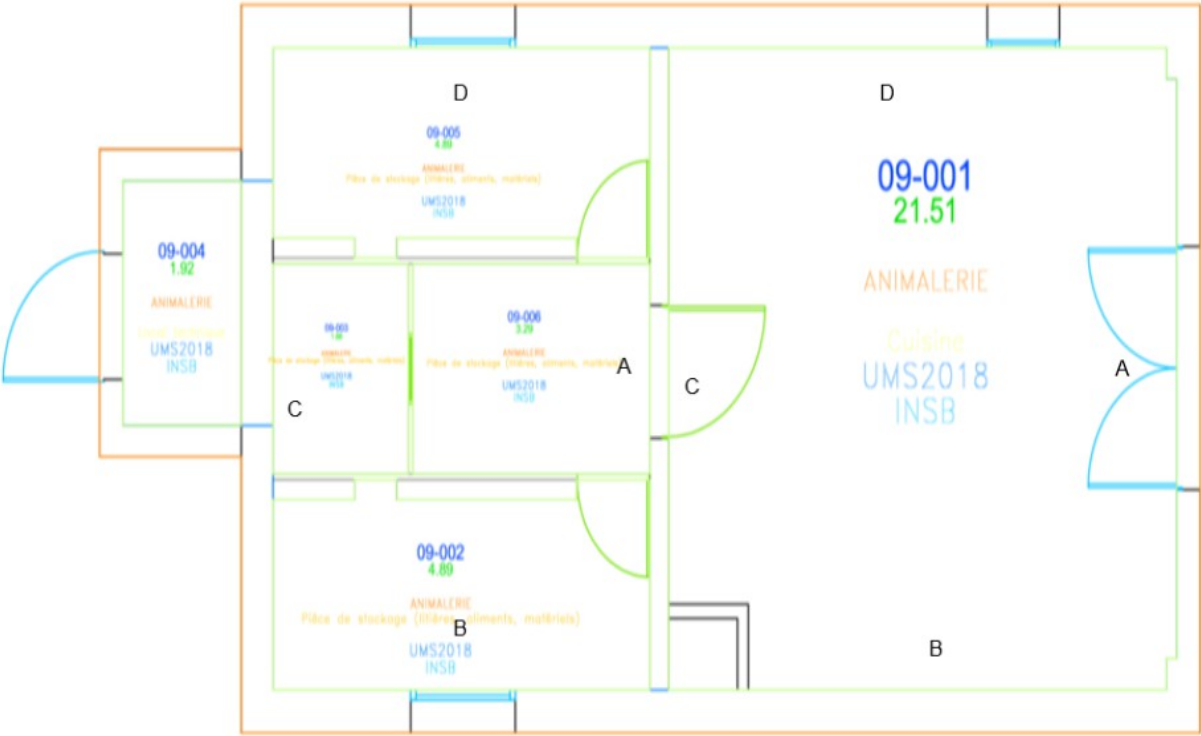

Adresse du bâtiment : ROUSSET - Atelier - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.


 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT Atelier		  	Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	DATE 18/11/2020	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 00	ECHELLE Echelle : 1/50ème	A		31/07/2016	Plan d'origine	S. ROUX et J.M. GARCON	
	Fichier : ROU09000 A					LOGICIEL Autocad 2015			

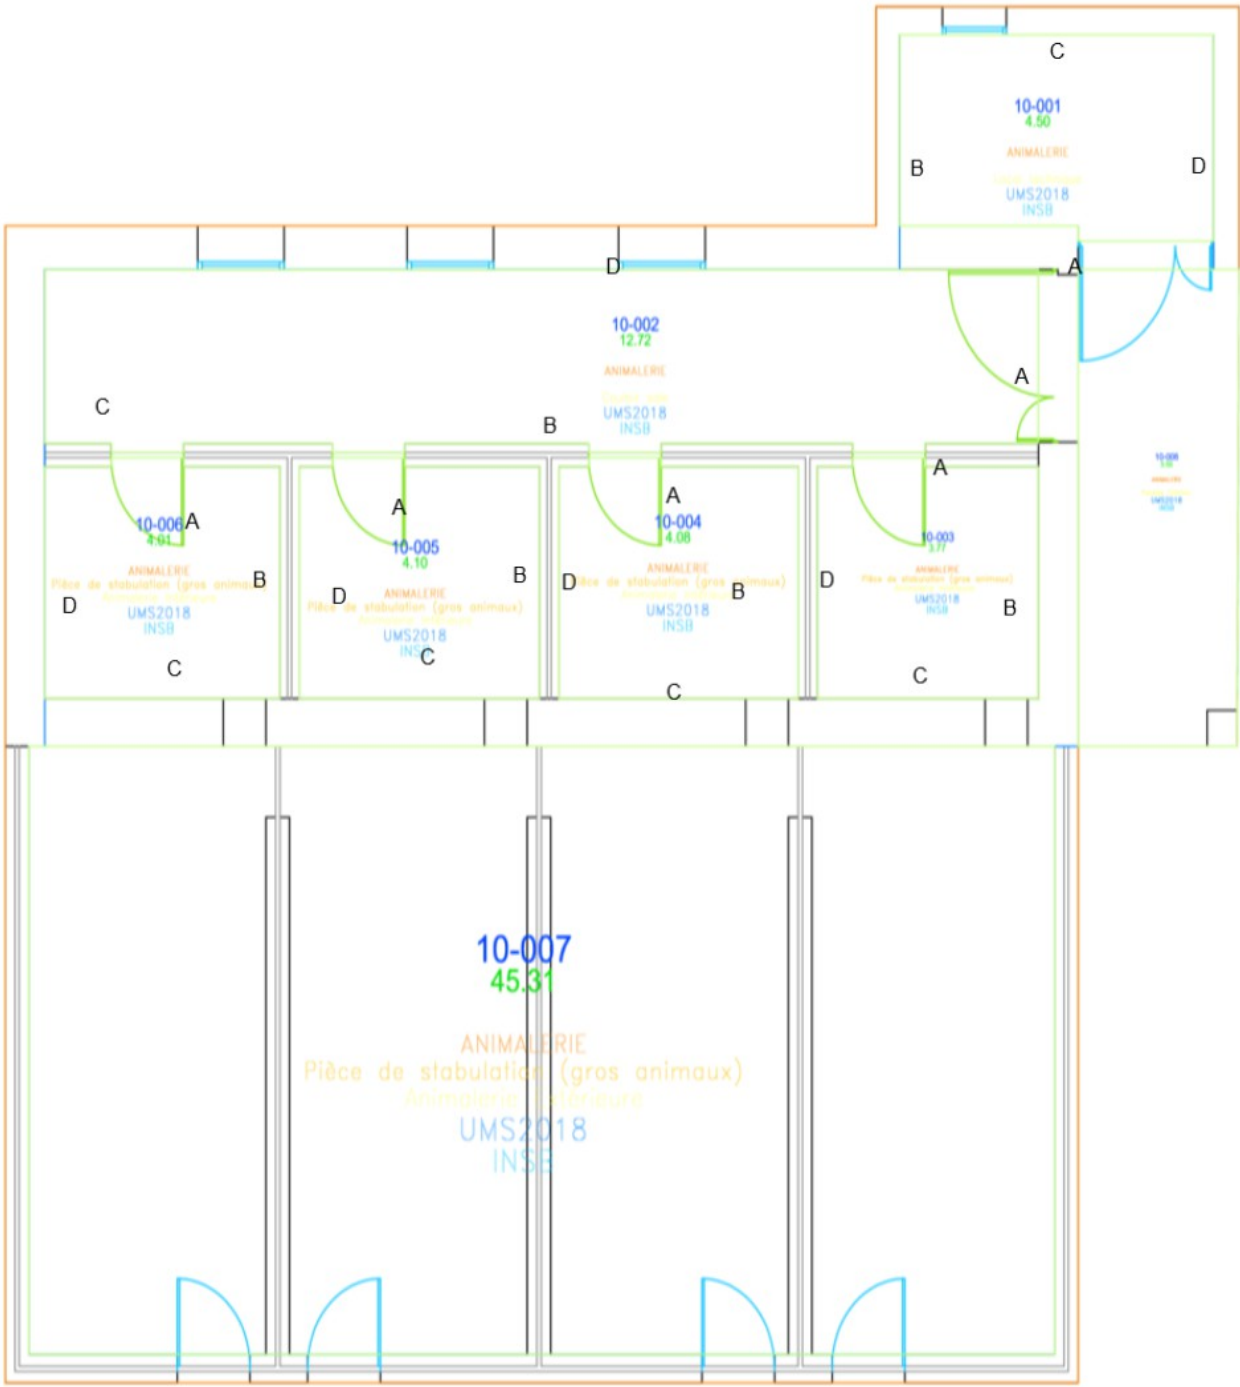

dresse du bâtiment : ROUSSET - Macaques - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset


Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.

 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	<div>SITE</div> <div>ROUSSET</div>		<div>NOM USUEL DU BATIMENT</div> <div>Macaques</div>				<div>ECHELLE GRAPHIQUE</div> <div></div>		Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	<div>DATE</div> <div>18/11/2020</div>	<div>NIVEAU/COUPE/FACADES</div> <div>NIVEAU 00</div>	<div>ECHELLE</div> <div>Echelle : 1/50ème</div>				A	31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J M GARCON		
	Fichier : <div>ROU100000</div> A									<div>LOGICIEL</div> <div>Autocad 2015</div>		

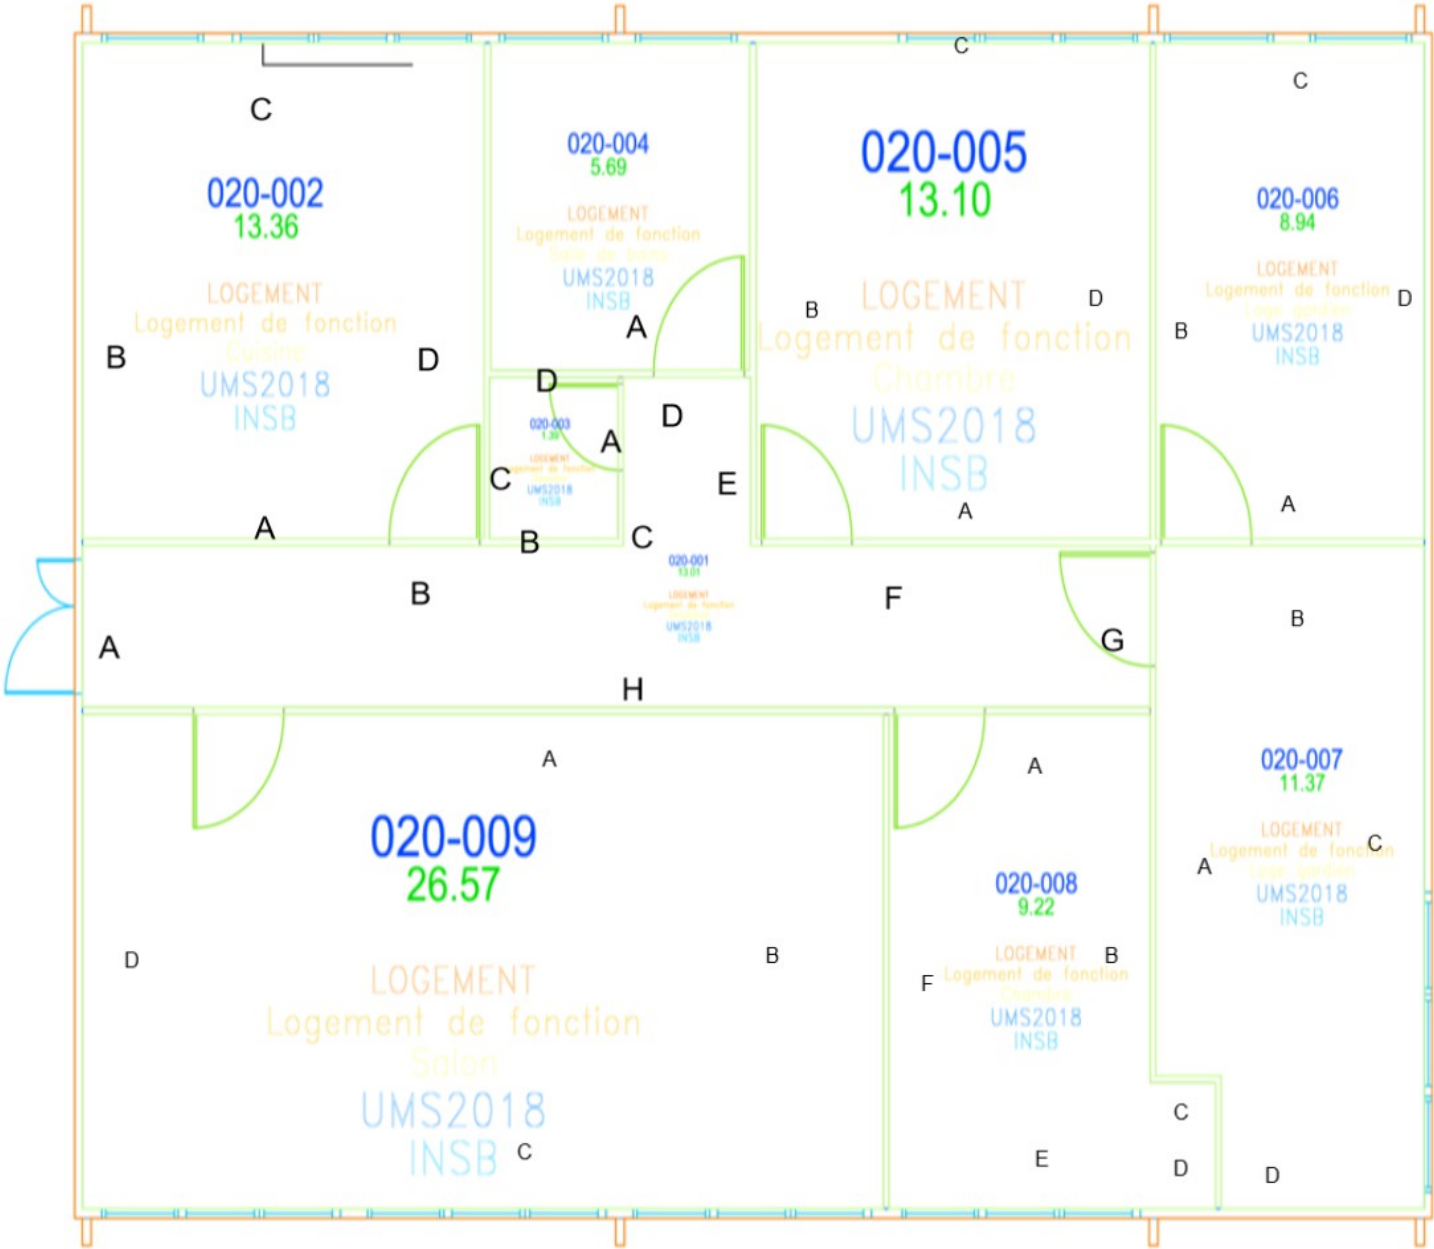





Adresse du bâtiment : ROUSSET - logement 1 - 2230 route des quatre tours - 13790-ROUSSET

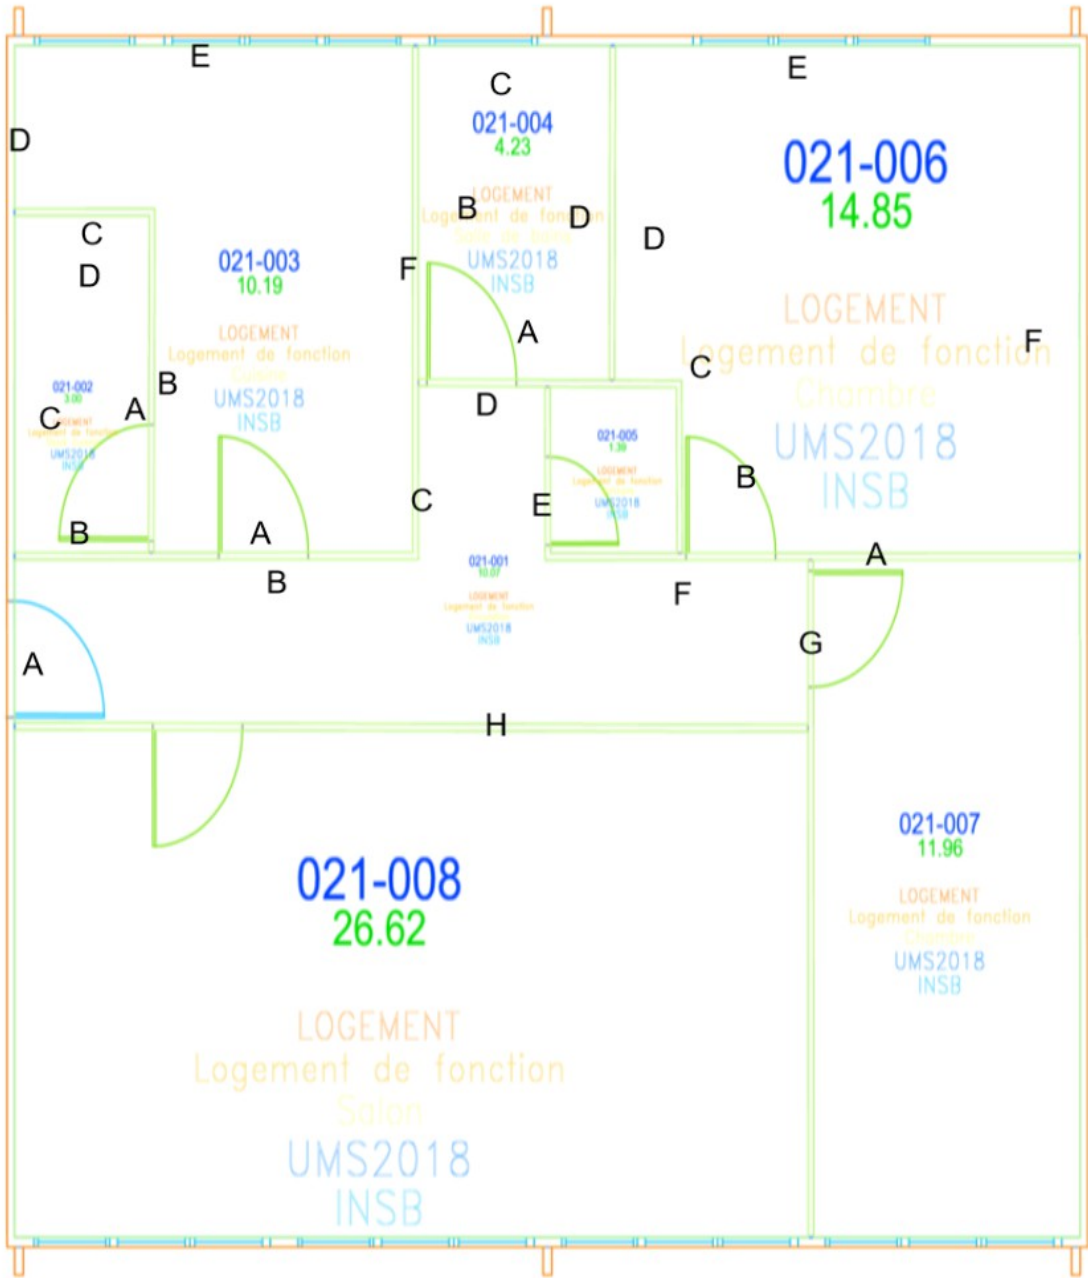
 Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT logement 1			ECHELLE GRAPHIQUE 	Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	DATE 26/02/2024	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 00	ECHELLE Echelle : 1/50ème	A			31/07/2016	Plan d'origine	Stéphane ROUX et Jean-Michel GARCIA	
	Fichier : ROU020000 A							LOGICIEL Autocad 2015		





dresse du bâtiment : ROUSSET - Logement R-Francioly - Chemin Départemental n°56 - 13790-Rousset

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CHRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.

 Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT Logement R-Francioly					Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	DATE 18/11/2020	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 00	ECHELLE Echelle : 1/50ème					A	31/07/2016	Plan d'origine	S ROUX et J M GARCON
	Fichier : ROU02100 A								LOGICIEL Autocad 2015		

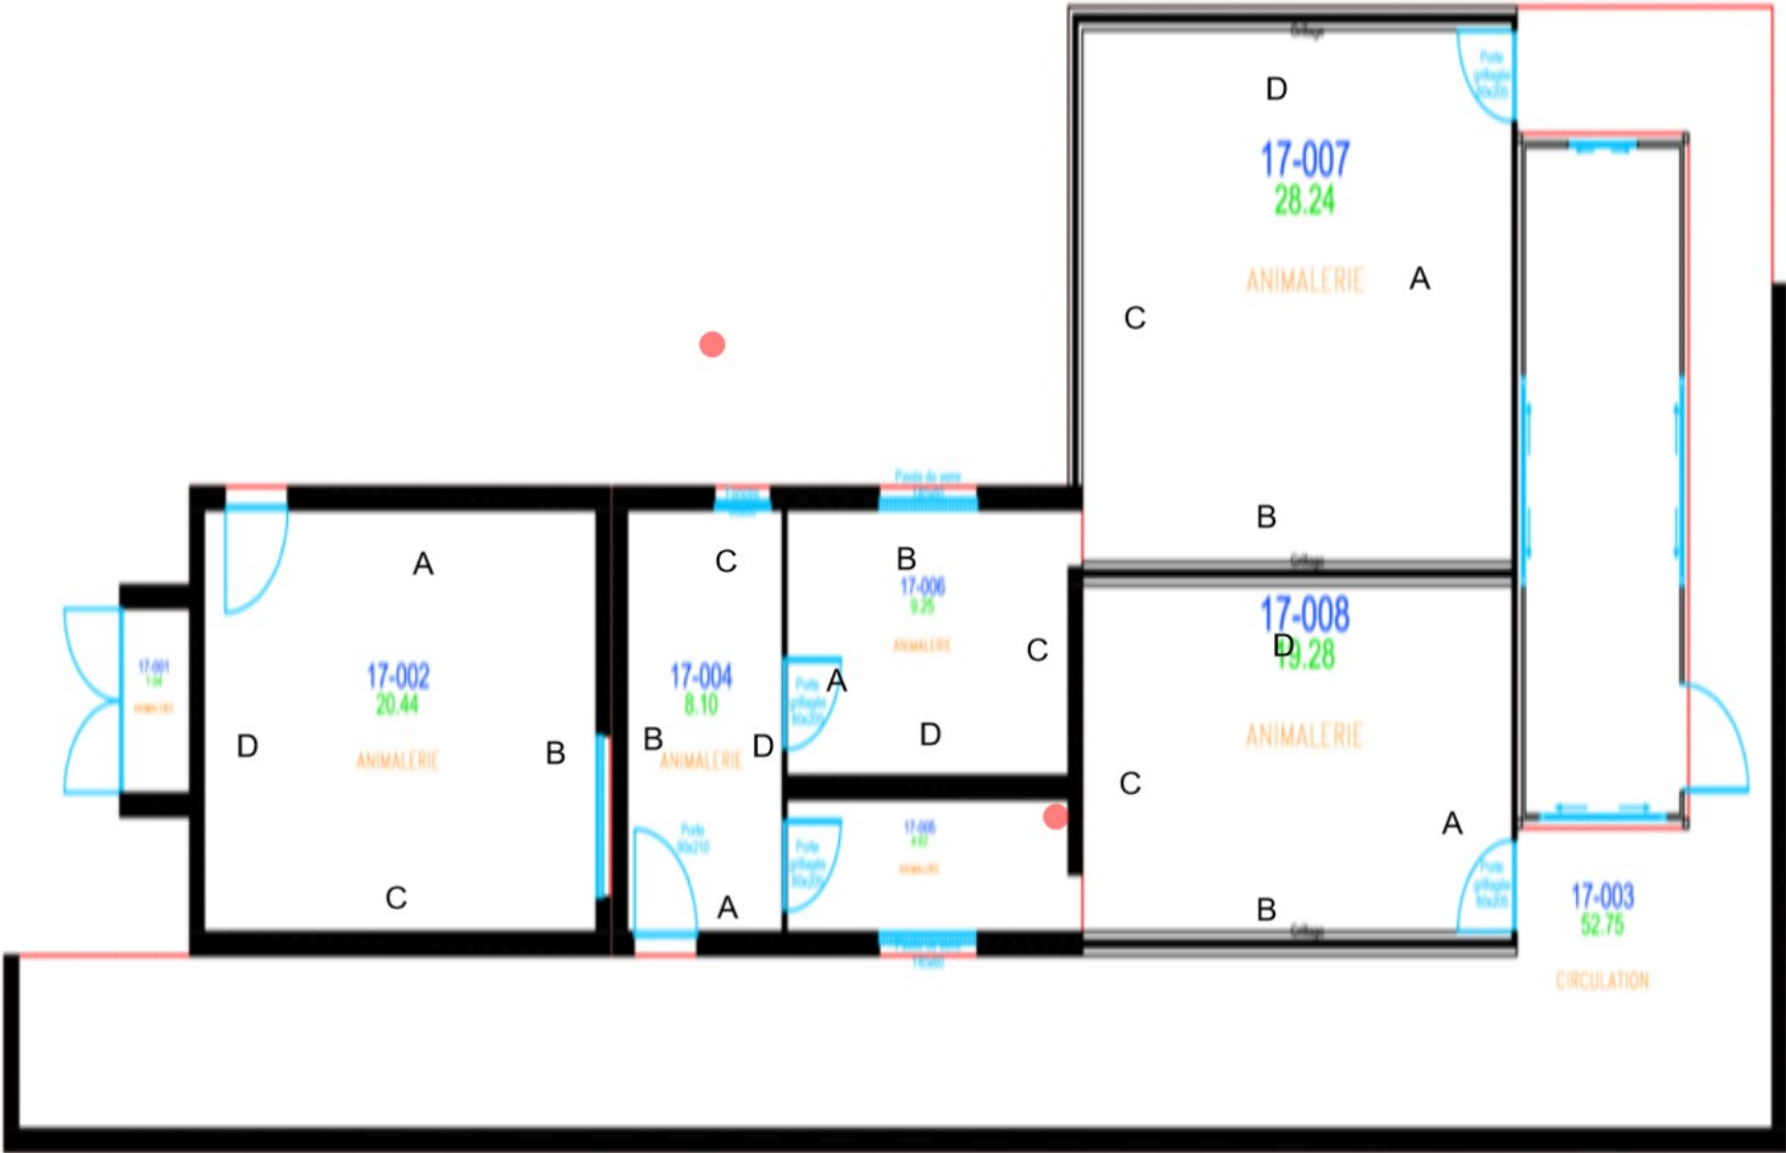

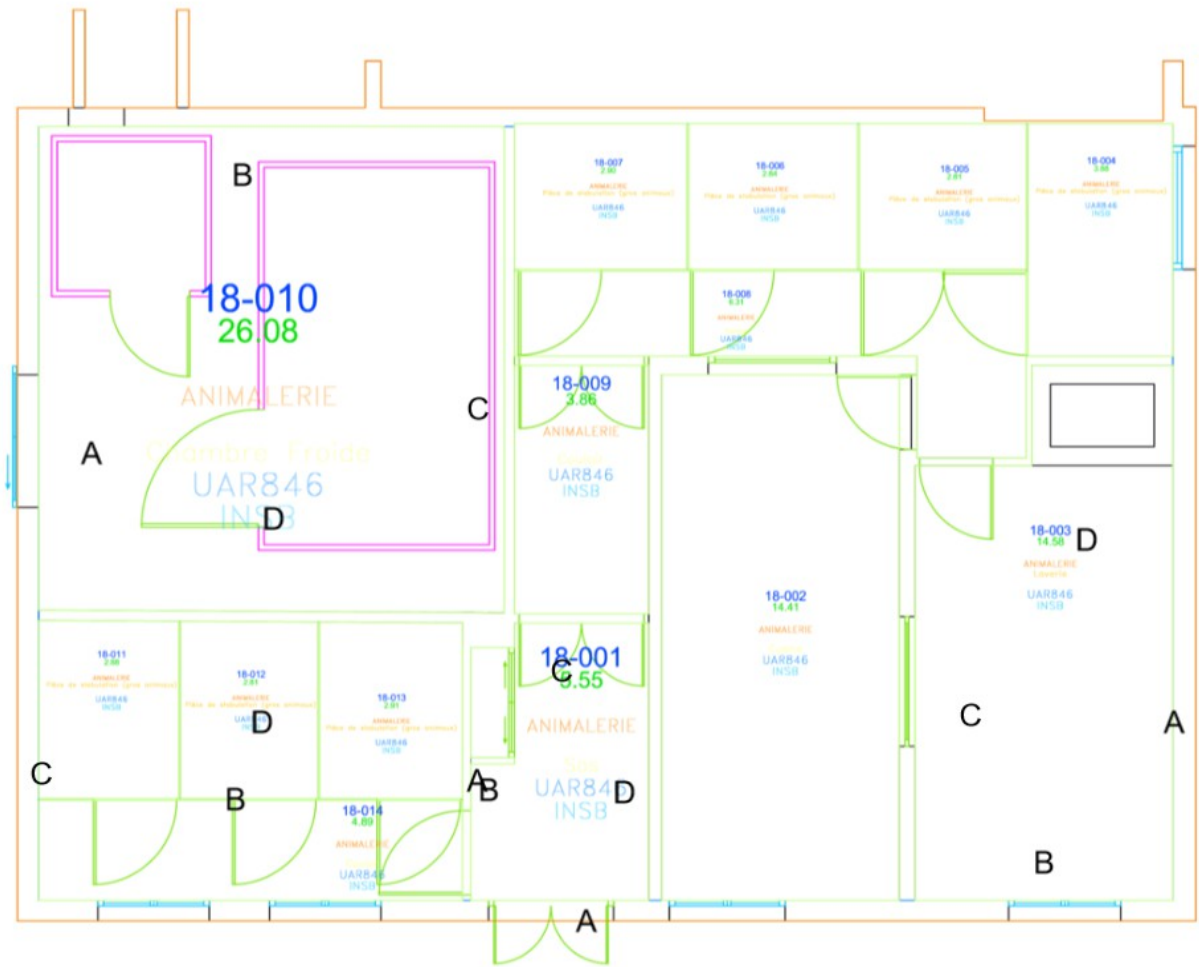

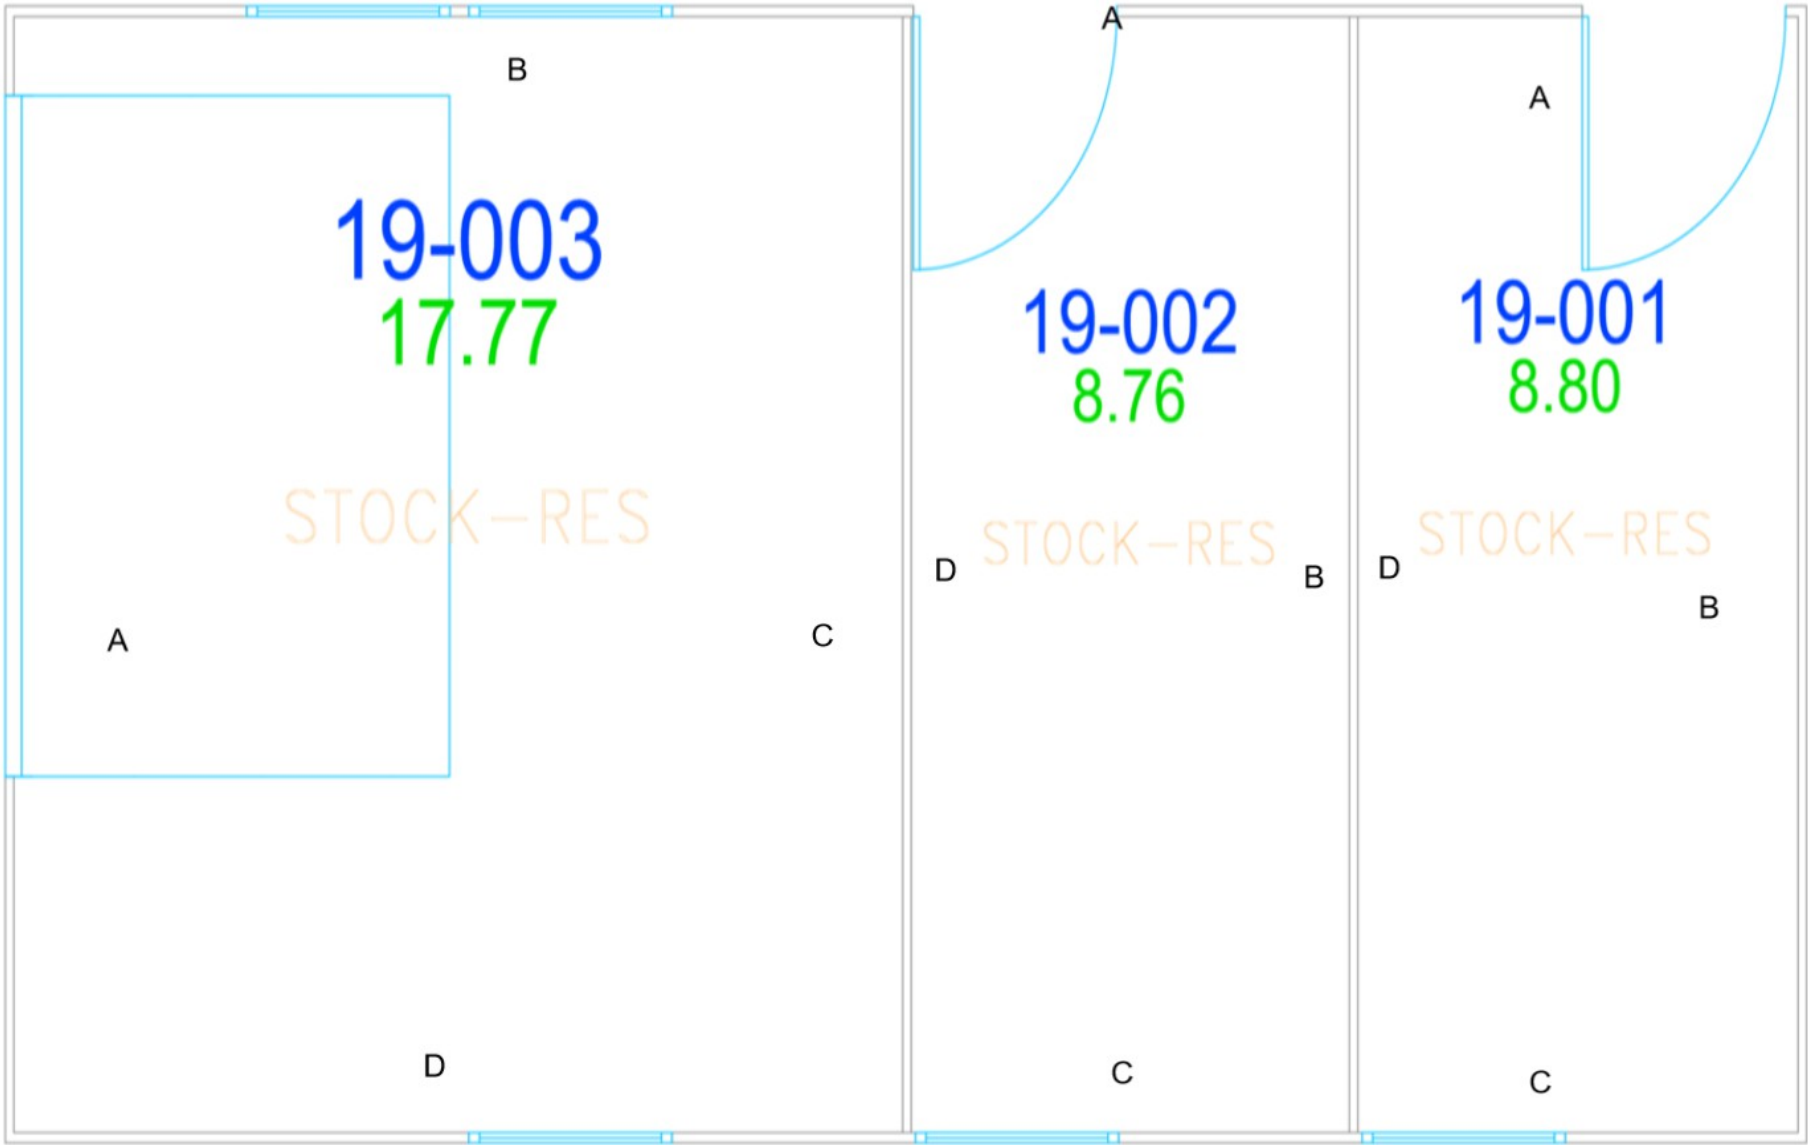

Adresse du bâtiment : ROUSSET - Préfabriqué - Chemin Départemental n°56 - 13790-ROUSSET

Les cotes et les dimensions portées sur ce plan sont à vérifier sur le site. Ce document, propriété du CNRS, ne peut être communiqué à une personne étrangère sans autorisation écrite et n'a aucune valeur contractuelle.





 <div>Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20</div>	<div>SITE</div> <div>ROUSSET</div>		<div>NOM USUEL DU BATIMENT</div> <div>Préfabriqué</div>				<div>ECHELLE GRAPHIQUE</div> <div></div>		Indice	Date	Désignation de la modification / mise à jour	Dessiné par
	<div>DATE</div> <div>10/03/2021</div>	<div>NIVEAU/COUPE/FACADES</div> <div>NIVEAU 00</div>	<div>ECHELLE</div> <div>Echelle : 1/25ème</div>	A			31/07/2016	Plan d'origine	Stéphane ROUX et Jean-Michel GARD			
	Fichier : ROU19000A									<div>LOGICIEL</div> <div>Autocad 2015</div>		

Planche de repérage usuel	
Type: Plan	Croquis: 16/16
Auteur: HERNANDEZ Emmanuel / Alpes Contrôles	
- D56	
13756 ROUSSET	



 Délégation Provence-Corse - DR12 Service Technique et Logistique 31 chemin Joseph Aiguier 13402 Marseille cedex 20	SITE ROUSSET		NOM USUEL DU BATIMENT Saimiris Haut			ECHELLE GRAPHIQUE 	Indice A	Date 31/07/2016	Désignation de la modification / mise à jour Plan d'origine	Dessiné par S ROUX et J M GARCON
	DATE 05/04/2022	NIVEAU/COUPE/FACADES NIVEAU 100	ECHELLE Echelle : 1/1000000	Fichier : ROUX12000 A			LOGICIEL AutoCAD 2000			

ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE



Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

189 boulevard Maiesherbes 75856 Paris Cedex 17
SIRET 429 599 509 00024
Tél : 33 (0)1 53 70 30 00 | euromaf@euromaf.fr
www.euromaf.fr
Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme
au capital de 21 250 000 € - R.C.S. Paris B 429 599 509

8F3825FFDC

633CDC85C5

ATTESTATION D'ASSURANCE 2024

La société d'assurance soussignée atteste avoir délivré à :

N° d'identification : 7380137/N/101
Une police N° : 7006693/S

couvrant ses responsabilités professionnelles spécifiques pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

N° d'édition d'attestation : 20242000019

La garantie du contrat s'applique aux opérations réalisées en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et dont le coût prévisionnel des travaux hors honoraires n'excède pas 30 000 000,00 € hors taxes sous réserve qu'un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale bénéficiant à l'adhérent soit souscrit pour les opérations dont le coût prévisionnel des travaux est égal ou supérieur à 20 000 000,00 € hors taxes.

Accédez aux éléments de vérification de délivrance de cette attestation en flashant ce code avec votre smartphone (vérifiez dans votre navigateur que vous êtes bien sur la page sécurisée https://attestation.maf.fr) ou en vous rendant sur https://attestation.maf.fr muni de cette clé de sécurité : aabe41f5 La vérification de la concordance des données s'effectue sous votre seul contrôle.



SAS BUREAU ALPES CONTROLES
Contrôleur technique

PAE LES GLAISINS
3 bis Impasse DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX
France

Cette police actuellement en vigueur satisfait à l'obligation d'assurance édictée par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Elle est conforme aux clauses-types énoncées à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances. La présente attestation ne peut engager la société d'assurance au-delà des conditions et limites du contrat auquel elle se réfère.

Activités assurées :

- SPS Missions de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les chantiers dans le cadre des articles L 4532-2 et suivants du Code du travail
- D Missions d'ordonnancement, pilotage et coordination des travaux à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle
- A.M.O Missions d'assistance et/ou de conseil auprès de maîtres d'ouvrage à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
- AMO HQE Missions d'assistance et/ou de conseil auprès des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la haute qualité environnementale (HQE) à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre
- AMO HAN Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la rédaction de l'attestation d'accessibilité, selon les dispositions de l'article L 111-7-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, en complément ou indépendamment d'une mission de contrôle technique
- O26 Missions d'études d'impact
- B.5.1a Missions de diagnostic thermique, d'audit énergétique sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations pouvant servir de base à la réalisation des travaux, d'infiltrométrie, de thermographie infrarouge
- B.5.1b Missions de diagnostic de performance énergétique confiées par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier en application des articles L 134-1 à L 134-5 et R 134-1 à R 134-5 du code de la construction et de l'habitation
- B.5.3 Missions d'audit acoustique, sans étude de conception d'ouvrages ou d'installations destinée à servir de base à la réalisation de travaux
- B.5.5 Missions de recherche de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis, confiées en application des articles L 1334-13 et R 1334-14 à R 1334-29 du code de la santé publique
- B.5.8 Missions d'état des lieux, diagnostic de bâtiments à l'exclusion de la maîtrise d'œuvre générale
- B.5.9 Missions de diagnostic saturnisme, de contrôle après travaux ou d'établissement de constat de risque d'exposition au plomb à l'exclusion de toute mission de maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, en application des articles L 1334-1 à L 1334-12 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé publique
- B.5.10 Missions d'établissement d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites ou d'attestations de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication (articles L 133-1, L 133-6 et R 133-1 du code de la construction et de l'habitation)
- B.5.11 Missions de diagnostic visant à évaluer les risques de présence de légionelles dans les réseaux d'eau
- B.5.13 Missions sans conception ni exécution de travaux confiée par tout vendeur ou bailleur d'un bien immobilier et consistant en l'établissement d'un état des risques naturels et technologiques selon la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, codifiée à l'article L-125-5 du Code de l'environnement
- B.5.17 Missions de diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments en application des articles R.111-43 à R.111-47 du Code de la construction et de l'habitation
- ICPE Missions d'établissement de dossier administratif au titre des installations classées pour la protection de l'environnement
- ENQ TEC Enquête de techniques nouvelles portant sur le développement de nouveaux produits ou procédés effectuée par l'adhérent pour le compte de fabricants, à l'exclusion de toute mission liée à la fabrication, commercialisation et mise en œuvre
- EVEN Missions de vérifications techniques (sur chantier) et/ou documents (plans d'exécution, notes de calcul) portant sur des installations ou équipements mis en place lors de manifestations publiques ou événementielles
- CONT TE Missions de contrôle technique portant sur les ouvrages de bâtiments ou de génie civil
- VEFA Mission de constat de l'achèvement d'un immeuble vendu dans l'état futur d'achèvement selon les articles du Code de la construction et de l'habitation
- CONT PER Mission d'inspection et de contrôle technique de prévention

Fin de liste

Fait à Paris, le 01 janvier 2024

EUROMAF SA

4FFFE2A9AE

706FD7C7BF

**MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :**

7380137 / N / 101

Votre correspondant :

Aline LUISIN | 0153703181
aline.luisin@maf.fr

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
CONTRÔLEUR TECHNIQUE
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

Paris, le 21 décembre 2023

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S : listées

- REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
- AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
- REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
- AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
- REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
- AMIANTE PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMBES (C.R.E.P)
- PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
- ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
- MISSION CARREZ
- MISSION ERP
- MISSION DIMELECT
- MISSION DIMGAZ
- AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
- MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
- MESURES EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
- REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
- DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
- MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN
