

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 27326529/S1/1/AM-RTV_V1**Rédigé le :** 16/07/2025**Référence au programme de travaux :**

Demande client Mail réalisé le 27/06/2025 par RIADH BEHLOUL

DONNEUR D'ORDRE

DGFIP**RIADH BEHLOUL**

1 PLACE PIERRE BILLOTTE

94000 CRETEIL

SITE D'INTERVENTION

DDFIP Nogent-sur-Marne

1 RUE JEAN SOULES

94130 NOGENT SUR MARNE

SOULES

Latitude : 48.836807 / Longitude : 2.479554

Date(s) d'intervention(s) :

Le 02/07/2025




SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Rénald Chambrier	Chargé d'affaires	Certification N° CPDI7581 Version 001	Rénald Chambrier
			

Le présent rapport comporte 84 pages, dont 65 pages d'annexes. Il ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	4
2. CONCLUSIONS	5
2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante	5
2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	7
2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre	7
2.4. Obligations réglementaires	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	19
7. ANNEXES	20
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	20
7.2. Photos prélèvements	23
7.3. Photos inaccessibilités	34
7.4. Attestation d'assurance	39
7.5. Certificat de compétence	41
7.6. Croquis de repérage	42
7.7. Rapport d'analyse du laboratoire	54

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
<ul style="list-style-type: none"> - Remplacement des menuiseries extérieures - Travaux d'isolation thermique et le ravalement de façades

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
01 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Etanchéité de toiture terrasse	Revêtements bitumineux relevés
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Elements ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pate de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pate de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Partie(s) du bâtiment :

- Façades intérieures et extérieures du bâtiment
- Menuiseries du R-1 au R+4

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Matériaux et produits contenant de l'amiante

Matériaux et produits listés en annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus contenant de l'amiante

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	R+1 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+1 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+1 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+1 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+2 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+3 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris

N°ZPSO	Localisation	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Aspect	Couleur
2	R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris
2	R+4 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris

2.2. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R+0 (IA 7)	sol sous boîtiers de radiateurs	boîtiers de radiateurs bloquent l'accès pour réaliser les sondages au sol	Dépose des boîtiers à réaliser par une entreprise spécialisée
R+0 (IA 8)	coffrage en bois des volets roulants	non démontables (démontage spécifique)	démontage à réaliser par une entreprise spécialisée
R+1 (IA 1)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+2 (IA 2)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+3 (IA 3)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+4 (IA 4)	3- Parois verticales intérieures	Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4
R+5 (IA 6)	couvertines sur acrotères de toiture terrasse	non démontable risque de dégradation importante et de rupture de l'étanchéité	Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée type étancheurs
Extérieur -> Façade Est (IA 12)	2- Parois verticales extérieures et façades	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Extérieur -> Façade Est (IA 13)	panneaux de façade	Non démontable (démontage spécifique avec problématique d'accès en hauteur)	Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée
Extérieur -> Façade Ouest (IA 10)	2- Parois verticales extérieures et façades	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4
Extérieur -> Façade Ouest (IA 11)	panneaux de façade	Non démontable (démontage spécifique avec problématique d'accès en hauteur)	Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée

2.3. Moyens d'accès à mettre en place par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
R-1 -> Cuisine (MA 5)	Local complet	Fermé à clé, pas de clef disponible	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte

2.4. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : DDFIP Nogent-sur-Marne
1 RUE JEAN SOULES
94130 NOGENT SUR MARNE

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
DDFIP Nogent-sur-Marne	Administrations, bureaux	Autres	01/01/1970	Non-communicué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
RIADH BEHLOUL	Donneur d'ordre	DGFIP	1 PLACE PIERRE BILLOTTE 94000 CRETEIL	0414943497 - 0625605548
COLIN	Accompagnateur	DGFIP	1 rue Jean SOULÈS 94130 Nogent-sur-Seine	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Le 02/07/2025

5.2. Ecart(s), adjonction(s) ou suppression(s) à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)

5.3. Conditions spécifiques

- Présence d'occupant lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)
- Encombrement de mobilier ou d'équipement lors de la visite (pas d'évacuation temporaire)

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Programme de travaux / Demande client	RIADH BEHLOUL	27/06/2025	Mail	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

(i) Les résultats d'analyses des échantillons de cette ZPSO sont discordants, une partie seulement révèle la présence d'amiante. Du fait de la représentativité des résultats, de la fiabilité des prélèvements, de l'absence de différence constructive manifeste et des résultats des sondages réalisés, la présence d'amiante est donc étendue à l'ensemble de cette ZPSO.
Ces résultats discordants sont caractéristiques de l'hétérogénéité des matériaux qui peut s'expliquer, entre autres, par une faible quantité d'amiante mélangé manuellement lors de la fabrication ou une faible quantité d'amiante naturel présente dans la charge minérale utilisée à la fabrication.

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R-1 -> Salle restauration	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P66* N	/	AN	/	Non
R-1 -> Salle restauration	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P67 N	/	AN	/	Non
R-1 -> Local 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P68 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Box 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P28 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Box 2	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P27* N	/	AN	/	Non
R+0 -> Salle de réunion	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P25 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+0 -> Salle de réunion	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	9	P24* N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P35* N	/	AN	sous plinthe carrelée beige	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Mortier	Gris	13	P33* N	/	AN	sous carrelage beige	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de sol	Colles de carrelage	Ciment, Mortier	Gris	13	P34 N	/	AN	sous carrelage beige	Non
R+0 -> Entrée de service	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Ciment	Gris	14	P36 N	/	AN	sous plinthe carrelée beige	Non
R+0 -> Bureau 5	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P29 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 6/7	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	10	P30 N	/	AN	/	Non
R+0 -> Bureau 6/7	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	9	P31 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	P64* P	/	AN	/	Oui
R+1 -> Palier 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P63 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Toilette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P62 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Salle de courrier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P23* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de courrier	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P23* N	/	AN	/	Non
R+1 -> plateau de bureaux	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P22* N	/	AN	/	Non
R+1 -> Salle de réunion	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir	8	P21 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P20 N	/	AN	/	Non
R+1 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+1 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Bulle téléphonique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P17 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Bulle téléphonique	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P17 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Bulle téléphonique	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P18* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P19 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P19 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P52 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Sanitaires femmes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	20	P53* N	/	AN	sous faïence blanche	Non
R+2 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+2 -> Palier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P49 N	/	AN	/	Non
R+2 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2 (i)	P50 N	/	AN	/	Oui
R+3 -> Palier 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P58 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+3 -> Toilette	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P61 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P60* N	/	AN	/	Non
R+3 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+3 -> Adjoint responsable pde	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Gris	3	P14* N	/	AN	de réparation	Non
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P16 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Bulle téléphonique 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P16 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P11 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P11 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires femmes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P12 N	/	AN	/	Non
R+3 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+3 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Palier 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Toilette	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Espace de confidentialité	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P1 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P1 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P2 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de confidentialité	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Souple, Mastic	Gris	3	P3 N	/	AN	de réparation	Non
R+4 -> plateau de bureaux	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Eléments de remplissage	Isolant, Laine de verre	Jaune	6	P7* N	/	AN	/	Non
R+4 -> Bureau 42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Peinture	/	Noir	1	P6 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Bureau 42	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Compact	Gris	1	P6 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Espace de convivialité	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P8 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P56 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Mortier	Blanc	20	P57 N	/	AN	sous faïence blanche	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	21	P55 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Sanitaires Hommes	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui
R+4 -> Palier 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Ciment, Peint, Plâtre	Beige, Blanc, Gris	12	P54 N	/	AN	/	Non
R+4 -> Palier 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	2	Idem P 64	/	AN	/	Oui

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Est	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P39* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P42 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact	Rouge, Gris	16	P38* N	/	AN	sur soubassement	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Blanc, Gris	18	P41* N	/	AN	sur mur haut	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P9* N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	5	P10* N	/	AN	entre panneaux de verre	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P15 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P32* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P37* N	/	AN	sur parement pierre	Non
Extérieur -> Façade Est	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P40 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Est	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P59 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non

Localisation	Ouvrage	Matériau / Produit	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Façade Ouest	Plafonds	Enduits de ragréage, débullage, lissage	Ciment, Peint	Beige, Blanc, Gris	17	P43 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Peint	Blanc, Gris	18	P44 N	/	AN	sur mur haut	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades lourdes y compris poteaux	Enduits pelliculaires de lissage/débullage	Ciment, Compact	Rouge, Gris	16	P47 N	/	AN	sur soubassement	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P4 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	5	P5 N	/	AN	entre panneaux de verre	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P13 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	11	P26 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Gris	7	P45 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Compact, Dur	Beige	19	P46* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Ciment	Gris	15	P48 N	/	AN	sur parement pierre	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P51 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non
Extérieur -> Façade Ouest	Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Joints d'assemblage	Souple, Mastic	Gris	4	P65 N	/	AN	entre menuiserie et habillage métallique	Non

6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante

N°ZPSO	Ouvrage	Partie d'ouvrage	Estimation quantitative
2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	16 U

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées


La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R-1	/
R-1 -> Salle restauration	/
R-1 -> Office	/
R-1 -> Local 1	/
R-1 -> Archives	/
R+0	/
R+0 -> Salle d'attente	/
R+0 -> Box 1	/
R+0 -> Box 2	/
R+0 -> Salle de réunion	/
R+0 -> Bureau 2	/
R+0 -> Bureau 2bis	/
R+0 -> Entrée de service	/
R+0 -> Bureau 5	/
R+0 -> Bureau 6/7	/
R+0 -> Bureau 8	/
R+0 -> Bureau 9	/
R+1	/
R+1 -> Palier 1	/
R+1 -> Toilette	/
R+1 -> Salle de courrier	/
R+1 -> plateau de bureaux	/
R+1 -> Espace de convivialité	/


Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+1 -> Débarras	/
R+1 -> Salle de réunion	/
R+1 -> Salle informatique	/
R+1 -> Sanitaires femmes	/
R+1 -> Sanitaires Hommes	/
R+1 -> Palier 2	/
R+2	/
R+2 -> Palier 1	/
R+2 -> Toilette	/
R+2 -> Bulle téléphonique	/
R+2 -> plateau de bureaux	/
R+2 -> Adjointe du responsable	/
R+2 -> Responsable SIE	/
R+2 -> Sanitaires femmes	/
R+2 -> Sanitaires Hommes	/
R+2 -> Palier 2	/
R+3	/
R+3 -> Palier 1	/
R+3 -> Toilette	/
R+3 -> plateau de bureaux	/
R+3 -> Adjoint responsable pde	/
R+3 -> Responsable PDE	/
R+3 -> Bulle téléphonique 1	/
R+3 -> Bulle téléphonique 2	/
R+3 -> Espace de convivialité	/
R+3 -> Sanitaires femmes	/
R+3 -> Sanitaires Hommes	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+3 -> Palier 2	/
R+4	/
R+4 -> Palier 1	/
R+4 -> Toilette	/
R+4 -> Espace de confidentialité	/
R+4 -> plateau de bureaux	/
R+4 -> Bureau 42	/
R+4 -> Bureau 45	/
R+4 -> Bureau 47	/
R+4 -> Box 417	/
R+4 -> Bureau 419	/
R+4 -> Espace de convivialité	/
R+4 -> Sanitaires femmes	/
R+4 -> Sanitaires Hommes	/
R+4 -> Palier 2	/
R+5	/
R+5 -> Toiture terrasse	/
Extérieur	/
Extérieur -> Façade Est	/
Extérieur -> Façade Ouest	/

7.2. Photos prélèvements

P66	ZPSO 12
R-1 -> Salle restauration	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P67	ZPSO 12
R-1 -> Salle restauration	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

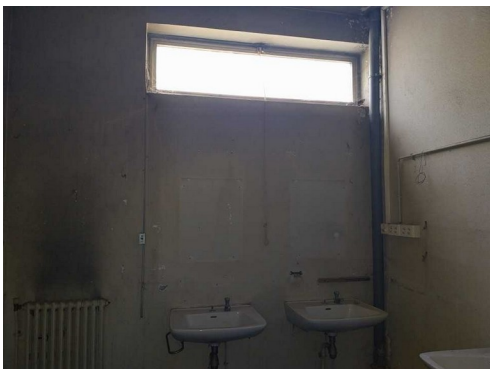
P68	ZPSO 12
R-1 -> Local 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P28	ZPSO 12
R+0 -> Box 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P27	ZPSO 10
R+0 -> Box 2	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 10
R+0 -> Salle de réunion	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P24	ZPSO 9
R+0 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

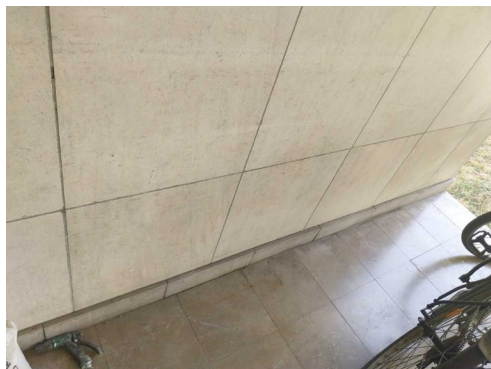P35	ZPSO 14
R+0 -> Bureau 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P33	ZPSO 13
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	

P34	ZPSO 13
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de sol -> Colles de carrelage	


P36	ZPSO 14
R+0 -> Entrée de service	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

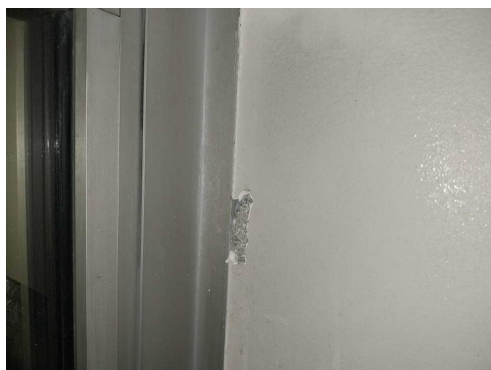P29	ZPSO 12
R+0 -> Bureau 5	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P30	ZPSO 10
R+0 -> Bureau 6/7	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P31	ZPSO 9
R+0 -> Bureau 6/7	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P64	ZPSO 2
R+1 -> Palier 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P63	ZPSO 12
R+1 -> Palier 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P62	ZPSO 12
R+1 -> Toilette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P23	ZPSO 1
R+1 -> Salle de courrier	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P22	ZPSO 8
R+1 -> plateau de bureaux	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P21	ZPSO 8
R+1 -> Salle de réunion	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P20	ZPSO 1
R+1 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P17	ZPSO 1
R+2 -> Bulle téléphonique	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P18	ZPSO 7
R+2 -> Bulle téléphonique	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P19	ZPSO 1
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

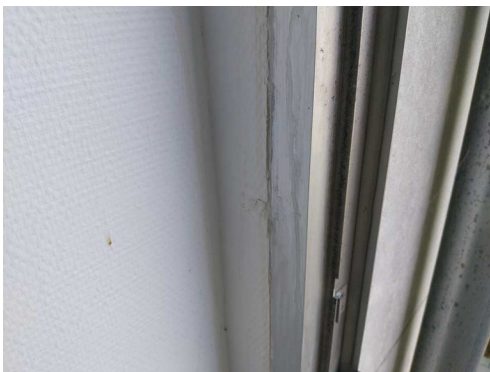P52	ZPSO 12
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P53	ZPSO 20
R+2 -> Sanitaires femmes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	


P49	ZPSO 12
R+2 -> Palier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P50	ZPSO 2
R+2 -> Palier 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P61	ZPSO 12
R+3 -> Toilette	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


P60	ZPSO 21
R+3 -> Toilette	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P14	ZPSO 3
R+3 -> Adjoint responsable pde	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	


P16	ZPSO 1
R+3 -> Bulle téléphonique 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P11	ZPSO 1
R+3 -> Sanitaires femmes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P12	ZPSO 21
R+3 -> Sanitaires femmes	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P1	ZPSO 1
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	


P2	ZPSO 21
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P3	ZPSO 3
R+4 -> Espace de confidentialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P7	ZPSO 6
R+4 -> plateau de bureaux	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs -> Eléments de remplissage	


P6	ZPSO 1
R+4 -> Bureau 42	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Peinture Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P8	ZPSO 21
R+4 -> Espace de convivialité	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

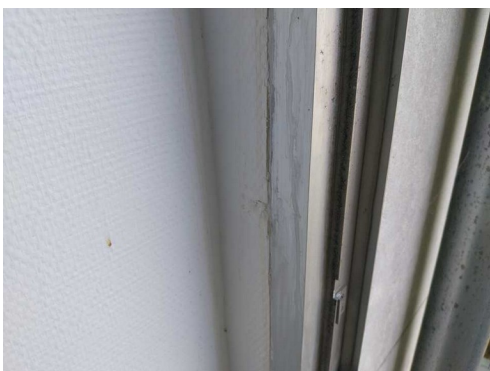P56	ZPSO 12
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

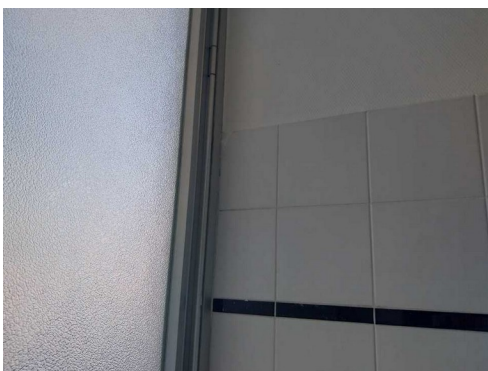P57	ZPSO 20
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence	

P55	ZPSO 21
R+4 -> Sanitaires Hommes	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P54	ZPSO 12
R+4 -> Palier 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Est	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P42	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Est	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P38	ZPSO 16
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P41	ZPSO 18
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P9	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P10	ZPSO 5
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P15	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P32	ZPSO 11
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P37	ZPSO 15
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P40	ZPSO 7
Extérieur -> Façade Est	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P59	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Est	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P43	ZPSO 17
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Plafonds -> Enduits de ragréage, débullage, lissage	

P44	ZPSO 18
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P47	ZPSO 16
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Enduits pelliculaires de lissage/débullage	

P4	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P5	ZPSO 5
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P13	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	

P26	ZPSO 11
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P45	ZPSO 7
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P46	ZPSO 19
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P51	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


P65	ZPSO 4
Extérieur -> Façade Ouest	
	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - > Joints d'assemblage	


7.3. Photos inaccessibilités


R-1 -> Cuisine		MA 5
Local complet		
Fermé à clé, pas de clef disponible		
	Moyen d'accès à mettre à disposition avant les travaux :	
	Fournir les clefs ou procéder à l'ouverture de la porte	


R+0	IA 7
sol sous boîtiers de radiateurs	
boîtiers de radiateurs bloquent l'accès pour réaliser les sondages au sol	
	<p>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</p> <p>Dépose des boîtiers à réaliser par une entreprise spécialisée</p>

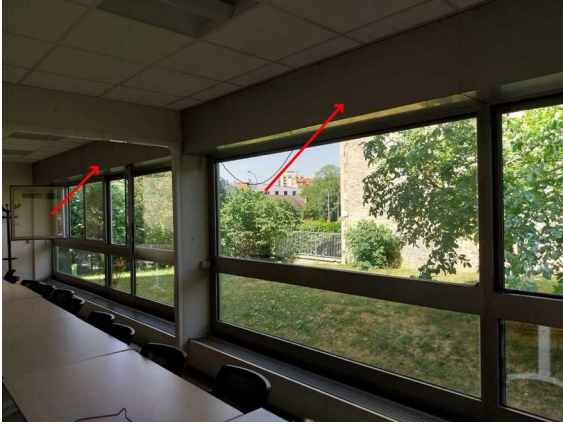
R+0	IA 8
coffrage en bois des volets roulants	
non démontables (démontage spécifique)	
	<p>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</p> <p>démontage à réaliser par une entreprise spécialisée</p>

R+1	IA 1
3- Parois verticales intérieures	
Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	
	<p>Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :</p> <p>Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4</p>

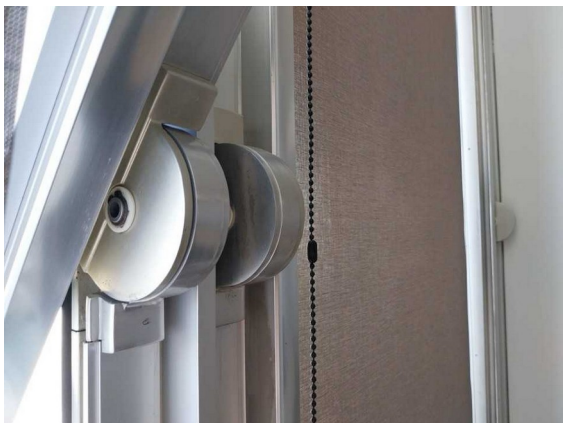R+2		IA 2
3- Parois verticales intérieures		
Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4


R+3		IA 3
3- Parois verticales intérieures		
Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4

R+4		IA 4
3- Parois verticales intérieures		
Inspection de(s) garniture(s) de friction de menuiserie(s) requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux : Faire procéder au démontage par une entreprise qualifiée et compétente SS4

R+5		IA 6
couvertines sur acrotères de toiture terrasse		
non démontable risque de dégradation importante et de rupture de l'étanchéité		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :
		Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée type étancheurs

Extérieur -> Façade Est		IA 12
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :
		Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

Extérieur -> Façade Est		IA 13
panneaux de façade		
Non démontable (démontage spécifique avec problématique d'accès en hauteur)		
		Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :
		Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée

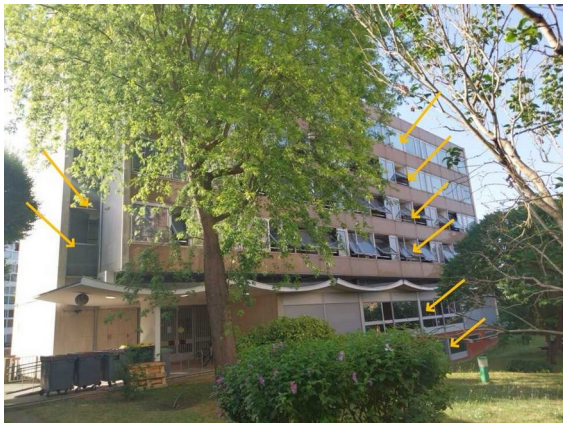Extérieur -> Façade Ouest		IA 10
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

Extérieur -> Façade Ouest		IA 11
panneaux de façade		
Non démontable (démontage spécifique avec problématique d'accès en hauteur)		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	Démontage à réaliser par une entreprise spécialisée	

7.4. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au- delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de : 92076 Paris La Défense 2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königinstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.5. Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI7581 Version 001

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CHAMBRIER Rénaud

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o6 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :


Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/10/2022 - Date d'expiration : 25/10/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 10/02/2025.



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

7.6. Croquis de repérage

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R-1	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	1 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage



Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+0	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	2 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+1	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	3 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		

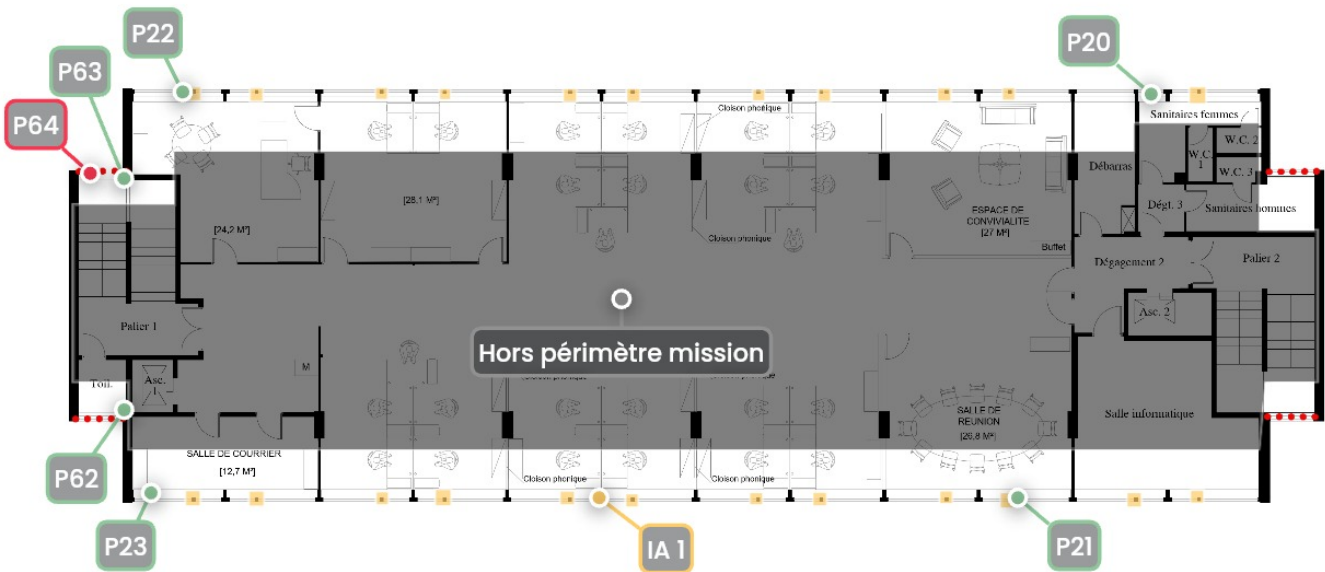

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	---

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+2	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	4 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		



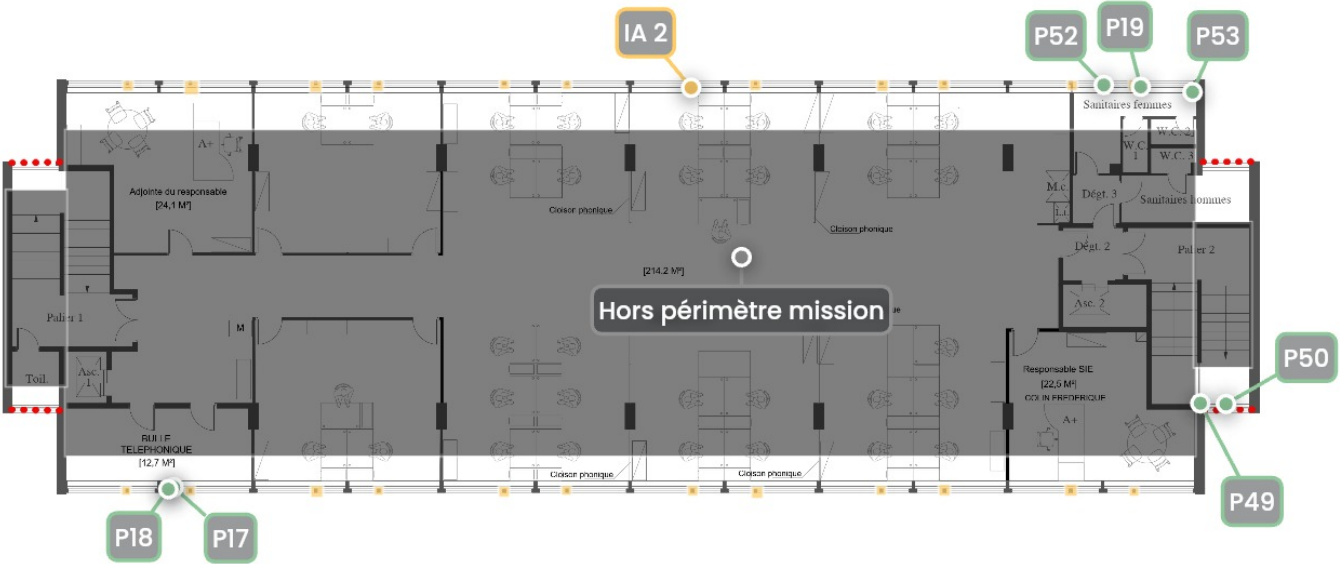


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+3	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	5 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		

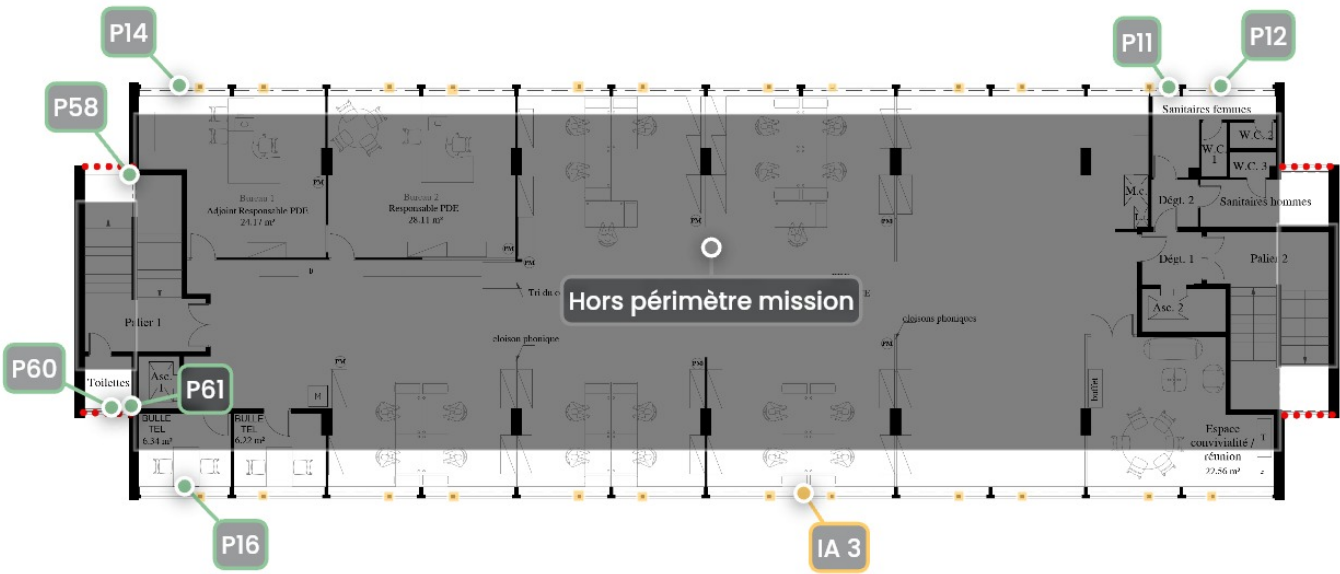

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+4	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	6 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante : Joints de mastic de vitrage		

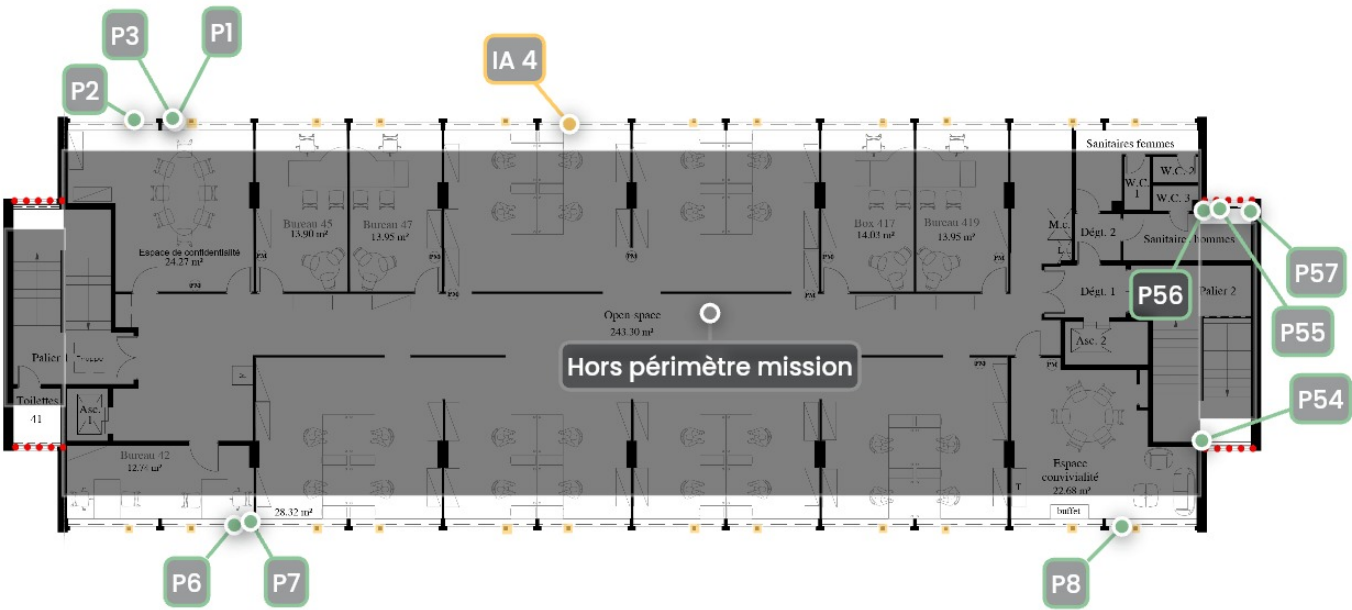

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation R+5	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	7 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		



LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Est	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	8 / 11
	Indice	1
Vue utilisée :		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

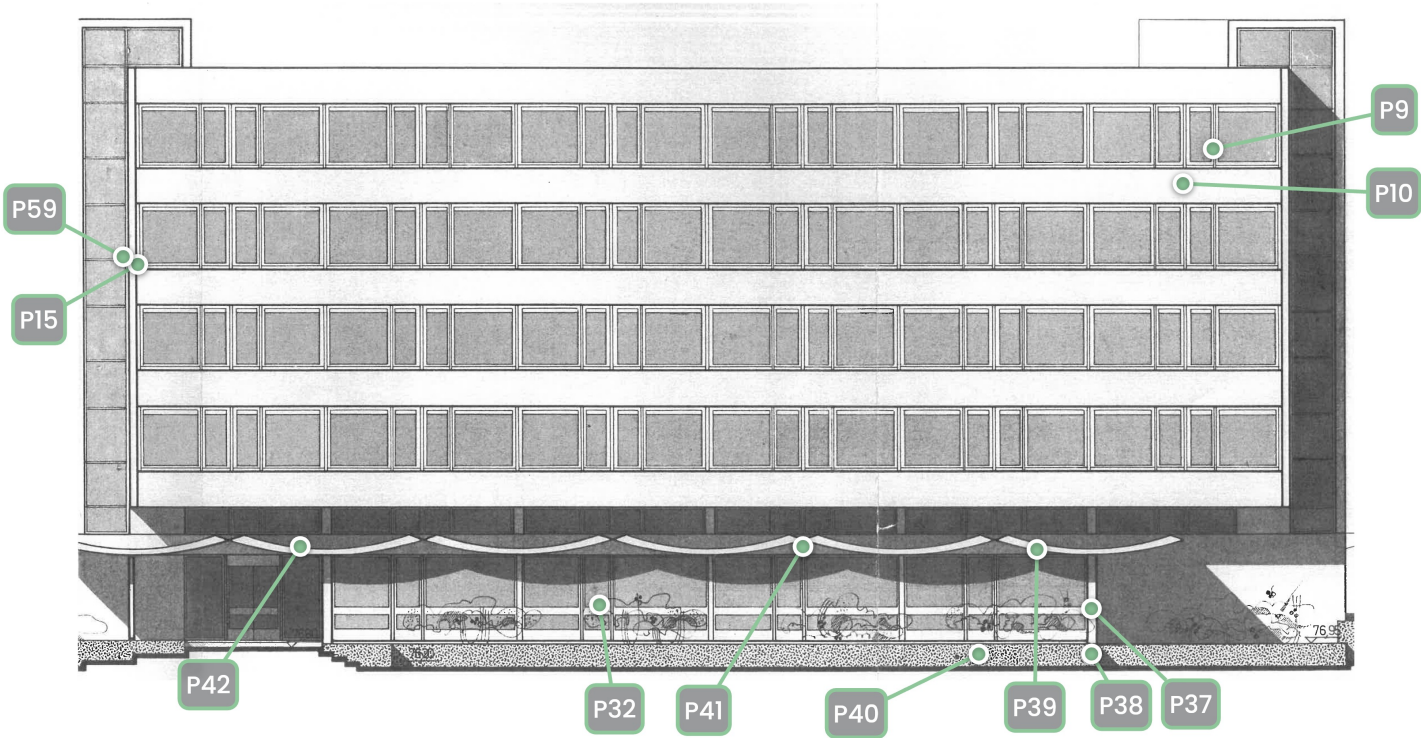

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité



Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Est	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	9 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
Inaccessibilité		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

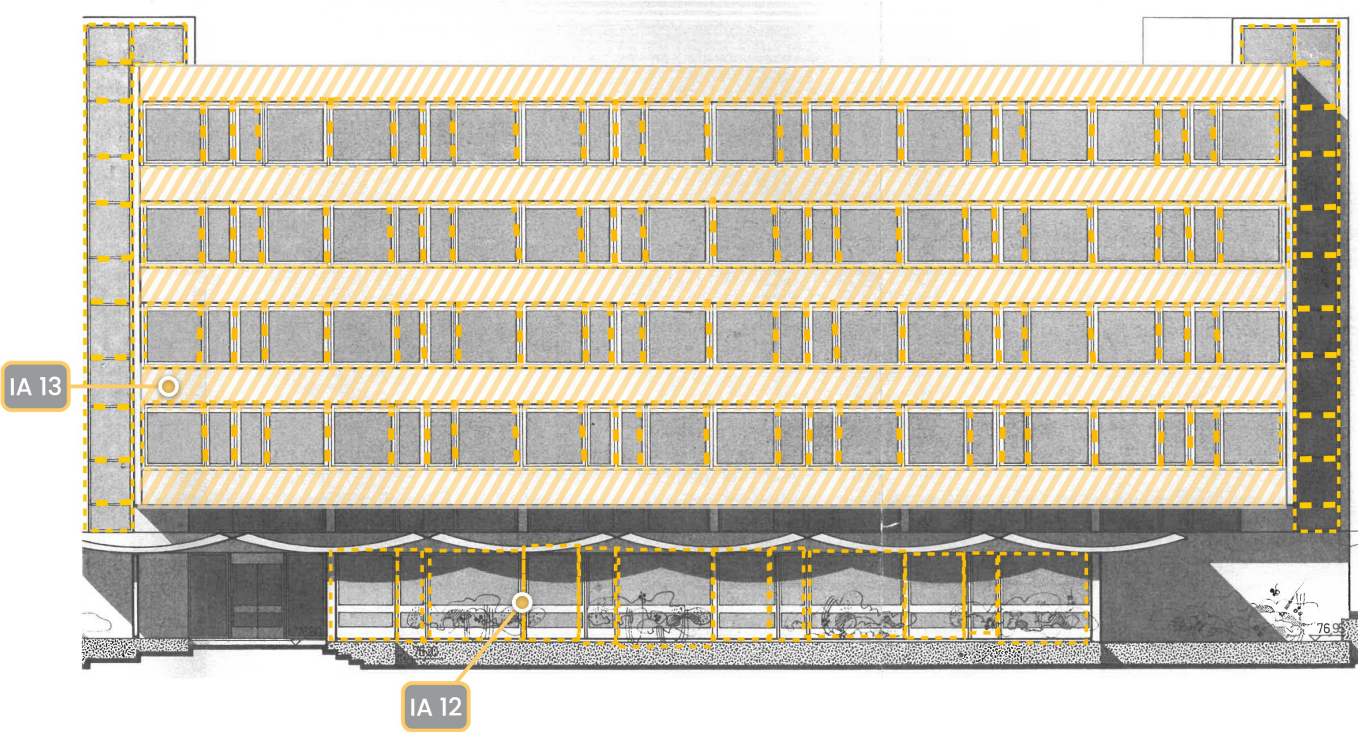

LEGENDE



Prélèvement positif



Prélèvement négatif



Sondage




Inaccessibilité




Observation

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Ouest	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	10 / 11
	Indice	1
<u>Vue utilisée :</u>		
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>		

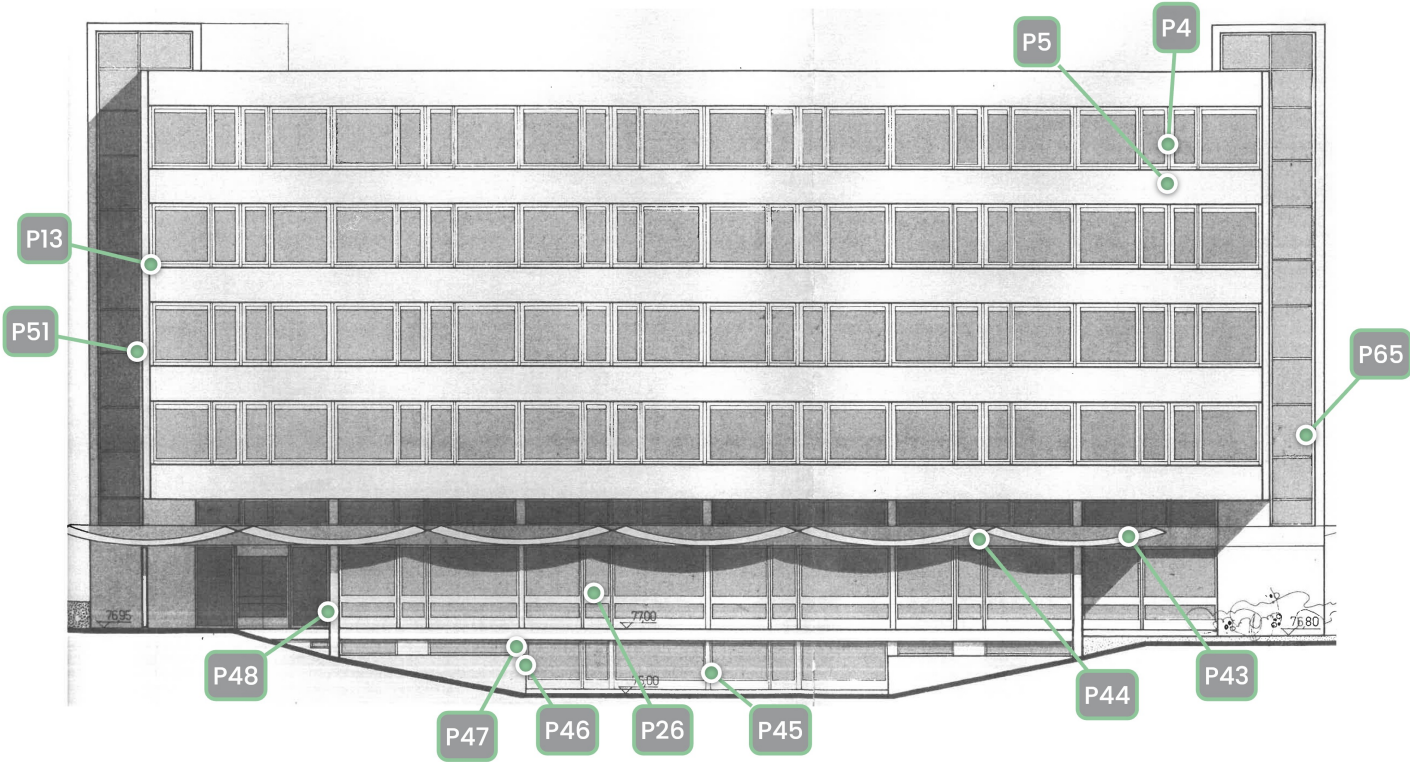

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE		
La planche de repérage est indissociable du rapport		
ADRESSE	DDFIP Nogent-sur-Marne 1 RUE JEAN SOULES 94130 NOGENT SUR MARNE	
Localisation Extérieur > Façade Ouest	Date visite	Le 02/07/2025
	Auteur	Rénald Chambrier
	N° dossier	27326529/S1/1
	Planche	11 / 11
	Indice	1
Inaccessibilité		
Matériaux et produits contenant de l'amiante :		

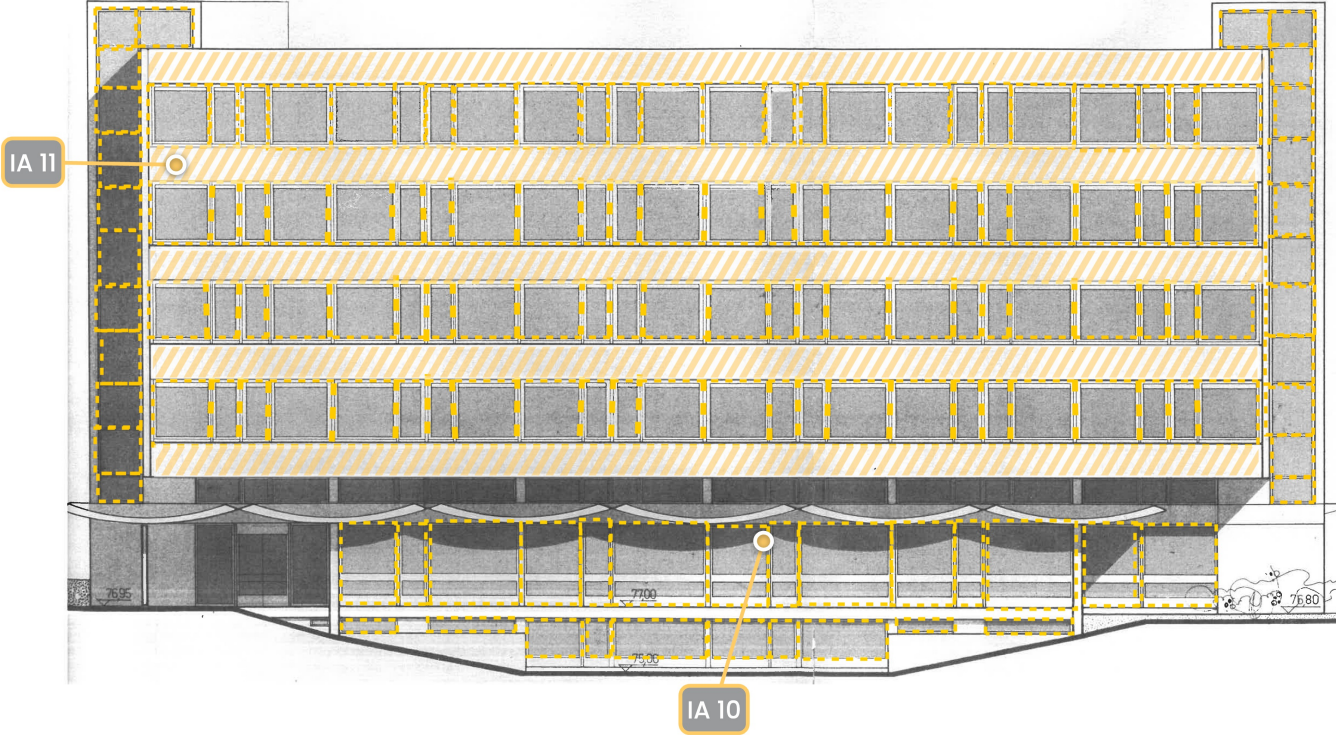

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	--	--	---	---	--

7.7. Rapport d'analyse du laboratoire

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Renald CHAMBRIER
6 Boulevard d'Archimède
77420 CHAMPS SUR MARNE

Notre référence : AR-25-LE-074314-01

Numéro de dossier : 25A023334

Référence de dossier : 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 25A023334-001 - Référence *ITM-JLKLY-2896453* Réf. Prel : *P1 R+4 - Espace de confidentialité/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-002 - Référence *ITM-FFCDC-2896454* Réf. Prel : *P2 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-003 - Référence *ITM-YZPTB-2896455* Réf. Prel : *P3 R+4 - Espace de confidentialité/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-004 - Référence *ITM-EXNYJ-2896457* Réf. Prel : *P4 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-005 - Référence *ITM-OVBGJ-2896456* Réf. Prel : *P5 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-006 - Référence *ITM-PRVYQ-2896458* Réf. Prel : *P6 R+4 - Bureau 42/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-007 - Référence ITM-PNYAH-2896459 Réf. Prel : P7 R+4 - plateau de bureaux/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Isolant, Laine de verre/Jaune), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-008 - Référence ITM-IUVTG-2896460 Réf. Prel : P8 R+4 - Espace de convivialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-009 - Référence ITM-OBSOU-2896461 Réf. Prel : P9 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-010 - Référence ITM-ISTWX-2896462 Réf. Prel : P10 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-011 - Référence ITM-QYGDS-2896463 Réf. Prel : P11 R+3 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-012 - Référence ITM-TBZRM-2896464 Réf. Prel : P12 R+3 - Sanitaires femmes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-013 - Référence ITM-EMYKZ-2896465 Réf. Prel : P13 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-014 - Référence ITM-LFBTE-2896466 Réf. Prel : P14 R+3 - Adjoint responsable pde/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-015 - Référence ITM-XQNIP-2896467 Réf. Prel : P15 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-016 - Référence ITM-EARRV-2896468 Réf. Prel : P16 R+3 - Bulle téléphonique 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-017 - Référence *ITM-BREIT-2896469 Réf. Prel : P17 R+2 - Bulle téléphonique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-018 - Référence *ITM-FINGI-2896470 Réf. Prel : P18 R+2 - Bulle téléphonique/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-019 - Référence *ITM-YVRZH-2896471 Réf. Prel : P19 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-020 - Référence *ITM-KATEP-2896472 Réf. Prel : P20 R+1 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-021 - Référence *ITM-LAMXC-2896473 Réf. Prel : P21 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-022 - Référence *ITM-OWFWJ-2896474 Réf. Prel : P22 R+1 - plateau de bureaux/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-023 - Référence *ITM-GYFDF-2896475 Réf. Prel : P23 R+1 - Salle de courrier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-024 - Référence *ITM-ENVQD-2896476 Réf. Prel : P24 R+0 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-025 - Référence *ITM-XSXNN-2896477 Réf. Prel : P25 R+0 - Salle de réunion/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-026 - Référence *ITM-STBXQ-2896478 Réf. Prel : P26 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-027 - Référence *ITM-NLJOZ-2896479 Réf. Prel : P27 R+0 - Box 2/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-028 - Référence *ITM-RKVKH-2896480 Réf. Prel : P28 R+0 - Box 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-029 - Référence *ITM-XLHJX-2896481 Réf. Prel : P29 R+0 - Bureau 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur"* - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-030 - Référence *ITM-XLHJX-2896482 Réf. Prel : P30 R+0 - Bureau 6/7/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-031 - Référence *ITM-FOALB-2896483 Réf. Prel : P31 R+0 - Bureau 6/7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-032 - Référence *ITM-MPLWG-289684 Réf. Prel : P32 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-033 - Référence *ITM-DYXOY-2896485 Réf. Prel : P33 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-034 - Référence *ITM-TLHWX-2896486 Réf. Prel : P34 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-035 - Référence *ITM-ESWBF-2896487 Réf. Prel : P35 R+0 - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-036 - Référence *ITM-UKHMJ-2896488 Réf. Prel : P36 R+0 - Entrée de service/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-037 - Référence *ITM-QGYE-2896489 Réf. Prel : P37 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-038 - Référence *ITM-AJAPK-2896490 Réf. Prel : P38 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-039 - Référence *ITM-FPBGG-2896491 Réf. Prel : P39 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-040 - Référence *ITM-UYSUD-2896492 Réf. Prel : P40 Extérieur - Façade Est/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-041 - Référence *ITM-PORRD-2896493 Réf. Prel : P41 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-042 - Référence *ITM-PORRD-2896494 Réf. Prel : P42 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-043 - Référence *ITM-TIMJR-2896495 Réf. Prel : P43 Extérieur - Façade Ouest/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-044 - Référence *ITM-TIMJR-2896496 Réf. Prel : P44 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-045 - Référence *ITM-CWDZC-2896497 Réf. Prel : P45 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-046 - Référence *ITM-SIZPA-2896498 Réf. Prel : P46 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Beige)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-047 - Référence *ITM-MUFJP-2896499 Réf. Prel : P47 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-048 - Référence *ITM-BWARX-2896500* Réf. Prel : *P48 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-049 - Référence *ITM-BWARX-2896502* Réf. Prel : *P49 R+2 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-050 - Référence *ITM-OOQTX-2896503* Réf. Prel : *P50 R+2 - Palier 2/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-051 - Référence *ITM-YEHHC-2896501* Réf. Prel : *P51 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-052 - Référence *ITM-PZURF-2896504* Réf. Prel : *P52 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-053 - Référence *ITM-PJBQO-2896505* Réf. Prel : *P53 R+2 - Sanitaires femmes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-054 - Référence *ITM-SWOZB-2850539* Réf. Prel : *P54 R+4 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-055 - Référence *ITM-VXFPH-2850540* Réf. Prel : *P55 R+4 - Sanitaires Hommes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-056 - Référence *ITM-JHHLS-2850541* Réf. Prel : *P56 R+4 - Sanitaires Hommes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-057 - Référence *ITM-KZODQ-2850542* Réf. Prel : *P57 R+4 - Sanitaires Hommes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)*, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-058 - Référence ITM-PZTEE-2850543 Réf. Prel : P58 R+3 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-059 - Référence ITM-IBZCD-2850544 Réf. Prel : P59 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-060 - Référence ITM-AXCKK-2850545 Réf. Prel : P60 R+3 - Toilette/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-061 - Référence ITM-KEFQQ-2850546 Réf. Prel : P61 R+3 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-062 - Référence ITM-UEJUX-2850547 Réf. Prel : P62 R+1 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-063 - Référence ITM-FSFGG-2850548 Réf. Prel : P63 R+1 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-064 - Référence ITM-FLJVU-2850549 Réf. Prel : P64 R+1 - Palier 1/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-065 - Référence ITM-MKGQQ-2850550 Réf. Prel : P65 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-066 - Référence ITM-JYLKE-2850551 Réf. Prel : P66 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-067 - Référence ITM-FSMET-2850552 Réf. Prel : P67 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 25A023334-068 - Référence ITM-IPDPW-2850553 Réf. Prel : P68 R-1 - Local 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris), prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT EST SAS REFERANT ST LABO

20 rue du Kochersberg - CS 50047
67701 SAVERNE CEDEX 1

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page1/22
Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
Date d'analyse : 08/07/2025
Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	25A023334-001 - ITM-JLKLY-2896453 Réf. Prel : P1 R+4 - Espace de confidentialité/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	25A023334-002 - ITM-FFCDC-289645 4 Réf. Prel : P2 R+4 - Espace de confidentialité/Menuis eries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	25A023334-003 - ITM-YZPTB-2896455 Réf. Prel : P3 R+4 - Espace de confidentialité/Menuis eries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 2/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	25A023334-004 - ITM-EXNYJ-2896457 Réf. Prel : P4 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	25A023334-005 - ITM-OVBGJ-289645 6 Réf. Prel : P5 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	25A023334-006 - ITM-PRVYQ-289645 8 Réf. Prel : P6 R+4 - Bureau 42/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 3/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
007	25A023334-007 - ITM-PNYAH-2896459 Réf. Prel : P7 R+4 - plateau de bureaux/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Isolant, Laine de verre/Jaune)	Matériau fibreux de type isolant (jaune) ; matériau de type colle (jaune) en traces	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	25A023334-008 - ITM-IUVTG-2896460 Réf. Prel : P8 R+4 - Espace de convivialité/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	25A023334-009 - ITM-OBSOU-289646 1 Réf. Prel : P9 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 4/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	25A023334-010 - ITM-ISTWX-2896462 Réf. Prel : P10 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	25A023334-011 - ITM-QYGDS-289646 3 Réf. Prel : P11 R+3 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	25A023334-012 - ITM-TBZRM-289646 4 Réf. Prel : P12 R+3 - Sanitaires femmes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 5/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	25A023334-013 - ITM-EMYKZ-289646 5 Réf. Prel : P13 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	25A023334-014 - ITM-LFBTE-2896466 Réf. Prel : P14 R+3 - Adjoint responsable pde/Menuiseries intérieures - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	25A023334-015 - ITM-XQNIP-2896467 Réf. Prel : P15 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type joint (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 6/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	25A023334-016 - ITM-EARRV-289646 8 Réf. Prel : P16 R+3 - Bulle téléphonique 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	25A023334-017 - ITM-BREIT-2896469 Réf. Prel : P17 R+2 - Bulle téléphonique/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	25A023334-018 - ITM-FINGI-2896470 Réf. Prel : P18 R+2 - Bulle téléphonique/Menuis eries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	25A023334-019 - ITM-YVRZH-289647 1 Réf. Prel : P19 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 7/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	25A023334-020 - ITM-KATEP-2896472 Réf. Prel : P20 R+1 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	25A023334-021 - ITM-LAMXC-289647 3 Réf. Prel : P21 R+1 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	25A023334-022 - ITM-OXFWJ-289647 4 Réf. Prel : P22 R+1 - plateau de bureaux/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	25A023334-023 - ITM-GYFDF-289647 5 Réf. Prel : P23 R+1 - Salle de courrier/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Noir)	Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 8/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	25A023334-024 - ITM-ENVQD-289647 6 Réf. Prel : P24 R+0 - Salle de réunion/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025 (1)	25A023334-025 - ITM-XSXNN-289647 7 Réf. Prel : P25 R+0 - Salle de réunion/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	25A023334-026 - ITM-STBXQ-289647 8 Réf. Prel : P26 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027 (1)	25A023334-027 - ITM-NLJOZ-2896479 Réf. Prel : P27 R+0 - Box 2/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 9/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028 (1)	25A023334-028 - ITM-RKVKH-289648 0 Réf. Prel : P28 R+0 - Box 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
029 (1)	25A023334-029 - ITM-XLHJX-2896481 Réf. Prel : P29 R+0 - Bureau 5/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030 (1)	25A023334-030 - ITM-XLHJX-2896482 Réf. Prel : P30 R+0 - Bureau 6/7/Poteaux - (Ciment, Peint, Plâtre/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 10/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	25A023334-031 - ITM-FOALB-2896483 Réf. Prel : P31 R+0 - Bureau 6/7/Menuiseries intérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	25A023334-032 - ITM-MPLWG-289684 Réf. Prel : P32 Extérieur - Façade Est/Menuiseries extérieures - (Caoutchouc/Noir)	Matériau souple de type joint (noir)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	25A023334-033 - ITM-DYXOY-289648 5 Réf. Prel : P33 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	25A023334-034 - ITM-TLHWX-289648 6 Réf. Prel : P34 R+0 - Entrée de service/Revêtements de sol - (Ciment, Mortier/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 11/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
035	25A023334-035 - ITM-ESWBF-289648 7 Réf. Prel : P35 R+0 - Bureau 2/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	25A023334-036 - ITM-UKHJM-289648 8 Réf. Prel : P36 R+0 - Entrée de service/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	25A023334-037 - ITM-QGYE-289648 9 Réf. Prel : P37 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 12/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
038	25A023334-038 - ITM-AJAPK-2896490 Réf. Prel : P38 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
039 (1)	25A023334-039 - ITM-FPBGG-289649 1 Réf. Prel : P39 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
040	25A023334-040 - ITM-UYSUD-289649 2 Réf. Prel : P40 Extérieur - Façade Est/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 13/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
041 (1)	25A023334-041 - ITM-PORRD-289649 3 Réf. Prel : P41 Extérieur - Façade Est/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (friable) (marron)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
042	25A023334-042 - ITM-PORRD-289649 4 Réf. Prel : P42 Extérieur - Façade Est/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
043 (1)	25A023334-043 - ITM-TIMJR-2896495 Réf. Prel : P43 Extérieur - Façade Ouest/Plafonds - (Ciment, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
044	25A023334-044 - ITM-TIMJR-2896496 Réf. Prel : P44 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Peint/Gris, Blanc)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 14/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
045	25A023334-045 - ITM-CWDZC-289649 7 Réf. Prel : P45 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / MA4T	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
046	25A023334-046 - ITM-SIZPA-2896498 Réf. Prel : P46 Extérieur - Façade Ouest/Menuiseries intérieures - (Compact, Dur/Beige)	Matériau semi-dur de type joint (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
047	25A023334-047 - ITM-MUFJP-2896499 Réf. Prel : P47 Extérieur - Façade Ouest/Façades lourdes y compris poteaux - (Ciment, Compact/Gris, Rouge)	Matériau dur (rouge) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 15/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
048	25A023334-048 - ITM-BWARX-289650 0 Réf. Prel : P48 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Ciment/Gris)	Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
049 (1)	25A023334-049 - ITM-BWARX-289650 2 Réf. Prel : P49 R+2 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
050	25A023334-050 - ITM-OOQTX-289650 3 Réf. Prel : P50 R+2 - Palier 2/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 16/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
051	25A023334-051 - ITM-YEHHC-289650 1 Réf. Prel : P51 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
052	25A023334-052 - ITM-PZURF-2896504 Réf. Prel : P52 R+2 - Sanitaires femmes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
053	25A023334-053 - ITM-PJBQO-289650 5 Réf. Prel : P53 R+2 - Sanitaires femmes/Revêtement s de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s)
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 17/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
054 (1)	25A023334-054 - ITM-SWOZB-285053 9 Réf. Prel : P54 R+4 - Palier 2/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
055	25A023334-055 - ITM-VXFPH-2850540 Réf. Prel : P55 R+4 - Sanitaires Hommes/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
056 (1)	25A023334-056 - ITM-JHHLS-2850541 Réf. Prel : P56 R+4 - Sanitaires Hommes/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 18/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
057	25A023334-057 - ITM-KZODQ-285054 2 Réf. Prel : P57 R+4 - Sanitaires Hommes/Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - (Mortier/Blanc)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
058	25A023334-058 - ITM-PZTEE-2850543 Réf. Prel : P58 R+3 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type ciment (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
059	25A023334-059 - ITM-IBZCD-2850544 Réf. Prel : P59 Extérieur - Façade Est/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 19/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		

Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
060	25A023334-060 - ITM-AXCKK-285054 5 Réf. Prel : P60 R+3 - Toilette/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur (friable) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
061 (1)	25A023334-061 - ITM-KEFQQ-285054 6 Réf. Prel : P61 R+3 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
062 (1)	25A023334-062 - ITM-UEJUX-2850547 Réf. Prel : P62 R+1 - Toilette/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
063 (1)	25A023334-063 - ITM-FSFGG-285054 8 Réf. Prel : P63 R+1 - Palier 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01 Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27 Page 20/22
 Dossier N° : 25GE006251 Date de réception : 08/07/2025 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025 Date de réception : 07/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
064	25A023334-064 - ITM-FLJVU-2850549 Réf. Prel : P64 R+1 - Palier 1/Menuiseries intérieures - (Dur, Compact/Gris)	Matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *
065	25A023334-065 - ITM-MKGQQ-285055 0 Réf. Prel : P65 Extérieur - Façade Ouest/Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs - (Mastic, Souple/Gris)	Matériau souple de type mastic (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
066 (1)	25A023334-066 - ITM-JYLKE-2850551 Réf. Prel : P66 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cimenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01
 Dossier N° : 25GE006251
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251
 Reçu au laboratoire le : 08/07/2025
 Date d'analyse : 08/07/2025
 Référence dossier Client:1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.

Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27
 Date de réception : 08/07/2025
 Référence de suivi du dossier N° : 25A023334
 Date de réception : 07/07/2025

Page 21/22

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
067 (1)	25A023334-067 - ITM-FSMET-285055 2 Réf. Prel : P67 R-1 - Salle restauration/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
068 (1)	25A023334-068 - ITM-IPDPW-2850553 Réf. Prel : P68 R-1 - Local 1/Murs et cloisons maçonnées "en dur" - (Ciment, Plâtre, Peint/Beige, Blanc, Gris)	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris)	MET * / M6XJ	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) échantillon(s)

(1) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050**.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-25-Z4-013984-01	Date d'émission de rapport : 09/07/2025 22:27	Page 22/22
Dossier N° : 25GE006251	Date de réception : 08/07/2025	Date d'analyse : 08/07/2025
Référence laboratoire sous-traitant N° : 25GE006251	Référence de suivi du dossier N° : 25A023334	
Reçu au laboratoire le : 08/07/2025	Date de réception : 07/07/2025	
Date d'analyse : 08/07/2025		
Référence dossier Client: 1510797622/27326529/S1/1/1_27326529/1/1		
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Est SAS.		

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (μm)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.



Guillaume Batt
Technicien(ne) Analyste Microscopie
CFR328

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
