

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Arrêtés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	79555-159292 A
Propriétaire	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE
Donneur d'ordre	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE
Adresse de l'immeuble	Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 Lunéville
Type de bien	Etablissement de santé
Date de la commande	18/06/2024
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage	28/06/2024
Date d'émission du rapport de repérage	09/07/2024
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	Commande 24008390

Signataire du rapport

Signature et Visa



apave
Apave Diagnostics
8, rue Pierre-Simon de Laplace
57070 METZ
Tél. : 33 (0)3 72 72 96 12
metz@adiag.apave.com
SIRET 483 336 319 00189

Opérateur de repérage :

TALEB Lahcen
Apave Diagnostics
Le 09/07/2024

Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

Commentaires :

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles au niveau de la pharmacie.

SOMMAIRE

SIGNATAIRE DU RAPPORT	1
CONCLUSIONS	1
DESCRIPTION DE LA MISSION	3
OBJET DE LA MISSION :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES :	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE :	3
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE :	3
PROGRAMME DE TRAVAUX	3
PROGRAMME DE REPERAGE	4
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
DATES ET NATURE DES VISITES SUR SITE	6
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020	6
ANALYSE DOCUMENTAIRE :	7
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES	7
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	7
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) :	7
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES	7
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE	9
ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	10
ANNEXE : PLANS / CROQUIS	22
ANNEXE : ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	25
ANNEXE : PROCES-VERBAUX D'ANALYSE	28
ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE	44
ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE	45

1 Description de la mission

1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **79555-159292**

Référence du donneur d'ordre : **R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie**

1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble : **CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE**

Adresse du propriétaire : **6 Rue Jean Girardet 54300 Lunéville**

Représenté par : **CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE**

Donneur d'ordre : **CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE**

Accompagnateur : **Mr :Cédric BUSSELOT**

Opérateur ayant réalisé le repérage : **Monsieur TALEB Lahcen**

N° de certification de l'opérateur : **CPDI6352**

Organisme : **I.Cert**

Nom et adresse de l'entreprise : **Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 METZ**

N° de Siret : **48333631900189**

RCP compagnie n° de police : **AXA IARD - 10800807204**

1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination : **Locaux santé du travail et pharmacie**

Adresse complète : **6 rue Girardet - 54301 Lunéville**

Référence Cadastre : **Non communiqué(e)**

Date du permis de construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Date de la construction : **Non communiquée**

Bâtiment : **Locaux santé du travail et pharmacie**

Etage : **R+1/combles**

Escalier : **Sans objet**

Porte : **Sans objet**

Fonction principale du bâtiment : **Etablissement de santé**

N° de lot : **NC**

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :

1.4 Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : **Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord**

Adresse du laboratoire : **557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont**

Numéro d'accréditation : **1-1593**

2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d'ouvrage à inspecter :

Programme de travaux : Repérage exhaustif, sols murs et plafonds et fenêtres pour une réhabilitation.

3 Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer, conformément à l'annexe1 de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou composants de la construction	Parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités	
Plaques ondulées et planes	Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles ») Plaques en matériaux bitumineux Revêtements anti-condensation sous bac acier
Ardoises, bardeaux bitumineux	Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Bardeaux bitumineux (« shingles »)
Éléments associés à la toiture	Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux pluviales Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Tresses d'étanchéité à l'air Éléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, closoirs, faitages, mîtres, costières, etc.) Jonctions bitumineuses Solins en fibre ciment Colle des solins en fibre ciment
Éléments sous toiture	Pare-vapeur, pare pluie Isolants fibreux en sous toiture Flocages, enduits projetés
Étanchéité de toiture terrasse	Parties planes : revêtements bitumineux (bandes, lés...), écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Relevés : revêtements bitumineux (bandes, lés...) Parties planes ou relevés : complexes asphaltés
Fenêtres de toit, lanterneaux, verrières	Mastics (vitriers, bitumineux...) Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature Garnitures de friction sur fenêtres basculantes
2 - Parois verticales extérieures et Façades	
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich	Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de remplissage Ardoises composites hors fibro ciment Ardoises en fibro ciment Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, tresses Revêtements intérieurs anti-condensation (hors peintures) Peintures des bardages métalliques
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Flocages, enduits projetés Carton-amiante
Façades lourdes y compris poteaux	Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), crépis extérieurs Revêtements plastiques épais (RPE) Peintures sur béton Enduits pelliculaires de lissage/débullage Colles et joints (faïence, pâte de verre, carrelage), ragréages, primaires d'accrochage, Imperméabilisants Éléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire Garnissage des joints de dilatation Joints de dilatation Couvre-joints Appuis de fenêtres en fibres-ciment
Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage (notamment châssis aluminium) Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure Garnitures de friction sur fenêtres basculantes Plaques de fibres-ciment (allèges, coffres, etc.)

	Peintures décoratives
Éléments associés aux façades	Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation Conduits d'eaux (pluviales et usées) Éléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
3 - Parois verticales intérieures	
Murs et cloisons maçonnés	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Enduits de ragréage, débullage, lissage Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Poteaux	Flocages Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison Entourages de poteau (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Flocages Plots de colle fixant les cloisons au mur Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre Sous couches des tissus muraux Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / têtes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse, carton, fibres-ciment
Gaines et coffres verticaux	Flocages Enduits à base de plâtre (projetés, lissés ou talochés) Enduits à base de ciment, lissés ou talochés (ragréage, débullage, lissage) Bandes calicot Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné Panneaux (fibres-ciment, ...) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifiques	Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et sur serrurerie) Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakélite Isolants intérieurs des portes
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Sous couches des tissus muraux, moquettes murales ou les vinyles Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris), revêtements durs en fibres-ciment Colles et joints de carrelage ou de faïence, ragréage, primaire d'accrochage Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...) Revêtements bitumineux Peintures intumescents
4 - Plafonds et faux plafonds	
Plafonds	Flocages Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés Panneaux collés vissés ou cloués Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite) Bandes calicot

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

	Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de plâtre
	Sous couches des tissus muraux
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Résines
	Colles de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage et joints de carrelage
Poutres et charpentes	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Entourages de poutres (carton-amiante, fibres ciment, matériaux sandwich)
	Peintures intumescentes
	Revêtements bitumineux
	Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)
	Jonctions avec la façade, calfeutremments, joints (coupe-feu, de dilatation, de structure)
Gaines et coffres horizontaux	Flocages
	Enduits à base de plâtre ou ciment (projetés, lissés ou talochés)
	Bandes calicot
	Enduits de jointoiement des plaques de plâtre cartonné
	Panneaux (fibres-ciment, ...)
	Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux)
Faux plafonds	Panneaux et plaques
	Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre panneaux
	Pare vapeur
	Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond
	Écrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum entre le faux plafond et le plancher supérieur)
Suspentes et contrevents	Flocages
	Protections en plâtre
	Peintures intumescentes
5 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sols	Dalles de sol
	Nez de marche
	Dalles moquettes avec entre couche noire
	Sous-couches (carton, feutre, ...) des revêtements souples
	Colles bitumineuses
	Colles non bitumineuses
	Moquette
	Sols coulés à base ciment (terrazolith, etc.)
	Peintures de sol
	Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires d'accrochage
	Revêtements de sols sportifs
	Joints de dilatation et d'assemblage
	Joints de cantonnement sur faux planchers
	Enduit de cuvelage
	Rebouchages autour de conduits (principalement IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment
6 - Conduits et accessoires intérieurs	
Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)	Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)
	Matelas
	Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de calorifugeage
	Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour brides
	Rubans adhésifs

	Mastics
	Conduits en fibres-ciment, manchons
	Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)
	Tresses dans câbles électriques d'alimentation, (notamment de secours, souvent orange), résistants au feu
Clapets / volets coupe-feu	Clapets (tunnels, lames, joints)
	Volets coupe-feu y compris ossature
	Rebouchages et calfeutremments de clapets et volets coupe-feu
Vide-ordures	Conduits et vidoirs en fibres-ciment
	Joints d'étanchéité des trappes
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques	
Portes et cloisons palières	Panneaux dans les portes palières
	Panneaux des cloisons palières
Parois des équipements	Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines, joues des escaliers mécaniques...)
	Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
	Isolants
	Colles
	Joints
Matériels en machinerie	Freins d'ascenseurs
	Éléments de protection contre les arcs électriques intégrés dans des équipements de type contacteurs, sélecteurs, coupe-circuits...
	Tresses
	Joints plats
8 - Équipements divers et accessoires	
Chaudières (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poêles à bois à fuel, à charbon, Groupes électrogènes	Flocages
	Bourres
	Tresses
	Calorifugeages
	Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
	Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)
	Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques
Convecteurs et radiateurs électriques	Isolants thermiques cartonnés
	Tresses des diffuseurs
Fusibles à broche	Carton, tresse
Canalisations électriques préfabriquées	Isolants
Coffres-forts	Portes et parois
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques	Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
Jardinières, bac à sable incendie	Éléments en fibres-ciment
9 - Fondations et soubassements	
Étanchéité des murs enterrés	Enduits bitumineux des ouvrages enterrés
Parois verticales et horizontales enterrées	Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation
Conduits et fourreaux	Fourreaux en fibres-ciment dans maçonnerie
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Conduits, Siphons	Éléments de canalisations enterrés en fibres-ciment
Voies	Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste partie bitume), asphaltes
Espaces sportifs	Revêtements de sols
Aménagements extérieurs	Éléments en fibres-ciment (jardinières, bordures...)

4 Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération.

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante – Partie privative qui doivent être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, l'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante : « A » désigne la zone de l'accès au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre.

Moyens mis à disposition : **Néant**

4.1 Dates et Nature des visites sur site

Date	Objet
28/06/2024	01 visite sur site

4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

4.3 Analyse Documentaire :

Auteur/Société	Titre	Référence	Date	Objet
CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Programme de travaux	Commande 24008390	19/06/2024	Voir descriptif travaux

4.4 Rapports précédemment réalisés

Néant

5 Résultats détaillés du repérage

5.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble visités

Parties d'immeuble concernées où Locaux à investiguer	Etage
Entrée n°1	R+1
Bureau n°1	R+1
Bureau n°2	R+1
WC	R+1
Repos	R+1
Combles	R+2
SAS	R+1
Entrée n°2	R+1
Fabrication	R+1
Chimiothérapie	R+1
Conditionnement	R+1

➤ Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Néant

➤ Liste des éléments non inspectés :

Néant

5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie d'immeuble	Etag e	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
Entrée n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
Bureau n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z002	Non	
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z008	Non	

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etag e	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z003	Non	
		Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z010	Non	
Bureau n°2	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P006)	Z006	Non	
		mur n°1	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P001)	Z001	Non	
		mur n°2	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P002)	Z002	Non	
		Mur donnant sur l'extérieur	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P003)	Z003	Non	
		Plafond	enduit plâtre	Résultat d'analyse (P008)	Z008	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse (P007)	Z007	Non	
		Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse (P009)	Z009	Non	
		Fenêtre	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse (P010)	Z010	Non	
WC	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P004)	Z004	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P005)	Z005	Non	
		Plafond	Enduit plâtre	Résultat d'analyse	Z008	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
Repos	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P015)	Z015	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z006	Non	
		Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond	Résultat d'analyse	Z007	Non	
		Fenêtre	Joint Compriband	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Plafond	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P014)	Z014	Non	
		Fenêtre	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z010	Non	
Combles	R+2	CTA	Aluminium	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Aluminium)		Non	
		mur de séparation	bande calicot	Résultat d'analyse (P017)	Z017	Non	
		Plancher - bois	Laine minérale	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante (Laine minérale)		Non	
SAS	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse (P013)	Z013	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Ensemble des murs	Bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
Entrée n°2	R+1	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P012)	Z012	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Ensemble des murs	bande calicot -	Résultat d'analyse	Z011	Non	

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Local / Partie d'immeuble	Etag e	Composant de la construction	Partie de composant	Critères de décision	Réf. ZPSO	Présence d'amiante (oui/non)	Estimatif de la quantité
			Peinture				
Fabrication	R+1	Fenêtre	Joint Comproband	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Ensemble des murs	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P011)	Z011	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Fenêtre	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z010	Non	
Chimiothérapie	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Ensemble des murs	Bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
Conditionnement	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple	Résultat d'analyse	Z013	Non	
		Ensemble des murs	Bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse	Z011	Non	
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse	Z012	Non	
		Fenêtre	Joint Comproband	Résultat d'analyse	Z009	Non	
		Fenêtre	Joint d'étanchéité	Résultat d'analyse	Z010	Non	

Commentaires :

A la demande du donneur d'ordre, les éléments susceptibles de contenir de l'amiante au niveau des sols et des murs ont été prélevés en périphérie des pièces pour ne pas faire de dégâts visibles au niveau de la pharmacie.

5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage


Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.


En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.


En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

ELEMENT : Plancher		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+2 - Combles - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement	Partie de composant Laine minérale
Résultat amiante : Absence d'amiante		

ELEMENT : CTA		
Emplacement : 		
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+2 - Combles - CTA - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement	Partie de composant Aluminium
Résultat amiante : Absence d'amiante		

PRELEVEMENT : P001			
Emplacement : 			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - mur n°1 - A	
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Bande calicot - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :01	
Bande calicot / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture avec couche en toile non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002			
Emplacement : 			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - mur n°2 - C	
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :01	
enduit plâtre / Peinture			

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :



Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Mur donnant sur l'extérieur - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : [Absence d'amiante](#)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - WC - Ensemble des murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant bande calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet bande calicot / Peinture	Planche de croquis n° :01
--	----------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - WC - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant lino+colle - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet lino+colle / Revêtement souple	Planche de croquis n° :01
--	----------------------------------

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Revêtement souple rose	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :



Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant lino+colle - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
lino+colle / Revêtement souple	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple rose	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Colle polymère jaune non séparable + bois aggloméré non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Faux-plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Panneaux de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Panneaux de faux-plafond	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit blanc	0	Fibres d'amiante non détectées
Fr2	Matériau fibreux beige	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Plafond - Plafond dans le plénum
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Enduit plâtre

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Enduit plâtre	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Fenêtre - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Joint Comproband

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Joint Comproband	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple noir	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Bureau n°2 - Fenêtre - Toutes zones	
Nom de l’opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Joint d'étanchéité	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :01		
Joint d'étanchéité			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Matériau souple blanc avec poussières	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - fabrication - Ensemble des murs - Toutes zones	
Nom de l’opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant bande calicot - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet	Planche de croquis n° :01		
bande calicot / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Entrée n°2 - Plafond - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Enduit plâtre / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - SAS - Plancher - Sol
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant lino+colle - Revêtement souple

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
lino+colle / Revêtement souple	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014			
<p align="center">Emplacement :</p> 			
Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Repos - Plafond - Plafond dans le plénum	
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Enduit plâtre - Peinture	
Résultat amiante : Absence d'amiante			
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :			
Objet		Planche de croquis n° :01	
Enduit plâtre / Peinture			
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+1 - Repos - Ensemble des murs - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant Bande calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Bande calicot / Peinture	

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture en faible quantité en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier	0	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017
Emplacement :


Nom du client CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE	Numéro de dossier 79555-159292 Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 54	Pièce ou local – Composant R+2 - Combles - mur de séparation - Toutes zones
Nom de l'opérateur TALEB Lahcen	Date de prélèvement 28/06/2024	Partie de composant bande calicot

Résultat amiante : Absence d'amiante


DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet	Planche de croquis n° :01
Bande calicot	


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)	Conclusion amiante
Fr1	Peinture non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable	0	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE : Plans / Croquis

Titre : Croquis N°1		N° planche : 1/2	N° dossier : 79555-159292	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE		Version : 0	Adresse : Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 Lunéville	
Intervenant : TALEB Lahcen		Date : 09/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur				
Commentaire : Néant			Localisation : Locaux santé du travail et pharmacie Locaux santé du travail et pharmacie	Lieu / Zone : R+1

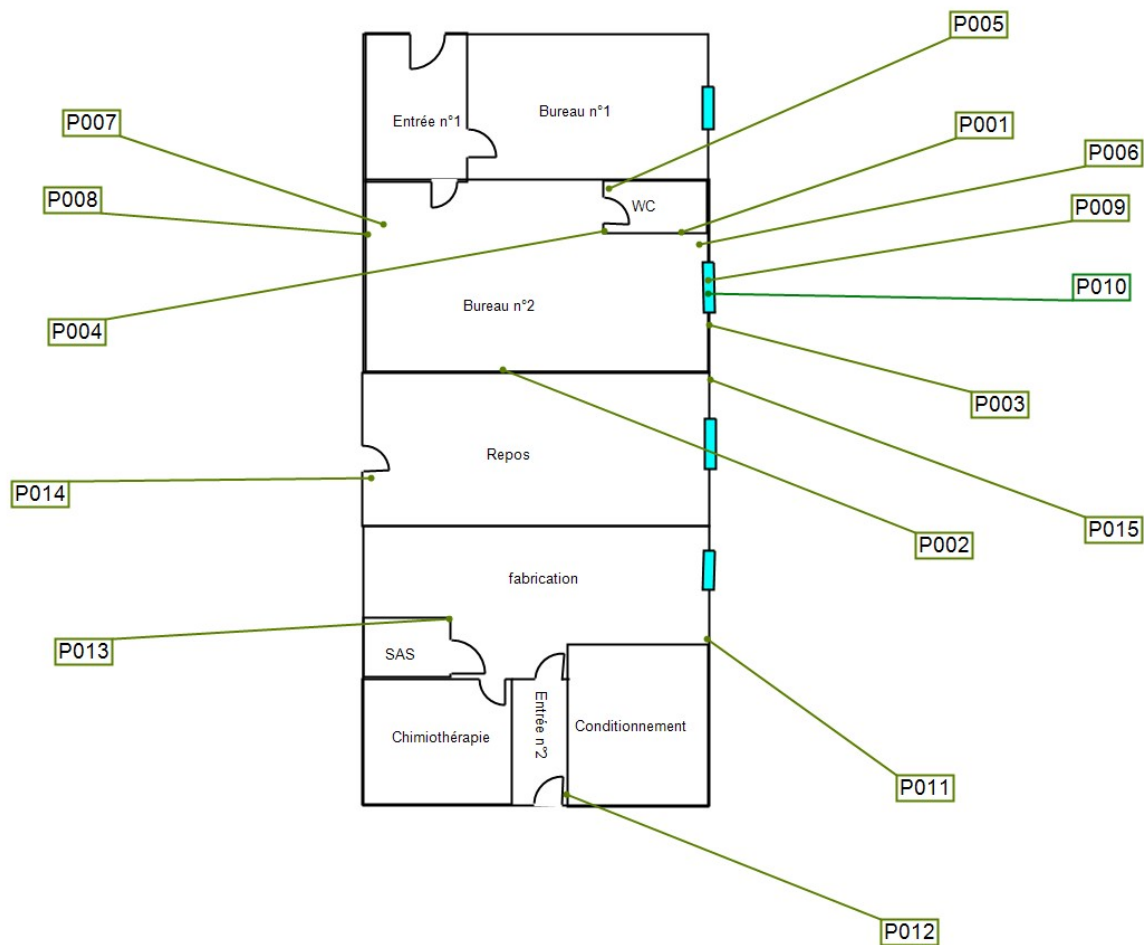

Titre : Croquis N°2		N° planche : 2/2	N° dossier : 79555-159292	Type : Planche de repérage usuel en plan
Client : CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE		Version : 0	Adresse : Locaux santé du travail et pharmacie 6 rue Girardet 54301 Lunéville	
Intervenant : TALEB Lahcen		Date : 09/07/2024		
Origine du plan : Diagnostiqueur				
Commentaire : Néant			Localisation : Locaux santé du travail et pharmacie Locaux santé du travail et pharmacie	Lieu / Zone : Combles

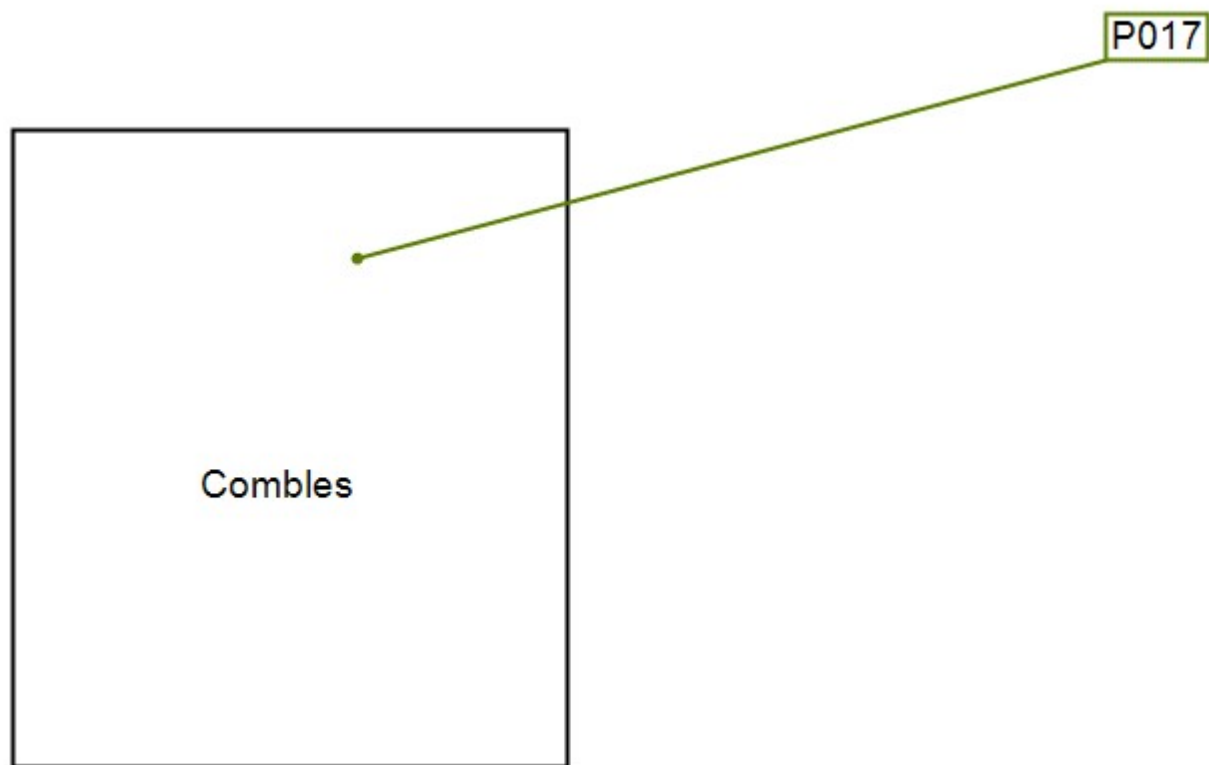

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d'Ouvrage

Z001 : mur bande calicot Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°2	R+1	mur n°1	bande calicot - Peinture		P001	Non	

Z002 : mur enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Bureau n°1	R+1	Ensemble des murs	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Bureau n°2	R+1	Mur n°2	Enduit plâtre - Peinture		P002	Non	

Z003 : Mur donnant sur l'extérieur enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°1	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit plâtre - Peinture			Non	
Bureau n°2	R+1	Mur donnant sur l'extérieur	Enduit plâtre - Peinture		P003	Non	

Z004 : Ensemble des murs bande calicot Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture		P004	Non	

Z005 : Plancher lino+colle Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
WC	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple		P005	Non	

Z006 : Plancher lino+colle Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée n°1	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Bureau n°1	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Bureau n°2	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple		P006	Non	
Repos	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	

Z007 : Faux-plafond Panneaux de faux-plafond (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée n°1	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau n°1	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Bureau n°2	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond		P007	Non	
WC	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	
Repos	R+1	Faux-plafond	Panneaux de faux-plafond			Non	

Z008 : Plafond enduit plâtre (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée n°1	R+1	Plafond	Enduit plâtre			Non	
Bureau n°1	R+1	Plafond	Enduit plâtre			Non	
Bureau n°2	R+1	Plafond	Enduit plâtre		P008	Non	
WC	R+1	Plafond	Enduit plâtre			Non	

Z009 : Fenêtre Joint Compriband (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°1	R+1	Fenêtre	Joint Compriband			Non	
Bureau n°2	R+1	Fenêtre	Joint Compriband		P009	Non	
Repos	R+1	Fenêtre	Joint Compriband			Non	
Fabrication	R+1	Fenêtre	Joint Compriband			Non	
Conditionnement	R+1	Fenêtre	Joint Compriband			Non	

Z010 : Fenêtre Joint d'étanchéité (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Bureau n°1	R+1	Fenêtre	Joint d'étanchéité			Non	
Bureau n°2	R+1	Fenêtre	Joint d'étanchéité		P010	Non	
Repos	R+1	Fenêtre	Joint d'étanchéité			Non	
Fabrication	R+1	Fenêtre	Joint d'étanchéité			Non	
Conditionnement	R+1	Fenêtre	Joint d'étanchéité			Non	

Z011 : Ensemble des murs bande calicot Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture			Non	
Entrée n°2	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture			Non	
Fabrication	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture		P011	Non	
Chimiothérapie	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture			Non	
Conditionnement	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture			Non	

Z012 : Plafond enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Entrée n°2	R+1	Plafond	enduit plâtre - Peinture		P012	Non	
fabrication	R+1	Plafond	enduit plâtre - Peinture			Non	
Chimiothérapie	R+1	Plafond	enduit plâtre - Peinture			Non	
Conditionnement	R+1	Plafond	enduit plâtre - Peinture			Non	

Z013 : Plancher lino+colle Revêtement souple (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
SAS	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple		P013	Non	
		Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Entrée n°2	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Fabrication	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Chimiothérapie	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	
Conditionnement	R+1	Plancher	lino+colle - Revêtement souple			Non	

Z014 : Plafond enduit plâtre Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos	R+1	Plafond	enduit plâtre - Peinture		P014	Non	

Z015 : Ensemble des murs bande calicot Peinture (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Repos	R+1	Ensemble des murs	bande calicot - Peinture		P015	Non	

Z016 : (continue : NON)

Z017 : mur de séparation bande calicot (continue : NON)

Local / partie d'immeuble	Etage	Composant de la construction	Partie de composant	Réf. Sondage	Réf. prélèvement.	Présence d'amiante	Estimatif de la quantité
Combles	R+2	Mur de séparation	bande calicot		P017	Non	

ANNEXE : Procès-verbaux d'analyse

E.23847928.0.PDF



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-751 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-751
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P001 - bande calicot - Peinture - R+1 - Bureau n°2 - A - mur n°1
Description ITGA	Peinture avec couche en toile / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture avec couche en toile non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

E.23847929.0.PDF



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-752 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-752
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P002 - enduit plâtre - Peinture - R+1 - Bureau n°2 - C - mur n°2
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847930.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

29/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-753 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-753
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P003 - enduit plâtre - Peinture - R+1 - Bureau n°2 - Toutes zones - Mur donnant sur l'extérieur
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847931.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

30/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-754 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-754
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P004 - bande calicot - Peinture - R+1 - WC - Toutes zones - Ensemble des murs
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847932.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

31/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-755 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-755
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P005 - lino+colle - Revêtement souple - R+1 - WC - Sol - Plancher
Description ITGA	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Bois aggloméré

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple rose	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB
► Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847933.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

32/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-756 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-756
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P006 - lino+colle - Revêtement souple - R+1 - Bureau n°2 - Sol - Plancher
Description ITGA	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Bois aggloméré

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple rose	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JJP
► Colle polymère jaune non séparable + Bois aggloméré non séparable	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JJP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847934.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

33/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-757 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-757
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P007 - Panneaux de faux-plafond - R+1 - Bureau n°2 - Toutes zones - Faux-plafond
Description ITGA	Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit blanc	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : KDB
► Matériau fibreux beige	MOLP le 04/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : MRT

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847935.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

34/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-758 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-758
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P008 - enduit plâtre - R+1 - Bureau n°2 - Plafond dans le plénum - Plafond
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DDG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847936.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

35/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-759 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-759
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P009 - Joint Comprisant - R+1 - Bureau n°2 - Toutes zones - Fenêtre
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau souple noir	META (B) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847937.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

36/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-760 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-760
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P010 - Joint d'étanchéité - R+1 - Bureau n°2 - Toutes zones - Fenêtre
Description ITGA	Matériau souple blanc avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau souple blanc avec poussières	META (B) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DDG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847938.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

37/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-761 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-761
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P011 - bande calicot - Peinture - R+1 - fabrication - Toutes zones - Ensemble des murs
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DDG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847939.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

38/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-762 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-762
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P012 - enduit plâtre - Peinture - R+1 - Entrée n°2 - Toutes zones - Plafond
Description ITGA	Peinture en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : JJP (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847940.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

39/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-763 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-763
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P013 - lino+colle - Revêtement souple - R+1 - SAS - Sol - Plancher
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Revêtement souple bleu + Colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : KDB (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847941.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

40/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-764 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-764
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P014 - enduit plâtre - Peinture - R+1 - Repos - Plafond dans le plénum - Plafond
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : BCR (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847942.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

41/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-765 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-765
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P015 - bande calicot - Peinture - R+1 - Repos - Toutes zones - Ensemble des murs
Description ITGA	Peinture en faible quantité en vrac / Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture en faible quantité en vrac non séparable + Enduit plâtreux blanc en faible quantité en vrac avec couche en papier	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DDG (2)

- (1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

E.23847944.0.PDF

Rapport n° : 79555-159292 A / Référence du donneur d'ordre : R+1 : Locaux santé du travail et pharmacie

Apave Diagnostics - 8 rue Pierre Simon de Laplace - 57070 - METZ

SIRET : 48333631900189 Tél : 03 72 72 96 12 Email : metz@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

42/46



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tél : 03.87.35.83.50
Fax : 03.87.35.50.60
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT032407-767 EN DATE DU 04/07/2024 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE DIAGNOSTICS - METZ
M. Lahcen TALEB
8 rue Pierre Simon de Laplace BP 66175
57075 METZ CEDEX 3

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0324-6698
Echantillon ITGA : IT032407-767
Reçu au laboratoire le : 01/07/2024

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	79555-159292--389--566--467-151632047
Dossier client	CENTRE HOSPITALIER DE LUNEVILLE + Locaux santé du travail et pharmacie - Locaux santé du travail et pharmacie - 6 rue Girardet - 54301 - Lunéville
Echantillon	P017 - bande calicot - R+2 - Combles - Toutes zones - mur de séparation
Description ITGA	Peinture / Matériau plâtreux blanc

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc non séparable	META (A) le 04/07/2024 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : DDG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Pierre-Louis LEFEVRE Responsable de laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 25

Page 1 / 1

ANNEXE : Certificat de compétence



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI 6352 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur TALEB Lahcen

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 28/03/2022 - Date d'expiration : 27/03/2029
Electricité	État de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 03/01/2023 - Date d'expiration : 02/01/2030
Energie avec mention	Energie avec mention Date d'effet : 12/05/2023 - Date d'expiration : 20/06/2029
Energie sans mention	Energie sans mention Date d'effet : 21/06/2022 - Date d'expiration : 20/06/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 13/03/2023 - Date d'expiration : 12/03/2030

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 12/05/2023.



Année du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Année du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Année du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 30 octobre 2009 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Année du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Année du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification. Ou Année du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev18

ANNEXE : Attestation d'assurance



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE DIAGNOSTICS
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- Bâtiment et génie civil
- Essais, mesures et métrologie
- Laboratoires d'analyses (non médicales)
- Conseils
- Formation
- Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada sous-limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2024 au 31/12/2024** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **10/01/2024**

Pour la société :

Mathieu GODART

Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

Fin du rapport
