



APAVE
AGENCE DE QUIMPER

12 allée Claude Derwenn CS 63009
29334 QUIMPER CEDEX
N° SIRET : 90386907100253

DONNEUR D'ORDRE
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE
SUD
18 RUE HENT GLAZ
29107 QUIMPER
CONTACT : Roland MADEC



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **2869150.2_Am_Clinique**
9_Amiante Sanitaires
Numéro de contrat : **C25171589**
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T251349568**
Date : **15/09/2025**

Lieu d'intervention :

SANITAIRES EXTERIEUR
Sanitaires extérieur
18 rue HENT GLAZ
29000 QUIMPER

Destinataire rapport :
ETS PUBLIC SANTE MENTALE
FINISTERE SUD

Date d'intervention :

Du **01/09/2025** au **01/09/2025**

Intervenant : **Monsieur Moustapha OULD**

Signature :

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 31 pages

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : Sanitaires extérieur
18 rue RUE HENT GLAZ
29000 QUIMPER

Référence Cadastre : AE - 316
Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997

Nature du bâtiment : SANITAIRES EXTERIEUR

1.2 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom : ETS PUBLIC SANTE MENTALE
FINISTERE SUD

Adresse : 18 RUE HENT GLAZ
29107 QUIMPER

Qualité :

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Nom: ETS PUBLIC SANTE MENTALE
FINISTERE SUD

Adresse : 18 RUE HENT GLAZ
29107 QUIMPER

1.3 EXÉCUTION DE LA MISSION

Repérage réalisé par : OULD Moustapha
N° certificat de qualification : CPDI6613 Version 06
Date d'obtention : 16/10/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : I.CERT

Date de la commande : 02/09/2025

Accompagnateur : Monsieur QUERE

Laboratoire d'Analyses : ITGA BREST
Adresse laboratoire : 7 Rue Charles Jourde 29200 BREST
Numéro d'accréditation : 1-6090

Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD

Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
N° de contrat d'assurance : 10800807204
Date de validité : 31/12/2025

1.4 SIGNATURE DE L'OPÉRATEUR DE REPERAGE

Nom du diagnostiqueur : OULD Moustapha
AGENCE DE QUIMPER 12 allée Claude Derwenn CS
63009 29334 QUIMPER CEDEX
Signature de l'opérateur



DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Lieu et date d'établissement du rapport
Fait à QUIMPER CEDEX le 15/09/2025

2 CONCLUSION(S) DU RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
SIGNATURE DE L'OPÉRATEUR DE REPERAGE	2
CONCLUSION(S) DU RAPPORT	2
RESULTATS DÉTAILLÉS DU REPERAGE	4
MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
MATÉRIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	4
INVESTIGATIONS NON RÉALISÉES	4
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCÈS À METTRE À DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	4
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ÊTRE RÉALISÉE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	4
PRÉCONISATIONS	5
COMMENTAIRES RELATIFS À LA PRESTATION	5
OBJECTIF	5
RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	5
CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPERAGE	5
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	6
PROGRAMME DE DÉMOLITION	6
PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPERAGE	6
RAPPORT(S) ANTÉRIEUR(S)	6
ANNEXE CROQUIS	7
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	12
ANNEXE PROCÈS VERBAUX D'ANALYSES	19
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITÉS	26
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	28

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Sanitaires	Plancher - Béton	Colle + ragréage carrelage	Résultat d'analyse (P001)	S001	
		Murs	Colle plinthes carrelage	Résultat d'analyse (P002)	S002	
		Murs	Colle faïence 2/2	Résultat d'analyse (P003)	S003	
		Murs	Colle faïence 15/15 blanc	Résultat d'analyse (P004)	S004	

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Sanitaires	Murs - Béton	Enduit ciment + peinture	Résultat d'analyse (P005)	S005	
		Muret - Béton	Enduit extérieur	Résultat d'analyse (P007)	S007	Z001
		Murs - Béton	Peinture	Résultat d'analyse (P006)	S006	
		Muret extérieur - Béton	Enduit	Résultat d'analyse (P007 - idem)		Z001

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Néant

4.2 Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Néant

5 PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6 COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1 OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis,
Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020,
Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification,
Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date de réalisation du repérage : 01/09/2025

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Documents remis : Néant

Commentaire : Néant

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION

7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION

Sanitaires en extérieur

7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :


Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Sanitaires	OUI	

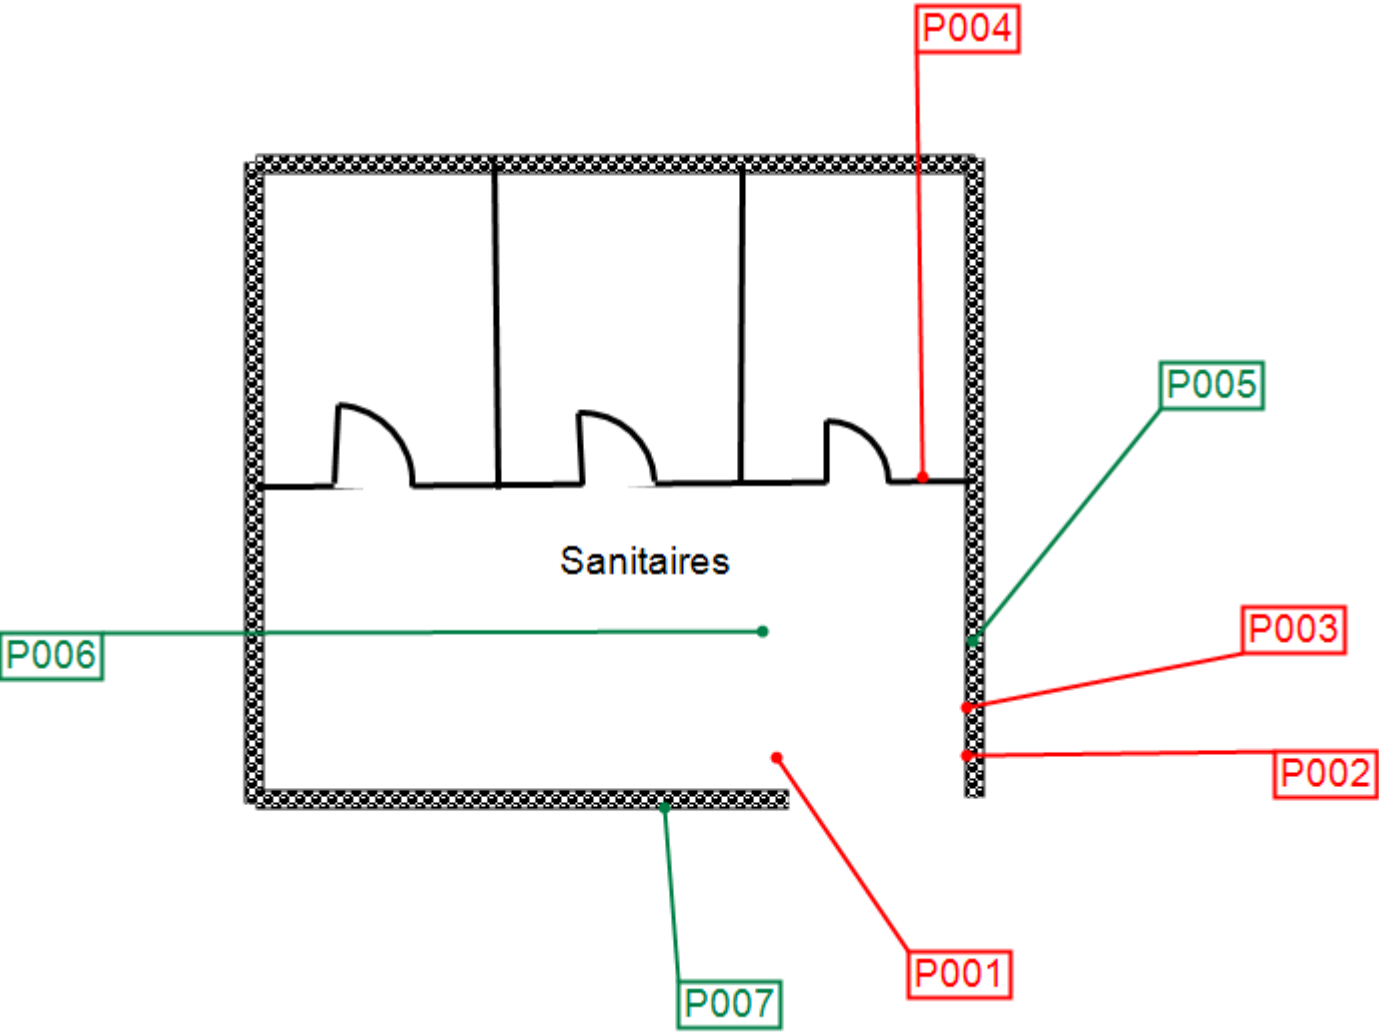
8 RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)



Rapports précédents :

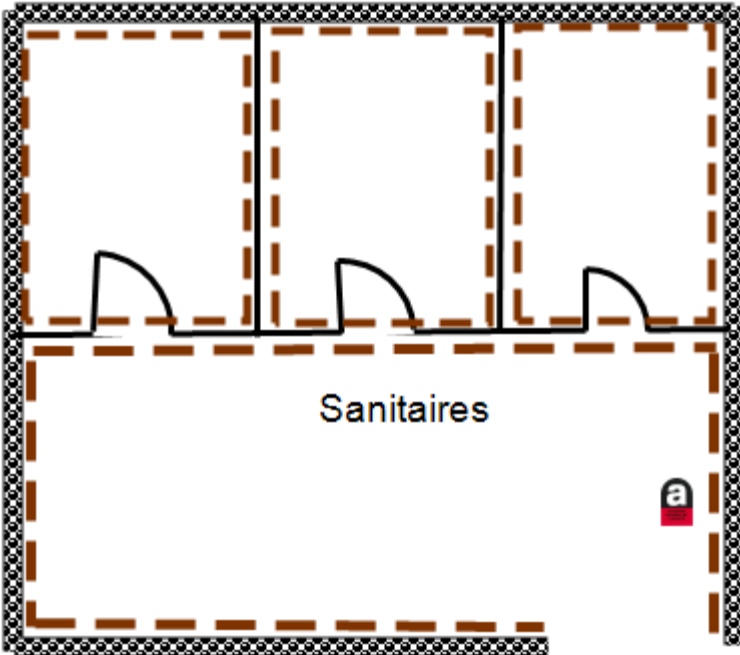
Absence de rapports antérieurs ou non communiqués


ANNEXE CROQUIS

	<div> <div>Planche de repérage</div> </div>			
<div> <div>Client :</div> <div>N° rapport :</div> <div>N° planche :</div> <div>Type :</div> <div>Date :</div> <div>Intervenant :</div> <div>Origine du plan :</div> </div>	<div> <div>ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD</div> <div>T251349568</div> <div>1/4</div> <div>Version : 0</div> <div>Planche de repérage technique en plan</div> <div>15/09/2025</div> <div>OULD Moustapha</div> <div>Opérateur de repérage</div> </div>	<div> <div>Titre :</div> <div>Lieu d'intervention :</div> <div>Bâtiment :</div> <div>Etage :</div> <div>Commentaire :</div> </div>	<div> <div>NIVEAU 0</div> <div>Sanitaires extérieur</div> <div>18 rue RUE HENT GLAZ</div> <div>29000 QUIMPER</div> <div>SANITAIRES EXTERIEUR</div> <div>RDC</div> </div>	



		Planche de repérage		<div>Legende :</div> <div> Colle faïence murale</div>			
Client :	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Titre :	NIVEAU 0				
N° rapport :	T251349568		Sanitaires extérieur				
N° planche :	2/4	Lieu d'intervention :	18 rue RUE HENT GLAZ 29000 QUIMPER				
Type :	Planche de repérage technique en plan	Bâtiment :	SANITAIRES EXTERIEUR				
Date :	15/09/2025	Etage :	RDC				
Intervenant :	OULD Moustapha	Commentaire :					
Origine du plan :	Opérateur de repérage						



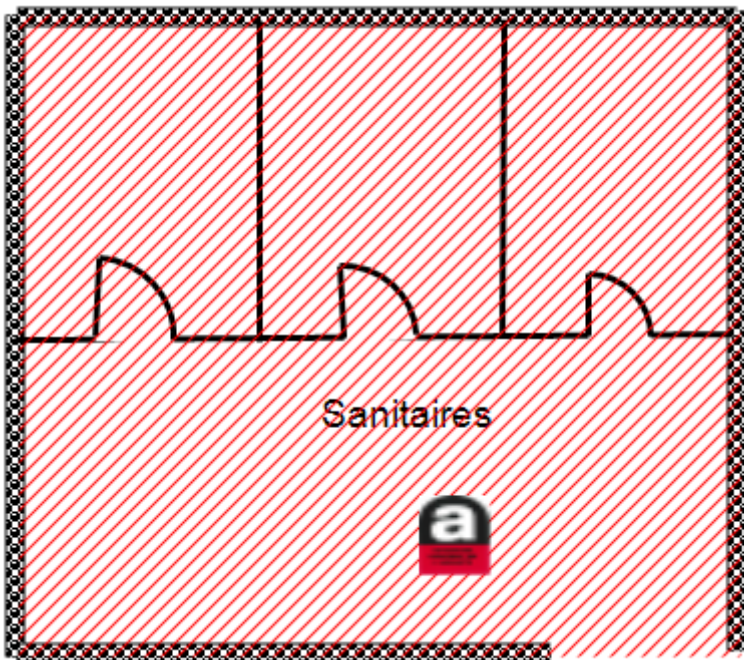


 Colle faïence murale

<div> <div>apave</div> <div> <div>Planche de repérage</div> </div> </div>		<div> <div>Legende :</div> <div> <div></div> <div>Colle de plinthes carrelage</div> </div> </div>	
Client :	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Titre :	Niveau 0
N° rapport :	T251349568	Lieu d'intervention :	Sanitaires extérieur 18 rue RUE HENT GLAZ 29000 QUIMPER
N° planche :	3/4		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	15/09/2025	Bâtiment :	SANITAIRES EXTERIEUR
Intervenant :	OULD Moustapha	Etage :	RDC
Origine du plan :	Opérateur de repérage	Commentaire :	



Colle plinthe carrelage

		Planche de repérage		<div>Legende :</div> <div> Colle + ragréage carrelage</div>			
Client :	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	Titre :	Niveau 0				
N° rapport :	T251349568		Sanitaires extérieur				
N° planche :	4/4	Lieu d'intervention :	18 rue RUE HENT GLAZ 29000 QUIMPER				
Type :	Planche de repérage technique en plan	Bâtiment :	SANITAIRES EXTERIEUR				
Date :	15/09/2025	Etage :	RDC				
Intervenant :	OULD Moustapha	Commentaire :					
Origine du plan :	Opérateur de repérage						
<div></div>							

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
PRELEVEMENT : P001
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle + ragréage carrelage	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Plancher - Sol

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle + ragréage carrelage


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Colle grise avec poussières + ragréage beige en faible quantité non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P002
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle plinthes carrelage	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

ColleColle plinthes carrelage


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P003
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence 2/2	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle faïence 2/2


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Joint cassant blanc non séparable + colle beige en vrac avec poussières non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P004
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle faïence 15/15 blanc	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Colle faïence 15/15 blanc


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Colle beige
Fr2	Matériau compact gris hétérogène

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante de type chrysotile
Fr2		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit ciment + peinture	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Murs A B C D

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit ciment + peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Peintures multiples avec poussières non séparable + enduit gris non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Plafond

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :
 Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Peintures multiples avec poussières

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD	T251349568	RDC - Sanitaires
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit mur extérieur	01/09/2025	OULD Moustapha

Localisation

Murs - Extérieur

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit mur extérieur


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle
Fr1	Enduit compact beige hétérogène non séparable + enduit gris non séparable

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
Fr1		Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES

E.26359139.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-841 EN DATE DU 08/09/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-841
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Client :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier client	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P001 - Colle + ragréage carrelage - RDC - Sanitaires - Sol - Plancher
Description ITGA	Carrelage / Colle grise avec poussières / Ragréage beige en faible quantité

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle grise avec poussières + Ragréage beige en faible quantité non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : EEG (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359140.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-842 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-842
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier cliant	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P002 - Colle plinthes carrelage - RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs
Description ITGA	Carrelage / Poussières en faible quantité / Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Colle beige + Matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : EEG (1)

(1) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le cliant. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le cliant, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359141.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-843 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-843
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier client	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P003 - Colle faïence 2/2 - RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs
Description ITGA	Carrelage / Joint cassant blanc / Colle beige en vrac avec poussières

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Joint cassant blanc non séparable + Colle beige en vrac avec poussières non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AKN (1)

(1) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359142.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



afel
Made in France

Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-844 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-844
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Cliant : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier cliant	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P004 - Colle faïence 15/15 blanc - RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Matériau compact gris hétérogène

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
▶ Colle beige	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	Analyste : AKN
▶ Matériau compact gris hétérogène	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EEG

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le cliant. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le cliant, ont été analysées.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359143.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-845 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-845
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier client	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P005 - Enduit ciment + peinture - RDC - Sanitaires - Murs A B C D - Murs
Description ITGA	Peintures multiples avec poussières / Enduit gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec poussières non séparable + Enduit gris non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EEG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359144.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



afel
Made in France

Accréditation n° 1-6090

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-846 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-846
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Cliant :

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier cliant	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P006 - Peinture - RDC - Sanitaires - Plafond - Murs
Description ITGA	Peintures multiples avec poussières

Préparation

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Peintures multiples avec poussières	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : AKN

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

E.26359145.0.PDF



7 Rue Charles Jourde
29200 BREST
Tél : 0230821209
Fax :
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6090
Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT382509-847 EN DATE DU 08/09/2025 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Cliant :

APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE -
QUIMPER (BATIMENT BRETAGNE SUD)
M. Moustapha OULD
12 allée Claude Dervenn
29000 QUIMPER

Prélèvement :

Commande ITGA : IT3825-2995
Echantillon ITGA : IT382509-847
Reçu au laboratoire le : 04/09/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	C25171589-120140-141323-91007-110953559
Dossier client	ETS PUBLIC SANTE MENTALE FINISTERE SUD + - Sanitaires extérieur - 18 rue RUE HENT GLAZ - 29000 - QUIMPER
Echantillon	P007 - Enduit mur extérieur - RDC - Sanitaires - Extérieur - Murs
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Enduit gris

Préparation Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
 - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
 - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
- La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
Enduit compact beige hétérogène non séparable + Enduit gris non séparable	META (A) le 08/09/2025 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1)	---	Analyste : EEG (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(2) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Validé par : Eline GARNIER Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 26

Page 1 / 1

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
RDC	Sanitaires	Plancher - Béton	Colle + ragréage carrelage	Environ 12 m²	
		Murs	Colle plinthes carrelage	Environ 24 ml	
		Murs	Colle faïence 2/2	Environ 14 m²	
		Murs	Colle faïence 15/15 blanc	Environ 35 m²	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

- Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux
- Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.
- La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



Certificat de compétences Diagnosticteur Immobilier

N° CPDI6613 Version 006

Je soussigné, Pierre-François TRILLAT, Responsable activités certifications d'I.Cert, atteste que :

Monsieur OULD Moustapha

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 16/10/2022 - Date d'expiration : 15/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 16/10/2022 - Date d'expiration : 15/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 17/11/2022 - Date d'expiration : 16/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2025.

Pierre-François TRILLAT
Responsable activités certifications d'I.Cert



(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnosticteurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticteur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTÉE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev21

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE



Votre interlocuteur
CBT VERLINGUE
(AGENCE D'ILLZACH)
29335 QUIMPER CEDEX

Portefeuille : 0201050284

☎ 03 89 61 64 64
📠 08 20 20 26 32

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

Votre contrat

RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE

Vos références

Contrat
10800807204

ATTESTATION

AXA France IARD, atteste que :

SAS APAVE
IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

a souscrit tant pour son compte que pour celui de sa filiale française :

APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France (AICF)
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN
92400 COURBEVOIE

le contrat n° 10800807204 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées :

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ Inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ Bâtiment et génie civil
- ☐ Essais, mesures et métrologie
- ☐ Laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ Conseils
- ☐ Formation
- ☐ Certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.23 du

Code de la construction et de l'habitation

- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.



Contrat N° 10800807204

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :


Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	
Sans pouvoir excéder pour :	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/CANADA	5 000 000 € par année d'assurance
sous-limités :	1 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable du **01/01/2025 au 31/12/2025** sous réserve du règlement de la prime émise ou à émettre et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre, le **03 janvier 2025**
Pour la société :
Mathieu GODART
Directeur Général Délégué



AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 R.C.S. Nanterre.
TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460.
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Entreprise régie par le code des assurances.

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « *Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.* »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

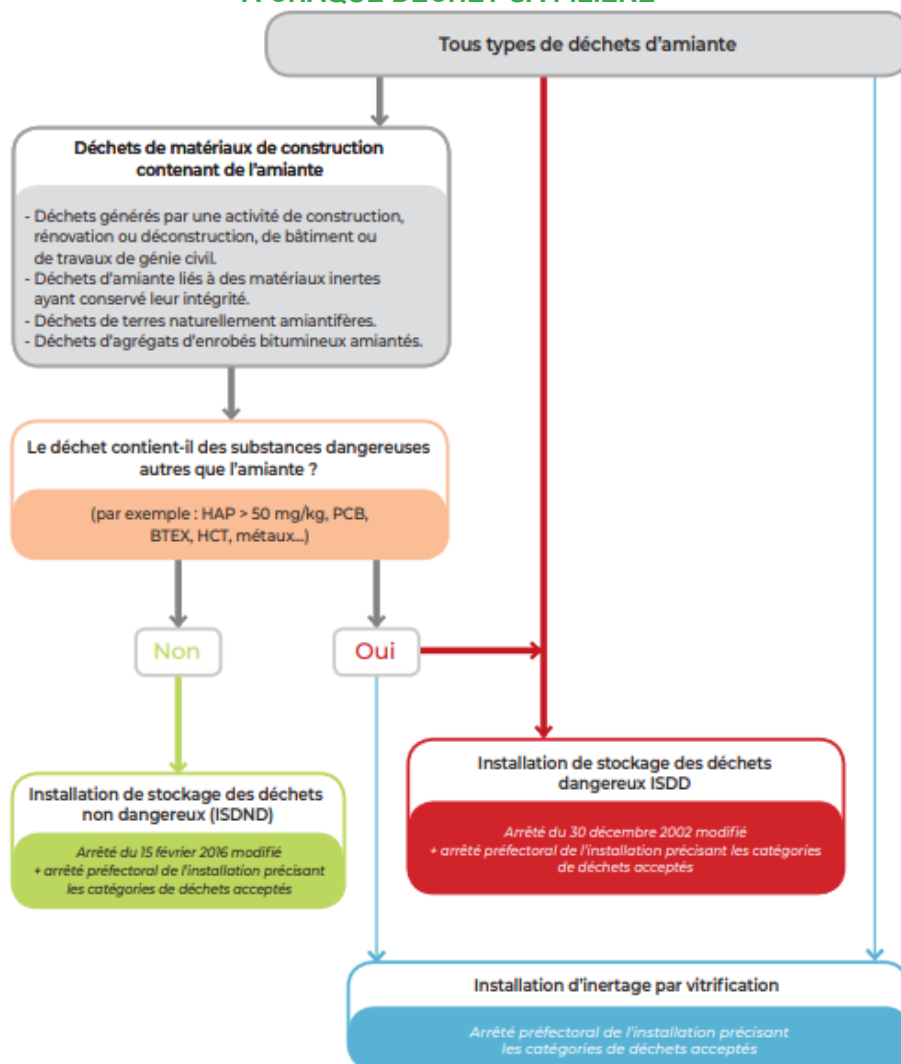


Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE



Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfetures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :
<https://www.sinoe.org/>
<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>
