

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON

Référence client : CNMSS - Bât Bleu

Désignation : CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU
SECURITE SOCIALE - Bât Bleu

Date de construction : En 1997

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : SOUCELIER RAPHAEL

Accompagnateur : Chargé de projets (04 23 18 00 01)

Date de repérage : 03/06/2025

Numéro attestation : 2262

Délivré le : 04/12/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC



A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

Donneur d'ordre :
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
247, AV JACQUES CARTIER
83000 TOULON

A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Date du rapport : 13/06/2025

Assurance : HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 13/06/2025

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

Non

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU
DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs

- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propriétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant

- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable

- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage

- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

F - Conclusions

- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

- Annexe : Plans
- Annexe : Reportage photographique
- Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
- Annexe : Prélèvements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+1 - Vol 3 (Cage escalier 3)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+3 - Vol 7 (Cage escalier 7)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+4 - Vol 9 (Cage escalier 9)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+5 - Vol 11 (Cage escalier 11)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-2 - Vol 15 (Dégagement 1)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-1 - Vol 17 (Dégagement 3)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-2 - Vol 19 (Plonge)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu RDC - Vol 2 (Cage escalier 2)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+1 - Vol 4 (Cage escalier 4)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+2 - Vol 6 (Cage escalier 6)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+3 - Vol 8 (Cage escalier 8)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N+4 - Vol 10 (Cage escalier 10)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chauferie)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Investigation complémentaire restant à réaliser
Sans objet	Sans objet	Sans objet

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Travaux de mise en conformité de certains ouvrages de sécurité incendie et réalisation de diverses prestations tous corps d'état

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Concerne le bien cité en tête de rapport.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la construction inspecté	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 2 (Cage escalier 2)	
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	Vol 1 (Cage escalier 1) - Vol 2 (Cage escalier 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1	Vol 3 (Cage escalier 3) - Vol 4 (Cage escalier 4)	
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1	Vol 3 (Cage escalier 3) - Vol 4 (Cage escalier 4)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1	Vol 3 (Cage escalier 3)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2	Vol 5 (Cage escalier 5) - Vol 6 (Cage escalier 6)	
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2	Vol 5 (Cage escalier 5)	
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2	Vol 5 (Cage escalier 5) - Vol 6 (Cage escalier 6)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3	Vol 7 (Cage escalier 7) - Vol 8 (Cage escalier 8)	

Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3	Vol 7 (Cage escalier 7) - Vol 8 (Cage escalier 8)
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3	Vol 8 (Cage escalier 8)
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4	Vol 9 (Cage escalier 9) - Vol 10 (Cage escalier 10)
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4	Vol 9 (Cage escalier 9)
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4	Vol 10 (Cage escalier 10)
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	Vol 11 (Cage escalier 11)
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	Vol 11 (Cage escalier 11)
Parois verticales intérieures et enduits	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	Vol 12 (Chaufferie) - Vol 13 (CTA) - Vol 14 (Menuiserie)
Plafond et faux-plafonds	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	Vol 12 (Chaufferie) - Vol 13 (CTA) - Vol 14 (Menuiserie)
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	Vol 12 (Chaufferie) - Vol 13 (CTA) - Vol 14 (Menuiserie) - Vol 16 (Dégagement 2)
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	Vol 15 (Dégagement 1) - Vol 19 (Plonge)
Revêtement de mur	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	Vol 16 (Dégagement 2) - Vol 17 (Dégagement 3)
Revêtement de mur	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	Vol 18 (Dégagement 4)
Revêtement de sol	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	Vol 18 (Dégagement 4)

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIELUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalisation d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en œuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 10 (Cage escalier 10)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW726043 n°6 - 1	P6	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Cage escalier 9)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002EW726043 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 9 (Cage escalier 9)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EW726043 n°8 - 1	P8	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 10 (Cage escalier 10)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW726043 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Dur Fibreux - Beige Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Cage escalier 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002EW726043 n°1 - 1	P1	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Cage escalier 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW726043 n°2 - 1	P2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cage escalier 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW726043 n°2 - 1	P2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 3 (Cage escalier 3) - Vol 4 (Cage escalier 4)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S2 - S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW7 26043 n °2 - 1	P2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 3 (Cage escalier 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW7 26043 n °3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 4 (Cage escalier 4)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW7 26043 n °9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effrifiable / Dur Fibreux / Effrifiable - Beige Gris / Beige Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 5 (Cage escalier 5)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cage escalier 6)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW7 26043 n °3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cage escalier 5)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °4 - 1	P4	Peinture / Mortier - Effrifiable / Dur - Blanc Orange / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 5 (Cage escalier 5)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °5 - 1	P5	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 6 (Cage escalier 6)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P9		002EW7 26043 n °9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effrifiable / Dur Fibreux / Effrifiable - Beige Gris / Beige Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse


CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 8 (Cage escalier 8)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002EW7 26043 n°3 - 1	P3	Colle - Dur - Beige Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Cage escalier 7)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n°6 - 1	P6	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 7 (Cage escalier 7)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n°7 - 1	P7	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Cage escalier 8)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002EW7 26043 n°8 - 1	P8	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Cage escalier 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Dur Fibreux - Beige Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 8 (Cage escalier 8)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW7 26043 n°10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Dur Fibreux - Beige Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Cage escalier 11)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002EW7 26043 n°6 - 1	P6	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige Gris / Blanc Beige	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 11 (Cage escalier 11)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P10		002EW7 26043 n °10 - 1	P10	Peinture / Enduit - Effritable / Dur Fibreux - Beige Gris / Beige Marron	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 12 (Chaufferie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °11 - 1	P11	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chaufferie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °12 - 1	P12	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 12 (Chaufferie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °13 - 1	P13	Flocage - Souple Fibreux - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (CTA)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °14 - 1	P14	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige Gris / Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (CTA)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °15 - 1	P15	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 13 (CTA)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °16 - 1	P16	Flocage / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chape maigre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °17 - 1	P17	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Bleu / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 14 (Menuiserie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °18 - 1	P18	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P18		002EW7 26043 n °18 - 1	P18	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages	P19	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °19 - 1	P19	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °20 - 1	P20	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P20		002EW7 26043 n °20 - 1	P20	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 14 (Menuiserie)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P21	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °21 - 1	P21	Matériau / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °23 - 1	P23	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °24 - 1	P24	Peinture / Colle / Enduit - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 16 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P24	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P24		002EW7 26043 n °24 - 1	P24	Peinture / Colle / Enduit - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 17 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °25 - 1	P25	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 17 (Dégagement 3)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P25		002EW7 26043 n °25 - 1	P25	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2

Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 15 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °22 - 1	P22	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Beige	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 19 (Plonge)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °28 - 1	P28	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC





Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 1 (Cage escalier 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °1 - 1	P1	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 1 (Cage escalier 1)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °2 - 1	P2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cage escalier 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002EW7 26043 n °2 - 1	P2	Laine - Souple Fibreux - Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 2 (Cage escalier 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °9 - 1	P9	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Dur Fibreux / Effritable - Beige Gris / Beige Marron / Gris	Négatif	Négatif sur analyse


CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC


Localisation	Categorie	Composant	Partie de composant	Réf action	Description	Précision	Ref photo	Ref pré.	Descriptif	Résultat	Conclusion
Vol 18 (Dégagement 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P26	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °26 - 1	P26	Colle / Ciment - Dur Fibreux / Dur - Gris / Gris	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Dégagement 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °27 - 1	P27 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Dégagement 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW7 26043 n °27 - 1	P27 Phase 1	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Dégagement 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EW7 26043 n °27 - 1	P27 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Vol 18 (Dégagement 4)	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P27		002EW7 26043 n °27 - 1	P27 Phase 2	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

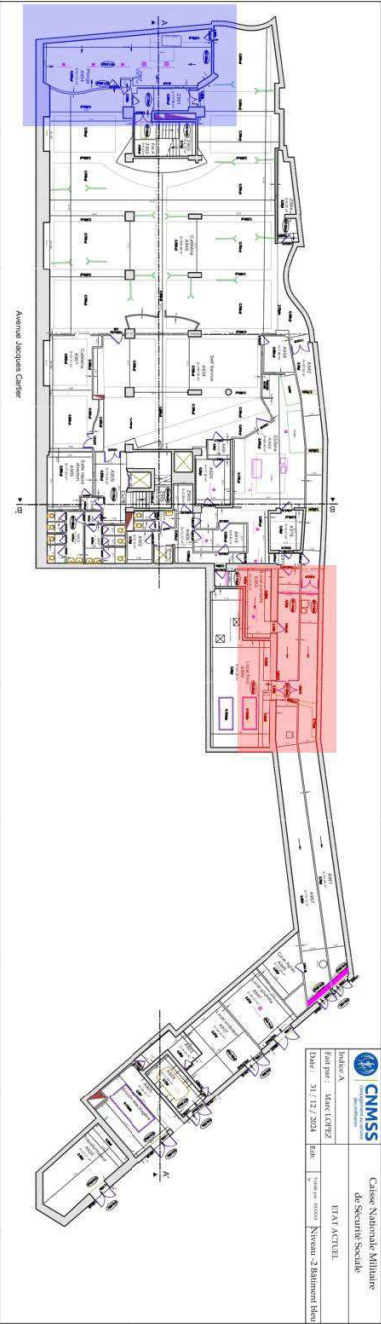
Ref.	Plans	Titre du plan
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Périmètre d'intervention 3 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Périmètre d'intervention 2 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+1 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Plan de repérage - Actions menées
	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+5 - Périmètre d'intervention 1 - Actions menées

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N-2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
<div></div>				Légende
				<div> Périmètre d'intervention 1</div>
				<div> Périmètre d'intervention 2</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL


Localisation d'un prélèvement négatif

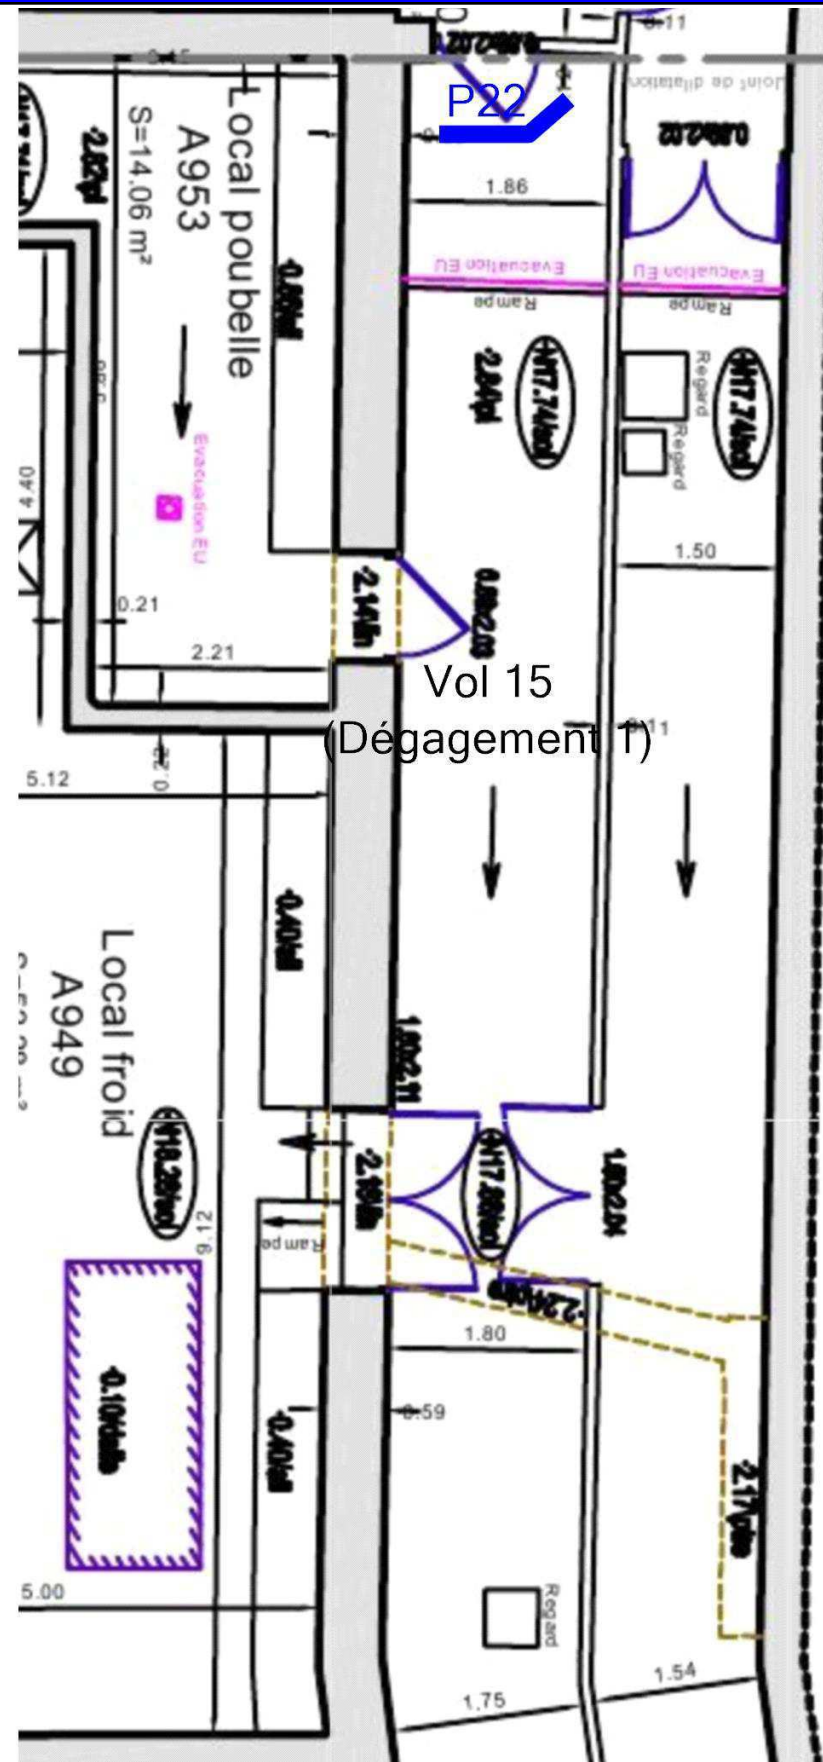


Plan de situation



Légende



Localisation dun prélèvement négatif

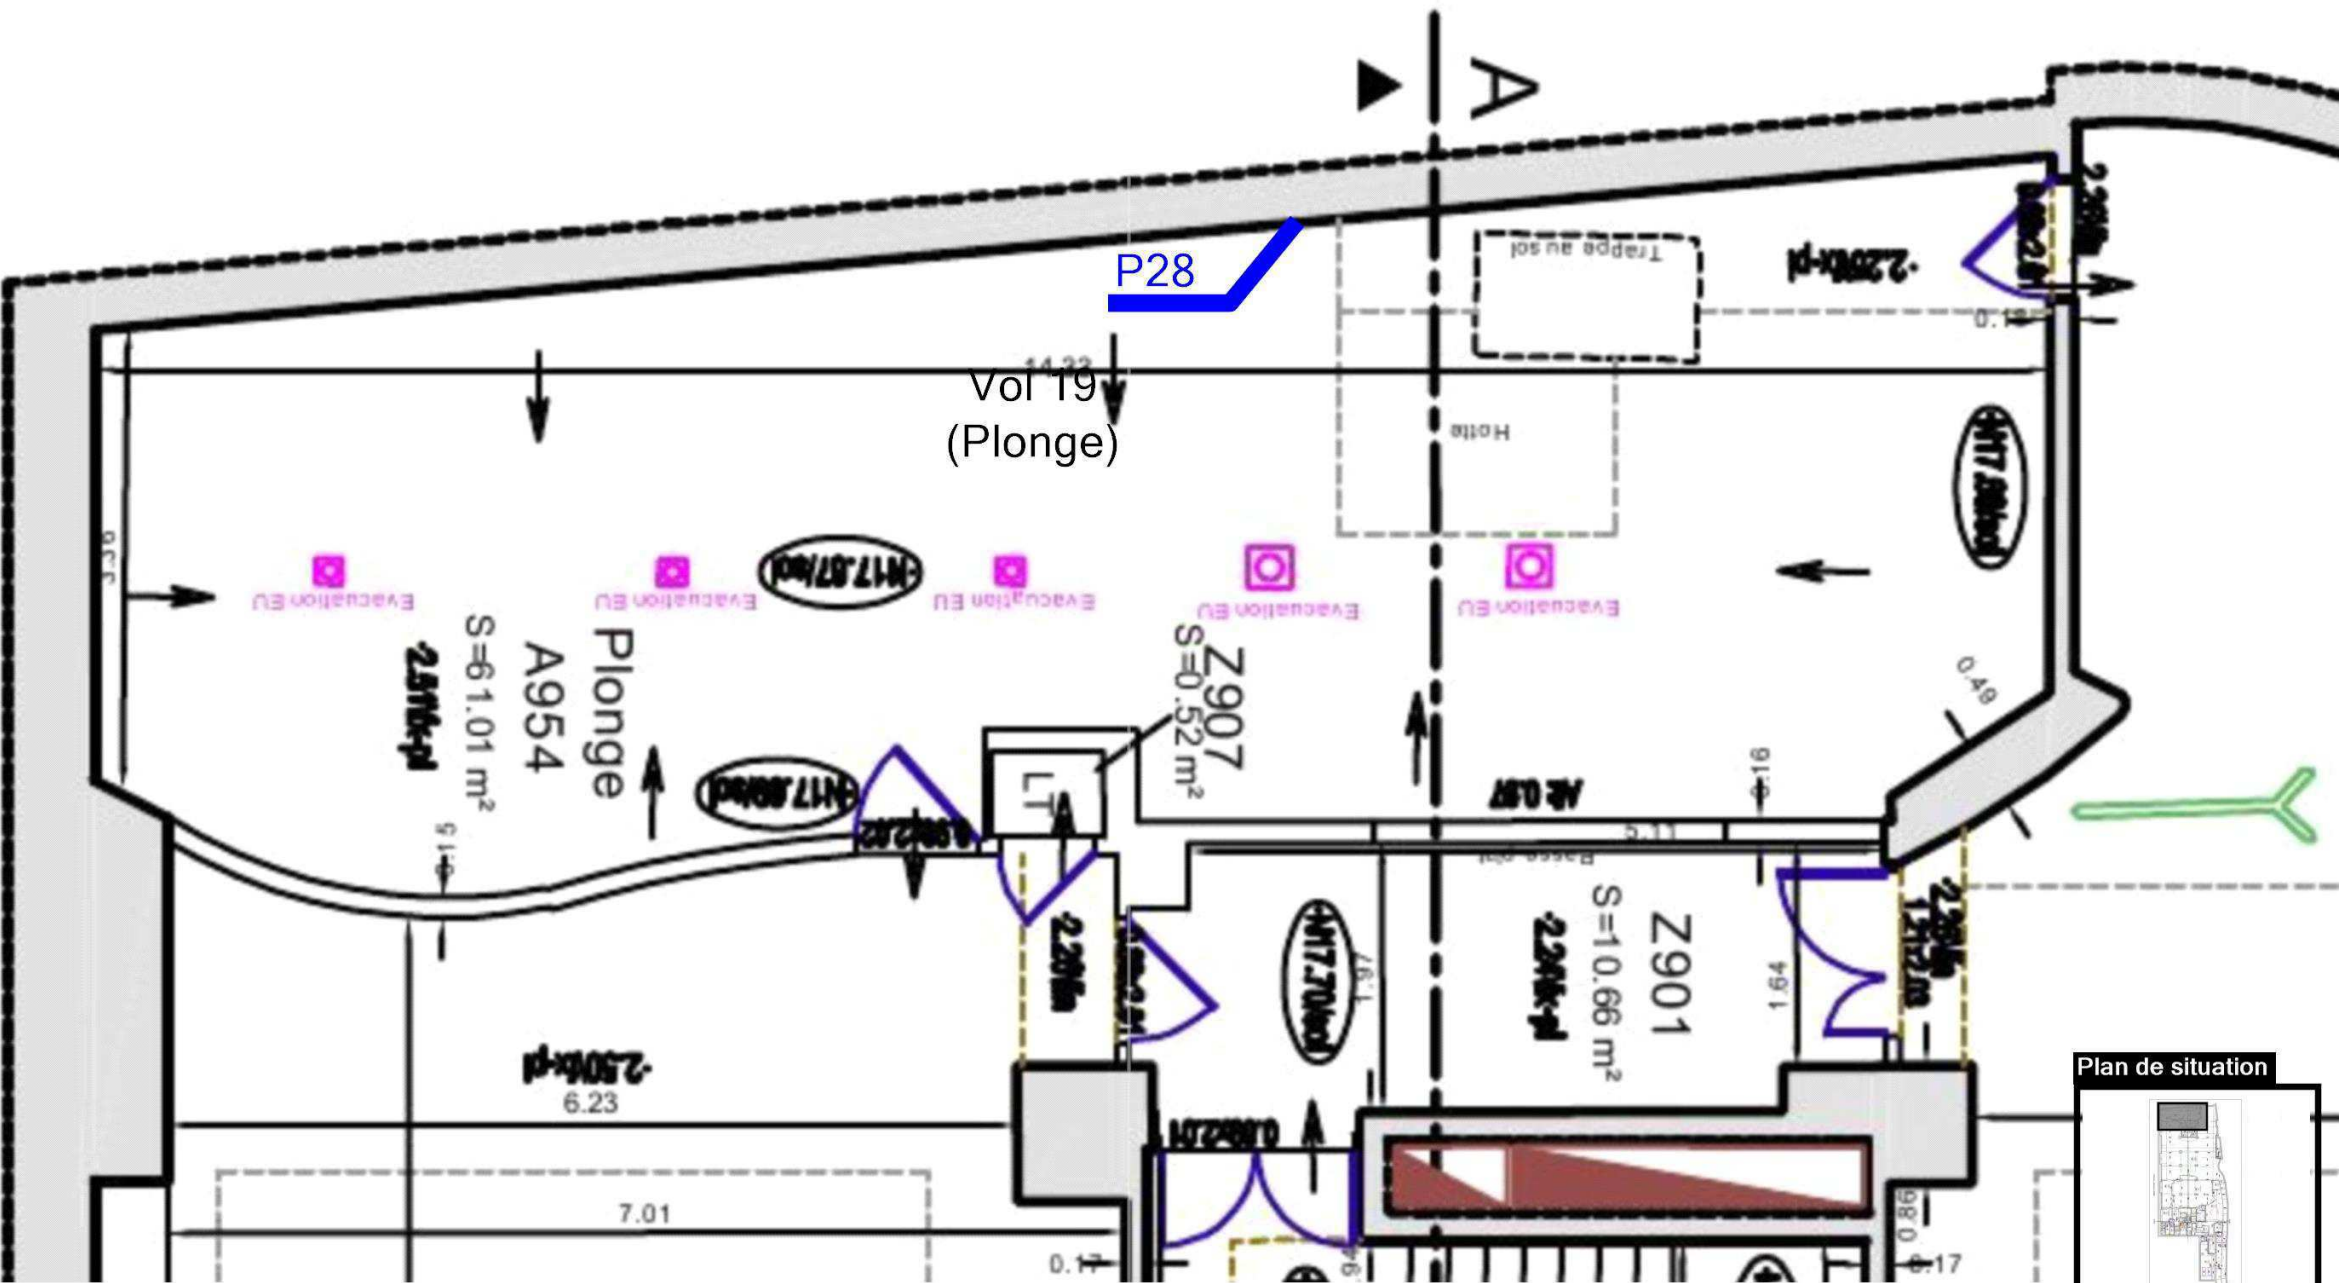

Adresse du bien

247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

Désignation







CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu


Date intervention

03/06/2025

Technicien intervenant

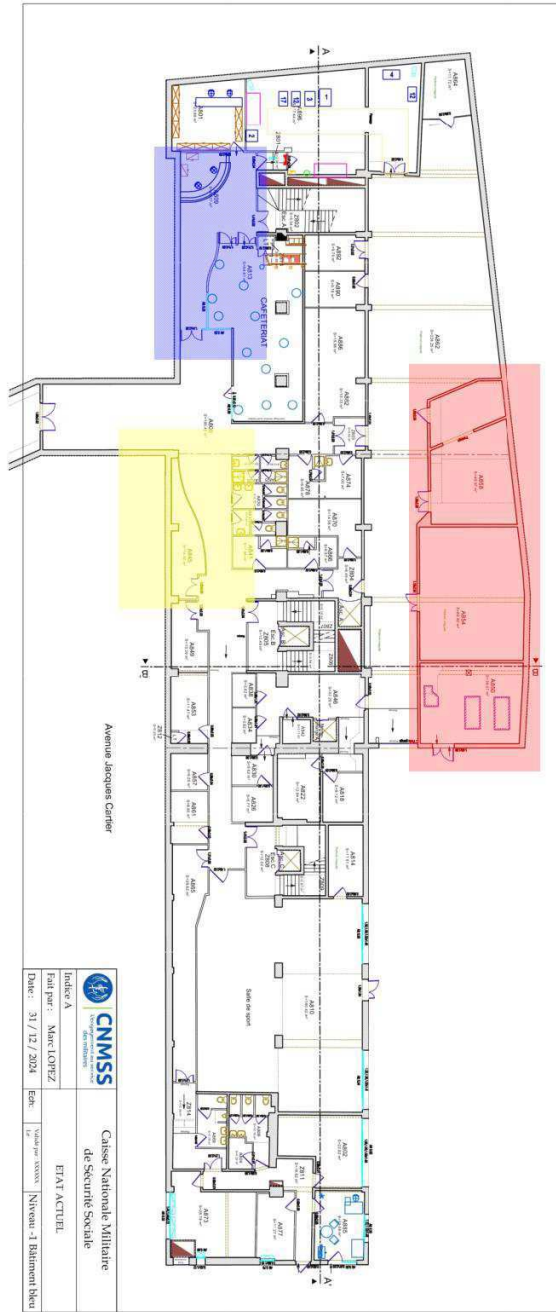SOUCELIER RAPHAEL

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N-1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
<div><div><div><div>CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE</div></div><div><div>Indice A</div><div>Fait par : M. LORZ</div><div>Date : 31 / 12 / 2024</div></div><div><div>ETAT ACTUEL</div><div>Niveau : 1 Bâtiment Bleu</div></div></div></div>	Légende			
		Périmètre d'intervention 1		
		Périmètre d'intervention 2		
		Périmètre d'intervention 3		
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

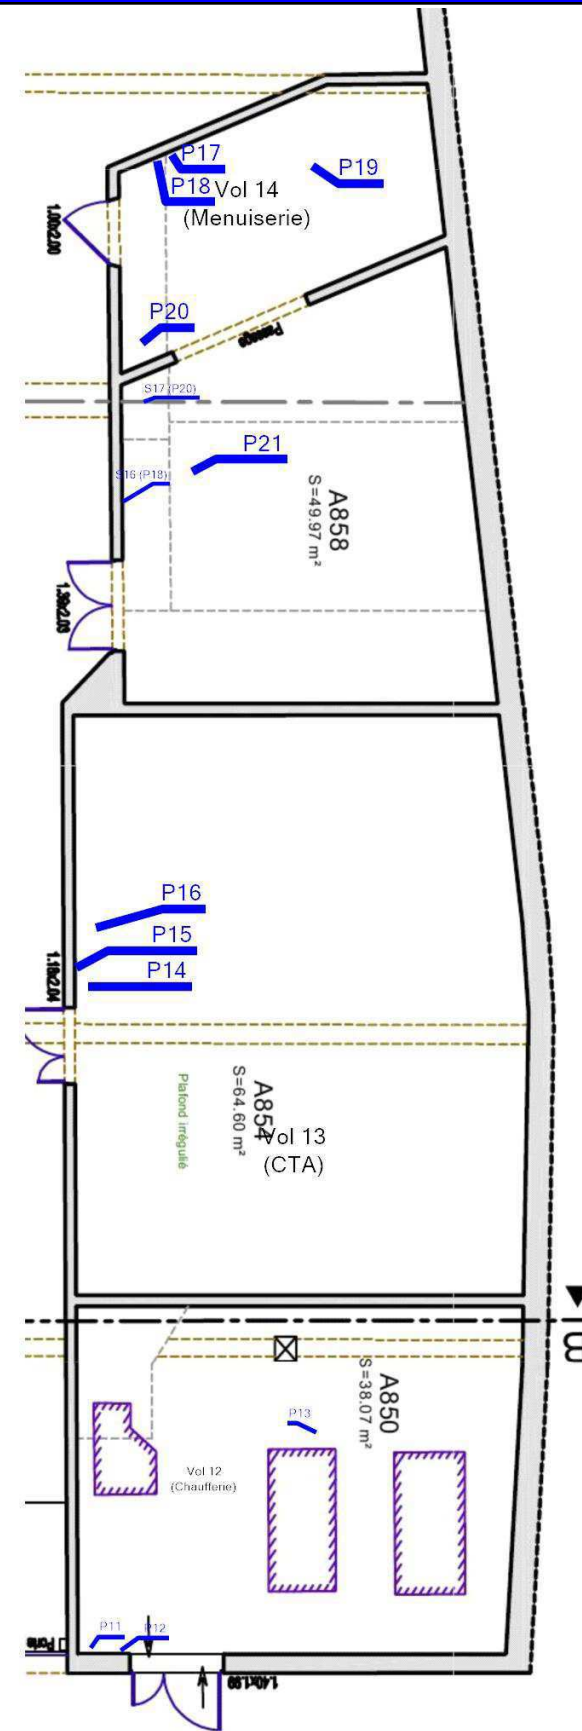

Localisation dun sondage négatif



Localisation d'un prélèvement négatif

P23

P24

~~A809~~
~~S=45.77 m²~~

A813
S=64.61 m²

CATERIA


247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu


03/06/2025



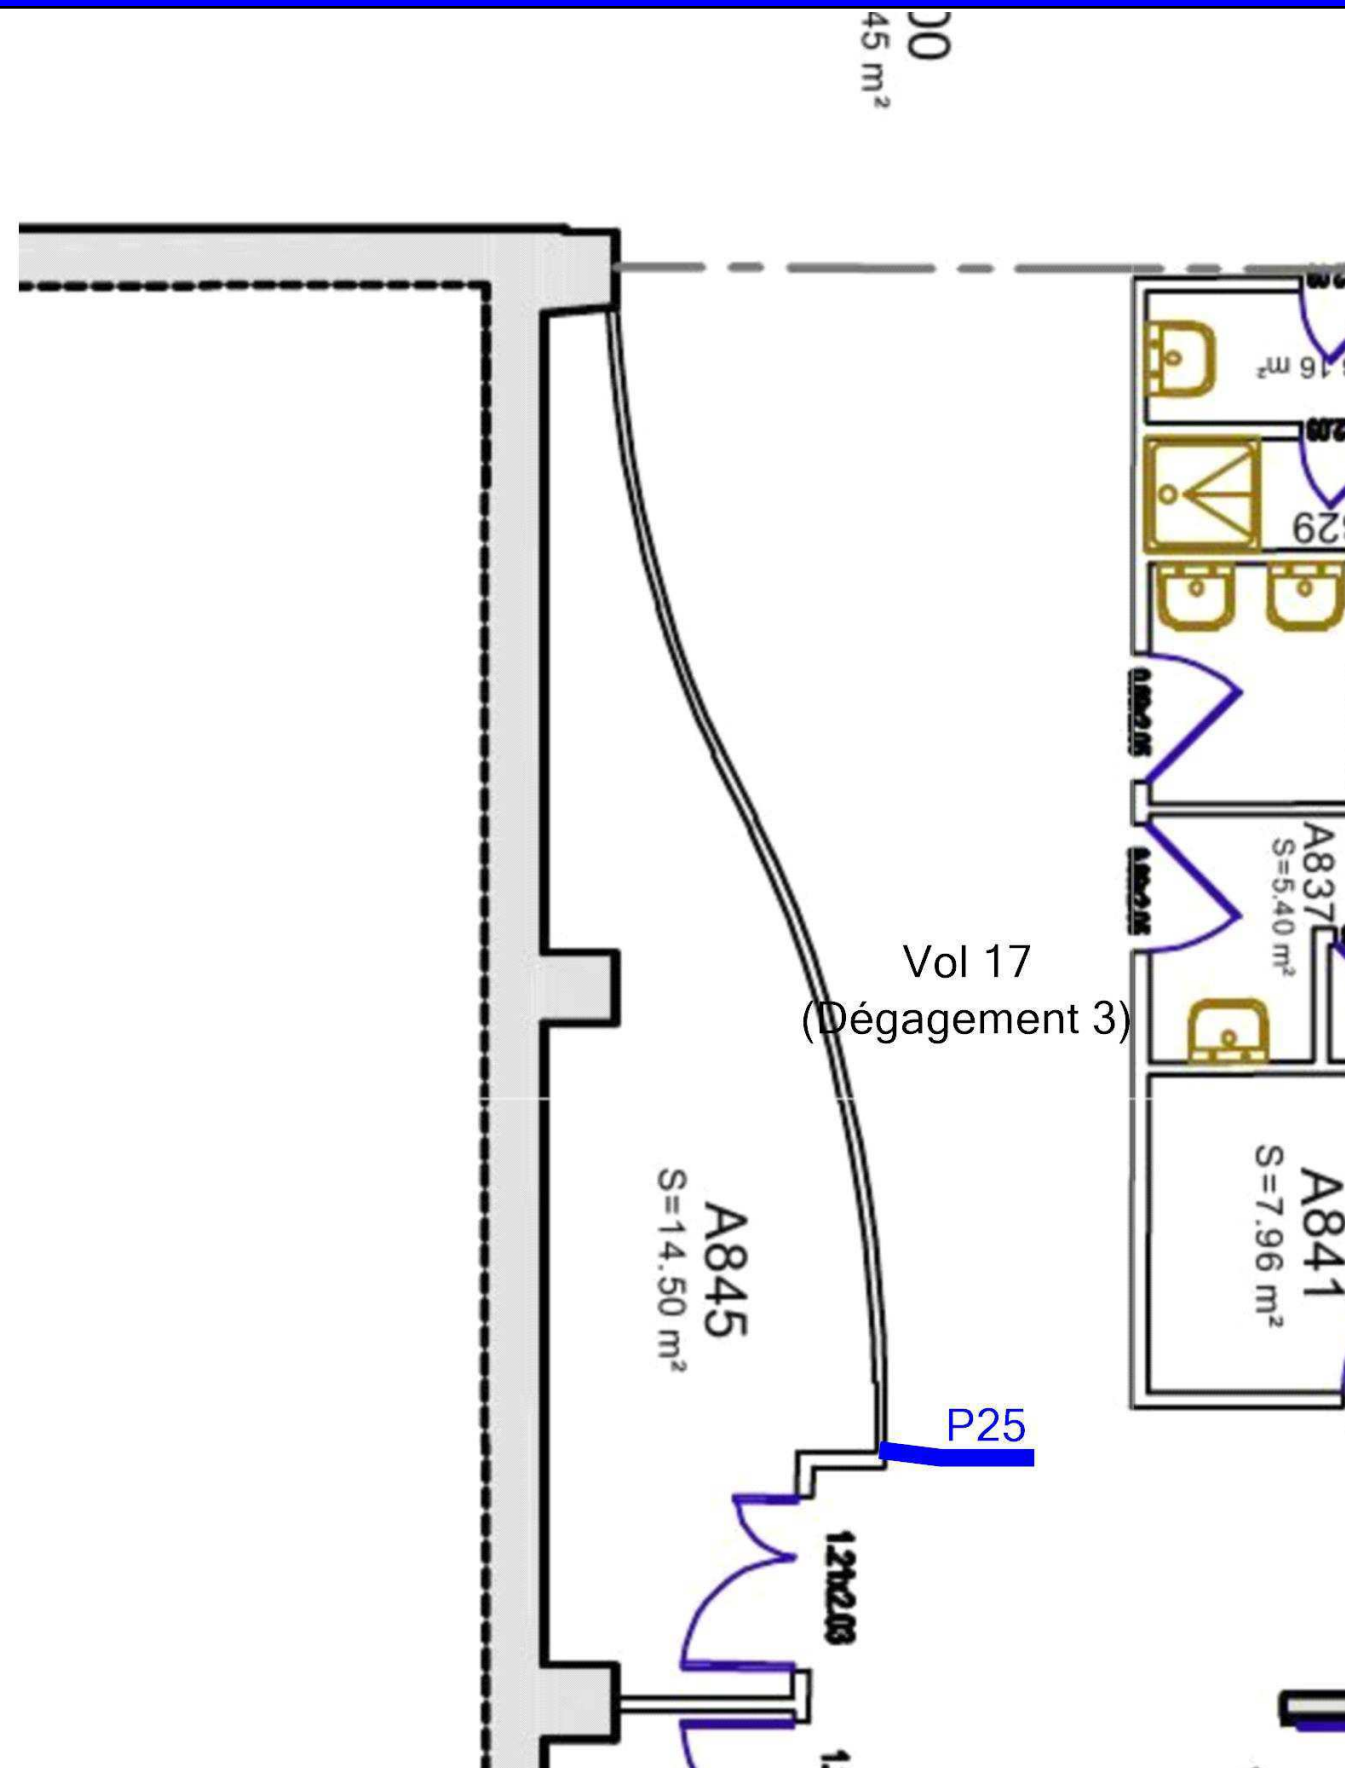

	SOUCELIER RAPHAEL
--	-------------------





Localisation dun prélèvement
négatif

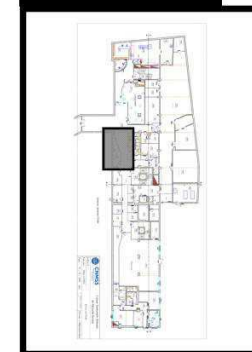



Plan de situation




CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
<div></div>				Légende
				<div> Périmètre d'intervention 1</div>
				<div> Périmètre d'intervention 2</div>
<div></div>	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

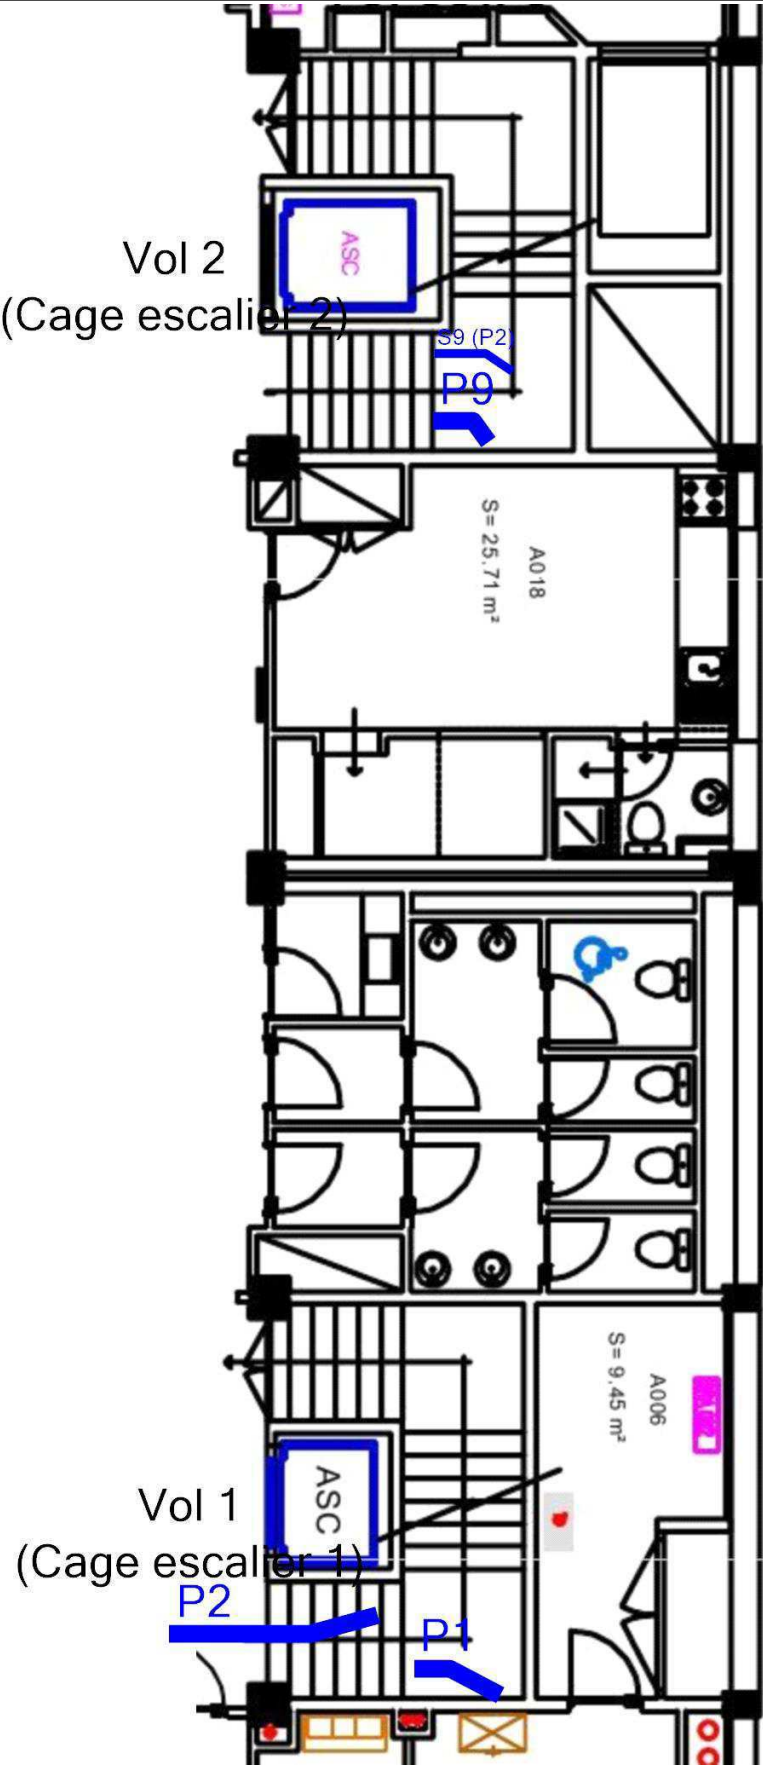
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU RDC - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
<div></div>				Légende
				 P Localisation dun prélèvement négatif
				 S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

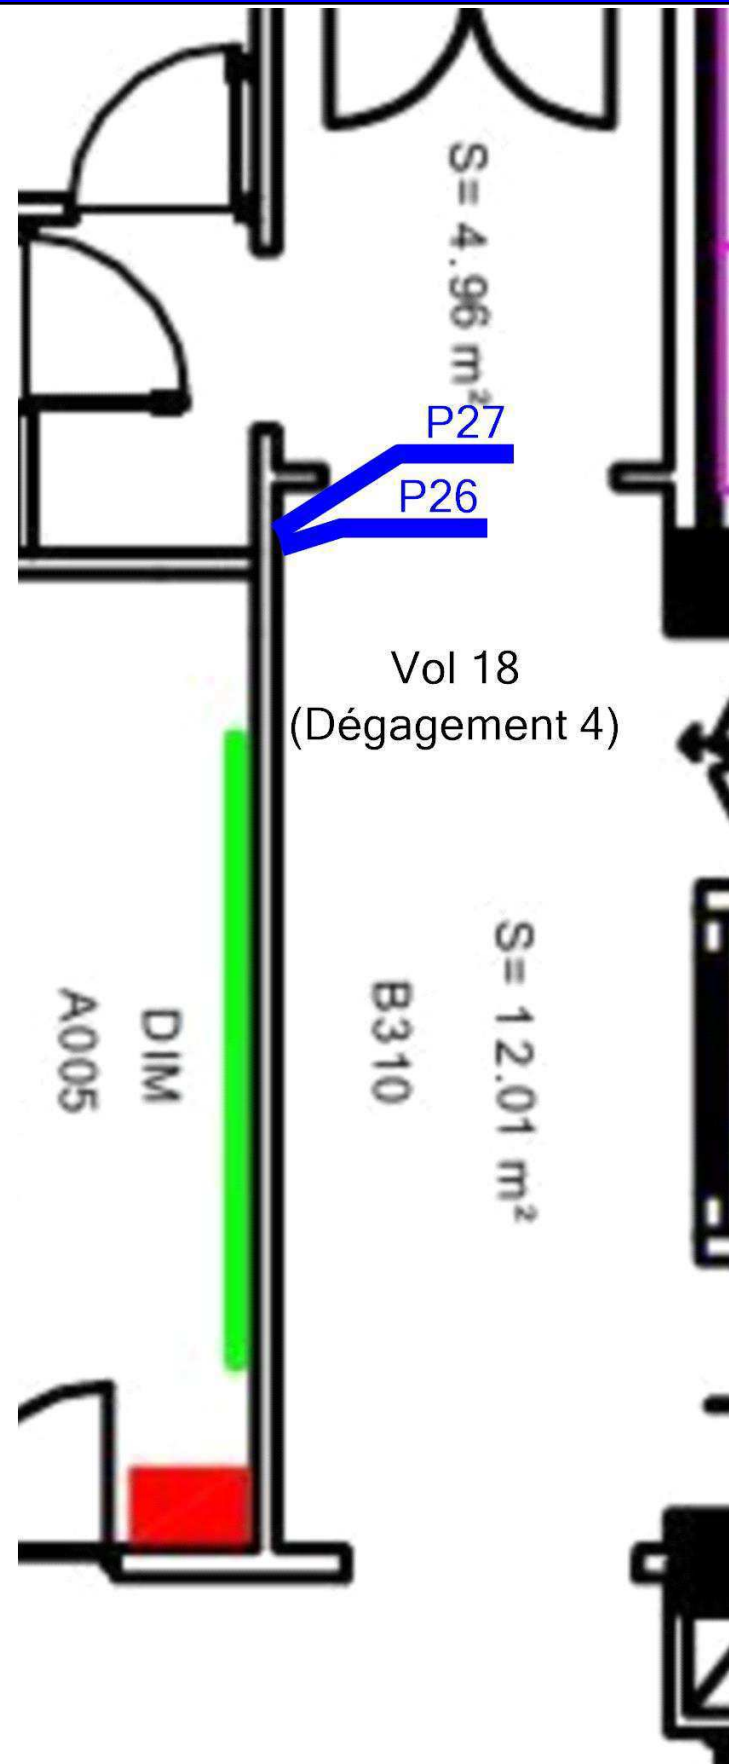[illegible]

Légende	
	Périmètre d'intervention 1

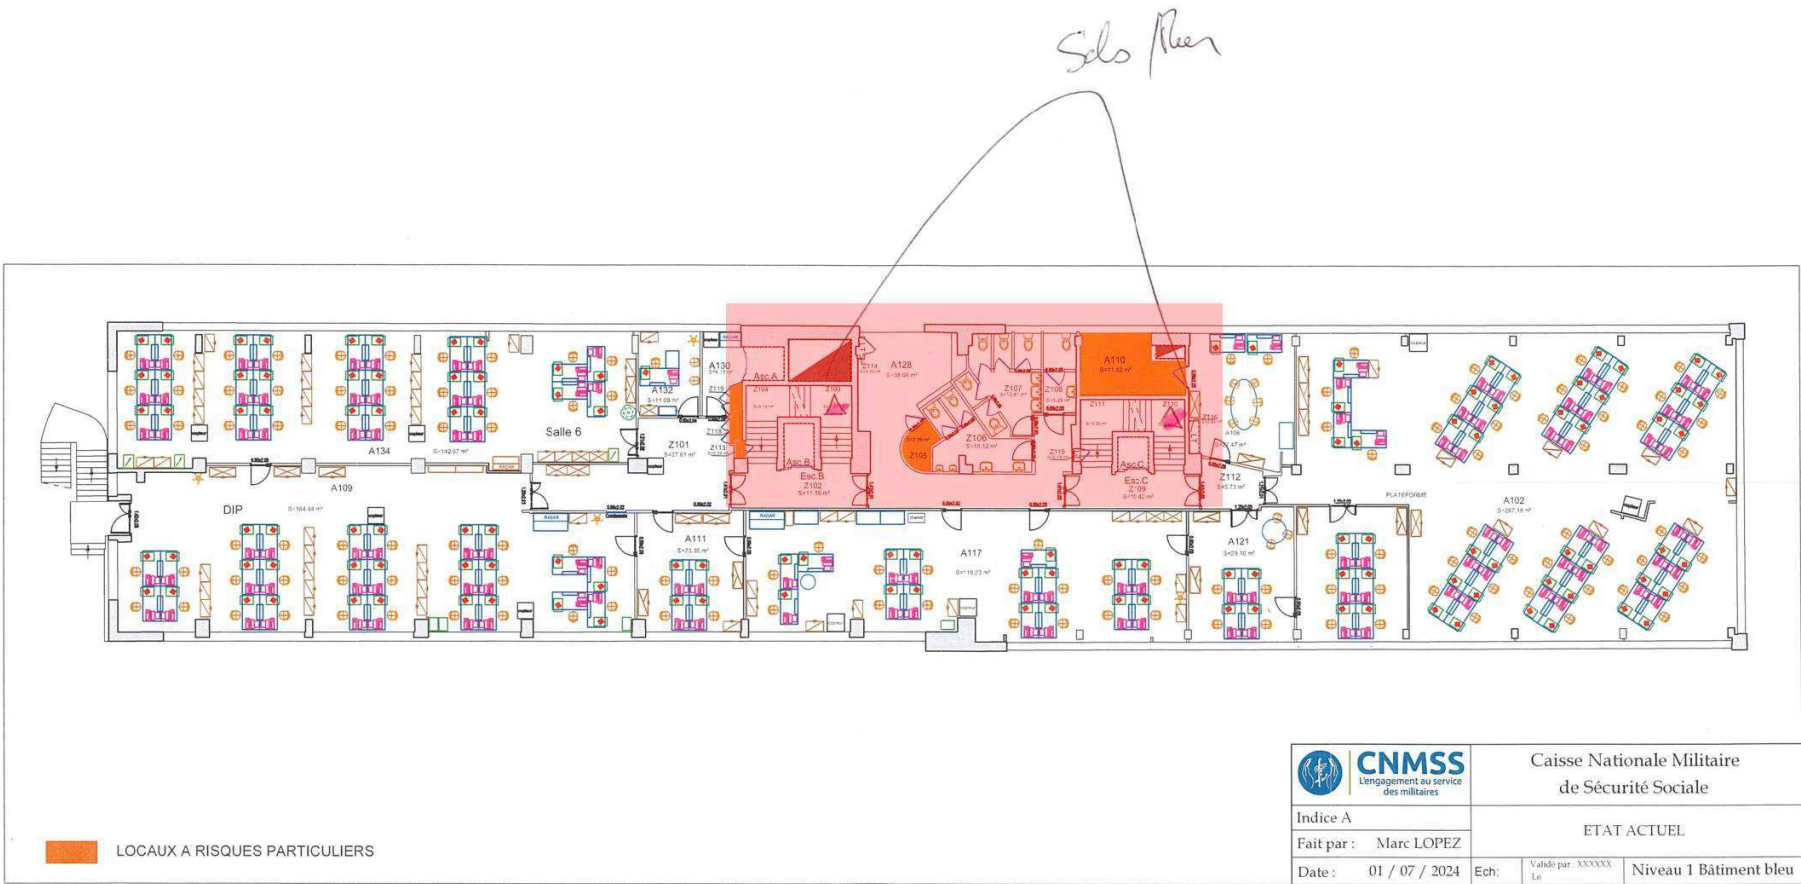



Localisation dun sondage négatif

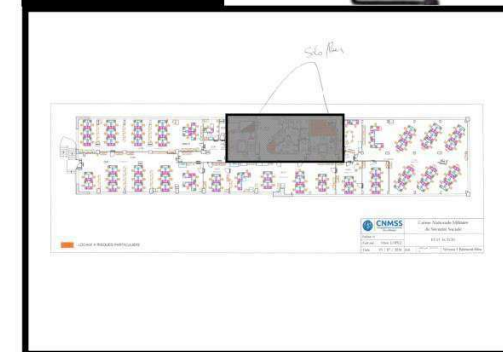



Légende	
	Périmètre d'intervention 1

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

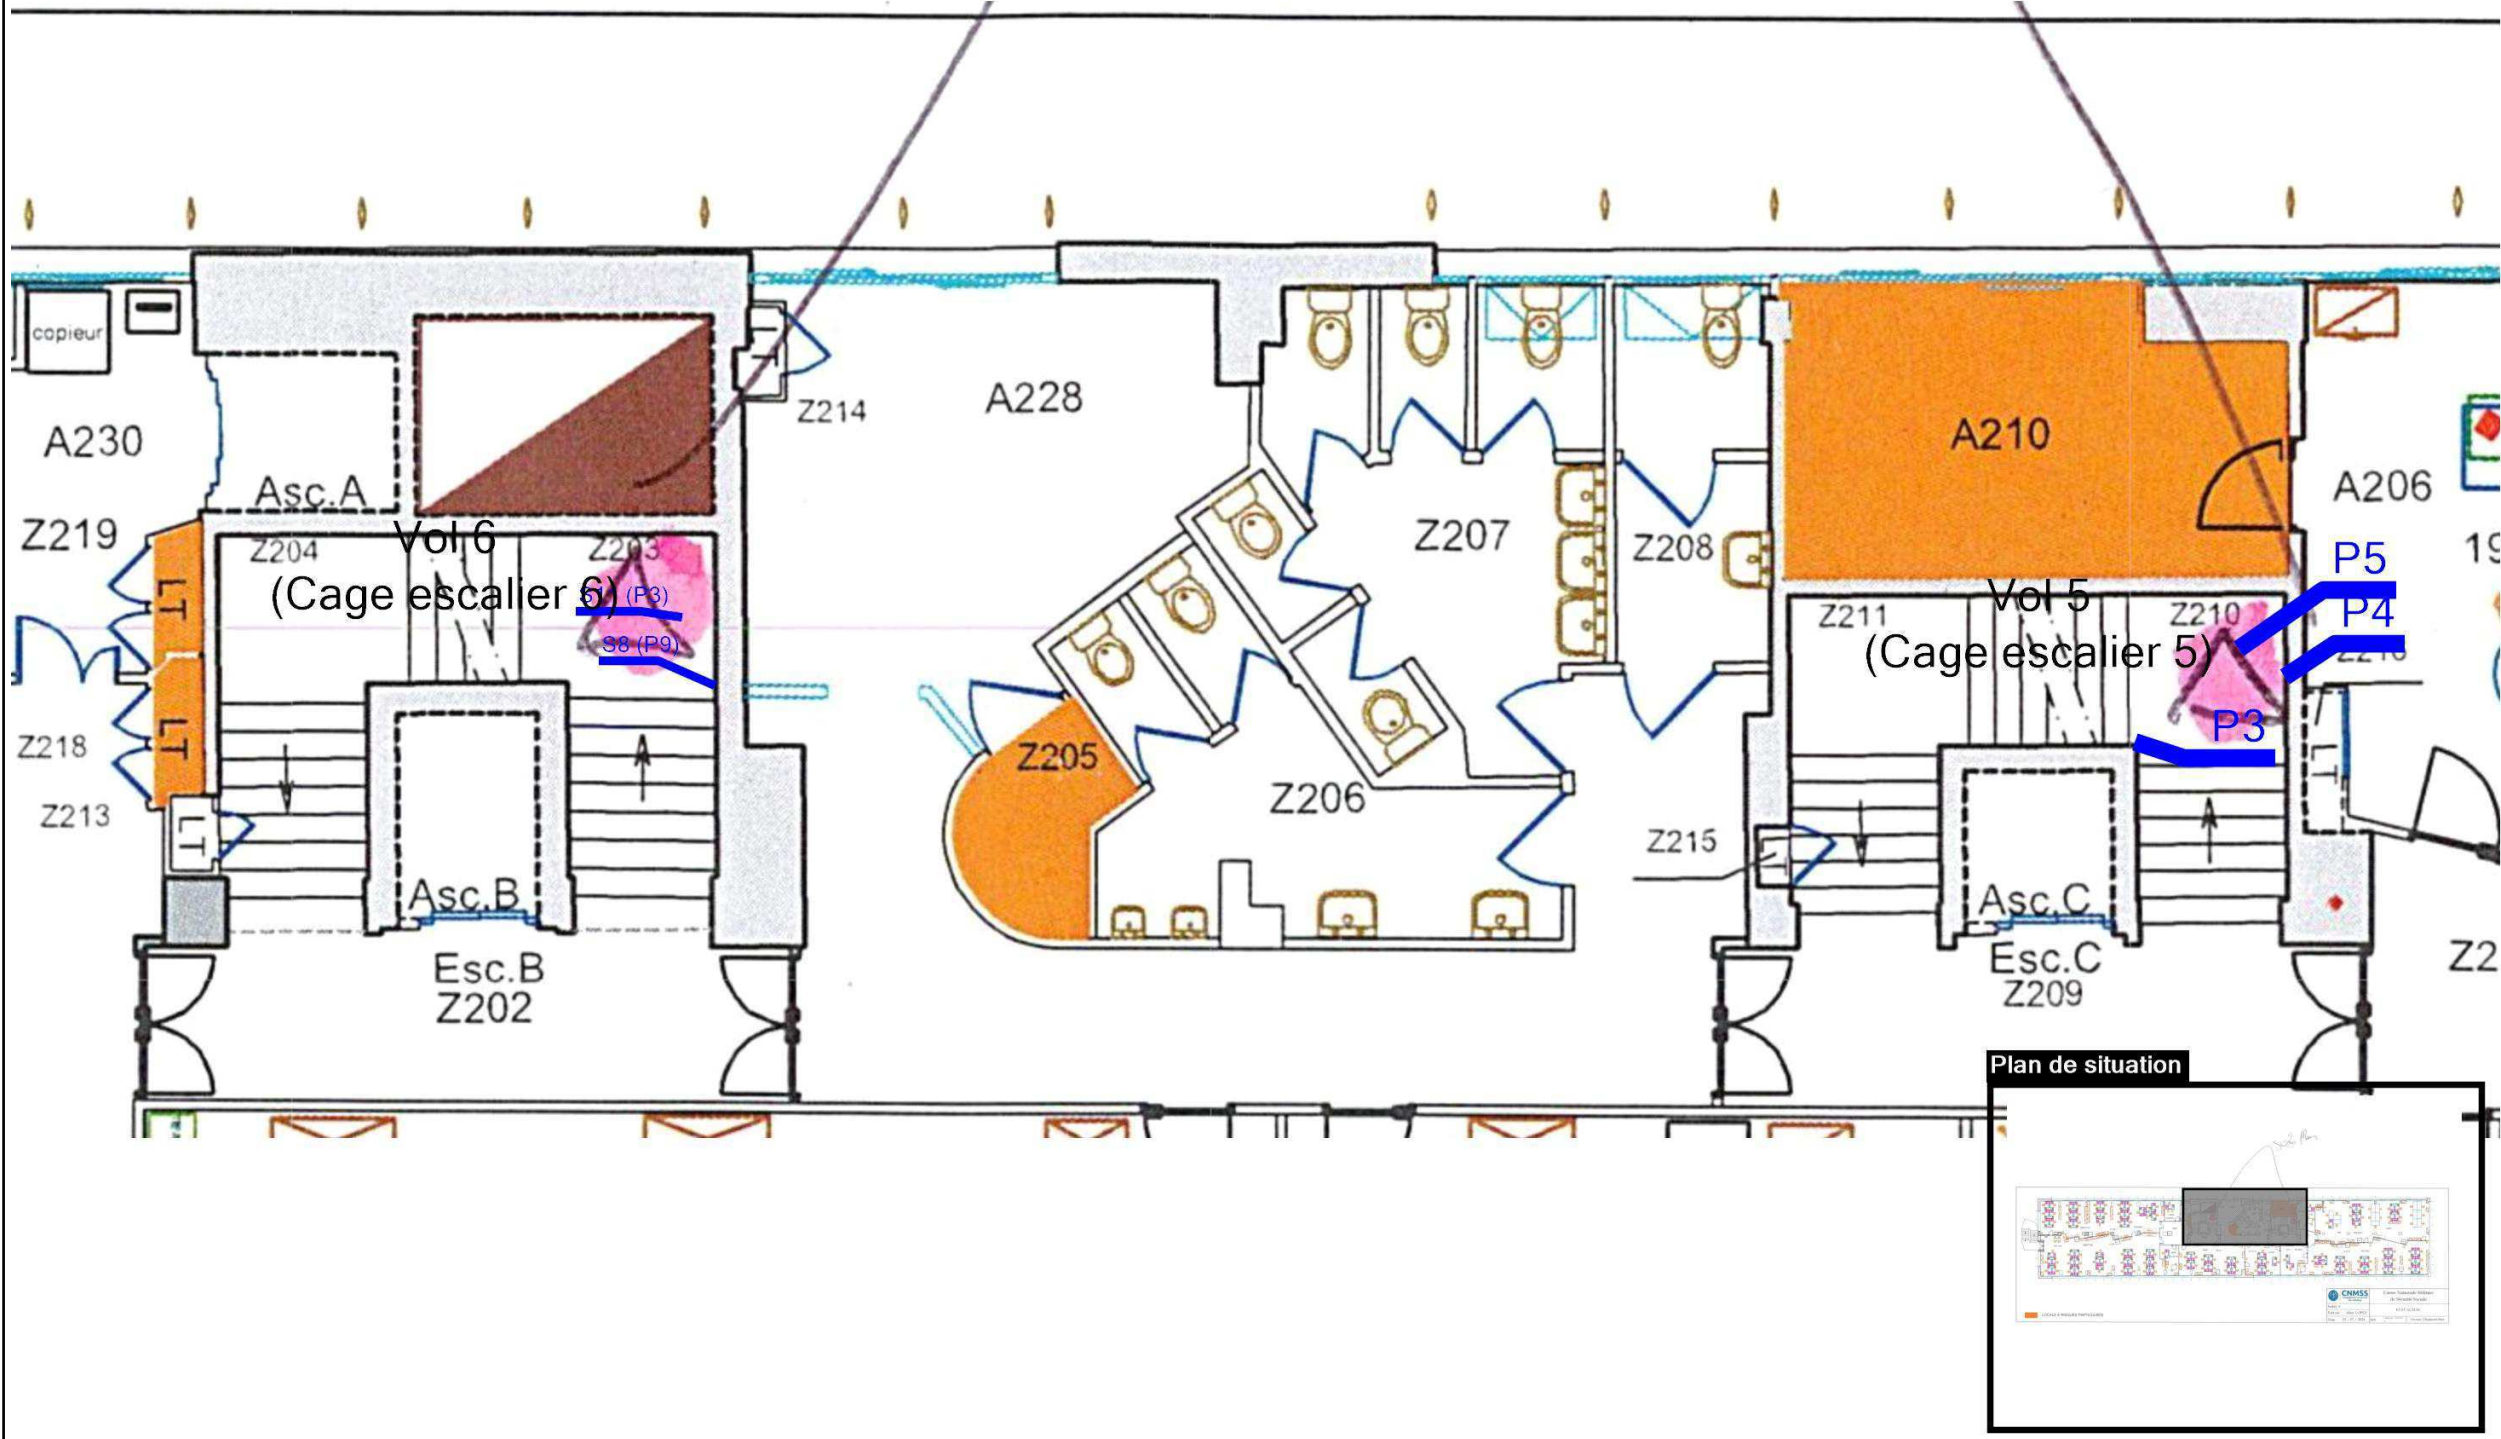CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N+2 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
				Légende <div> <div>P</div> <div>Localisation dun prélèvement négatif</div> </div> <div> <div>S</div> <div>Localisation dun sondage négatif</div> </div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

--	--

--	--

	Ten
--	-----

--	--



CNMSS
L'engagement au service
des militaires

Caisse Nationale Militaire
de Sécurité Sociale

Indice A

ETAT ACTUEL

Fait par : Marc LOPEZ

Date: 01 / 07 / 2024

Ech

Validé par : XXXXXX

Plan Niveau 3 Bt bleu



Adresse du bien

247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

Désignation



CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu

Date intervention

03/06/2025

Techniciens intervenant

	SOUCELIER RAPHAEL
--	-------------------

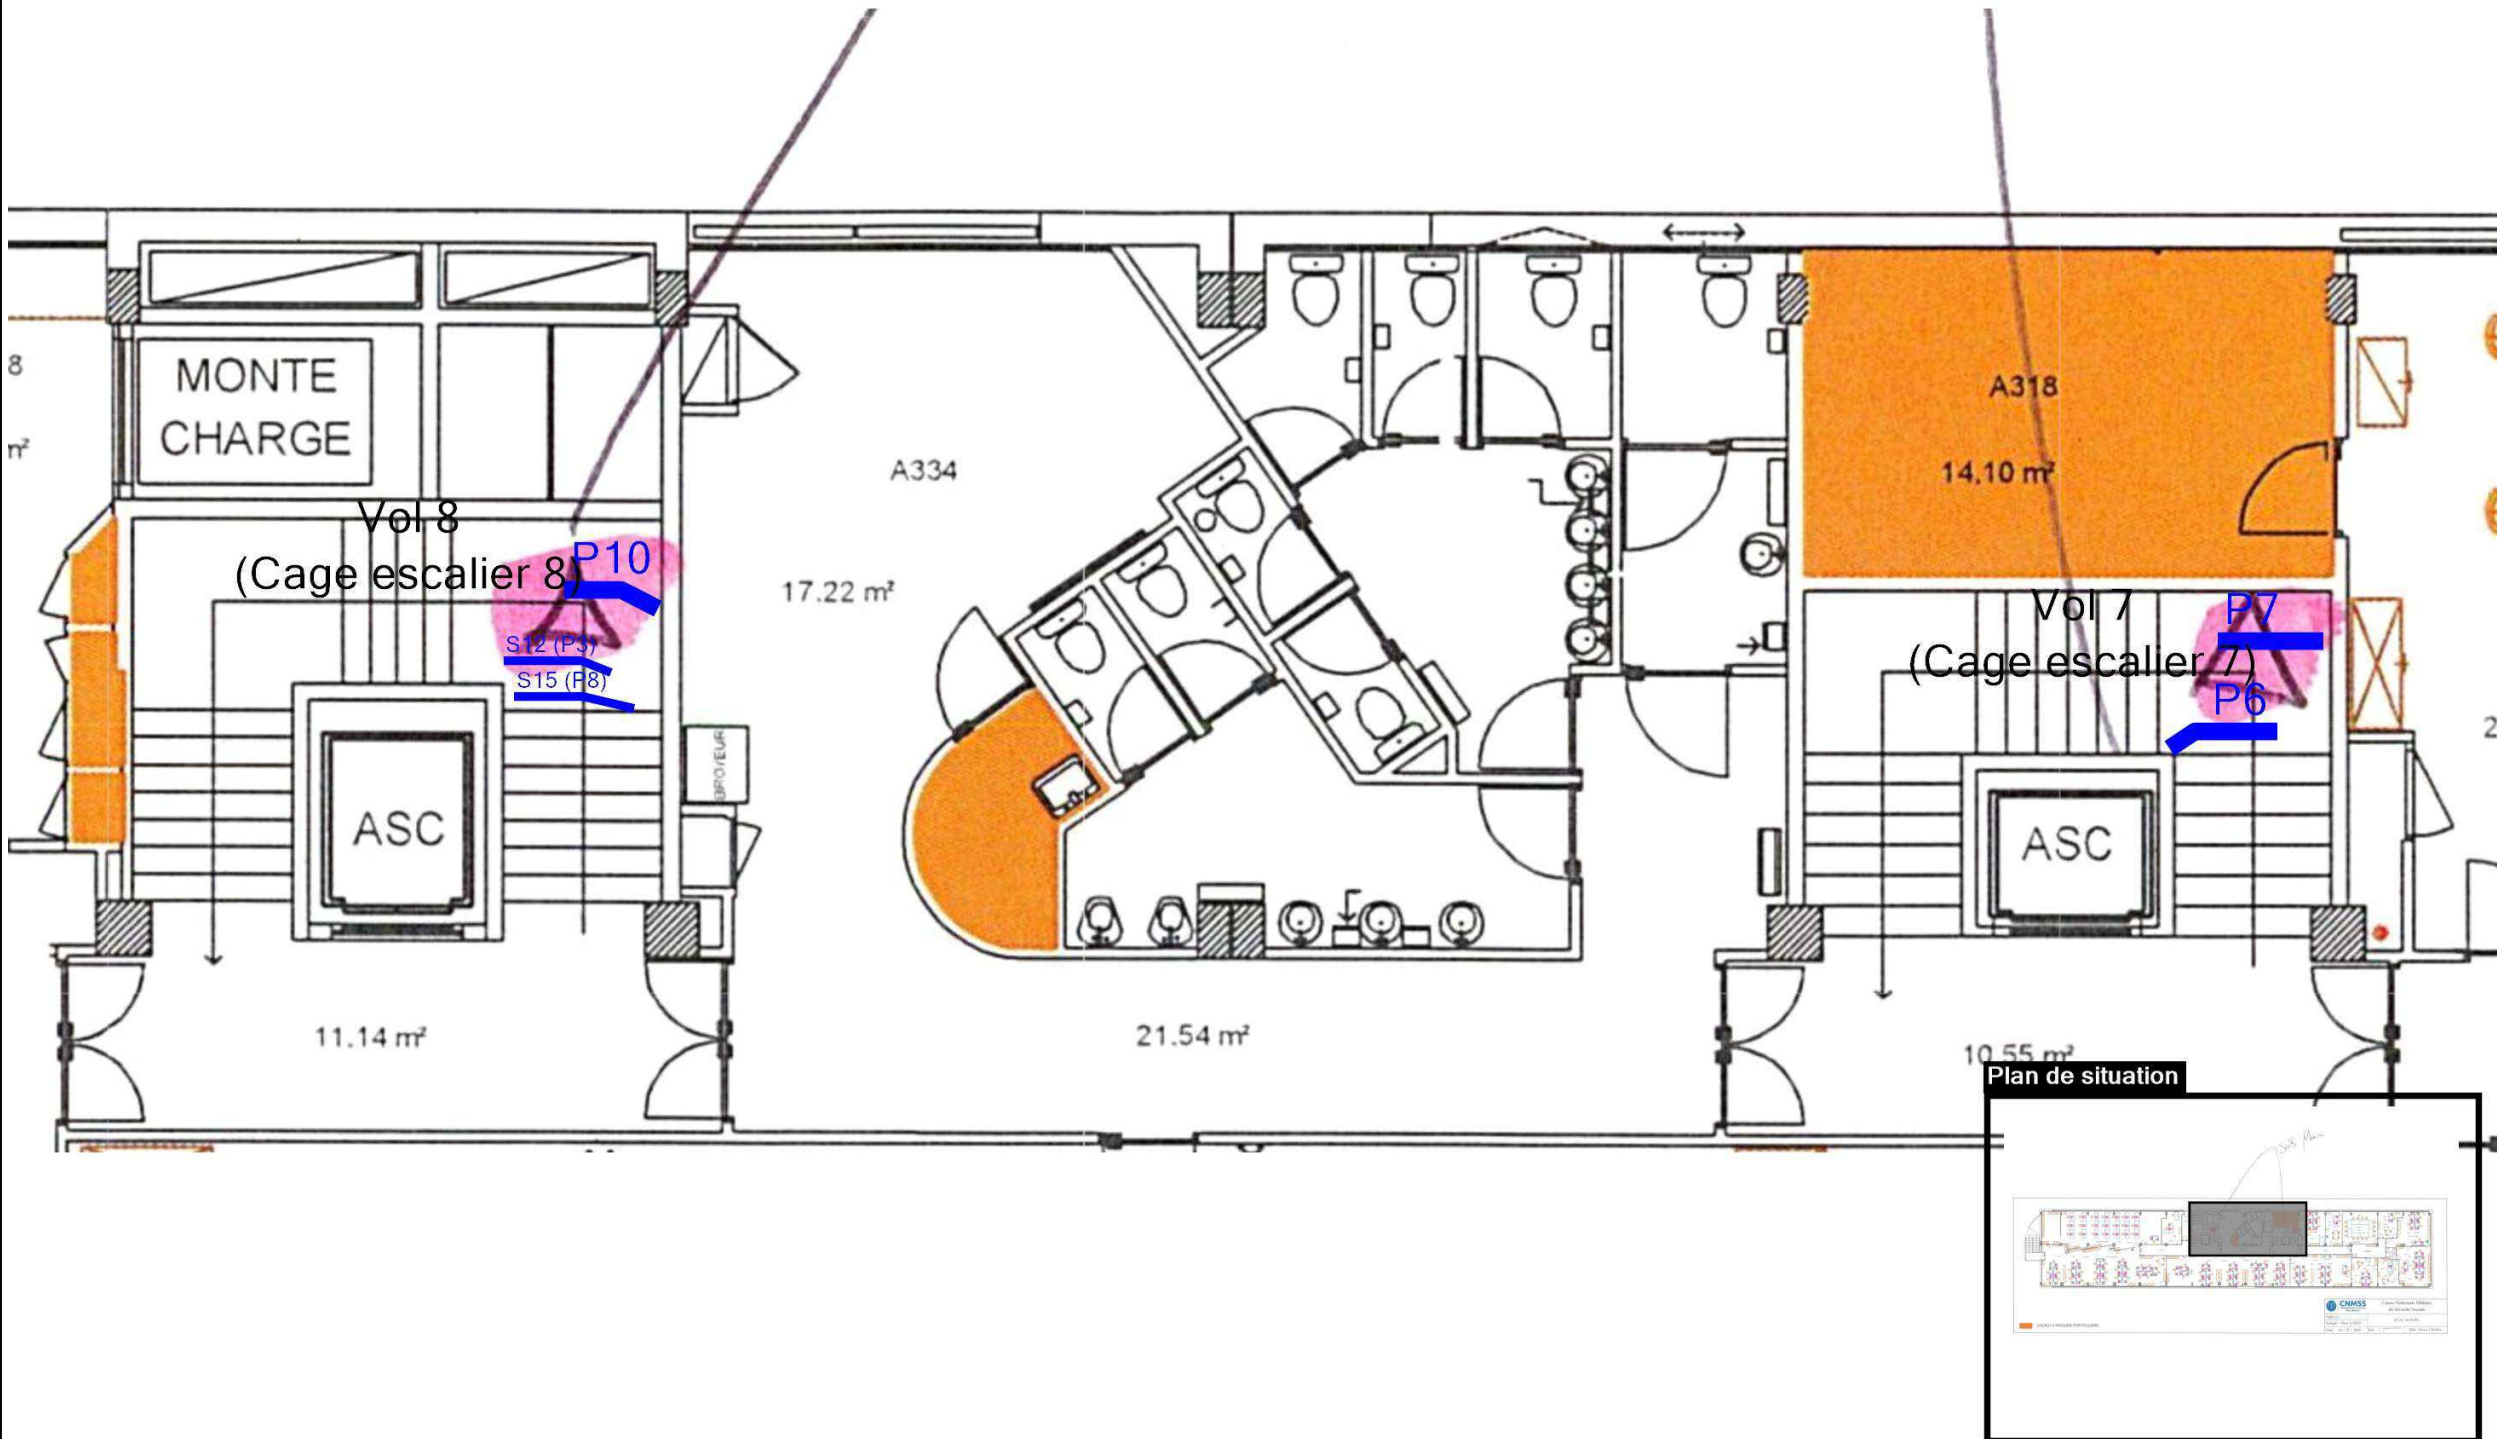CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - BÂT BLEU N+3 - PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EW726043
				Légende
				<div>P</div> <div>Localisation dun prélèvement négatif</div>
				<div>S</div> <div>Localisation dun sondage négatif</div>
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

--	--

--	--

	Ten
--	-----

--	--



Caisse Nationale Militaire
de Sécurité Sociale

Indice A

ETAT ACTUEL

Fait par : Marc LOPEZ


Date: 18/ 03 / 2024

Ech:


Validé par : XXXXXX

Plan Niveau 4 Bt bleu


Légende



Localisation dun prélèvement négatif



Localisation dun sondage négatif

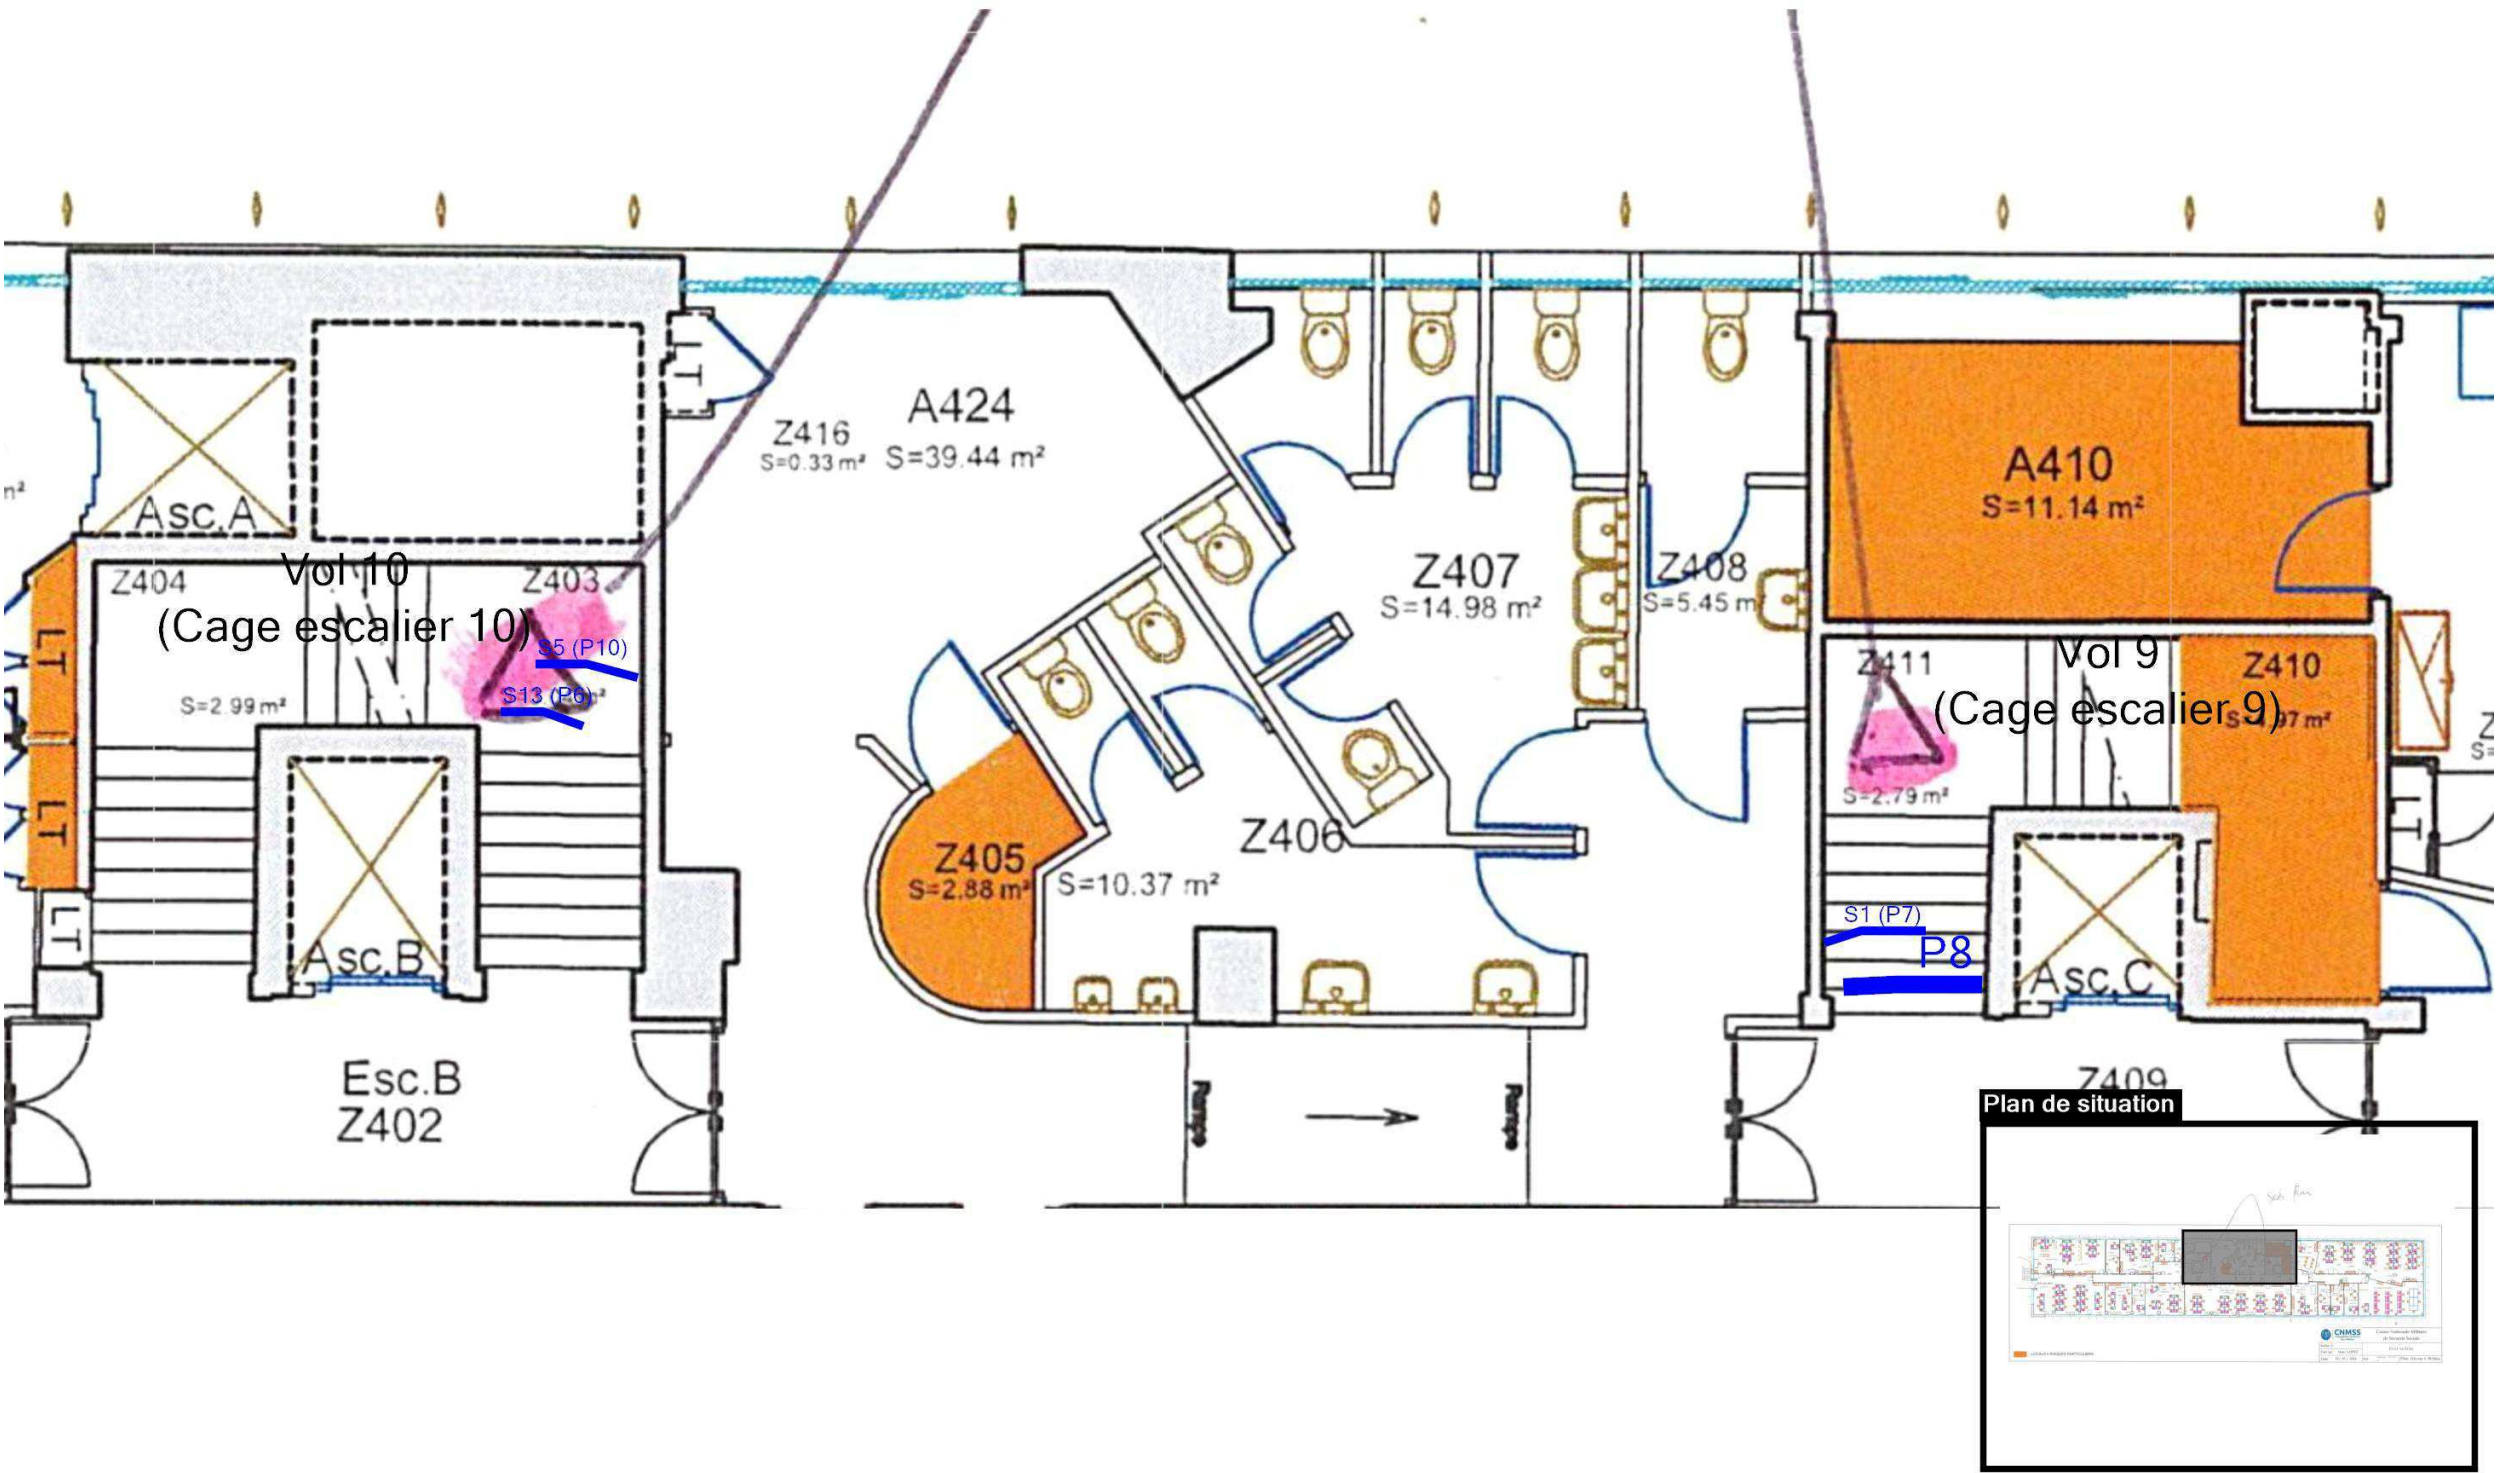

Adresse du bien

247 Avenue Jacques Cartier
83000 TOULON

Désignation

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE -
Bât Bleu

Date intervention

03/06/2025


Technicien intervenant

SOUCELIER RAPHAEL

Légende

Périmètre d'intervention 1



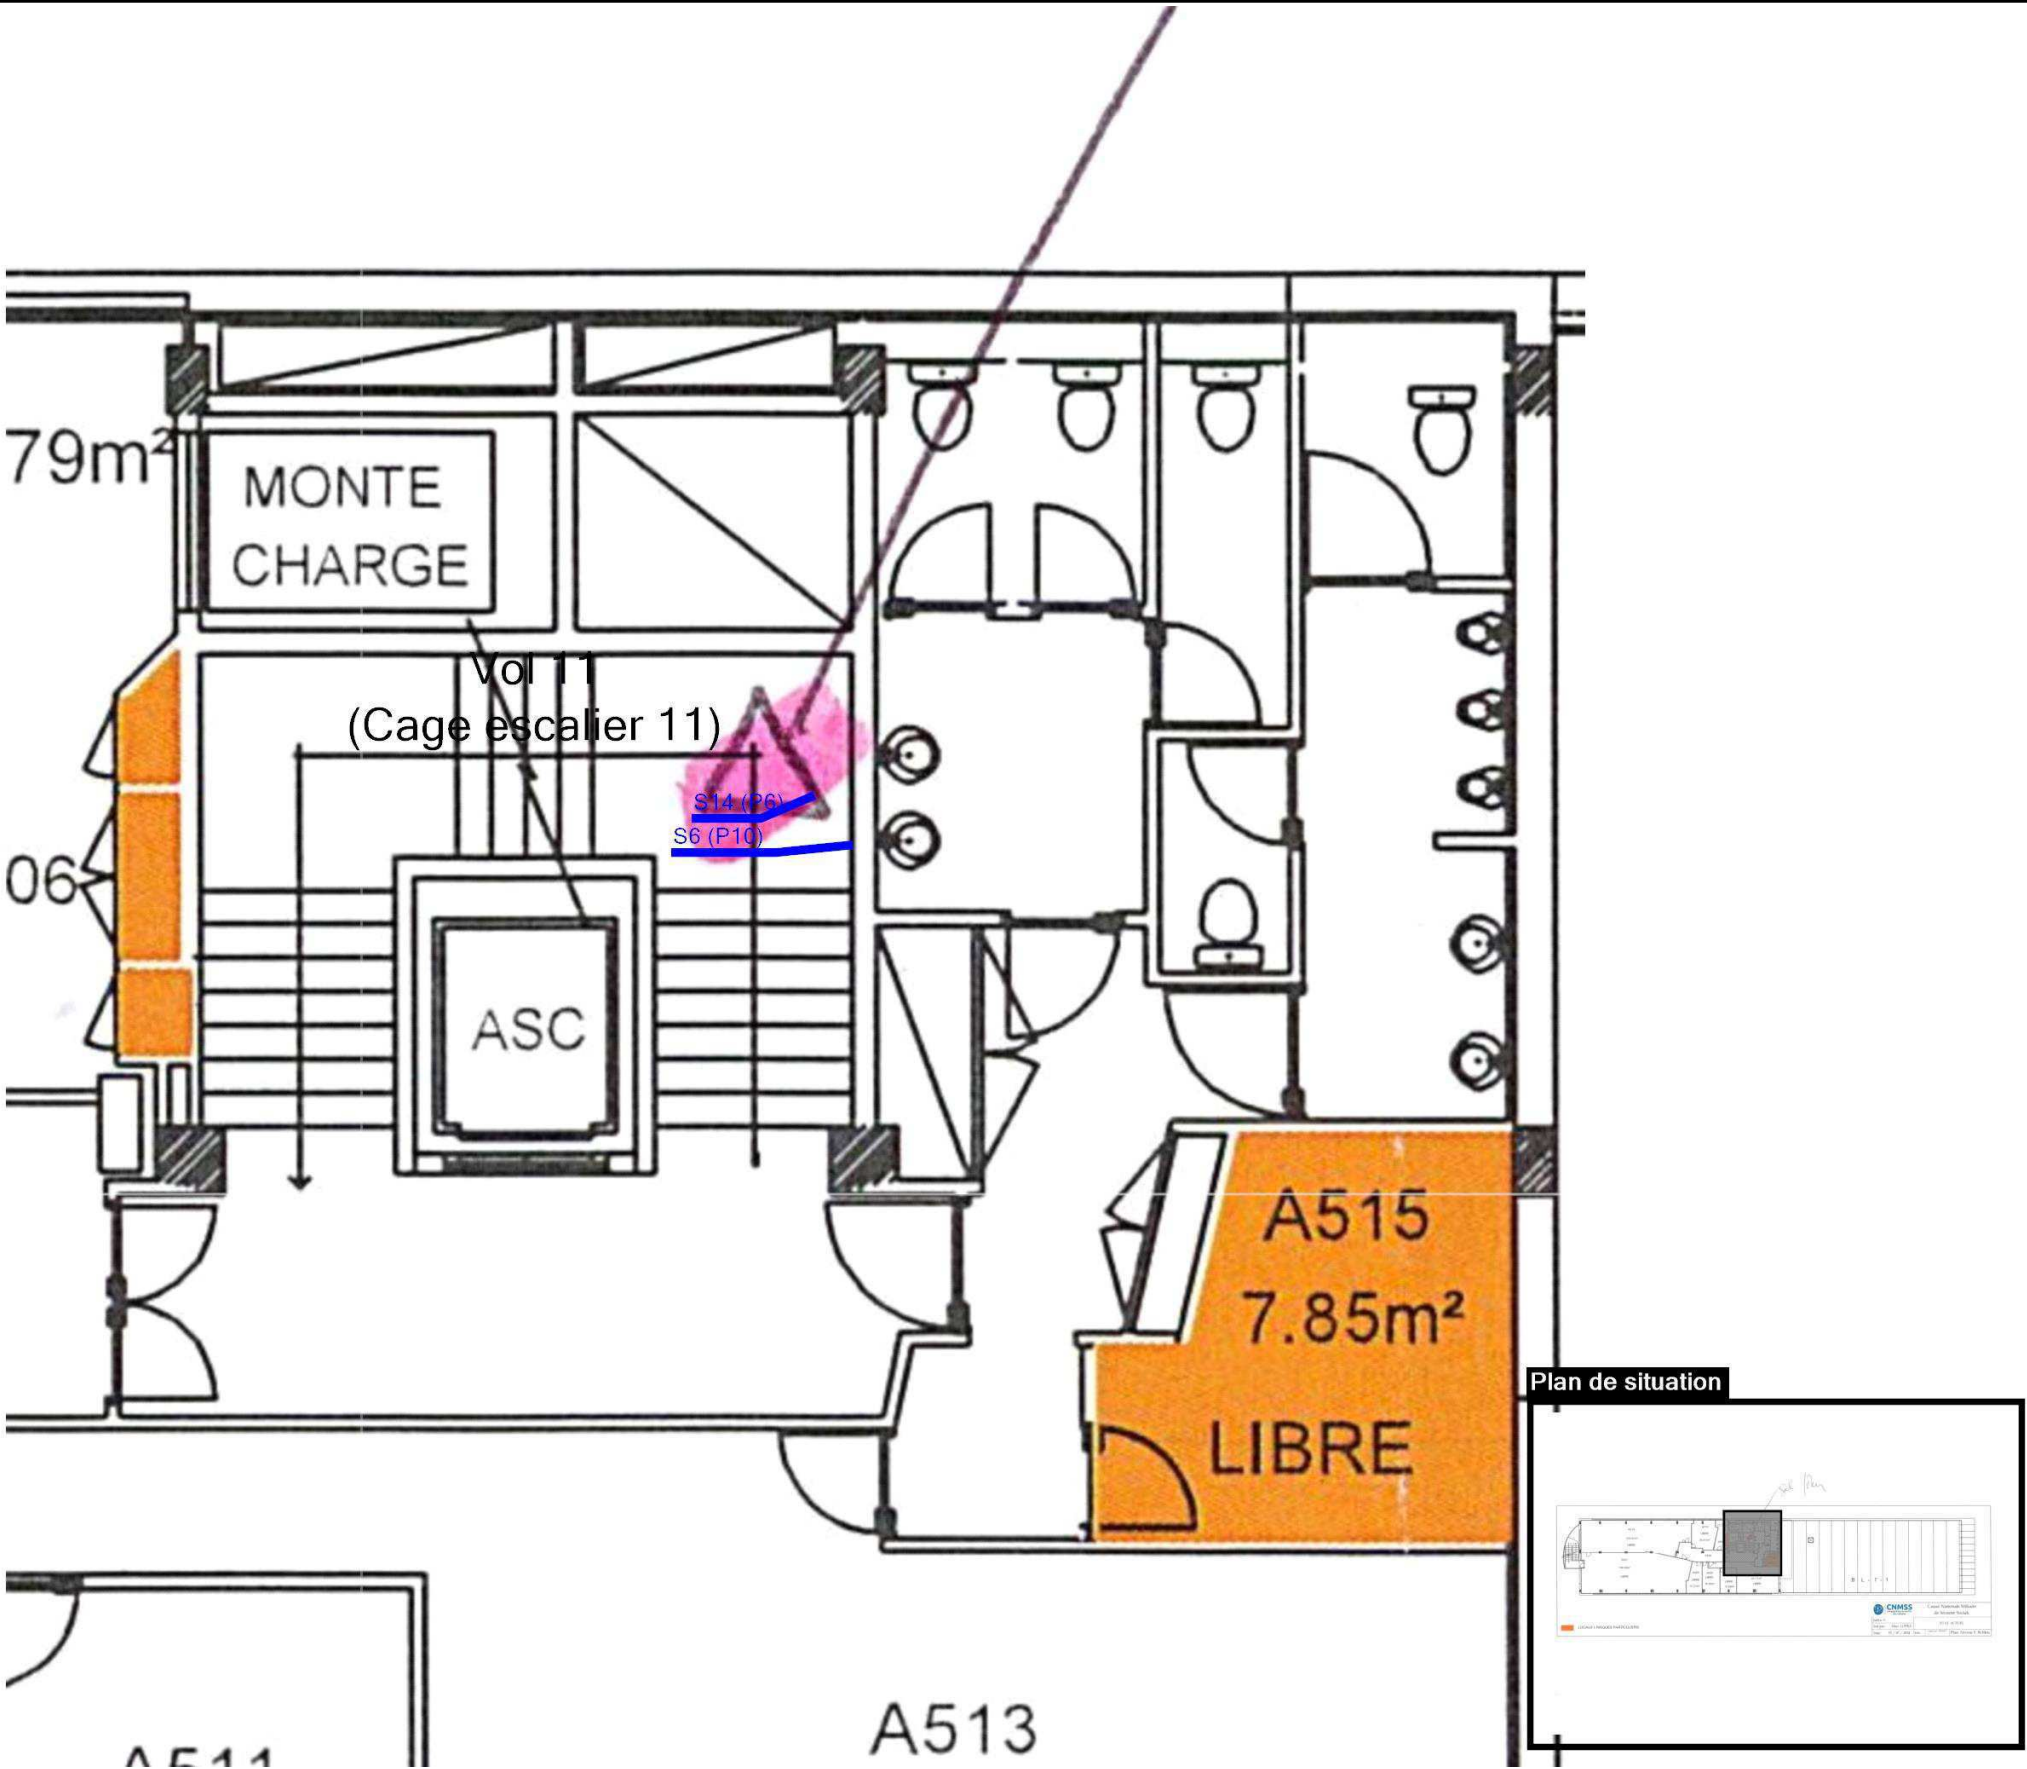

Légende	
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu	03/06/2025	SOUCELIER RAPHAEL

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EW726043 n°8 - 1 (P8)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4 - Vol 9 (Cage escalier 9)	Prélevement négatif
002EW726043 n°3 - 1 (P3)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	Prélevement négatif
002EW726043 n°4 - 1 (P4)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	Prélevement négatif
002EW726043 n°5 - 1 (P5)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	Prélevement négatif
002EW726043 n°6 - 1 (P6)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 7 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW726043 n°7 - 1 (P7)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 7 (Cage escalier 7)	Prélevement négatif
002EW726043 n°10 - 1 (P10)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 8 (Cage escalier 8)	Prélevement négatif
002EW726043 n°11 - 1 (P11)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW726043 n°12 - 1 (P12)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW726043 n°13 - 1 (P13)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)	Prélevement négatif
002EW726043 n°14 - 1 (P14)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)	Prélevement négatif
002EW726043 n°15 - 1 (P15)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)	Prélevement négatif
002EW726043 n°16 - 1 (P16)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)	Prélevement négatif


002EW726043 n°17 - 1 (P17)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°18 - 1 (P18)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°19 - 1 (P19)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°20 - 1 (P20)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°21 - 1 (P21)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°23 - 1 (P23)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°24 - 1 (P24)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°25 - 1 (P25)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 17 (Dégagement 3)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°22 - 1 (P22)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 15 (Dégagement 1)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°28 - 1 (P28)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 19 (Plonge)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°1 - 1 (P1)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°2 - 1 (P2)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°9 - 1 (P9)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 2 (Cage escalier 2)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°26 - 1 (P26)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif
002EW726043 n°27 - 1 (P27)	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)	Prélèvement négatif



002EW726043 n°1 - 1 (P1) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol
1 (Cage escalier 1)



002EW726043 n°2 - 1 (P2) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC -
Vol 1 (Cage escalier 1)

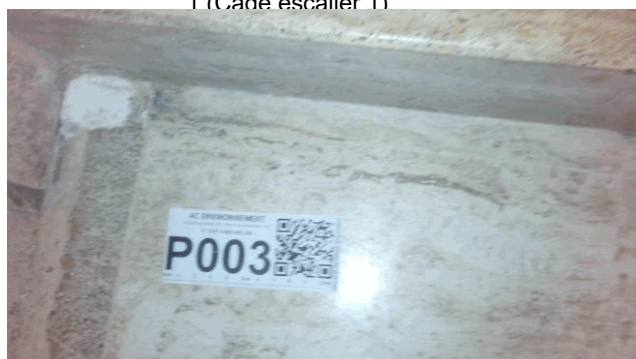

002EW726043 n°3 - 1 (P3) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol
5 (Cage escalier 5)

002EW726043 n°4 - 1 (P4) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 -
Vol 5 (Cage escalier 5)



002EW726043 n°5 - 1 (P5) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol
5 (Cage escalier 5)

002EW726043 n°6 - 1 (P6) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 -
Vol 7 (Cage escalier 7)



002EW726043 n°7 - 1 (P7) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol
7 (Cage escalier 7)



002EW726043 n°8 - 1 (P8) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4 -
Vol 9 (Cage escalier 9)



002EW726043 n°9 - 1 (P9) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol
2 (Cage escalier 2)

002EW726043 n°10 - 1 (P10) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 -
Vol 8 (Cage escalier 8)



002EW726043 n°11 - 1 (P11) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol
12 (Chaufferie)

002EW726043 n°12 - 1 (P12) - CAISSE NATIONALE
MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 -
Vol 12 (Chaufferie)




002EW726043 n°13 - 1 (P13) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)



002EW726043 n°14 - 1 (P14) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)



002EW726043 n°15 - 1 (P15) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)

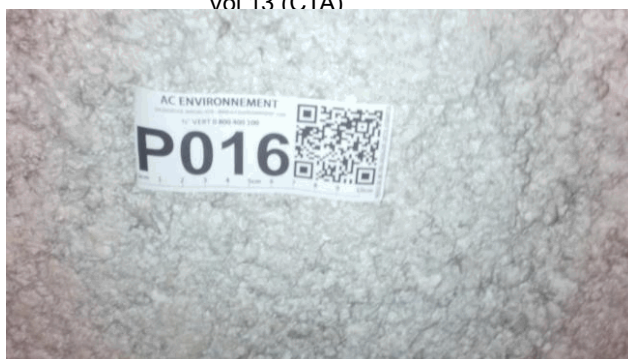

002EW726043 n°16 - 1 (P16) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)



002EW726043 n°17 - 1 (P17) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)



002EW726043 n°18 - 1 (P18) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)



002EW726043 n°19 - 1 (P19) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)



002EW726043 n°20 - 1 (P20) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)



002EW726043 n°21 - 1 (P21) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)



002EW726043 n°22 - 1 (P22) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 15 (Dégagement 1)



002EW726043 n°23 - 1 (P23) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)




002EW726043 n°24 - 1 (P24) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)



002EW726043 n°25 - 1 (P25) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 17 (Dégagement 3)



002EW726043 n°26 - 1 (P26) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)



002EW726043 n°27 - 1 (P27) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)



002EW726043 n°28 - 1 (P28) - CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 19 (Plonge)

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif Amiante

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Marron / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 1 (Cage escalier 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle - Dur - Beige Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Blanc Orange / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+2 - Vol 5 (Cage escalier 5)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Joint - Dur / Dur - Beige Gris / Blanc Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 7 (Cage escalier 7)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc Beige / Blanc / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 7 (Cage escalier 7)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Laine - Souple Fibreux - Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+4 - Vol 9 (Cage escalier 9)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Dur Fibreux / Effritable - Beige Gris / Beige Marron / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 2 (Cage escalier 2)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Enduit - Effritable / Dur Fibreux - Beige Gris / Beige Marron	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N+3 - Vol 8 (Cage escalier 8)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment - Effritable / Dur - Beige Marron / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Souple Fibreux - Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 12 (Chaufferie)
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Ciment / Mortier - Effritable / Effritable / Dur - Beige Gris / Gris / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage / Matériau - Fibreux Effritable / Effritable - Beige / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 13 (CTA)
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture / Mortier - Effritable / Dur - Bleu / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit / Ciment - Effritable / Effritable - Blanc / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)
P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocage - Fibreux Effritable - Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)
P20	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Faux-plafond - Effritable Fibreux - Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau / Fibres / Laine - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux - Blanc / Translucide / Jaune	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 14 (Menuiserie)

P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Blanc / Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 15 (Dégagement 1)
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Mortier - Dur / Dur - Gris / Beige	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)
P24	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Colle / Enduit - Effritable / Dur / Effritable - Blanc / Gris / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 16 (Dégagement 2)
P25	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Enduit - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-1 - Vol 17 (Dégagement 3)
P26	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Dur Fibreux / Dur - Gris / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)
P27 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle / Matériau - Dur / Effritable - Blanc / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)
P27 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture / Joint - Effritable / Dur - Blanc / Blanc	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu RDC - Vol 18 (Dégagement 4)
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle / Ciment - Effritable / Effritable - Gris / Gris	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu N-2 - Vol 19 (Plonge)



ITGA ANALYTICS RIORGES Riorges
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

cofrac

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ESSAIS

CHANTIER	COORDONNÉES DESTINATAIRE
Référence C022025321105 Adresse Commande : 002EW726043 Affaire : CNMSS - Bât Bleu 247 Avenue Jacques Cartier 83000 TOULON	AC Environnement 64, rue Clément Ader 42153 RIORGES

Riorges, le 13/06/2025

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Laboratoire d'analyse	ITGA Analytics Riorges
Normes et techniques analytiques	HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1 (parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée (MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*) Parties utiles de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET)
Texte réglementaire	Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Méthodes internes	Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1
Préparation des échantillons	Prise d'essai représentative de l'échantillon - Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique - Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique

Référence échantillon : 002EW726043_001

Référence labo	42PM02570269	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 1 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris Marron Multicolore		

Description			MOLP	MET				Résultat			
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante			
1	1	Peinture Effritable Blanc Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	●
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_002

Référence labo	42PM02570270	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 1 (Cage escalier 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	DGC	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW726043_003

Référence labo	42PM02570271	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 5 (Cage escalier 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone		1	2	RPM	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW726043_004

Référence labo	42PM02570272	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 5 (Cage escalier 5)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris Marron Multicolore		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Blanc Orange	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_005

Référence labo	42PM02570273	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 5 (Cage escalier 5)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2	DGC	-	-	-	-	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			0 MET				

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW726043_006

Référence labo	42PM02570274	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 7 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP		MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Colle Dur Beige Gris	-	-	-	Acétone		1	2	RPM	Non détecté
	2	Joint Dur Blanc Beige	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET						

Remarque concernant l'analyse La couche Joint / Dur / Blanc Beige est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

Référence échantillon : 002EW726043_007

Référence labo	42PM02570275	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 7 (Cage escalier 7)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Blanc		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Peinture Effritable Blanc Beige	-	-	-	Acétone	1	2	RPM	Non détecté	
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-						
	3	Ciment Effritable Gris	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_008

Référence labo	42PM02570276	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	02/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 9 (Cage escalier 9)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP		MET				Résultat	
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Laine Souple Fibreux Jaune	2	2 DGC	-	-	-	Non détecté	●	
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP		0 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW726043_009

Référence labo	42PM02570277	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 2 (Cage escalier 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige Gris Marron		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**) Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations Grilles explorées(**) Analyste	Présence d'amiante		
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	- - -	Acétone	1	2	RPM	Non détecté
	2	Enduit Dur Fibreux Beige Marron	- - -					
	3	Ciment Effritable Gris	- - -					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP	1 MET				

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Toile Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002EW726043_010

Référence labo	42PM02570278	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 8 (Cage escalier 8)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Beige Gris Marron		

Description			MOLP	MET				Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb. de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb. de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	Acétone	1	2	Non détecté
	2	Enduit Dur Fibreux Beige Marron	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET			

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Peinture Effritable Blanc, Toile Souple Fibreux Blanc, Ciment Effritable Gris

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_011

Référence labo	42PM02570279	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 12 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Peinture Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Marron	-	-	-	Acétone	1	2	RPM
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Mortier Dur Beige Gris

Référence échantillon : 002EW726043_012

Référence labo	42PM02570280	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 12 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	RPM
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW726043_013

Référence labo	42PM02570281	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 12 (Chaufferie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Souple Fibreux Blanc	2	2	DGC	Acétone	1	2	PJB
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_014

Référence labo	42PM02570282	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 13 (CTA)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Beige Gris	-	-	-	Acétone	1	2	RPM
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
	3	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : La couche Flocage / Souple Fibreux / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Flocage Souple Fibreux Blanc

Référence échantillon : 002EW726043_015

Référence labo	42PM02570283	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 13 (CTA)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW726043_016

Référence labo	42PM02570284	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 13 (CTA)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Fibreux Effritable Beige	2	2	PCR	Acétone	1	2	FGA
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_017

Référence labo	42PM02570285	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Chape maigre		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 14 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Dur Beige Gris Noir		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Bleu	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Mortier Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW726043_018

Référence labo	42PM02570286	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 14 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Enduit Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Enduit Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW726043_019

Référence labo	42PM02570287	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Flocages		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 14 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Flocage Fibreux Effritable Blanc	2	2	PCR	Acétone	1	2	FGA
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : RAS

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_020

Référence labo	42PM02570288	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 14 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)		Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)		Analyste	Présence d'amiante
1	1	Faux-plafond Effritable Fibreux Beige	2	2	PCR	Acétone		1	2	FGA	Non détecté
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			1 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse RAS

Référence échantillon : 002EW726043_021

Référence labo	42PM02570289	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 14 (Menuiserie)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Matériau Fibreux Jaune		

Description			MOLP			MET			Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Matériau Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG	Non détecté	
	2	Fibres Souple Fibreux Translucide	-	-	-						
	3	Laine Souple Fibreux Jaune	-	-	-						
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.

Référence échantillon : 002EW726043_022

Référence labo	42PM02570290	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 15 (Dégagement 1)		
Remarque concernant le prélèvement	RAS		

Description			MOLP	MET				Résultat		
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique		Nb de préparations Grilles explorées(**)	Analyste	Présence d'amiante	
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG	Non détecté
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-					
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP		1 MET					

Remarque concernant l'analyse Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105

RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_023

Référence labo	42PM02570291	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 16 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Mortier Dur Beige	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW726043_024

Référence labo	42PM02570292	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 16 (Dégagement 2)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Colle Dur Gris	-	-	-				
	3	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002EW726043_025

Référence labo	42PM02570293	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 17 (Dégagement 3)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Blanc Beige		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Enduit Effritable Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Les couches Matériau / Effritable / Orange, Plâtre / Effritable / Blanc ne sont pas analysées car elles sont présentes en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couches non-analysées : Matériau Effritable Orange, Plinthe Dur Gris, Plâtre Effritable Blanc

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RS022025321105
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence échantillon : 002EW726043_026

Référence labo	42PM02570294	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 18 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Fibreux Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Ciment Dur Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : La couche Colle / Dur Fibreux / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

Référence échantillon : 002EW726043_027

Référence labo	42PM02570295	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 18 (Dégagement 4)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Beige Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Dur Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Matériau Effritable Blanc	-	-	-				
2	3	Peinture Effritable Blanc	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	4	Joint Dur Blanc	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			2 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche 4 non dissociable(***) analysée avec la couche 3.
Couche non-analysée : Plinthe Dur Gris

Référence échantillon : 002EW726043_028

Référence labo	42PM02570296	Échantillon conforme aux critères d'acceptation	Oui
Date du prélèvement	06/06/2025	Analyse réglementaire	Oui
Auteur du prélèvement	RAPHAEL SOUCELIER	Date d'analyse	12/06/2025
Type de prélèvement	Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage		
Zone de prélèvement	CAISSE NATIONALE MILITAIRE DU SECURITE SOCIALE - Bât Bleu - Vol 19 (Plonge)		
Remarque concernant le prélèvement	Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Dur Gris		

Description			MOLP			MET			Résultat
Phase	Couche	Aspect, Texture, Couleur	Nb de préparations	Lames explorées(**)	Analyste	Attaque chimique	Nb de préparations	Grilles explorées(**)	Analyste
1	1	Colle Effritable Gris	-	-	-	Acétone	1	2	ETG
	2	Ciment Effritable Gris	-	-	-				
Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat			0 MOLP			1 MET			Présence d'amiante

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Carrelage Dur Gris

RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022025321105
RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

Référence dossier: RSC022025321105

Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons : 7 MOLP et 26 MET

Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac : 29/29

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm

(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder à la lecture

(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Tgur0"Áswkrq"uwrrnÁcpvg
Anaïs Feugère



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.

Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.

(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection

(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

L.M.O.F 07.8 V11

PAGE 11 / 11

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2025 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

AC ENVIRONNEMENT

Les activités garanties sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mûre
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Énergétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, annexe ERNMT ou ESSRS)
- Certificat de déconce - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traité
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.

HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasowski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T : +33 (0) 1 44 05 96 00
F : +33 (0) 1 44 05 96 00



- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques
- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION		MONTANT DES GARANTIES
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	7 500 000 EUR	par sinistre
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre
• Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle	2 500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Atteintes accidentelles à l'environnement (pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)	500 000 EUR	par sinistre et par période d'assurance
• Dommages aux Biens confiés	30 000 EUR	par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE		
Tous Dommages Con fondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels)	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
Dont		
• Dommages matériels et immatériels consécutifs	3 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance
• Dommages immatériels non consécutifs	1 000 000 EUR	par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2025 au 31/12/2025, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2024 – RE/CT



HDI Global SE
HDI Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register: HR Hannover
HR Number: HR 6020
VAT registration ID: DE 219828792

Chairman of the Supervisory Board: Tordten Lause
Board of Management: Dr. Edgar Pule (Chairman), Ragn
Bettler,
Dr. Maltecker Endersson, Dr. Christian Hemminger, Dr.
Dirk Hering, David Hübner, Dr. Barbara Kinnasowski-
Bettler, Dr. Thomas Kuhn

Attestation AC 2025



ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du 1 de l'article L. 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscritrice d'une assurance responsabilité civile professionnelle n° **76208471-30015** souscrit auprès de la compagnie d'assurance **HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à mon entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente



AC ENVIRONNEMENT
Sûreté Société - AC, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
SAS au capital 1 000 000 € - SIRET : 44135591400298 - RCS RIORGES - APE : 7120B - Assurée par HDI Global SE - N° professionnel : 76208471-30015

01 44 77 44 92 44
contact@ac-environnement.com
www.ac-environnement.com

LCP – 25 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC – 2262



**Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier
N°2262**

Monsieur SOUCELIER Raphaël

Amiante sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Amiante Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Amiante avec mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Missions spécifiques, bâtiments complexes Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
DPE individuel Selon arrêté du 20 juillet 2023	Diagnostic de performances énergétiques Date d'effet : 01/07/2024 - Date d'expiration : 03/12/2030
DPE avec mention Selon arrêté du 20 juillet 2023	DPE par immeuble, bâtiments à usage autre que d'habitation Date d'effet : 01/07/2024 - Date d'expiration : 03/12/2030
Electricité Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure électricité Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Gaz Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Plomb sans mention Selon arrêté du 1er juillet 2024	Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 04/12/2023 - Date d'expiration : 03/12/2030
Termites métropole Selon arrêté du 1er juillet 2024	Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments Date d'effet : 12/02/2024 - Date d'expiration : 11/02/2031

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit.
Émis le 02/09/2024, à Pessac par **MOLEZUN Jean-Jacques** Président.

Sûreté : 25, avenue Léonard de Vinci – Technoparc Europarc – 33600 PESSAC
Tél : 05 33 89 39 39 – Mail : contact@lcp-certification.fr – site : www.lcp-certification.fr
SAS au capital de 15 000 € - SIRET : 809 649 900032 – RCS BORDEAUX – 809 1 40 108 – Code APE : 7022 Z
Env 487P LE CERTIFICAT V013 du 01-09-2024

