

Pré-rapport de repérage amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Article R4412-97 du Code du Travail, Norme NF X 46-020

REFERENCES MISSION

Rapport N° : 25285339/S6/1/AM-RTV_V1

Rédigé le : 07/03/2025

Référence au programme de travaux :
N°RENOVATION ET REAMENAGEMENT D'UN
IMMEUBLE DE BUREAUX réalisé le 07/11/2024 par

DONNEUR D'ORDRE

--
4 RUE FRANCOIS DE GUISE
57000 METZ

SITE D'INTERVENTION

FINANCES METZ

4 RUE FRANCOIS DE GUISE
57000 METZ

IMMEUBLE BUREAUX

Latitude : 49.110600 / Longitude : 6.166700



SYNTHESE DE CONCLUSION



Cf. paragraphe 2

OPERATEUR(S) DE REPERAGE

Prénom Nom	Fonction	Compétence	Signataire du rapport
Loïc MULLER	Opérateur de repérage	21252239	Loïc MULLER
			

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement.

SOMMAIRE

1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION	3
1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre	3
1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage	3
1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage	5
2. CONCLUSIONS	6
2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre	7
2.2. Obligations réglementaires	8
2.3. Remarque(s) complémentaire(s)	8
3. INFORMATIONS GENERALES	9
3.1. Immeuble bâti objet de la mission	9
3.2. Parties prenantes	9
4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE	9
4.1. Références réglementaires	9
5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	10
5.1. Date(s) de visite(s)	10
5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020	10
5.3. Conditions spécifiques	10
5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite	10
6. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	11
6.1. Matériaux et produits repérés	11
6.2. Estimation quantitative des matériaux et produits contenant de l'amiante	34
7. ANNEXES	34
7.1. Parties d'immeuble bâti visitées	34
7.2. Photos prélèvements	37
7.3. Photos sondages	47
7.4. Photos inaccessibilités	50
7.5. Photos observations	51
7.6. Attestation d'assurance	63
7.7. Certificat de compétence	65
7.8. Croquis de repérage	66
7.9. Rapport d'analyse du laboratoire	73

BUREAU VERITAS vous accompagne durant toutes les phases de vos projets



1. PROGRAMMES ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

1.1. Programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Selon le(s) document(s) remis par le donneur d'ordre, le programme des travaux prévus est le suivant :

Description succincte du programme des travaux
Rénovation complète : Changement des sols, peinture des murs et plafonds, modification de cloisons, reprise de la façade et modification des extérieurs.

1.2. Programme de repérage défini par l'opérateur de repérage

Il définit les ouvrages de la construction et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, impactés par les travaux prévus.

Le présent repérage concerne uniquement les produits ou matériaux identifiés comme concernés directement ou indirectement par les travaux au vu des informations fournies par le donneur d'ordre.

Dans le cas où des produits et matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'ont pas fait l'objet de recherche d'amiante car non identifiés comme concernés par les travaux prévus au vu des informations fournies préalablement au repérage, il conviendra que le donneur d'ordre fasse effectuer des investigations supplémentaires ultérieures.

Ouvrages et parties d'ouvrages de l'annexe 1 de l'arrêté du 16/07/2019 concernés par les travaux prévus

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
02 - Parois verticales extérieures et façades	
Conduits en façade	Conduits d'eaux pluviales, Conduits d'eaux usées, Conduits de fumée
Eléments associés à la façade	Conduits, Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches
Façades légères, murs rideaux, bardages, panneaux sandwichs	Ardoises composites hors fibres-ciment, Ardoises en fibres-ciment, Bacs en fibres-ciment, Eléments de remplissage, Joints d'assemblage, Joints d'étanchéité, Mastics, Panneaux, Peinture, Plaques, Revêtements intérieurs anti condensation, Tresses
Façades lourdes y compris poteaux	Appuis de fenêtres en fibres-ciment, Coffrages perdus, Colle, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de pâte de verre, Couvre-joints, Eléments en maçonnerie silico-calcaire (1880-1940) briques blanches silico-calcaire, Enduits extérieurs projetés, lissés ou talochés, crépis extérieurs, Enduits pelliculaires de lissage/débullage, Garnissage des joints de dilatation, Imperméabilisant, Isolant, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Joints de faïence, Joints de pâte de verre, Peintures, Primaires d'accrochage, Ragréage, Revêtements plastiques épais (RPE)
Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage	Carton-amiante, Enduits projetés, Flocages
Menuiseries extérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
03 - Parois verticales intérieures	
Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot, Bourre en vrac, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Isolants intérieurs fibreux, Jonctions panneaux préfabriqués : entre panneaux, en tête et en pieds de cloisons (joints, tresse, carton, fibres-ciment), Panneaux de cloisons, Peinture, Plots de colle, Sous couches des tissus muraux
Gaines et coffres verticaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre panneaux), Panneaux
Menuiseries intérieures	Garnitures de friction sur fenêtres basculantes, Joints d'étanchéité, Joints de mastic de vitrage, Peintures décoratives, Plaques en fibres-ciment
Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints coupe-feu, Joints d'assemblage, Joints de dilatation, Peinture, Revêtements durs
Plinthes	Peintures
Portes	
Portes coupe-feu	Isolants intérieurs, Joints, Joints (bandes), Joints (tresses), Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes frigorifiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes isothermiques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Portes pare-flammes	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux

Ouvrages de la construction	Parties d'ouvrages
Portes phoniques	Isolants intérieurs, Joints, Panneaux, Peintures, Plaques des vantaux
Poteaux	Coffrages perdus, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poteaux, Flocages, Joints d'assemblage avec poutraison, Joints de dilatation, Revêtements durs
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles, Colles de carrelage, Colles de faïence, Colles de plinthe, Dalles plastique, Joints de carrelage, Joints de faïence, Joints de plinthe, Moquettes murales, Panneaux décoratifs (lambris), Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Primaires d'accrochage, Ragréages, Revêtements bitumineux, Revêtements durs en fibres-ciment, Sous couches des tissus muraux, Vinyles
04 - Plafonds et faux plafonds	
Charpentes	Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Revêtements bitumineux
Faux plafonds	Ecrans de cantonnement, Isolants, Joints d'écrans de cantonnement, Joints entre panneaux, Jonctions entre faux plafond et structure, Panneaux, Pare-vapeur, Plaques
Gainés et coffres horizontaux	Bandes calicot, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Jonctions entre panneaux (étanchéité entre panneaux), Jonctions entre panneaux (tresses), Panneaux, Panneaux collés, Panneaux vissés
Plafonds	Bandes calicot, Coffrages perdus, Colles de carrelage, Enduits de jointoiement des plaques de plâtre, Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Flocages, Fourreaux, Joints de carrelage, Joints de dilatation, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures décoratives, Peintures intumescentes, Plots de colle, Primaires d'accrochage, Rebouchages de trémie, Résines, Revêtements bitumineux, Sous couches des tissus muraux
Poutres	Enduits de ragréage, débullage, lissage, Enduits lissés, projetés ou talochés, Enduits projetés, Entourages de poutres, Flocages, Joints (coupe-feu, de dilatation, de structure), Jonctions avec la façade, calfeutrements, Panneaux collés, Panneaux vissés, Peintures, Revêtements bitumineux
Suspentes et contrevents	Flocages, Peintures, Projections en plâtre
05 - Planchers et planchers techniques	
Revêtements de sol	Colles bitumineuses, Colles de carrelage, Colles non bitumineuses, Dalles de sol, Dalles moquettes avec entre-couche noire, Enduit de cuvelage, Fourreaux, Joints de cantonnement sur faux planchers, Joints de carrelage, Joints de dilatation et d'assemblage, Moquettes, Nez de marche, Peintures de sol, Plaques en fibres-ciment, Primaires d'accrochage, Ragréages, Rebouchages autour de conduits, Revêtements de sols sportifs, Sols coulés à base ciment, Sous-couches des revêtements souples
06 - Conduits et accessoires intérieurs	
Clapets coupe-feu	Calfeutrements, Clapets, Joints, Lames, Rebouchages, Tunnels
Conduits	Calorifugeages, Colles de calorifugeage, Conduits, Conduits de drainage en fibres-bitumes, Enveloppes de calorifuges, Flocages, Joints entre éléments, joints de brides, Manchons, Mastics, Matelas, Rubans adhésifs
Vide-ordures	Conduits, Joints d'étanchéité des trappes, Vidoirs en fibres-ciment
Volets coupe-feu	Calfeutrements, Ossature, Rebouchages, Volets
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers	
Aménagements extérieurs	Bordures en fibres-ciment, Eléments extérieurs en fibres-ciment, Jardinières en fibres-ciment, Plaques de caniveau en fibres-ciment, Pots de fleur en fibres-ciment
Conduits	Eléments de canalisations enterrés
Espaces sportifs	Revêtements de sol
Grilles	Peintures
Murs	Enduits de ragréage, débullage, lissage
Portails	Peintures
Portes	
Revêtements de murs	Peintures décoratives
Syphons	Eléments de canalisations enterrés
Voiries	Asphaltes, Enrobé bitumineux des couches de voiries

1.3. Périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

Au vu du descriptif des travaux prévus, les parties de bâtiment objets de la mission sont les suivantes :

Totalité du bâtiment

2. CONCLUSIONS

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de pré-rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies. Les obligations réglementaires ne sont pas remplies.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

2.1. Investigations approfondies devant être réalisées par le donneur d'ordre

Localisation	Ouvrage	Motifs	Actions à réaliser par le donneur d'ordre
Extérieur -> Facade D (IA 1)	2- Parois verticales extérieures et façades - joint d'étanchéité des fenêtres PVC inaccessible sans détériorer les fenêtres.	Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique	Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4

2.2. Obligations réglementaires

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique, ce DAPP ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du Code de la Santé Publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du Code du Travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

2.3. Remarque(s) complémentaire(s)

les zps0 31 et 32 (joint d'étanchéité de la porte PMR) sont un élément unique et peu accessible un seul prélèvement à pu être fait.

3. INFORMATIONS GENERALES

3.1. Immeuble bâti objet de la mission

Adresse : FINANCES METZ
4 RUE FRANCOIS DE GUISE
57000 METZ

Bâtiment	Fonction principale	Classement	Date permis de construire ou année de construction	Année de réhabilitation ou description des modifications
FINANCES METZ GEP	Administrations, bureaux	Autres	Sans informations fournies par le donneur d'ordre, la date d'obtention du permis de construire est présumée être inférieure au 1 juillet 1997	Non communiqué

3.2. Parties prenantes

Contact	Qualité	Société	Adresse	Coordonnées
--	Donneur d'ordre	/	4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ	/

4. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits impactés par les travaux listés en annexe de l'arrêté du 16/07/2019, en vue de la réalisation de l'évaluation initiale du risque amiante.

4.1. Références réglementaires

- Code du travail : articles L4412-2, R4412-97,
- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations,
- Arrêté du 16/07/2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
- Norme NF X 46-020 du 5 août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis.

5. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

5.1. Date(s) de visite(s)

Du 18/02/2025 au 20/02/2025

5.2. Ecart, adjonctions ou suppressions à la norme NF X46-020

Absence de documents, d'informations concernant :

- Les dates de délivrance du permis de construire ou des années de construction
- Les années de modification ou de réhabilitation
- La construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation...)
- Les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

5.3. Conditions spécifiques

- Réalisation d'un nombre de prélèvements inférieur aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X46-020
les zps 31 et 32 (joint d'étanchéité de la porte PMR) sont un élément unique et peu accessible un seul prélèvement a pu être fait.

5.4. Documents remis par le donneur d'ordre ou disponibles lors de la visite

Objet / Type de document	Auteur	Date	Référence	Conclusions (si rapport de repérage)
Plans / METZ_4FDG_EX_R-1□R+2	/	07/11/2024	23-032 STR	/
Plans / METZ_4FDG_EX_R-1□RDC	/	07/11/2024	23-032 STR	/
Avant projet sommaire / METZ_4RFDG_CDC_DIAG_AMIANTE_PB_I NSECTES	/	07/11/2024	RENOVATION ET REAMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX	/

Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante utilisés pour la réalisation du repérage, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de diagnostics, constats et repérages amiante.

6. RESULTATS DETAILS DU REPERAGE

6.1. Matériaux et produits repérés

Abréviations du tableau :

ZPSO = Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage
Pxx P = Prélèvement n°xx Positif, contenant de l'amiante
Pxx N = Prélèvement n°xx Négatif, ne contenant pas d'amiante
xx_ant = Prélèvement réalisé lors d'un repérage antérieur
Sxx = Sondage n°xx
xx* = élément témoin de la ZPSO
Nota : Hormis pour l'élément témoin, tout prélèvement est précédé d'un sondage

Critères de décision :
AN = Analyse
DC = Document consulté
MA = Marquage
PN = Ne contient pas d'amiante par nature

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SALLE DE REUNION	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	14	/	S10	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	S16	MA	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	17	P26* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose, Gris	17	P26* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	18	P27* N	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> SALLE DE REUNION	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	/	S17	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	17	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Rose, Gris	17	P38 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune, Blanc	19	P28* N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Ciment	Gris	20	P29* N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 1	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	23	P32* N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	/	S12	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune, Blanc	19	/	S11	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 2	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> BUREAU 2	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Granuleux	Gris	23	P33 N	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune, Blanc	19	Idem P 28	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 1	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Beige	21	P30* N	/	AN	porte	Non
RDC -> DGT 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune, Blanc	22	P31* N	/	AN	porte	Non
RDC -> DGT 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	Granuleux	Beige	10	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	Granuleux	Beige	10	Idem P 23	/	AN	/	Non
RDC -> DEGGT 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> DEGGT 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> DEGGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> DEGGT 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> DEGGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> DEGGT 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 1	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Dur	Jaune, Blanc	19	Idem P 28	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	25	P36* N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Revêtements de sol	Sols coulés à base ciment	Ciment	Gris	25	P37 N	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> LOCAL 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> LOCAL 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	13	/	S14	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Gris	24	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	P34* N	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Gris	24	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	24	P35 N	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> CUISINE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> CUISINE	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
RDC -> SAN 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	/	S13	AN	/	Non
RDC -> SAN 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	/	S13	AN	/	Non
RDC -> SAN 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
RDC -> SAN 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 1	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
RDC -> SAN 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> SAN 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
RDC -> SAN 2	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
RDC -> ACCUEIL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous sol -> DEGGT 1	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	P45* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> DEGGT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Sous sol -> DEGGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Blanc	27	P43* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> DEGGT 2	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	Idem P 45	/	AN	/	Non
Sous sol -> DEGGT 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Sous sol -> DGT 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	P40* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> DGT 3	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	Idem P 45	/	AN	/	Non
Sous sol -> DGT 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Blanc	27	P42 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> DGT 4	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	Idem P 45	/	AN	/	Non
Sous sol -> DGT 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Sous sol -> ARCHIVES 1	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	Idem P 45	/	AN	/	Non
Sous sol -> ARCHIVES 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Sous sol -> ARCHIVES 2	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	P44 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> ARCHIVES 2	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
Sous sol -> ARCHIVES 3	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	P41 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> ARCHIVES 3	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Gris	28	Idem P 45	/	AN	/	Non
Sous sol -> CHAUFFERIE	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Beige	29	P46* N	/	AN	/	Non
Sous sol -> CHAUFFERIE	Plafonds	Enduits projetés	Ciment	Beige	29	P47 N	/	AN	/	Non
Sous sol -> CHAUFFERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Blanc	27	/	S18	AN	/	Non
Sous sol -> CHAUFFERIE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits projetés	Ciment	Gris	26	Idem P 40	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	/	S4	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	/	S4	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	P17* N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Semi-dur	Jaune	7	P18* N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	16	P19* N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	14	P22* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 4	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	P20* N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	P21* N	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	/	S6	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 5	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 5	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Bleu, Gris	11	Idem P 9	/	AN	barreaux fenêtre	Non
R+1 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 6	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 7	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> BUREAU 8	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 8	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 8	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 8	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	Idem P 3	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 8	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	Idem P 20	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 9	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 9	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 9	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 10	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> BUREAU 10	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 10	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 10	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> BUREAU 10	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	14	P14 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGGT 1	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	16	P16 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	P12* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	13	P13* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose, Blanc	15	P15* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Poteaux	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose, Blanc	15	P39 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	Granuleux	Beige	10	P23* N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> DGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	S15	MA	/	Non
R+1 -> DGGT 4	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou taloches	Plâtre	Rose	13	P24 N	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> DEGGT 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> DEGGT 5	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DEGGT 5	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> DEGGT 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> DEGGT 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> DGGT 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> DGGT 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P25* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	P25* N	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> SAN	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> SAN	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Murs et cloisons maçonnées "en dur"	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	13	/	S7	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Plafonds	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Beige	14	/	S8	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Poutres	Enduits lissés, projetés ou talochés	Plâtre	Rose	16	/	S9	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> Wc1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc1	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
R+1 -> Wc2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+1 -> Wc2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+1 -> Wc2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+1 -> Wc2	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	S1	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	P1* N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P1* N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	P2 N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	P7 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	/	S3	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Semi-dur	Jaune	7	P5 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Joints de mastic de vitrage	Rigide	Blanc	5	P3* N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	P4 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Menuiseries intérieures	Peintures décoratives	Epais	Blanc	8	P6 N	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 5	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> BUREAU 6	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 6	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 7	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Bleu, Gris	11	P9* N	/	AN	barreaux fenêtre	Non
R+2 -> BUREAU 7	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> BUREAU 7	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> BUREAU 7	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 1	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	S2	PN	plénium	Non
R+2 -> DGGT 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> DGGT 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Enduits projetés	Granuleux	Beige	10	P8 N	/	AN	/	Non
R+2 -> DGT 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> DGT 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 3	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> DGGT 3	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 3	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+2 -> DGGT 4	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> SAN 1	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	P10 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 1	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	P10 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	P11 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 1	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	P11 N	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 1	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> SAN 1	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 1	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> SAN 2	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de faïence	Ciment	Gris	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Joints de faïence	Enduit	Blanc	12	Idem P 25	/	AN	/	Non
R+2 -> SAN 2	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
R+2 -> LOCAL PERSONNEL	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> LOCAL PERSONNEL	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> LOCAL PERSONNEL	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
R+2 -> LOCAL PERSONNEL	Conduits	Conduits	Métallique	Gris	4	/	/	PN	/	Non
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	Faux plafonds	Panneaux	Fibreux	Blanc	3	/	/	MA	/	Non
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de sol	Colles non bitumineuses	/	Clair	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de sol	Ragréages	Ciment	Gris	1	Idem P 1	/	AN	/	Non
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	Colles de plinthe	Mastic	Blanc	2	Idem P 12	/	AN	/	Non
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	Cloisons (légères et préfabriquées)	Bandes calicot	Papier, Plâtre	Blanc	9	Idem P 17	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade A	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	Epais	Bleu, Gris	11	P48 N	/	AN	barreaux fenêtre	Non
Extérieur -> Facade A	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu, Blanc	30	P49* N	/	AN	main courante escalier chauffage	Non
Extérieur -> Facade A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Mousse expansée	Gris	31	P50* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade A	Menuiseries extérieures	Joints d'étanchéité	Caoutchouc	Noir, Blanc	32	P51* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade A	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	33	P52* N	/	AN	/	Non

Localisation	Ouvrage	Matériaux	Aspect	Couleur	N° ZPSO	N° Prél.	N° Sond.	Critère de décision	Observation	Présence amiante
Extérieur -> Facade A	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Semi-dur	Jaune	7	Idem P 18	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade A	Eléments associés à la façade	Conduits	Fonte, Métallique	Gris	36	/	/	PN	/	Non
Extérieur -> Facade C	Equipements	Peintures	Décoratif	Bleu	34	P54* N	/	AN	peinture portail	Non
Extérieur -> Facade C	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Semi-dur	Jaune	7	Idem P 18	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade C	Menuiseries intérieures	Joints d'étanchéité	Mastic	Blanc	6	Idem P 21	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade C	Eléments associés à la façade	Conduits	Fonte, Métallique	Gris	36	/	/	PN	/	Non
Extérieur -> Facade D	Eléments associés à la façade	Conduits	Fonte, Métallique	Gris	36	/	S19	PN	/	Non
Extérieur -> Facade D	Menuiseries extérieures	Joints de mastic de vitrage	Caoutchouc	Noir	33	P53 N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade D	Menuiseries extérieures	Peintures décoratives	/	Bleu	35	P55* N	/	AN	/	Non
Extérieur -> Facade D	Façades lourdes y compris poteaux	Colle	Semi-dur	Jaune	7	Idem P 18	/	AN	/	Non
Coure extérieur	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Gris	37	P56* N	/	AN	/	Non
Coure extérieur	Voiries	Enrobé bitumineux des couches de voiries	Bitumineux	Rouge	38	P57* N	/	AN	/	Non

7. ANNEXES

7.1. Parties d'immeuble bâti visitées

La liste ci-dessous présente les parties d'immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée à BUREAU VERITAS. Il appartient au donneur d'ordre ou à son représentant, seule personne à même d'avoir une parfaite connaissance des lieux, de signifier à BUREAU VERITAS toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux ou zones figurant à un titre ou à un autre dans le présent rapport.

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
RDC	/
RDC -> SALLE DE REUNION	/
RDC -> BUREAU 1	/
RDC -> BUREAU 2	/
RDC -> BUREAU 3	/
RDC -> DGT 1	/
RDC -> DGT 2	/
RDC -> DEGGT 3	/
RDC -> DEGGT 4	/
RDC -> LOCAL 1	/
RDC -> LOCAL 2	/
RDC -> CUISINE	/
RDC -> SAN 1	/
RDC -> SAN 2	/
RDC -> ACCUEIL	/
Sous sol	/
Sous sol -> VIDE SANITAIRE 1	/
Sous sol -> VIDE SANITAIRE 2	/
Sous sol -> DEGGT 1	/
Sous sol -> DEGGT 2	/
Sous sol -> DGT 3	/
Sous sol -> DGT 4	/
Sous sol -> ARCHIVES 1	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
Sous sol -> ARCHIVES 2	/
Sous sol -> ARCHIVES 3	/
Sous sol -> CHAUFFERIE	/
R+1	/
R+1 -> BUREAU 1	/
R+1 -> BUREAU 2	/
R+1 -> BUREAU 3	/
R+1 -> BUREAU 4	/
R+1 -> BUREAU 5	/
R+1 -> BUREAU 6	/
R+1 -> BUREAU 7	/
R+1 -> BUREAU 8	/
R+1 -> BUREAU 9	/
R+1 -> BUREAU 10	/
R+1 -> DGGT 1	/
R+1 -> DGT 2	/
R+1 -> DGT 3	/
R+1 -> DGGT 4	/
R+1 -> DEGGT 5	/
R+1 -> DGGT 6	/
R+1 -> SAN	/
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	/
R+1 -> Wc1	/
R+1 -> Wc2	/
R+2	/
R+2 -> BUREAU 1	/
R+2 -> BUREAU 2	/

Localisation	Descriptif sol / mur / plafond
R+2 -> BUREAU 3	/
R+2 -> BUREAU 4	/
R+2 -> BUREAU 5	/
R+2 -> BUREAU 6	/
R+2 -> BUREAU 7	/
R+2 -> DGGT 1	/
R+2 -> DGT 2	/
R+2 -> DGGT 3	/
R+2 -> DGGT 4	/
R+2 -> SAN 1	/
R+2 -> SAN 2	/
R+2 -> LOCAL PERSONNEL	/
R+2 -> LOCAL TECHNIQUE	/
Extérieur	/
Extérieur -> Facade A	/
Extérieur -> Facade B	/
Extérieur -> Facade C	/
Extérieur -> Facade D	/
Coure extérieur	/

7.2. Photos prélèvements

P26	ZPSO 17
RDC -> SALLE DE REUNION	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P27	ZPSO 18
RDC -> SALLE DE REUNION	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P38	ZPSO 17
RDC -> BUREAU 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P28	ZPSO 19
RDC -> BUREAU 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P29	ZPSO 20
RDC -> BUREAU 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P32	ZPSO 23
RDC -> BUREAU 2	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P33	ZPSO 23
RDC -> BUREAU 3	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P30	ZPSO 21
RDC -> DGT 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P31	ZPSO 22
RDC -> DGT 1	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	


P36	ZPSO 25
RDC -> LOCAL 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P37	ZPSO 25
RDC -> LOCAL 2	
	
Revêtements de sol -> Sols coulés à base ciment	

P34	ZPSO 24
RDC -> CUISINE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P35	ZPSO 24
RDC -> CUISINE	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P45	ZPSO 28
Sous sol -> DEGGT 1	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

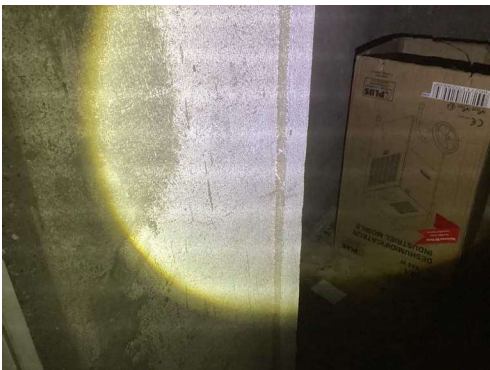P43	ZPSO 27
Sous sol -> DEGGT 2	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P40	ZPSO 26
Sous sol -> DGT 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P42	ZPSO 27
Sous sol -> DGT 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P44	ZPSO 28
Sous sol -> ARCHIVES 2	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P41	ZPSO 26
Sous sol -> ARCHIVES 3	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

P46	ZPSO 29
Sous sol -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P47	ZPSO 29
Sous sol -> CHAUFFERIE	
	
Plafonds -> Enduits projetés (Liste B)	

P17	ZPSO 9
R+1 -> BUREAU 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P18	ZPSO 7
R+1 -> BUREAU 2	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P19	ZPSO 16
R+1 -> BUREAU 3	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P22	ZPSO 14
R+1 -> BUREAU 4	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P20	ZPSO 8
R+1 -> BUREAU 4	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

P21	ZPSO 6
R+1 -> BUREAU 4	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P14	ZPSO 14
R+1 -> DGGT 1	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P16	ZPSO 16
R+1 -> DGGT 1	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P12	ZPSO 2
R+1 -> DGGT 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P13	ZPSO 13
R+1 -> DGGT 1	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P15	ZPSO 15
R+1 -> DGGT 1	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P39	ZPSO 15
R+1 -> DGGT 1	
	
Poteaux -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P23	ZPSO 10
R+1 -> DGT 3	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P24	ZPSO 13
R+1 -> DGGT 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P24	ZPSO 13
R+1 -> DGGT 4	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

P25	ZPSO 12
R+1 -> SAN	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P1	ZPSO 1
R+2 -> BUREAU 2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P2	ZPSO 2
R+2 -> BUREAU 2	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

P7	ZPSO 9
R+2 -> BUREAU 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

P5	ZPSO 7
R+2 -> BUREAU 3	
	
Façades lourdes y compris poteaux -> Colle	

P3	ZPSO 5
R+2 -> BUREAU 3	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P4	ZPSO 6
R+2 -> BUREAU 3	
	
Menuiseries intérieures -> Joints d'étanchéité	

P6	ZPSO 8
R+2 -> BUREAU 3	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	


P9	ZPSO 11
R+2 -> BUREAU 7	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P8	ZPSO 10
R+2 -> DGT 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Enduits projetés (Liste B)	

P10	ZPSO 1
R+2 -> SAN 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

P11	ZPSO 12
R+2 -> SAN 1	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de faïence Joints de faïence	

P48	ZPSO 11
Extérieur -> Facade A	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

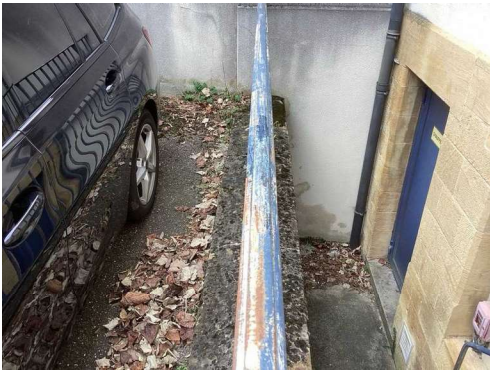P49	ZPSO 30
Extérieur -> Facade A	
	
Equipements -> Peintures	

P50	ZPSO 31
Extérieur -> Facade A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P51	ZPSO 32
Extérieur -> Facade A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints d'étanchéité	

P52	ZPSO 33
Extérieur -> Facade A	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P54	ZPSO 34
Extérieur -> Facade C	
	
Equipements -> Peintures	

P53	ZPSO 33
Extérieur -> Facade D	
	
Menuiseries extérieures -> Joints de mastic de vitrage	

P55	ZPSO 35
Extérieur -> Facade D	
	
Menuiseries extérieures -> Peintures décoratives	

P56	ZPSO 37
Courre extérieur	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

P57	ZPSO 38
Courre extérieur	
	
Voiries -> Enrobé bitumineux des couches de voiries	

7.3. Photos sondages

S10	ZPSO 14
RDC -> SALLE DE REUNION	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	


S16	ZPSO 3
RDC -> SALLE DE REUNION	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S17	ZPSO 8
RDC -> BUREAU 1	
	
Menuiseries intérieures -> Peintures décoratives	

S12	ZPSO 9
RDC -> BUREAU 2	
	
Cloisons (légères et préfabriquées) -> Bandes calicot	

S11	ZPSO 19
RDC -> BUREAU 2	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S14	ZPSO 13
RDC -> CUISINE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

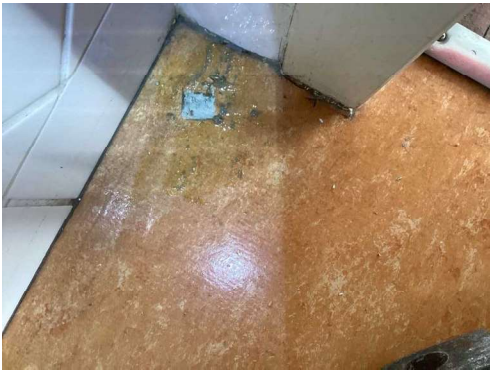S13	ZPSO 1
RDC -> SAN 1	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	

S18	ZPSO 27
Sous sol -> CHAUFFERIE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits projetés (Liste B)	

S4	ZPSO 1
R+1 -> BUREAU 2	
	
Revêtements de sol -> Colles non bitumineuses Ragréages	


S6	ZPSO 5
R+1 -> BUREAU 4	
	
Menuiseries intérieures -> Joints de mastic de vitrage	

S15	ZPSO 3
R+1 -> DGGT 4	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S7	ZPSO 13
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	
	
Murs et cloisons maçonnées "en dur" -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S8	ZPSO 14
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	
	
Plafonds -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

S9	ZPSO 16
R+1 -> LOCAL TECHNIQUE	
	
Poutres -> Enduits lissés, projetés ou talochés	

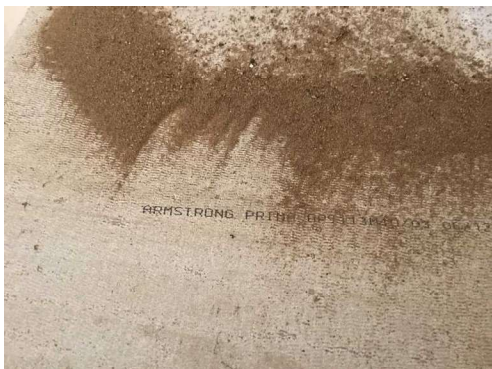S1	ZPSO 3
R+2 -> BUREAU 2	
	
Faux plafonds -> Panneaux (Liste A)	

S3	ZPSO 2
R+2 -> BUREAU 3	
	
Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres -> Colles de plinthe	

S2	ZPSO 4
R+2 -> DGGT 1	
	
Conduits -> Conduits (Liste B)	

S19	ZPSO 36
Extérieur -> Facade D	
	
Eléments associés à la façade -> Conduits	

Extérieur -> Facade D		IA 1
2- Parois verticales extérieures et façades		
Inspection de la jonction entre menuiserie et structure requérant un outillage et/ou une compétence spécifique		
	Investigation approfondie à réaliser avant les travaux :	
	joint d'étanchéité des fenêtres PVC inaccessible sans détériorer les fenêtres. Faire procéder à la dépose de la menuiserie par une entreprise qualifiée et compétente SS4	

7.5. Photos observations

RDC -> DGT 1		OBS 31
	<u>Observation :</u> sol et plinthes hors périmètre de repérage	
RDC -> DGT 2		OBS 32
	<u>Observation :</u> sol et plinthes hors périmètre de repérage	
Sous sol -> VIDE SANITAIRE 1		OBS 33
	<u>Observation :</u> hors champs des travaux	

R+1 -> BUREAU 5		OBS 25
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+1 -> BUREAU 6		OBS 28
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+1 -> BUREAU 8		OBS 27
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+1 -> BUREAU 9		OBS 30
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+1 -> DGT 3		OBS 26
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+1 -> DGGT 6		OBS 29
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+2 -> BUREAU 1		OBS 10
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> BUREAU 2		OBS 1
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> BUREAU 3		OBS 9
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+2 -> BUREAU 3		OBS 11
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> BUREAU 4		OBS 4
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+2 -> BUREAU 4		OBS 12
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> BUREAU 5		OBS 3
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+2 -> BUREAU 5		OBS 13
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		Observation : bois

R+2 -> BUREAU 6		OBS 2
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+2 -> BUREAU 6		OBS 2
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+2 -> BUREAU 6		OBS 14
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		Observation : bois

R+2 -> BUREAU 7		OBS 8
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		Observation : plancher bois

R+2 -> BUREAU 7		OBS 15
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> DGGT 1		OBS 16
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> DGT 2		OBS 5
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	

R+2 -> DGT 2		OBS 17
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> DGGT 3		OBS 6
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
	<u>Observation :</u>	
	plancher bois	


R+2 -> DGGT 3		OBS 18
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
	<u>Observation :</u>	
	bois	

R+2 -> DGGT 3		OBS 24
		Observation : combles hors périmètre de repérage

R+2 -> DGGT 4		OBS 19
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		Observation : bois

R+2 -> SAN 1		OBS 20
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		Observation : bois

R+2 -> SAN 2		OBS 21
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		<u>Observation :</u> bois

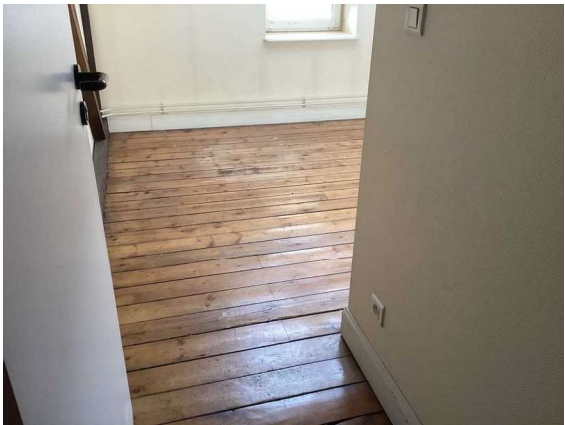R+2 -> LOCAL PERSONNEL		OBS 7
05 - Planchers et planchers techniques		
Revêtements de sol		
		<u>Observation :</u> plancher bois

R+2 -> LOCAL PERSONNEL		OBS 22
04 - Plafonds et faux plafonds		
Plafonds		
		<u>Observation :</u> bois

R+2 -> LOCAL TECHNIQUE

OBS 23

04 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds



Observation :

bois

7.6. Attestation d'assurance



Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE** - Succursale en France - 1 Cours Michelet – CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex, (« la Compagnie ») certifions par la présente que la société :

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
FR - 92200 Neuilly sur Seine

agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale,

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
4 Place des Saisons
92400 Courbevoie

a souscrit auprès de notre compagnie la police n° **FRL001575** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités garanties et notamment :

Missions travaux :

- Repérage amiante avant travaux / démolition (tout domaine d'activité)
- Mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Examen visuel des surfaces traitées (tout domaine d'activité)
- Repérage du plomb avant travaux (tout domaine d'activité)
- Diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets (tout domaine d'activité)
- Etat parasitaire
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic mûrle

Missions exploitation :

- Repérage amiante pour intégration aux documents de traçabilité et de cartographie amiante (pour DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Création ou mise à jour des documents de traçabilité et de cartographie amiante (DTA, DAPP, DT navire, DTCA autres domaines d'activité)
- Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
- Diagnostic radon
- Diagnostic technique global
- Diagnostic accessibilité

Missions transaction / location :

- Repérage amiante pour établissement du constat vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Etat relatif à la présence de termites
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Mesurages Carrez - Boutin
- Etat des risques

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michelet - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agos.allianz.com



Autres missions :

- Assistance technique amiante et plomb
- Prélèvement et analyse de matières dangereuses

Il est précisé que SONT EXCLUS LES DOMMAGES CAUSES PAR L'AMIANTE.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION:

Tous dommages confondus
(corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non).....**1'000'000 EUR** par sinistre et
par année d'assurance

Période d'assurance : du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Le contenu de la présente attestation ne peut en aucun cas être considéré ou interprété comme dérogeant ou modifiant l'une des conditions ou dispositions de la police ci-dessus mentionnée.

Fait à Paris La Défense, le 7 janvier 2025.
Pour la compagnie


Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
Signé par : Cours Michel Juliette Allavoine
E-mail : CS 30051 juliette.allavoine@allianz.com
Heure de signature : 07-2025 10:12:02
Adresse IP : 147.161.232.110

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Succursale en France
1 cours Michel - CS 30051
92076 Paris La Défense Cedex
487 424 608 RCS Nanterre
N° TVA intracommunautaire FR
00 487 424 608

Siège social :
Königsstrasse 28
80802 Munich
Allemagne

Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N° HRB 208312
Entreprise soumise au contrôle de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Grauhendorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
www.agcs.allianz.com

7.7. Certificat de compétence



Certificat attribué à

Loïc MULLER

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES	Référence des arrêtés	Date de certification originale	Validité du certificat *
Amiante avec mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	13/02/2024	12/02/2031
Amiante sans mention	Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification	13/02/2024	12/02/2031

Date : 02/10/2024
 Numéro du certificat : **2152239** Samuel DUPRIEU - Président



* Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'à : voir ci-dessus. Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme : <https://www.bv.com/fr/la-validite-de-ce-certificat>
 Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
 1 Place Zélie Hadol 92400 Courbevoie





7.8. Croquis de repérage


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				
La planche de repérage est indissociable du rapport				
ADRESSE	FINANCES METZ 4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ			
	Localisation	Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025	
Sous sol		Auteur	Loïc MULLER	
		N° dossier	25285339/s6/h	
		Planche	1 / 6	
		Indice	1	

Vue utilisée :

--	--

Matériaux et produits contenant de l'amiante :


--	--

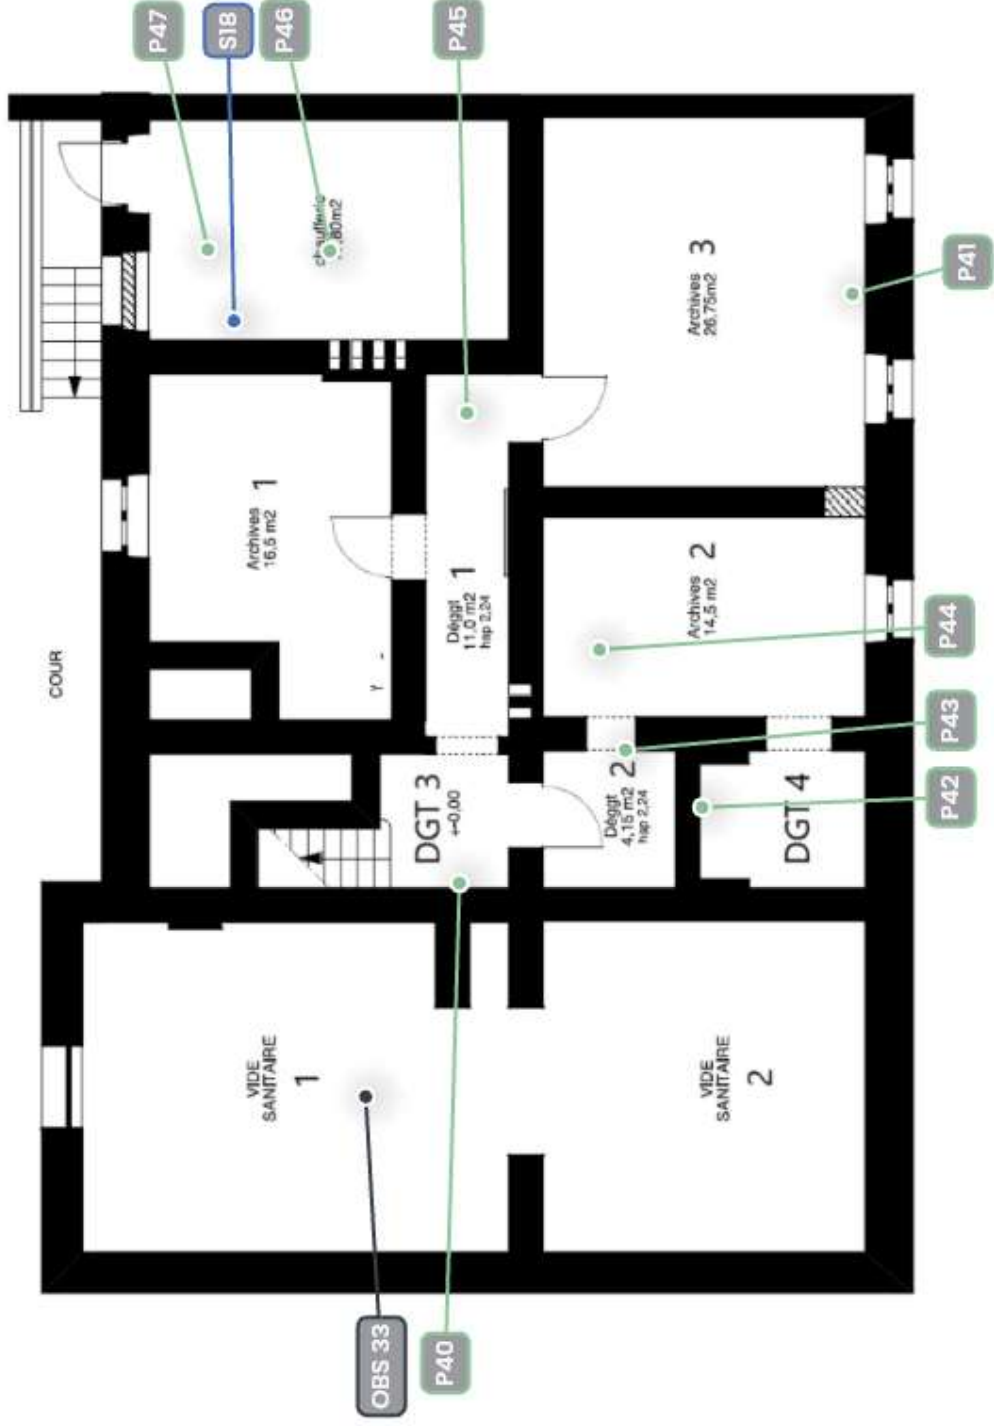

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				
La planche de repérage est indissociable du rapport				
ADRESSE	FINANCES METZ 4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ			
	Localisation	Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025	
RDC		Auteur	Loïc MULLER	
		N° dossier	25285339/s6/h	
		Planche	2 / 6	
		Indice	1	


Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :	

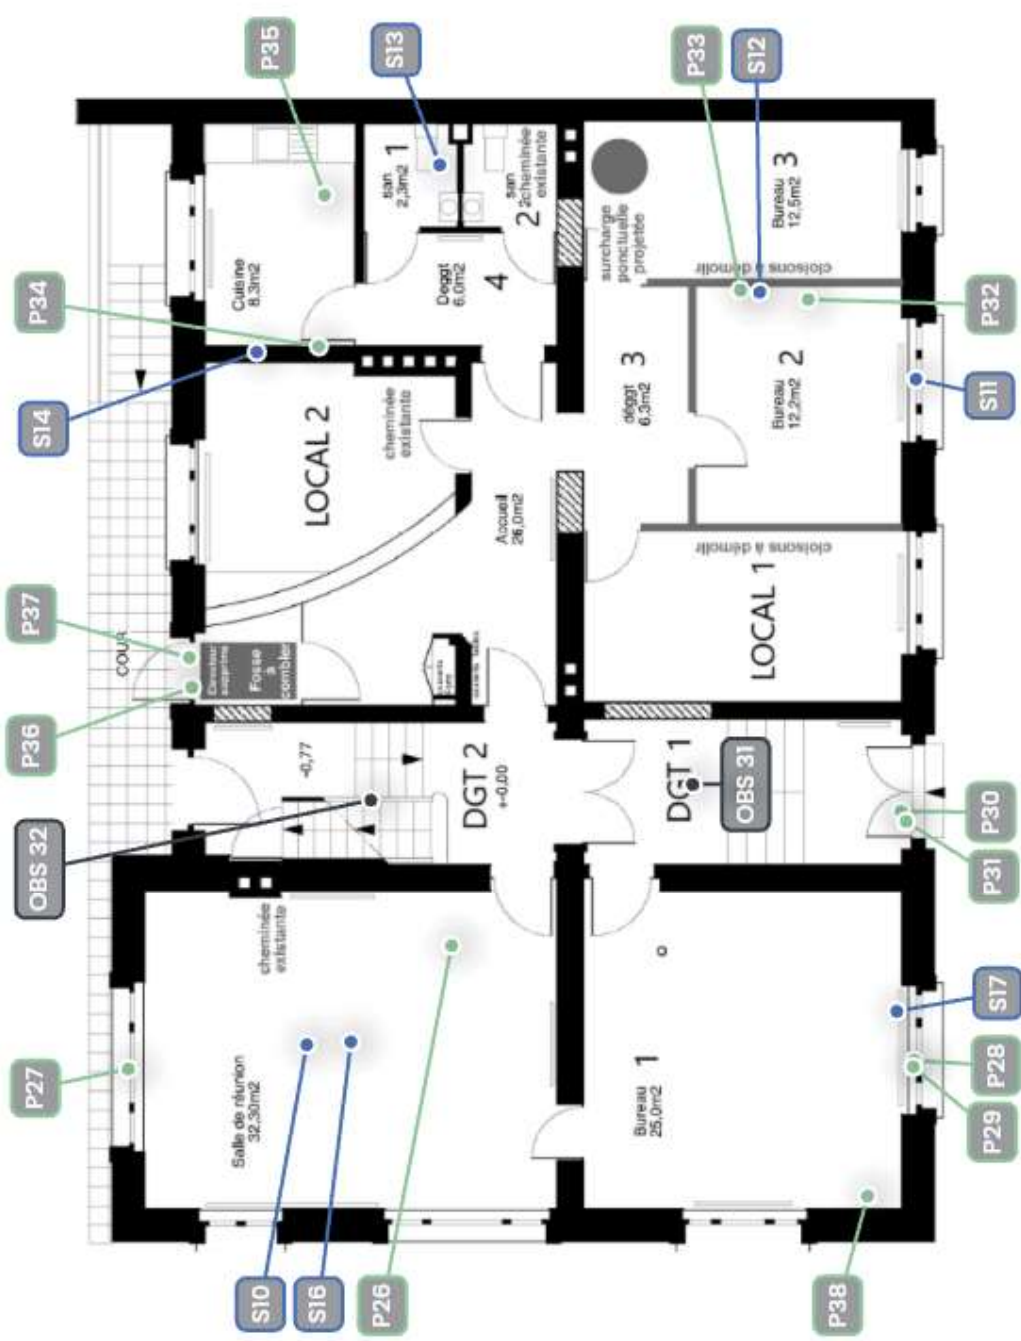

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				
La planche de repérage est indissociable du rapport				
ADRESSE	FINANCES METZ			
	4 RUE FRANCOIS DE GUISE			
	57000 METZ			
Localisation	R+1	Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025	
		Auteur	Loïc MULLER	
		N° dossier	25285339/s6/h	
		Planche	3 / 6	
		Indice	1	


Matériaux et produits contenant de l'amiante :

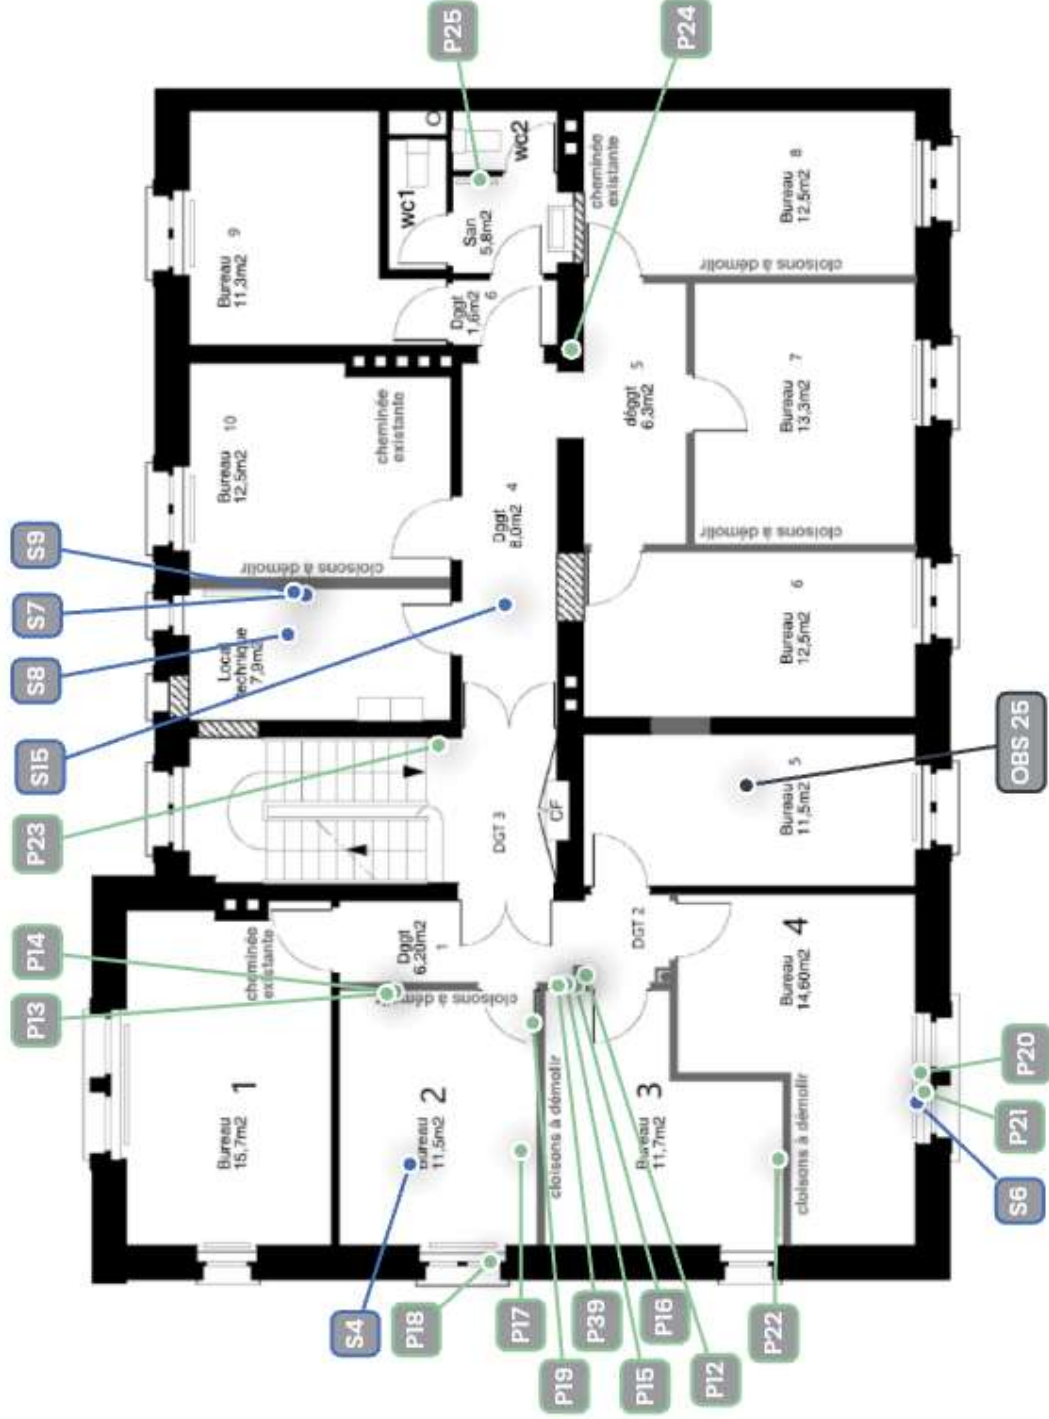

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------


PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE			
La planche de repérage est indissociable du rapport			
ADRESSE	FINANCES METZ 4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ		
	Localisation	Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025
R+2	Auteur	Loïc MULLER	
	N° dossier	25285339/s6/h	
	Planche	4 / 6	
		Indice	1

Vue utilisée :	
Matériaux et produits contenant de l'amiante :	

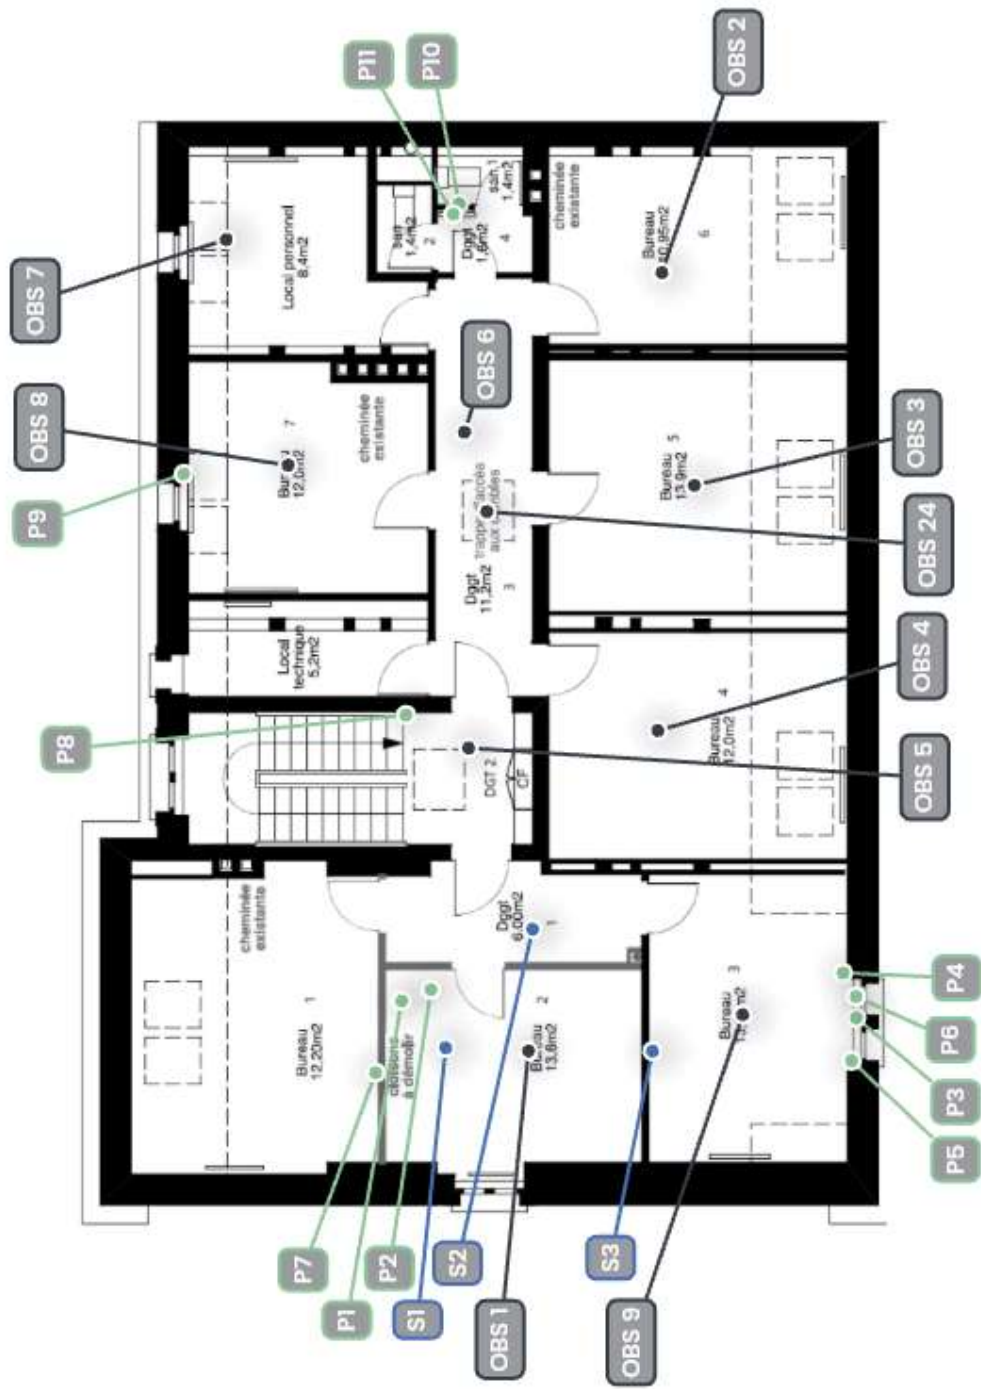

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE					
La planche de repérage est indissociable du rapport					
ADRESSE		FINANCES METZ 4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ			
Localisation Extérieur		Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025		
		Auteur	Loïc MULLER		
		N° dossier	25285339/S6/h		
		Planche	5 / 6		
		Indice	1		
Vue utilisée :					
Matériaux et produits contenant de l'amiante :					

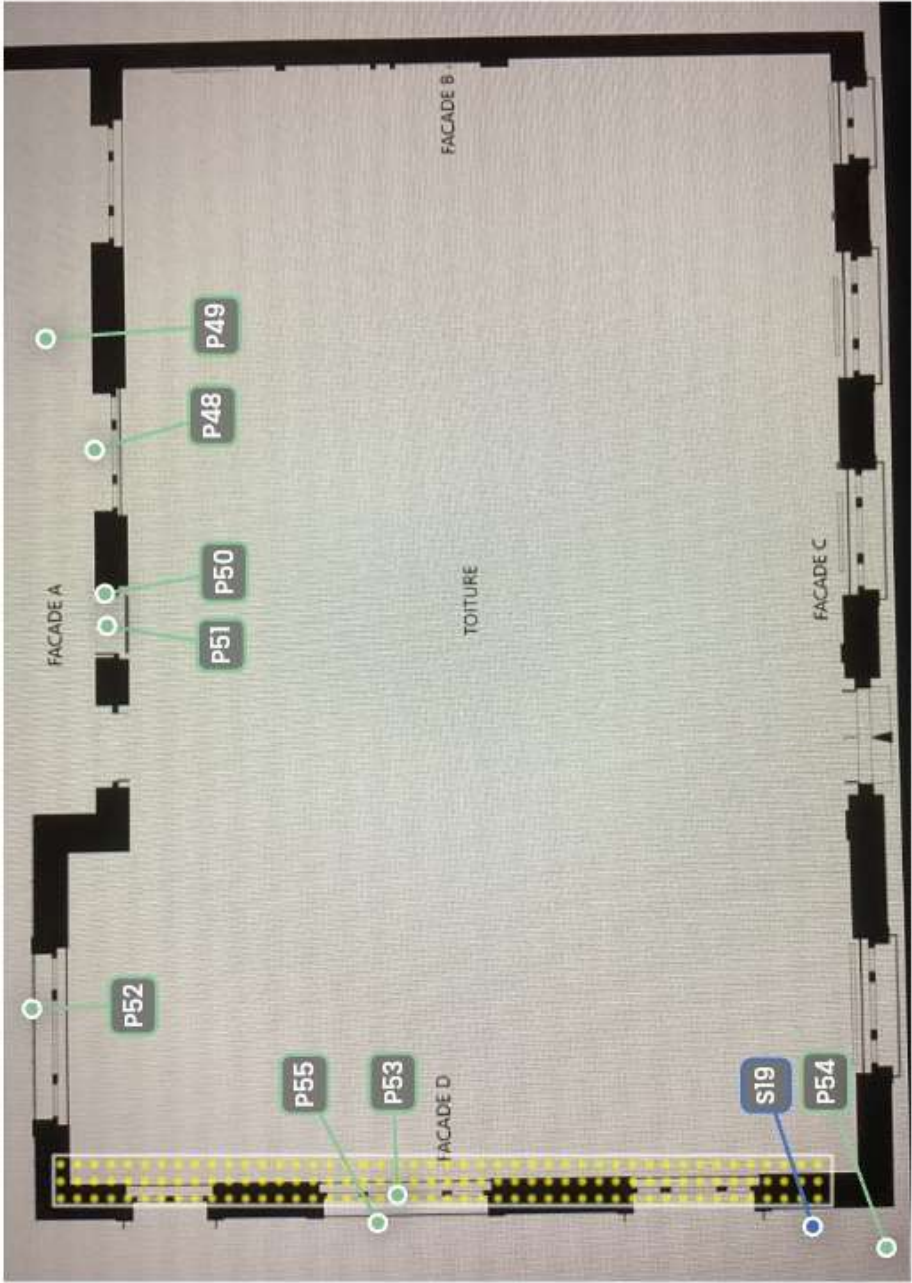

LEGENDE	● Prélèvement positif	● Prélèvement négatif	● Sondage	● Inaccessibilité	● Observation
---------	-----------------------	-----------------------	-----------	-------------------	---------------

PLANCHE DE REPERAGE TECHNIQUE				
La planche de repérage est indissociable du rapport				
ADRESSE		FINANCES METZ 4 RUE FRANCOIS DE GUISE 57000 METZ		
Localisation		Date visite	Du 18/02/2025 au 20/02/2025	
Coure extérieur		Auteur	Loïc MULLER	
		N° dossier	25285339/s6/h	
		Planche	6 / 6	
		Indice	1	
<u>Vue utilisée :</u>				
<u>Matériaux et produits contenant de l'amiante :</u>				



LEGENDE	●	●	●	●	●
Prélèvement positif	Prélèvement négatif	Sondage	Inaccessibilité	Observation	

7.9. Rapport d'analyse du laboratoire



1 Rue Graham Bell - Technopole 2000
57070 METZ
Tel : 03.87.35.83.50
www.itga.fr



Accréditation n° 1-6091

Portée disponible
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Cliant : BUREAU VERITAS EXPLOITATION - FLEVILLE DEVANT NANCY 29 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY	Réf. Commande ITGA : IT0325-2264 Réf. Commande Client : 1510797887/25285339/S6/1/1_25285339/6/1
---	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 24/02/2025

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :
ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7591	
Réf échantillon client : ITM-AABLE-2103698 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P41 Sous sol - ARCHIVES 3 Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige en vrac	
Peinture non séparable + Matériau compact beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7592	
Réf échantillon client : ITM-ALZHS-2104470 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P7 R+2 - BUREAU 2 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau plâtreux blanc	
Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7593	
Réf échantillon client : ITM-CNBTT-2103697 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P40 Sous sol - DGT 3 Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7594	
Réf échantillon client : ITM-DKPLA-2103692 - [Revêtements de sol] - [rel : P35 RDC - CUISINE Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7595	
Réf échantillon client : ITM-DMUBU-2103677 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P20 R+1 - BUREAU 4 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture + Matériau gris en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7596	
Réf échantillon client : ITM-DNLXL-2103705 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P48 Extérieur - Facade A Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau noir et rouge en vrac	
▸ Matériau noir et rouge en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7597	
Réf échantillon client : ITM-DWWCI-2103700 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P43 Sous sol - DEGGT 2 Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige hétérogène	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige hétérogène	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7598	
Réf échantillon client : ITM-DYSRP-2103691 - [Revêtements de sol] - [rel : P34 RDC - CUISINE Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7599	
Réf échantillon client : ITM-ECQSU-2103688 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P31 RDC - DGT 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7600	
Réf échantillon client : ITM-ELTZE-2103686 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P29 RDC - BUREAU 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact gris	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7601	
Réf échantillon client : ITM-FXZDP-2103713 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P55 Extérieur - Facade D Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7602	
Réf échantillon client : ITM-GFXVO-2103699 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P42 Sous sol - DGT 4 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7603	
Réf échantillon client : ITM-GRJPW-2103687 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P30 RDC - DGT 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau souple beige	
▸ Matériau souple beige	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7604	
Réf échantillon client : ITM-HDYRC-2103671 - [Plafonds] - [rel : P14 R+1 - DGGT 1 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7605	
Réf échantillon client : ITM-HHBFE-2103672 - [Poteaux] - [rel : P15 R+1 - DGGT 1 Poteaux]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7606	
Réf échantillon client : ITM-IAJRV-2104473 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P4 R+2 - BUREAU 3 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau mou beige	
▸ Matériau mou beige	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7607	
Réf échantillon client : ITM-IBXTO-2103685 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P28 RDC - BUREAU 1 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7608	
Réf échantillon client : ITM-ISWVG-2103668 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P11 R+2 - SAN 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7609	
Réf échantillon client : ITM-JGSCS-2103679 - [Plafonds] - [rel : P22 R+1 - BUREAU 4 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7610	
Réf échantillon client : ITM-JOGOR-2103682 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P25 R+1 - SAN Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7611	
Réf échantillon client : ITM-KMBDL-2104472 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P5 R+2 - BUREAU 3 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7612	
Réf échantillon client : ITM-KTTAP-2103706 - [Equipements] - [rel : P49 Extérieur - Facade A Equipements]		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
▸ Matériau gris en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7613	
Réf échantillon client : ITM-MJZJV-2103680 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P23 R+1 - DGT 3 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7614	
Réf échantillon client : ITM-MOZEP-2103683 - [Revêtements de sol] - [rel : P26 RDC - SALLE DE REUNION Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage rose	
▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7615		
Réf échantillon client : ITM-NDHLO-2103712 - [Equipements] - [rel : P54 Extérieur - Facade C Equipements]	Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
▸ Peintures multiples en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7616		
Réf échantillon client : ITM-NJUNI-2103674 - [Poutres] - [rel : P19 R+1 - BUREAU 3 Poutres]	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7617		
Réf échantillon client : ITM-NODJB-2103702 - [Plafonds] - [rel : P45 Sous sol - DEGGT 1 Plafonds]	Description ITGA : Matériau beige en vrac		
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7618		
Réf échantillon client : ITM-NWHYD-2103689 - [Poutres] - [rel : P32 RDC - BUREAU 2 Poutres]	Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige		
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7619		
Réf échantillon client : ITM-OCLWH-2103711 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P53 Extérieur - Facade D Menuiseries extérieures]	Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir		
▸ Peinture non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339	Réf échantillon ITGA : IT032502-7620		
Réf échantillon client : ITM-OEFED-2103695 - [Revêtements de sol] - [rel : P38 RDC - BUREAU 1 Revêtements de sol]	Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage rose	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7621	
Réf échantillon client : ITM-OIYGZ-2103669 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P12 R+1 - DGGT 1 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Matériau souple blanc	
▸ Matériau souple blanc	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7622	
Réf échantillon client : ITM-PFHXR-2103678 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P21 R+1 - BUREAU 4 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau souple beige en vrac	
▸ Matériau souple beige en vrac	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7623	
Réf échantillon client : ITM-PJCQO-2103708 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P50 Extérieur - Facade A Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau mousse noire	
▸ Peinture non séparable + Matériau mousse noire	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7624	
Réf échantillon client : ITM-POIHK-2103709 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P51 Extérieur - Facade A Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau souple blanc en faible quantité	
▸ Matériau souple noir + Matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7625	
Réf échantillon client : ITM-PXBXC-2103676 - [Façades lourdes y compris poteaux] - [rel : P18 R+1 - BUREAU 2 Façades lourdes y compris poteaux]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7626	
Réf échantillon client : ITM-PXJBV-2104468 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P9 R+2 - BUREAU 7 Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Matériau noir en vrac	
▸ Matériau noir en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7627	
Réf échantillon client : ITM-RUVEB-2103694 - [Revêtements de sol] - [rel : P37 RDC - LOCAL 2 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
▸ Matériau gris en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7628	
Réf échantillon client : ITM-SGLLL-2103684 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P27 RDC - SALLE DE REUNION Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Matériau souple noir avec couche souple	
▸ Matériau souple noir avec couche souple	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7629	
Réf échantillon client : ITM-SIDVB-2103704 - [Plafonds] - [rel : P47 Sous sol - CHAUFFERIE Plafonds]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7630	
Réf échantillon client : ITM-SKZSV-2104476 - [Revêtements de sol] - [rel : P1 R+2 - BUREAU 2 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche en toile / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige avec couche en toile	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7631	
Réf échantillon client : ITM-SNTMU-2104467 - [Revêtements de sol] - [rel : P10 R+2 - SAN 1 Revêtements de sol]		Description ITGA : Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige avec couche fibreuse	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB
▸ Colle polymère jaune non séparable + Ragréage gris	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7632	
Réf échantillon client : ITM-UBWUI-2103681 - [Murs et cloisons maçonneries "en dur"] - [rel : P24 R+1 - DGGT 4 Murs et cloisons maçonneries "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7633	
Réf échantillon client : ITM-UEECA-2104471 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P6 R+2 - BUREAU 3 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau gris en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau gris en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7634	
Réf échantillon client : ITM-URTBN-2103703 - [Plafonds] - [rel : P46 Sous sol - CHAUFFERIE Plafonds]		Description ITGA : Matériau beige en vrac	
▸ Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7635	
Réf échantillon client : ITM-UVKOL-2103696 - [Poteaux] - [rel : P39 R+1 - DGGT 1 Poteaux]		Description ITGA : Matériau compact blanc	
▸ Matériau compact blanc	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7636	
Réf échantillon client : ITM-WCKZQ-2103675 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P17 R+1 - BUREAU 2 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche en papier	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7637	
Réf échantillon client : ITM-WKHHH-2103701 - [Plafonds] - [rel : P44 Sous sol - ARCHIVES 2 Plafonds]		Description ITGA : Peinture / Matériau beige en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau beige en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7638	
Réf échantillon client : ITM-XFWUI-2104474 - [Menuiseries intérieures] - [rel : P3 R+2 - BUREAU 3 Menuiseries intérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7639	
Réf échantillon client : ITM-XPZY-2104469 - [Cloisons (légères et préfabriquées)] - [rel : P8 R+2 - DGT 2 Cloisons (légères et préfabriquées)]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : KDB (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7640	
Réf échantillon client : ITM-XSPZU-2103670 - [Murs et cloisons maçonnées "en dur"] - [rel : P13 R+1 - DGGT 1 Murs et cloisons maçonnées "en dur"]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux blanc en vrac	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux blanc en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7641	
Réf échantillon client : ITM-YNJED-2103690 - [Poutres] - [rel : P33 RDC - BUREAU 3 Poutres]		Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau compact beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : DDG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7642	
Réf échantillon client : ITM-YOTAE-2103673 - [Poutres] - [rel : P16 R+1 - DGGT 1 Poutres]		Description ITGA : Peinture / Matériau plâtreux beige	
▸ Peinture non séparable + Matériau plâtreux beige	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7643	
Réf échantillon client : ITM-ZOOXZ-2103710 - [Menuiseries extérieures] - [rel : P52 Extérieur - Facade A Menuiseries extérieures]		Description ITGA : Peinture / Matériau souple noir	
▸ Peinture non séparable + Matériau souple noir	META (B) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0325-2264 EN DATE DU 25/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7644	
Réf échantillon client : ITM-ZPQLK-2104475 - [Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres] - [rel : P2 R+2 - BUREAU 2 Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres]		Description ITGA : Peinture avec couche en papier / Matériau blanc	
▸ Peinture avec couche en papier non séparable + Matériau blanc	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : YNG (3)
Réf dossier client : 25285339		Réf échantillon ITGA : IT032502-7645	
Réf échantillon client : ITM-ZYADU-2103693 - [Revêtements de sol] - [rel : P36 RDC - LOCAL 2 Revêtements de sol]		Description ITGA : Matériau gris en vrac	
▸ Matériau gris en vrac	META (A) le 25/02/2025 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (1) / -	Analyste : BCR (2)

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.
(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Yoann GUISLAIN Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT252502-2979_1 EN DATE DU 28/02/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - FLEVILLE DEVANT NANCY
29 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT 2525-1082
Echantillon ITGA : IT 252502-2979
Reçu au laboratoire le : 25/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1510797887/25285339/S6/1/2_25285339/6/1
Dossier client	25285339
Echantillon	ITM-EQSKP-2103716 - [Voiries] - [rel : P57 Coure extérieur Voiries]

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :

- Phase mastic – Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252502-2979_1 EN DATE DU 28/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Éléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques /Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
► Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 28/02/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽⁴⁾	---	Analyste : ISD
► Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽³⁾	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 28/02/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽⁴⁾	---	Analyste : ABK

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Matthieu MEAR - Analyste

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT252502-2980_1 EN DATE DU 28/02/2025

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE DELIBEREMENT AJOUTE ET NATURELLEMENT PRESENT DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS MANUFACTURES

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - FLEVILLE DEVANT NANCY
29 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY
54710 FLEVILLE DEVANT NANCY

Prélèvement :

Commande ITGA : IT 2525-1082
Echantillon ITGA : IT 252502-2980
Reçu au laboratoire le : 25/02/2025

Réf. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	1510797887/25285339/S6/1/2_25285339/6/1
Dossier client	25285339
Echantillon	ITM-YOHCM-2103717 - [Voiries] - [rel : P56 Coure extérieur Voiries]

Description ITGA	Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène
------------------	--

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :

- Phase mastic – Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)
- Phase granulaire – Traitement thermique (méthode interne : IT 413)
- Pour l'analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement, réduction de la matrice et montage adapté sur lame de microscopie (méthode interne : IT 444).
- Pour l'analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiantes optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ET/OU

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de l'International Mineralogical Association - IMA) :
Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d'amiantes est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

RAPPORT D'ESSAI N° IT252502-2980_1 EN DATE DU 28/02/2025
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Fraction Analysée	Données préparations		Données Analytiques		Résultat ⁽²⁾	Variété d'amiante ⁽²⁾	Éléments analytiques
	Nombre de préparations	Traitement	Techniques analytiques /Date d'analyse	Nombre de supports analytiques			
► Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux	Nombre de préparations : 1	Chimique	META le 28/02/2025	Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté ⁽⁴⁾	---	Analyste : ISD
► Agrégats d'enrobé bitumineux - matériau granulaire hétérogène ⁽³⁾	Nombre de préparations : 3	Thermique et mécanique	META le 28/02/2025	Nombre de supports d'analyse : 6	Amiante non détecté ⁽⁴⁾	---	Analyste : ABK

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamètre supérieur à 0.2 micromètre.

(2) Ce résultat porte sur l'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.

(3) La fraction analysée a subi un traitement thermique préalable.

(4) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres d'amiante inférieure à la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Matthieu MEAR - Analyste
